H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

EJERCICIO 2023

ESTIMACION 03 (TRES) Y FINIQUITO

SUBMODALIDAD: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III) RAMO XXXIII.**

CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**

OBRA/PROYECTO/ACCIÓN: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.**

UBICACIÓN: **ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO**

CONTRATISTA: **IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.**

NUMERO DE ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA: **(ZAP): 2721**

CLAVE DE LA LOCALIDAD: **12001 0001**

NUMERO DE (AGEB) **: 12001 0001 2721**

ORIGINAL

2878

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

REMISION DE DOCUMENTOS

MODALIDAD: **CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2023**
SUBMODALIDAD: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III) RAMO XXXIII**
OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES. ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.**
CONTRATO No.: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
DOCUMENTOS REMITIDOS A LA: **AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO**
DEPENDENCIA EJECUTORA: **12M01 H. A. ACAPULCO**

No. PROG.	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
			TOTAL	RETENCIONES	NETO
1	28-dic.-23	IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. FACT. No 8E9F	2,522,558.32	767,640.60	1,754,917.72
		SUBTOTAL $	2,522,558.32	767,640.60	1,754,917.72
		TOTAL $	2,522,558.32	767,640.60	1,754,917.72

viernes 29 de diciembre de 2023

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

TRANSFERENCIA: 978

23 DE FEBRERO DE 2024

Paguese vía transferencia a:
IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

La cantidad de:
1,754,917.72

(** UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 72/100 M.N. **)

PÓLIZA TRANSFERENCIA

Beneficiario IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Banco a transferir

CLABE

Cuenta

Banco pagador
FIII FAISM 2023 STDER 9395
23/02/2024 978

Cuenta
65509609395
1,754,917.72

Concepto
Pago de solicitudes : 1501-1538, PAGO FACTURA NO. 8E9F EST. 03 (TRES Y FINIQUITO) REHABILITACION DE CALLE FELIPE II TRAM O FARALLON AV. UNIVERSIDAD FRACC. MAGALLANES CON CARGO AL RA
Facturas: 9411D527-FEA3-42C2-9AA6-04AA03AA8E9F,

Cuenta	NUP	Descripción	Debe	Haber
21130-00000-10004-00045		Generado por cuenta por pagar	1,754,917.72	
11120-00000-02005-00005		IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE		1,754,917.72
			1,754,917.72	1,754,917.72

Solicitud de pago
504 - 647

Póliza
11 2 106

OPERADO
FISM 2023

Elaboró
JCM

Revisó
EMO

Autorizó
CAMR

978

Santander

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ 080122053040

Usuario: 53420142 - MONTSERRAT MONTES MANRRIQUEZ

Referencia: 24430

Referencia numérica del Emisor:

Referencias del Movimiento: 6913538

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014260655096093956

Cuenta Cargo: 65509609395 - R33 FIII FAISM 2023

Cuenta Abono: 072261002480081016 - IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Importe: $ 1,754,917.72 MXN

Concepto: R33FIII F8E9F EST3 FIN REHAB CFELIPE

Fecha y hora de Alta: 23/02/2024 15:50:35

Fecha y hora de Liquidación: 23/02/2024 15:50:46

Clave de Rastreo: 20240223400140BET0000469135380

RFC Beneficiario:

RFC Ordenante: MAJ010101NA3

Importe IVA:

Email del Beneficiario:

Banco Destino: BANORTE

OPERADO
FAISMUN - 2023

Operación realizada por internet

Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó **55 5169 4303**

SuperLinea Empresarial SuperLinea PyME

RFC emisor:	ICO091216UUA	**Folio fiscal:**	9411D527-FEA3-42C2-9AA6-04AA03AA8E9F
Nombre emisor:	IMEXA CONSTRUCTORES	**No. de serie del CSD:**	00001000000702553491
RFC receptor:	MAJ010101NA3	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	39530 2023-12-28 20:05:31
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ		
Código postal del receptor:	39350	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
		Régimen fiscal:	General de Ley Personas Morales
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	**Exportación:**	No aplica
Uso CFDI:	Construcciones.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
72141103		1.00	E48	Unidad de servicio	1,522,233.47	1,522,233.47	10,873.10	Sí objeto de impuesto.

Descripción: ESTIMACIÓN 03 (TRES) Y FINIQUITO NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD FRACC. MAGALLANES UBICADA EN ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO CON CARGO AL FONDO III RAMO 33 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023 SEGUN CONTRATO No. MAJ-FAISMUN/426-2023/LP DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2023 PERIODO DE CONTRATO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	1,522,233.46	Tasa	16.00%	243.557.35

Número de pedimento	Número de cuenta predial

OPERADO
FAISMUN - 2023

Moneda:	Peso Mexicano
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago:	Pago en una sola exhibición

Subtotal			$ 1,522,233.47
Descuento			$ 10,873.10
Impuestos trasladados	IVA	16.00%	$ 243,557.35
Total			**$ 1,754,917.72**

Sello digital del CFDI:

JVlBluu5keLafsCtpyevm6+cOpG9twKlWN+KVIR+2+2SP1oqQ+kn/ZnmToeg6A4jjlJoZTLme891leJhpbm2p8pZTq6ZFPkMrmevJElLL99gVWM8+ndtDftZmL4LH7UFcVb81/QzTvuxx8/6YsTC
xzKzeiYnm9TC1Hrn606Xj8Dsru4awUXlz/aNxThmA5Y4Jz2EJ/hm21nRk+b5T/FY8Ccl/SnkDsMnohxGjCiokBFCuuVbuz+rMASeIpV5r0mEQnvJV+Mc8jSnLFDbsUB5XuwOBK0UtxiK2Y//GLA
/aXdT6pBaOEiqVm43yn+msZZaOKGzYwV2VDZQubW9Nly4HQ==

Sello digital del SAT:

DMFwteUEqieanZN9RBixjVAd7CBK8m6rlQKc9lgGcML+BGpJXEyeHhdAFYtiHClCgASTPSVQpJhxrukGvL6u9Dci8X42r30sXMhkwmpYCjcs+/HJ4vNl+5lmEqJzV1elpJZew8ToSw0a6+eUW
5uO06Il8YQjlFMX2VMjjrBGPqxlqQZ4ySzWPTOOUAFoE68oUAS/KHsu+teNSZLx6SxThH+4c+9PPuz78foKaUk5OCvXhHEO1CmW2b0ZpfE+mdlP+Ll7B4d3AqLHNPKej4YWb7qGvsulaB8
r8FFnRB81/ljlrqEgF5VidqgZNAa/TPTpdskF7Uq1PQM1XOMkmm1tLA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9411D527-FEA3-42C2-9AA6-04AA03AA8E9F|2023-12-28T20:05:46|SAT970701NN3|JVlBluu5keLafsCtpyevm6+cOpG9twKlWN+KVIR+2+2SP1oqQ
+kn/ZnmToeg6A4jjlJoZTLme891leJhpbm2p8pZTq6ZFPkMrmevJElLL99gVWM8+ndtDftZmL4LH7UFcVb81/QzTvuxx8/6YsTCxzKzeiYnm9TC1Hrn606Xj8
Dsru4awUXlz/aNxThmA5Y4Jz2EJ/hm21nRk+b5T/FY8Ccl/SnkDsMnohxGjCiokBFCuuVbuz+rMASeIpV5r0mEQnvJV+Mc8jSnLFDbsUB5XuwOBK0UtxiK2
Y//GLA/aXdT6pBaOEiqVm43yn+msZZaOKGzYwV2VDZQubW9Nly4HQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2023-12-28 20:05:46

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

REVISADO:
C. P. MIGUEL JAIMES RAMOS
SINDICO PROCURADOR ADMINISTRATIVO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISADO:
DR. CARLOS ARMANDO MORILLÓN RAMÍREZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

IMEXA CONSTRUCTORES S A DE C V

R.F.C. ICO091216UUA

Corregidora No. 4 Col. Morelos, C.P. 39530

CLIENTE:

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
R.F.C. MAJ010101NA3
AV. CUAUHTÉMOC S/N INTERIOR PARQUE PAPAGAYO COL. HORNOS INSURGENTES. CP. 39350

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES

UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
PERIODO DEL CONTRATO: DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
No. DE OBRA: MAJ/426
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONTRATO No.	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE CON I.V.A.	ANTICIPO CON I.V.A.
MAJ-FAISMUN/426-2023/LP	15 DE AGOSTO DEL 2023	$5,000,427.46	$1,500,128.24

TIPO DE OBRA: DOMINIO PUBLICO

METAS PROGRAMADAS: 1,471.35 M2

METAS ALCANZADAS: 100%

RECIBI DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, A TRAVES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III) QUE TIENE COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO EL RAMO XXXIII., APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, LA CANTIDAD DE: $ 1,754,917.72 (UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 72/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES) Y FINIQUITO, DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, UBICADA EN ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO No. MAJ-FAISMUN/426-2023/LP.

DEDUCCIONES:

AMORTIZACION DEL ANTICIPO	$756,767.50
5 AL MILLAR DE SUPERV.	$10,873.10
5 AL MILLAR DE LA CMIC	$0.00
TOTAL DE DEDUCCIONES	**$767,640.60**

CALCULO DE LA ESTIMACION:

IMPORTE DE LA ESTIMACION CON IVA	$2,522,558.32
MENOS DEDUCCIONES	$767,640.60
SALDO A PAGAR	**$1,754,917.72**

REPRESENTANTE LEGAL

ING. IRINA SALGADO HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
POR ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023

SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONÓMICO

L.C. ERIC ROMERO MORALES

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. CARLOS ARMANDO MORILLON RAMIREZ

OPERADO FAISMUN - 2023

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

SUBTOTAL	$1,522,233.47
DESCUENTO	$10,873.10
IMPUESTOS TRASLADOS IVA 16.0000%	$243,557.35
TOTAL	**$1,754,917.72**

CANTIDAD CON LETRA

(UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 72/100 M.N.)

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.


```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cartaporte30="http://www.sat.gob.mx/CartaPorte30" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Fecha="2023-12-28T20:05:31"
Sello="JVIBluu5keLafsCtpyevm6+cOpG9twKlWN+KVIR+2+2SP1oqQ+kn/ZnmToeg6A4jjlJoZTLme891IeJhpbm2p8pZTq6ZFPkMrmevJEILL99gVWM8+ndtDftZmL4LH7UFcVb81/QzTvuxx8/6Ys
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000702553491"
Certificado="MIIGEDCCA/igAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDI1NTM0OTEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwgU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVU
SubTotal="1522233.47" Descuento="10873.10" Moneda="MXN" Total="1754917.72" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="39530">
  <cfdi:Emisor Rfc="ICO091216UUA" Nombre="IMEXA CONSTRUCTORES" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="MAJ010101NA3" Nombre="MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ" DomicilioFiscalReceptor="39350" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="72141103" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de servicio" Descripcion="ESTIMACIÓN 03 (TRES) Y FINIQUITO
    NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD FRACC. MAGALLANES UBICADA EN ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO CON
    CARGO AL FONDO III RAMO 33 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023 SEGUN CONTRATO No. MAJ-FAISMUN/426-2023/LP DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2023 PERIODO DE CONTRATO
    DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023." ValorUnitario="1522233.47" Importe="1522233.47" Descuento="10873.10" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="1522233.46" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="243557.35"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="243557.35">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="1522233.46" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="243557.35"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="9411D527-FEA3-42C2-9AA6-04AA03AA8E9F"
    FechaTimbrado="2023-12-28T20:05:46" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
    SelloCFD="JVIBluu5keLafsCtpyevm6+cOpG9twKlWN+KVIR+2+2SP1oqQ+kn/ZnmToeg6A4jjlJoZTLme891IeJhpbm2p8pZTq6ZFPkMrmevJEILL99gVWM8+ndtDftZmL4LH7UFcVb81/QzTvu
    NoCertificadoSAT="00001000000504465028"
    SelloSAT="DMFwteUEqieanZN9R8ixjVAd7CBK8m6rlQKc9lgGcML+BGpJXEyeHhdAFYtiHClCgASTPSVQpJhxrukGvL6u9Dci8X42r30sXMhkwmpYCjcs+/HJ4vNl+5lmEqJzV1elpJZew8ToSw0
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```


OPERADO
FAISMUN - 2023

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

HACIENDA SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ICO091216UUA	IMEXA CONSTRUCTORES	MAJ010101NA3	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
9411D527-FEA3-42C2-9AA6-04AA03AA8E9F	2023-12-28T20:05:31	2023-12-28T20:05:46	SAT970701NN3
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$1,754,917.72	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
FAISMUN - 2023

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

4.1 ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN

Este documento deberá ser firmado por el CPS únicamente si la obra ha sido concluida y funciona correctamente para las personas beneficiadas

Siendo el día 12 del mes de DICIEMBRE del año 2023, a las 13:00 horas en el domicilio ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, localizado en el municipio **ACAPULCO DE JUAREZ**, de la entidad federativa **GUERRERO**, conforme a lo establecido en los lineamientos FAIS 2023, la autoridad local, representada por la persona enlace FAISMUN en conjunto con el Comité de participación social, realizan el acto de entrega-recepción de la obra realizada con recursos del FAIS, según las siguientes especificaciones:

DATOS DE LA OBRA *Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN			
Fecha de llenado:	12 DE DICIEMBRE DE 2023		
Nombre de la obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES			
Folio asignado en la MIDS: 428242		Monto total planeado: $5'000,427.96	
Periodo de ejecución	Fecha de inicio: 15-AGO-2023	Fecha de conclusión: 12/12/23	
Entidad: **GUERRERO**	Municipio: **ACAPULCO DE JUAREZ**	Localidad: ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO	
Si la obra tiene más de una subclasificación, indíquelas a continuación, así como los montos correspondientes:			
Subclasificación: Rehabilitación de calle		Monto: $	3'741,351.67
Subclasificación: Drenaje Sanitario		Monto: $	113,963.67
Subclasificación: Guarniciones		Monto: $	261,294.03
Subclasificación: Muro de Contención.		Monto: $	883,818.09

Una vez celebrada la entrega y verificación de la obra, mediante su recorrido de inspección por parte de las autoridades municipales y las personas integrantes del Comité de participación social, se concluye que la obra se encuentra concluida y funcionando conforme a lo previsto en el programa de ejecución según las especificaciones y la inversión ejercida para esta.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

BIENESTAR

FAIS

2023 Francisco VILLA

ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

ENTREGA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE **ACAPULCO DE JUAREZ**

M.C. ALEJANDRO DIAZ LOPEZ

Enlace ~~FAISMUN~~

DIRECTOR DE PLANEACION

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

RECIBE EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Lucero Mata Méndez

Presidenta(e)

Nombre completo y firma

Mario Alberto Díaz Salado

Secretaria(o)

Nombre completo y firma

Ana María Sotelo M.

Vocal

Nombre completo y firma

Luis Medina Sotelo

Vocal

Nombre completo y firma

CARMELO DIAZ DIAZ

Vocal

Nombre completo y firma

Rosa Teran Díaz

Testigo

Marcelo Diaz Teran

Testigo

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

2023 Francisco VILLA

ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

DATOS DE LA OBRA *Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN		
Fecha de llenado: 12 DE DICIEMBRE DE 2023		
Nombre de la obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES		
Folio asignado en la MIDS: 428242		Monto total planeado: 65'000,427.46
Periodo de ejecución	Fecha de inicio: 15-AGO-2023	Fecha de conclusión: 12/12/23
Entidad: GUERRERO	Municipio: ACAPULCO DE JUAREZ	Localidad: ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO
Si la obra tiene más de una subclasificación, indíquelas a continuación, así como los montos correspondientes:		
Subclasificación: Rehabilitación de calle		Monto: $ 3'741 351.67
Subclasificación: Drenaje Sanitario		Monto: $ 113'963.67
Subclasificación: Guarniciones		Monto: $ 261,294.03
Subclasificación: Muro de Contensión		Monto: $ 883,818.09

4.2. REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
*Esta sección deberá ser llenada a mano por el CPS

1. Indiquen el número veces que visitaron la obra durante su inicio, desarrollo y conclusión:

[3]

2. ¿La obra concluyó en la fecha en que informó la autoridad local?

a) Sí. [/]

b) No, concluyó antes de la fecha informada. [ ]

c) No, concluyó después de la fecha informada. [ ]

d) No ha concluido. [ ]

2a. ¿En caso de que la obra no esté concluida, qué fecha tentativa informó la autoridad local para su conclusión?

3. ¿Ustedes (CPS) estuvieron presentes en la entrega de la obra? Sí [/] No [ ]

3a. En caso de responder que no, ¿por qué no estuvieron presentes?

4. ¿La obra se entregó terminada y funcionando? Sí [/] No [ ]

4a. En caso de responder que no, ¿por qué no se terminó o por qué no funciona la obra?

ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

5. ¿Ustedes (CPS) recibieron por parte de la autoridad local el acta entrega- recepción? Sí [✓] No [ ]

6. ¿La autoridad local colocó la placa de conclusión de la obra? Sí [✓] No [ ]

7. **De los siguientes mecanismos, tachen aquellos que utilizaron para** comunicar a la ciudadanía las actividades de **seguimiento a las obras del FAISMUN:**

a) **No las comunicaron.** [ ]
b) **Juntas vecinales o comunitarias.** [✓]
c) **Carteles informativos.** [ ]
d) Perifoneo (altavoces, etc.). [ ]
e) A través de redes sociales (Facebook, grupos de WhatsApp, etc.). [ ]
f) Otros. [ ]

7a. Si se utilizaron otros mecanismos, ¿cuáles fueron?

8. Mencionen dos resultados o beneficios obtenidos en su comunidad con el trabajo realizado por ustedes a través de su participación en el CPS del FAISMUN.

MEJORO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES, HAY MAS TRANSPORTE ESTA MAS LIMPIA LA CALLE, MENOS PROLIFERACION DE MOSQUITOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024
SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPCIÓN SOCIAL

Lucero Mata Méndez

Presidenta(e)
Nombre completo y firma

Mario Alberto Díaz Salado

Secretaria(o)
Nombre completo y firma

Ana María Sotelo M.

Vocal
Nombre completo y firma

Luis Medina Sotelo

Vocal
Nombre completo y firma

CARMELO DIAZ DIAZ

Vocal
Nombre completo y firma

M.C. ALEJANDRO DIAZ LOPEZ

Enlace FAISMUN
DIRECTOR DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

ACAPULCO
CERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

E S T A D O D E C U E N T A

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	ESTIMACION No.	03 (TRES) Y FINIQUITO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL:	01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	No. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/426-2023/LP	AL:	12 DE DICIEMBRE DEL 2023
		FECHA:	12 DE DICIEMBRE DEL 2023		

IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	PERIODO DEL CONTRATO	IMPORTE DEL ANTICIPO (CON IVA)	FECHA DE ANTICIPO
$ 5,000,427.46	DEL 15 DE AGOSTO DE 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	$ 1,500,128.24	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

ESTIMACION	PERIODO ESTIMACION	IMPORTE ESTIMACION	IVA	2 AL MILLAR C.M.I.C	5 AL MILLAR INSP. DE OBRAS	AMORTIZACION ANTICIPO	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
01 (UNO)	DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023	1,501,204.22	240,192.68	0.00	7,506.02	522,419.07	529,925.09	1,211,471.81
02 (DOS)	DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023	634,889.86	101,582.38	0.00	3,174.45	220,941.67	224,116.12	512,356.12
03 (TRES) Y FINIQUITO	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	2,174,619.25	347,939.07	0.00	10,873.10	756,767.50	767,640.60	1,754,917.72
	TOTAL	4,310,713.33	689,714.13	0.00	21,553.57	1,500,128.24	1,521,681.81	3,478,745.65
	SALDO	$0.00		SALDO POR AMORTIZAR		$0.00		

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

R E S U M E N D E L A E S T I M A C I Ó N

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023	
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	FECHA:	01 DE OCTUBRE DEL 2023 (12 DICIEMBRE)	AL:	12 DE DICIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/426-2023/LP	ESTIMACION No.:	03 (TRES) Y FINIQUITO
		TIPO DE OBRA:	URBANIZACION		

No.	P A R T I D A	IMPORTE
A1	PRELIMINARES	0.00
A2	TERRACERIAS	236,923.20
A3	INSTALACION HIDRAULICA	4,909.02
A4	INSTALACION SANITARIA	0.00
A5	ALBAÑILERIA	0.00
A6	INSTALACIONES ELECTRICAS Y LUMINARIAS	69,381.66
A7	PAVIMENTACION	1,818,634.79
A8	ACARREOS Y LIMPIEZAS	44,770.58
	TOTAL DE PARTIDAS $	2,174,619.25
	SUBTOTAL $	2,174,619.25
	16 % IVA $	347,939.07
	TOTAL $	2,522,558.32

LA PRESENTE ESTIMACION IMPORTA LA CANTIDAD DE: $ 2,522,558.32 (DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N.))

AVANCE FISICO 100.00%

AVANCE FINANCIERO ANTERIOR 49.55%

AVANCE FINANCIERO ACTUAL 50.45%

AVANCE FINANCIERO TOTAL 100.00%

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	E S T I M A C I Ó N			ESTIMACIÓN No. 03 (TRES) Y FINIQUITO	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO**	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023	
	NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES**	FECHA:	**12 DE DICIEMBRE DEL 2023**	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	
	CONTRATISTA: **IMEXA CONSTRUCTORES S.A DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	HOJA: 1	DE: 9
		TIPO DE OBRA:	URBANIZACION		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
A1	**PRELIMINARES**								
3-0073	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICAS DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIES MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD) INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS.	M2	17.31	2,692.81	2,052.42	0.00	2,052.42	0.00	0.00
D-CAR5A10	DEMOLICION A MAQUINA DE CARPETA ASFALTICA DE 5.00 A 10.00 CMS. DE ESPESOR INCLUYE MANO DE OBRA Y ACARREOS EN 1ra, ESTACION	M2	73.31	1,649.00	1,719.80	0.00	1,719.80	70.80	0.00
D-BANQU	DEMOLICION MECANICA DE BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: HERAMIENTA MENOR, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	63.40	146.04	226.11	0.00	226.11	80.07	0.00
D-GUARM	DEMOLICION MECANICA DE GUARNICION DE 15X20X50 CM, INCLUYE: EXTRACCION DE PEDACERIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	69.73	183.67	236.61	0.00	236.61	52.94	0.00
1-0056	DESCORONAMIENTO DE MURO DE PIEDRA BRAZA DE 30 CM. DE ANCHO INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA PRODUCTO DE LA DEMOLICION.	M	108.12	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXC-001	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II INCLUYE AFINE DE TALUD Y FONDO, ACARREOS A PRIMERA ESTACION DE 20 MTS.	M3	74.30	699.43	846.51	0.00	846.51	147.08	0.00

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

	E S T I M A C I Ó N			ESTIMACIÓN No. 03 (TRES) Y FINIQUITO	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO**	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023	
	NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES**	FECHA:	**12 DE DICIEMBRE DEL 2023**	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	
	CONTRATISTA: **IMEXA CONSTRUCTORES S.A DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	HOJA: 2	DE: 9
		TIPO DE OBRA:	URBANIZACION		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
9-0139	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	83.66	420.29	489.78	0.00	489.78	69.49	0.00
9-0138	RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA , MEDIDO COMPACTADO.	M3	498.99	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PRELIMINARES :								**$0.00**
A2	**TERRACERIAS**								
31-0448	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO II-A, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO DEL MATERIAL	M3	82.27	558.00	556.52	0.00	556.52	0.00	0.00
31-0454	AFINE Y COMPACTACION DE SUB RASANTE AL 90% PROCTOR MINIMO, POR MEDIOS MECANICOS.	M2	40.15	1,471.35	0.00	1,637.51	1,637.51	166.16	65,746.03
31-0457	FORMACION DE BASE DE 30 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO CON EQUIPO MECANICO INCLUYE VERTIDO, AFINE, COMPACTADO AL 95% PROCTOR Y AGUA.	M3	519.14	442.62	0.00	327.48	327.48	0.00	170,007.97
32-0466	AFINE Y COMPACTACION EN BANQUETAS, ANDADORES Y PLAZAS A MANO INCLUYE ACARREOS A PRIMERA ESTACION	M2	39.85	556.64	179.55	29.34	208.89	0.00	1,169.20
	TOTAL TERRACERIAS :								**$236,923.20**

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
M.I. VLADIMIR HERNÁNDEZ ALEMAN

. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE J. REZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	E S T I M A C I Ó N			ESTIMACIÓN No. 03 (TRES) Y FINIQUITO	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023	
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	FECHA:	12 DE DICIEMBRE DEL 2023	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/426-2023/LP	HOJA: 3	DE: 9
		TIPO DE OBRA:	URBANIZACION		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
A3	INSTALACION HIDRAULICA								
4-0080	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II-A, EN SECO Y BARRETA DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, DEPOSITANDO EL PRODUCTO DE EXCAVACION A ORILLA DE CEPA, CUALQUIER ZONA.	M3	200.62	16.00	37.92	0.00	37.92	21.92	0.00
9-0139	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO	M3	83.66	15.80	32.84	0.00	32.84	17.04	0.00
5-0102	CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA INCLUYE; ACOSTILLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M3	475.56	2.00	4.74	0.00	4.74	2.74	0.00
27-0412	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 3" CED. RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	449.24	50.00	79.00	0.00	79.00	29.00	0.00
TOMDOM*	TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CON TUBO DE CPVC DE 13 MM. DE 6 MTS. DE LONGITUD, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, VALVULA DE INSERCION, ABRAZADERA DE 4", ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1,760.31	3.00	0.00	2.00	2.00	0.00	3,520.62
314-IHS-07-087	VALVULA DE ESFERA DE CPVC 13 MM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	242.93	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BOTA01	CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA (BOTA) INCLUYE: LLAVE DE CUADRO ROSCABLE 1/2" , HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO	PZA	1,388.40	3.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1,388.40
	TOTAL INSTALACION HIDRAULICA :								$4,909.02

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	E S T I M A C I Ó N			ESTIMACIÓN No. 03 (TRES) Y FINIQUITO	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO**	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023	
	NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES**	FECHA:	**12 DE DICIEMBRE DEL 2023**	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	
	CONTRATISTA: **IMEXA CONSTRUCTORES S.A DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	HOJA: 4	DE: 9
		TIPO DE OBRA:	URBANIZACION		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
A4	**INSTALACION SANITARIA**								
EXC-001	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II INCLUYE AFINE DE TALUD Y FONDO, ACARREOS A PRIMERA ESTACION DE 20 MTS.	M3	74.30	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9-0139	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	83.66	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9-0138	RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	498.99	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-0102	CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA INCLUYE: ACOSTILLLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION Y MANO DE OBRA.	M3	475.56	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28-0417	POZO DE VISITA DE FORMA CONICA DE 0.60 A 1.20 MTS. DE DIAMETRO INTERIOR POR 1.50 MTS. DE ALTURA A BASE DE MAMPOSTERIA, MURO DE TABIQUE DE 25 CMS CON APLANADO DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO, INCLUYE: EXCAVACION, ACARREO Y RELLENO.	PZA	13,271.34	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37-0579BP	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO ALTA RESISTENCIA ABIERTO O CERRADO PARA POZO DE VISITA DE 60 CM. DE DIAMETRO, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	4,210.10	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26-0390*	REGISTRO SANITARIO DE 0.40X0.60X0.60 MTS. A BASE DE TABICON 10X14X28, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR, ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, PISO DE 10 CM, DE CONCRETO SIMPLE F´C=150 KG/CM2 TAPA DE CONCRETO F´C= 250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DEL No 3 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, DE 15 CM DE ESPESOR INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, BARRENADO Y DEMOLICION DE ROCA, ACARREO Y M.O.	PZA	2,482.13	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

.. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE ..REZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	E S T I M A C I Ó N			ESTIMACIÓN No. 03 (TRES) Y FINIQUITO	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023	
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	FECHA:	12 DE DICIEMBRE DEL 2023	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/426-2023/LP	HOJA: 5	DE: 9
		TIPO DE OBRA:	URBANIZACION		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
TUBO 8"	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES SECUNDARIOS, CONEXIONES Y MANO DE OBRA.	M	773.19	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUM-COD2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SANITARIO DE 6"X45°, INCLUYE CARGA Y DESCARGA EN ALMACEN DE OBRA.	PZA	356.10	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PU-6255	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNION DE SERVICIO DE P.V.C. DE 150 MM. (6") DE DIAMETRO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO INCLUYE CARGA Y DESCARGA EN ALMACEN DE OBRA	PZA	624.14	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PU-6239	SUMINISTRO DE TUBO DE PVC SANITARIO DE NORMA LISO DE 150 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: FLETE , CARGA Y DESCARGA EN ALMACEN DE OBRA.	ML	483.03	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INSTALACION SANITARIA:								**$0.00**
A5	**ALBAÑILERIA**								
18-0296	MURO DE PIEDRA BRAZA DE LA REGION, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO COMUN INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION DE 20 MTS.	M3	2,755.36	276.52	382.58	0.00	382.58	106.06	0.00
18-0313	DREN PARA MURO DE MAMPOSTERIA A BASE DE P.V.C. 4" TIPO RIGIDO INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	130.32	26.00	48.90	0.00	48.90	22.90	0.00

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	E S T I M A C I Ó N			ESTIMACIÓN No. 03 (TRES) Y FINIQUITO	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO**	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023	
	NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES**	FECHA:	**12 DE DICIEMBRE DEL 2023**	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	
	CONTRATISTA: **IMEXA CONSTRUCTORES S.A DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	HOJA: 6	DE: 9
		TIPO DE OBRA:	URBANIZACION		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
18-0318	FILTRO DE GRAVA Y/O RAJUELA DE PIEDRA DE 30 CMS DE ESPESOR INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M3	1,019.51	53.70	35.01	0.00	35.01	0.00	0.00
11-0151*	ANCLAJE DE CASTILLO DE 20 X 15 CMS 4 VAR. # 4 Y ESTRIBOS DEL # 2 A.C. 20 CMS HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 50 CMS. CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	441.46	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-0160*	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F´C=250 KG/CM2, DE 15X20 CM, ARMADO CON 6 VARILLAS No. 4 Y ESTRIBOS No, 2 A CADA 25 CM. INCLUYE CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1RA. ESTACION.	M	882.93	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-0221	LOSAS DE CONCRETO F´C= 250 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ARMADA CON VAR. No. 4 A CADA 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, PARA PASO PEATONAL, SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO COLADO Y DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	2,869.37	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F-BARANDAL1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE TUBO DE ACERO NEGRO DE 1 1/2 CON DIVISION DE TUBO DE 1" CON POSTES DE 1 1/2" A CADA METRO SOLDADO A PLACA DE 1/2" DE 15X15 CMS. EMBUTIDA EN LOSA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, PINTURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	2,373.49	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ALBAÑILERIA:								**$0.00**

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	E S T I M A C I Ó N			ESTIMACIÓN No. 03 (TRES) Y FINIQUITO	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO**	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023	
	NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES**	FECHA:	**12 DE DICIEMBRE DEL 2023**	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	
	CONTRATISTA: **IMEXA CONSTRUCTORES S.A DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/426-2023/AD**	HOJA: 7	DE: 9
		TIPO DE OBRA:	URBANIZACION		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
A6	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y LUMINARIAS**								
REG-AUX	REGISTRO AUXILIAR PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 50X60X65 MTS, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28 CMS. CON 14 CMS. DE ESPESOR ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR F´C=100 KG/CM2, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X 3/16" CONCRETO F´C=200 KG/CM2 EN TAPA Y FIJACION DE MARCO, DREN DE GRAVA DE 20 CMS DE ESPESOR, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	3,554.46	8.00	0.00	11.00	11.00	3.00	39,099.06
TUB-PESA50	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO 50 MM DE DIAMETRO INCLUYE: CONEXIÓN, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, CAMA DE ARENA, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M	201.24	200.00	70.72	150.48	221.20	21.20	30,282.60
	TOTAL INSTALACIONES ELEC TRICAS Y LUMINARIAS								**$69,381.66**
A7	**PAVIMENTACION.**								
4-0080	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II-A, EN SECO Y BARRETA DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, DEPOSITANDO EL PRODUCTO DE EXCAVACION A ORILLA DE CEPA, CUALQUIER ZONA.	M3	200.62	64.35	26.01	9.90	35.91	0.00	1,986.14
9-0138	RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO, DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	498.99	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	E S T I M A C I Ó N			ESTIMACIÓN No. 03 (TRES) Y FINIQUITO	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023	
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	FECHA:	12 DE DICIEMBRE DEL 2023	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/426-2023/LP	HOJA: 8	DE: 9
		TIPO DE OBRA:	URBANIZACION		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
32-0471	GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE DE F´C=200 KG/CM2 DE 20X15X40 CM. DE SECCION T.M.A. 3/4" INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	530.82	424.35	340.70	50.54	391.24	0.00	26,827.64
32-0475A	PAVIMENTO PREMEZCLADO F´C= 300 KG/CM2, T.A.M. 3/4" DE 20 CM. DE ESPESOR RESISTENCIA NORMAL, ACABADO A REGLA INCLUYE: JUNTA CONSTRUCTIVA CON CHAFLAN DE 1/2", EN CADA JUNTA FRIA (AL TERMINO DEL COLADO) SE PROCEDERA A COLOCAR 8 CONECTORES CON VARILLA DE 1/2" A CADA 60 CMS 30-30 CMS. FIBRA MICROSINTETICA, CURADO CON CURACRETO, VIBRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 1RA. ESTACION.	M2	976.95	1,471.35	0.00	1,637.51	1,637.51	166.16	1,599,765.39
SUMPOL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO CALIBRE 600 PARA EVITAR DESHIDRATACION DEL CONCRETO, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	57.02	1,471.35	0.00	1,637.51	1,637.51	166.16	93,370.82
CORTE01	CORTE DE JUNTAS EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA MANUAL DE DISCO DIAMANTADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA.	ML	36.40	522.00	0.00	693.42	693.42	171.42	25,240.49
32-0484	CALAFATEO EN LOSAS Y GUARNICIONES A BASE DE ASFALTO OXIDADO INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, ACARREOS A PRIMERA ESTACION Y MANO DE OBRA.	ML	28.53	522.00	0.00	693.42	693.42	171.42	19,783.27

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMÉNEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

.. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE ..AREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	E S T I M A C I Ó N			ESTIMACIÓN No. 03 (TRES) Y FINIQUITO	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO**	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023	
	NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES**	FECHA:	**12 DE DICIEMBRE DEL 2023**	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	
	CONTRATISTA: **IMEXA CONSTRUCTORES S.A DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	HOJA: 9	DE: 9
		TIPO DE OBRA:	URBANIZACION		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
22-0333*	PINTURA ESMALTE AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES CON DESARROLLO DE 30.0 CM. INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y ACARREOS A PRIMERA ESTACION.	ML	91.64	424.35	0.00	391.24	391.24	0.00	35,853.23
32-0468	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F´C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, T.M.A 3/4", INCLUYE CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	538.78	556.64	179.55	29.34	208.89	0.00	15,807.81
	TOTAL PAVIMENTACION:								**$1,818,634.79**
A8	**ACARREOS Y LIMPIEZAS**								
CARGA	CARGA MECANICA CON USO DE RETROEXCAVADORA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO (6 M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION A TIRO LIBRE.	M3	229.33	979.64	1,506.54	54.00	1,560.54	580.90	12,383.82
33-0528	LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20 MTS.	M2	15.99	2,692.81	0.00	2,025.4383	2,025.4383	0.00	32,386.76
	TOTAL DE ACARREOS Y LIMPIEZAS								**$44,770.58**
								TOTAL DE ESTA ESTIMACION:	**$2,174,619.25**

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

No. DE OBRA: MAJ/426	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	CONSTRUCTORA: IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	FECHA: 12 de diciembre del 2023
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO	MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	No. DE CONTRATO: MAJ-FAISMUN/426-2023/LP	
ESTIMACIONES QUE AMPARAN EL FINIQUITO: 01 (UNO) , 02 (DOS), 03 (TRES) Y FINIQUITO		MONTO CONTRATADO: 5,000,427.46	HOJA: 1
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: LICITACION PUBLICA		MONTO TOTAL ESTIMADO: 5,000,427.46	DE: 9

CLAVE	CONCEPTO / PARTIDAS	UNIDAD DE MEDIDA	CONTRATADO			ESTIMADO			VARIACIONES - VOLUMENES NO EJECUTADOS			VARIACIONES + VOLUMENES EXCEDENTES			ESTIMACION
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
A1	PRELIMINARES														
3-0073	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICAS DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIES MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD) INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS.	M2	2,692.81	17.31	46,612.54	2,052.42	17.31	35,527.39	640.39	17.31	11,085.15	0.00	17.31	0.00	01 (UNO)
D-CAR5A10	DEMOLICION A MAQUINA DE CARPETA ASFALTICA DE 5.00 A 10.00 CMS. DE ESPESOR INCLUYE MANO DE OBRA Y ACARREOS EN 1a, ESTACION.	M2	1,649.00	73.31	120,888.19	1,719.80	73.31	126,078.54		73.31	0.00	70.80	73.31	5,190.35	01(UNO), 02(DOS)
D-BANQU	DEMOLICION MECANICA DE BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: HERAMIENTA MENOR, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	146.04	63.40	9,258.94	226.11	63.40	14,335.37		63.40	0.00	80.07	63.40	5,076.44	01(UNO), 02(DOS)
D-GUARM	DEMOLICION MECANICA DE GUARNICION DE 15X20X50 CM, INCLUYE: EXTRACCION DE PEDACERIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	183.67	69.73	12,807.31	236.61	69.73	16,498.82		69.73	0.00	52.94	69.73	3,691.51	01(UNO), 02(DOS)
1-0056	DESCORONAMIENTO DE MURO DE PIEDRA BRAZA DE 30 CM. DE ANCHO INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA PRODUCTO DE LA DEMOLICION.	M	120.00	108.12	12,974.40	0.00	108.12	0.00	120.00	108.12	12,974.40	0.00	108.12	0.00	
EXC-001	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II INCLUYE AFINE DE TALUD Y FONDO, ACARREOS A PRIMERA ESTACION DE 20 MTS.	M3	699.43	74.30	51,967.65	846.51	74.30	62,895.69		74.30	0.00	147.08	74.30	10,928.04	01(UNO), 02(DOS)

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

No. DE OBRA: MAJ/426	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	CONSTRUCTORA: IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	FECHA: 12 de diciembre del 2023
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO	MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	No. DE CONTRATO: MAJ-FAISMUN/426-2023/LP	
ESTIMACIONES QUE AMPARAN EL FINIQUITO: 01 (UNO) , 02 (DOS), 03 (TRES) Y FINIQUITO		MONTO CONTRATADO: 5,000,427.46	HOJA: 2
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: LICITACION PUBLICA		MONTO TOTAL ESTIMADO: 5,000,427.46	DE: 9

CLAVE	CONCEPTO / PARTIDAS	UNIDAD DE MEDIDA	CONTRATADO			ESTIMADO			VARIACIONES - VOLUMENES NO EJECUTADOS			VARIACIONES + VOLUMENES EXCEDENTES			ESTIMACION
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
9-0139	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	420.29	83.66	35,161.46	489.78	83.66	40,974.99		83.66	0.00	69.49	83.66	5,813.53	01(UNO), 02(DOS)
9-0138	RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	30.00	498.99	14,969.70	0.00	498.99	0.00	30.00	498.99	14,969.70	0.00	498.99	0.00	
	TOTAL DE PRELIMINARES:				304,640.19			296,310.81			39,029.25			30,699.88	
A2	TERRACERIAS														
31-0448	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO II-A, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO DEL MATERIAL	M3	558.00	82.27	45,906.66	556.52	82.27	45,784.90	1.48	82.27	121.76	0.00	82.27	0.00	01(UNO)
31-0454	AFINE Y COMPACTACION DE SUB RASANTE AL 90% PROCTOR MINIMO, POR MEDIOS MECANICOS.	M2	1,471.35	40.15	59,074.70	1,637.51	40.15	65,746.03		40.15	0.00	166.16	40.15	6,671.32	03 (TRES) Y FINIQUITO
31-0457	FORMACION DE BASE DE 30 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO CON EQUIPO MECANICO INCLUYE VERTIDO, AFINE, COMPACTADO AL 95% PROCTOR Y AGUA.	M3	442.62	519.14	229,781.75	327.48	519.14	170,007.97	115.14	519.14	59,773.78	0.00	519.14	0.00	03 (TRES) Y FINIQUITO
32-0466	AFINE Y COMPACTACION EN BANQUETAS, ANDADORES Y PLAZAS A MANO INCLUYE ACARREOS A PRIMERA ESTACION	M2	556.64	39.85	22,182.10	208.89	39.85	8,324.27	347.75	39.85	13,857.84	0.00	39.85	0.00	01 (UNO) , 03 (TRES) Y FINIQUITO
	TOTAL DE TERRACERIAS:				356,945.21			289,863.17			73,753.38			6,671.32	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

No. DE OBRA: MAJ/426 NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES

CONSTRUCTORA: IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. FECHA: 12 de diciembre del 2023

LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ

No. DE CONTRATO: MAJ-FAISMUN/426-2023/LP

ESTIMACIONES QUE AMPARAN EL FINIQUITO: 01 (UNO) , 02 (DOS), 03 (TRES) Y FINIQUITO

MONTO CONTRATADO: 5,000,427.46 HOJA: 3

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: LICITACION PUBLICA

MONTO TOTAL ESTIMADO: 5,000,427.46 DE: 9

CLAVE	CONCEPTO / PARTIDAS	UNIDAD DE MEDIDA	CONTRATADO			ESTIMADO			VARIACIONES - VOLUMENES NO EJECUTADOS			VARIACIONES + VOLUMENES EXCEDENTES			ESTIMACION
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
A3	INSTALACION HIDRAULICA														
4-0080	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II-A, EN SECO Y BARRETA DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, DEPOSITANDO EL PRODUCTO DE EXCAVACION A ORILLA DE CEPA, CUALQUIER ZONA.	M3	16.00	200.62	3,209.92	37.92	200.62	7,607.51		200.62	0.00	21.92	200.62	4,397.59	01(UNO), 02(DOS)
9-0139	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO	M3	15.80	83.66	1,321.83	32.84	83.66	2,747.39		83.66	0.00	17.04	83.66	1,425.57	01(UNO), 02(DOS)
5-0102	CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA INCLUYE; ACOSTILLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1ra, ESTACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M3	2.00	475.56	951.12	4.74	475.56	2,254.15		475.56	0.00	2.74	475.56	1,303.03	01(UNO), 02(DOS)
27-0412	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 3" CED. RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	50.00	449.24	22,462.00	79.00	449.24	35,489.96		449.24	0.00	29.00	449.24	13,027.96	01(UNO), 02(DOS)
TOMDOM*	TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CON TUBO DE CPVC DE 13 MM. DE 6 MTS. DE LONGITUD, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, VALVULA DE INSERCION, ABRAZADERA DE 4", ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	1,760.31	5,280.93	2.00	1,760.31	3,520.62	1.00	1,760.31	1,760.31	0.00	1,760.31	0.00	03 (TRES) Y FINIQUITO

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

No. DE OBRA: MAJ/426	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	CONSTRUCTORA: IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	FECHA: 12 de diciembre del 2023
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO	MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	No. DE CONTRATO: MAJ-FAISMUN/426-2023/LP	
ESTIMACIONES QUE AMPARAN EL FINIQUITO: 01 (UNO) , 02 (DOS), 03 (TRES) Y FINIQUITO		MONTO CONTRATADO: 5,000,427.46	HOJA: 4
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: LICITACION PUBLICA		MONTO TOTAL ESTIMADO: 5,000,427.46	DE: 9

CLAVE	CONCEPTO / PARTIDAS	UNIDAD DE MEDIDA	CONTRATADO			ESTIMADO			VARIACIONES - VOLUMENES NO EJECUTADOS			VARIACIONES + VOLUMENES EXCEDENTES			ESTIMACION
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
314-IHS-07-087	VALVULA DE ESFERA DE CPVC 13 MM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	242.93	728.79	0.00	242.93	0.00	3.00	242.93	728.79	0.00	242.93	0.00	
BOTA01	CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA (BOTA) INCLUYE: LLAVE DE CUADRO ROSCABLE 1/2", HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO	PZA	3.00	1,388.40	4,165.20	1.00	1,388.40	1,388.40	2.00	1,388.40	2,776.80	0.00	1,388.40	0.00	03 (TRES) Y FINIQUITO
	TOTAL DE INSTALACION HIDRAULICA:				38,119.79			53,008.03			5,265.90			20,154.15	
A4	INSTALACION SANITARIA														
EXC-001	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II INCLUYE AFINE DE TALUD Y FONDO, ACARREOS A PRIMERA ESTACION DE 20 MTS.	M3	47.26	74.30	3,511.42	0.00	74.30	0.00	47.26	74.30	3,511.42	0.00	74.30	0.00	
9-0139	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	31.79	83.66	2,659.55	0.00	83.66	0.00	31.79	83.66	2,659.55	0.00	83.66	0.00	
9-0138	RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	13.62	498.99	6,796.24	0.00	498.99	0.00	13.62	498.99	6,796.24	0.00	498.99	0.00	
5-0102	CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA INCLUYE: ACOSTILLLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION Y MANO DE OBRA.	M3	3.37	475.56	1,602.64	0.00	475.56	0.00	3.37	475.56	1,602.64	0.00	475.56	0.00	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

No. DE OBRA: MAJ/426 NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES

CONSTRUCTORA: IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

FECHA: 12 de diciembre del 2023

LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ

No. DE CONTRATO: MAJ-FAISMUN/426-2023/LP

ESTIMACIONES QUE AMPARAN EL FINIQUITO: 01 (UNO) , 02 (DOS), 03 (TRES) Y FINIQUITO

MONTO CONTRATADO: 5,000,427.46

HOJA: 5

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: LICITACION PUBLICA

MONTO TOTAL ESTIMADO: 5,000,427.46

DE: 9

CLAVE	CONCEPTO / PARTIDAS	UNIDAD DE MEDIDA	CONTRATADO			ESTIMADO			VARIACIONES - VOLUMENES NO EJECUTADOS			VARIACIONES + VOLUMENES EXCEDENTES			ESTIMACION
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
28-0417	POZO DE VISITA DE FORMA CONICA DE 0.60 A 1.20 MTS. DE DIAMETRO INTERIOR POR 1.50 MTS. DE ALTURA A BASE DE MAMPOSTERIA, MURO DE TABIQUE DE 25 CMS CON APLANADO DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO, INCLUYE: EXCAVACION, ACARREO Y RELLENO	PZA	2.00	13,271.34	26,542.68	0.00	13,271.34	0.00	2.00	13,271.34	26,542.68	0.00	13,271.34	0.00	
37-0579BP	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO ALTA RESISTENCIA ABIERTO O CERRADO PARA POZO DE VISITA DE 60 CM. DE DIAMETRO, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	4,210.10	8,420.20	0.00	4,210.10	0.00	2.00	4,210.10	8,420.20	0.00	4,210.10	0.00	
26-0390*	REGISTRO SANITARIO DE 0.40X0.60X0.60 MTS. A BASE DE TABICON 10X14X28, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 PISO DE 10 CM, DE CONCRETO SIMPLE F´C=150 KG/CM2, TAPA DE CONCRETO F´C=250 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DEL No 3 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, DE 15 CM DE ESPESOR INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, BARRENADO Y DEMOLICION DE ROCA, ACARREO Y M.O.	PZA	2.00	2,482.13	4,964.26	0.00	2,482.13	0.00	2.00	2,482.13	4,964.26	0.00	2,482.13	0.00	
TUBO 8"	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES SECUNDARIOS, CONEXIONES Y MANO DE OBRA.	M	42.80	773.19	33,092.53	0.00	773.19	0.00	42.80	773.19	33,092.53	0.00	773.19	0.00	
SUM-COD2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SANITARIO DE 6"X45°, INCLUYE CARGA Y DESCARGA EN ALMACEN DE OBRA.	PZA	2.00	356.10	712.20	0.00	356.10	0.00	2.00	356.10	712.20	0.00	356.10	0.00	
PU-6255	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNION DE SERVICIO DE P.V.C. DE 150 MM. (6") DE DIAMETRO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO INCLUYE CARGA Y DESCARGA EN ALMACEN DE OBRA	PZA	2.00	624.14	1,248.28	0.00	624.14	0.00	2.00	624.14	1,248.28	0.00	624.14	0.00	
PU-6239	SUMINISTRO DE TUBO DE PVC SANITARIO DE NORMA LISO DE 150 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: FLETE , CARGA Y DESCARGA EN ALMACEN DE OBRA.	ML	18.00	483.03	8,694.54	0.00	483.03	0.00	18.00	483.03	8,694.54	0.00	483.03	0.00	
	TOTAL DE INSTALACION SANITARIA:				98,244.54			0.00			98,244.54			0.00	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

No. DE OBRA: MAJ/426 NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES

CONSTRUCTORA: IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. FECHA: 12 de diciembre del 2023

LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ

No. DE CONTRATO: MAJ-FAISMUN/426-2023/LP

ESTIMACIONES QUE AMPARAN EL FINIQUITO: 01 (UNO) , 02 (DOS), 03 (TRES) Y FINIQUITO

MONTO CONTRATADO: 5,000,427.46 HOJA: 6

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: LICITACION PUBLICA

MONTO TOTAL ESTIMADO: 5,000,427.46 DE: 9

CLAVE	CONCEPTO / PARTIDAS	UNIDAD DE MEDIDA	CONTRATADO			ESTIMADO			VARIACIONES - VOLUMENES NO EJECUTADOS			VARIACIONES + VOLUMENES EXCEDENTES			ESTIMACION
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
A5	ALBAÑILERIA														
18-0296	MURO DE PIEDRA BRAZA DE LA REGION, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO COMUN INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION DE 20 MTS.	M3	276.52	2,755.36	761,912.15	382.58	2,755.36	1,054,145.63		2,755.36	0.00	106.06	2,755.36	292,233.48	01(UNO), 02(DOS)
18-0313	DREN PARA MURO DE MAMPOSTERIA A BASE DE P.V.C. 4" TIPO RIGIDO INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	26.00	130.32	3,388.32	48.90	130.32	6,372.65		130.32	0.00	22.90	130.32	2,984.33	01(UNO), 02(DOS)
18-0318	FILTRO DE GRAVA Y/O RAJUELA DE PIEDRA DE 30 CMS DE ESPESOR INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M3	53.70	1,019.51	54,747.69	35.01	1,019.51	35,693.05	18.69	1,019.51	19,054.64	0.00	1,019.51	0.00	01(UNO)
11-0151*	ANCLAJE DE CASTILLO DE 20 X 15 CMS 4 VAR # 4 Y ESTRIBOS DEL # 2 A,C, 20CMS HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 50 CMS. CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	13.00	441.46	5,738.98		441.46	0.00	13.00	441.46	5,738.98	0.00	441.46	0.00	
11-0160*	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F´C=250 KG/CM2, DE 15X20 CM, ARMADO CON 6 VARILLAS No. 4 Y ESTRIBOS No, 2 A CADA 25 CM. INCLUYE CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1RA. ESTACION.	M	31.53	882.93	27,838.78		882.93	0.00	31.53	882.93	27,838.78	0.00	882.93	0.00	
11-0221	LOSAS DE CONCRETO F´C= 250 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ARMADA CON VAR. No. 4 A CADA 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, PARA PASO PEATONAL, SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO COLADO Y DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	26.80	2,869.37	76,899.12		2,869.37	0.00	26.80	2,869.37	76,899.12	0.00	2,869.37	0.00	
F-BARANDAL1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE TUBO DE ACERO NEGRO DE 1 1/2 CON DIVISION DE TUBO DE 1" CON POSTES DE 1 1/2" A CADA METRO SOLDADO A PLACA DE 1/2" DE 15X15 CMS. EMBUTIDA EN LOSA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, PINTURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	39.78	2,373.49	94,417.43		2,373.49	0.00	39.78	2,373.49	94,417.43	0.00	2,373.49	0.00	
	TOTAL DE ALBAÑILERIA:				1,024,942.47			1,096,211.33			223,948.95			295,217.81	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

No. DE OBRA: MAJ/426 NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES

CONSTRUCTORA: IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. FECHA: 12 de diciembre del 2023

LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ

No. DE CONTRATO: MAJ-FAISMUN/426-2023/LP

ESTIMACIONES QUE AMPARAN EL FINIQUITO: 01 (UNO) , 02 (DOS), 03 (TRES) Y FINIQUITO

MONTO CONTRATADO: 5,000,427.46 HOJA: 7

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: LICITACION PUBLICA

MONTO TOTAL ESTIMADO: 5,000,427.46 DE: 9

CLAVE	CONCEPTO / PARTIDAS	UNIDAD DE MEDIDA	CONTRATADO			ESTIMADO			VARIACIONES - VOLUMENES NO EJECUTADOS			VARIACIONES + VOLUMENES EXCEDENTES			ESTIMACION
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
A6	INSTALACIONES ELECTRICAS Y LUMINARIAS														
REG-AUX	REGISTRO AUXILIAR PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 50X60X65 MTS, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28 CMS. CON 14 CMS. DE ESPESOR ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 INCUYE: PLANTILLA DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR F´C=100 KG/CM2, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X 16" CONCRETO F´C=200 KG/CM2 EN TAPA Y FIJACION DE MARCO, DREN DE GRAVA DE 20 CMS DE ESPESOR, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	8.00	3,554.46	28,435.68	11.00	3,554.46	39,099.06		3,554.46	0.00	3.00	3,554.46	10,663.38	03 (TRES) Y FINIQUITO
TUB-PESA50	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO 50 MM DE DIAMETRO INCLUYE: CONEXIÓN, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, CAMA DE ARENA, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M	200.00	201.24	40,248.00	221.20	201.24	44,514.29		201.24	0.00	21.20	201.24	4,266.29	01(UNO), 03(TRES) Y FINIQUITO
	TOTAL : INSTALACIONES ELECTRICAS Y LUMINARIAS				68,683.68			83,613.35			0.00			14,929.67	
A7	PAVIMENTACION.														
4-0080	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II-A, EN SECO Y BARRETA DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, DEPOSITANDO EL PRODUCTO DE EXCAVACION A ORILLA DE CEPA, CUALQUIER ZONA.	M3	64.35	200.62	12,909.90	35.91	200.62	7,204.26	28.44	200.62	5,705.63	0.00	200.62	0.00	01(UNO), 02(DOS), 03 (TRES) Y FINIQUITO
9-0138	RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO, DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	38.55	498.99	19,236.06	0.00	498.99	0.00	38.55	498.99	19,236.06	0.00	498.99	0.00	
32-0471	GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE DE F´C=200 KG/CM2 DE 20X15X40 CM. DE SECCION T.M.A. 3/4" INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	424.35	530.82	225,253.47	391.24	530.82	207,678.02	33.11	530.82	17,575.45	0.00	530.82	0.00	01(UNO), 02(DOS), 03 (TRES) Y FINIQUITO

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

No. DE OBRA: MAJ/426 NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES

CONSTRUCTORA: IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. FECHA: 12 de diciembre del 2023

LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ

No. DE CONTRATO: MAJ-FAISMUN/426-2023/LP

ESTIMACIONES QUE AMPARAN EL FINIQUITO: 01 (UNO) , 02 (DOS), 03 (TRES) Y FINIQUITO

MONTO CONTRATADO: 5,000,427.46 HOJA: 8

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: LICITACION PUBLICA

MONTO TOTAL ESTIMADO: 5,000,427.46 DE: 9

CLAVE	CONCEPTO / PARTIDAS	UNIDAD DE MEDIDA	CONTRATADO			ESTIMADO			VARIACIONES - VOLUMENES NO EJECUTADOS			VARIACIONES + VOLUMENES EXCEDENTES			ESTIMACION
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
32-0475A	PAVIMENTO PREMEZCLADO F´C= 300 KG/CM2, T.A.M. 3/4" DE 20 CM. DE ESPESOR RESISTENCIA NORMAL, ACABADO A REGLA INCLUYE: JUNTA CONSTRUCTIVA CON CHAFLAN DE 1/2", EN CADA JUNTA FRIA (AL TERMINO DEL COLADO) SE PROCEDERA A COLOCAR 8 CONECTORES CON VARILLA DE 1/2" A CADA 60 CMS 30-30 CMS. FIBRA MICROSINTETICA, CURADO CON CURACRETO, VIBRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 1RA. ESTACION.	M2	1,471.35	976.95	1,437,435.38	1,637.51	976.95	1,599,765.39		976.95	0.00	166.16	976.95	162,330.01	03 (TRES) Y FINIQUITO
SUMPOL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO CALIBRE 600 PARA EVITAR DESHIDRATACION DEL CONCRETO, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	1,471.35	57.02	83,896.38	1,637.51	57.02	93,370.82		57.02	0.00	166.16	57.02	9,474.44	03 (TRES) Y FINIQUITO
CORTE01	CORTE DE JUNTAS EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA MANUAL DE DISCO DIAMANTADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA.	ML	522.00	36.40	19,000.80	693.42	36.40	25,240.49		36.40	0.00	171.42	36.40	6,239.69	03 (TRES) Y FINIQUITO
32-0484	CALAFATEO EN LOSAS Y GUARNICIONES A BASE DE ASFALTO OXIDADO INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, ACARREOS A PRIMERA ESTACION Y MANO DE OBRA.	ML	522.00	28.53	14,892.66	693.42	28.53	19,783.27		28.53	0.00	171.42	28.53	4,890.61	03 (TRES) Y FINIQUITO
22-0333*	PINTURA ESMALTE AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES CON DESARROLLO DE 30.0 CM. INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y ACARREOS A PRIMERA ESTACION.	ML	424.35	91.64	38,887.43	391.24	91.64	35,853.23	33.11	91.64	3,034.20	0.00	91.64	0.00	03 (TRES) Y FINIQUITO
32-0468	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F´C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, T.M.A 3/4", INCLUYE CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	556.64	538.78	299,906.50	208.89	538.78	112,545.75	347.75	538.78	187,360.75	0.00	538.78	0.00	01(UNO), 03 (TRES) Y FINIQUITO
	TOTAL DE PAVIMENTACION.				2,151,418.58			2,101,441.24			232,912.09			182,934.75	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA

ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

No. DE OBRA: MAJ/426	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	CONSTRUCTORA: IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	FECHA: 12 de diciembre del 2023
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO	MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	No. DE CONTRATO: MAJ-FAISMUN/426-2023/LP	
ESTIMACIONES QUE AMPARAN EL FINIQUITO: 01 (UNO) , 02 (DOS), 03 (TRES) Y FINIQUITO		MONTO CONTRATADO: 5,000,427.46	HOJA: 9
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: LICITACION PUBLICA		MONTO TOTAL ESTIMADO: 5,000,427.46	DE: 9

CLAVE	CONCEPTO / PARTIDAS	UNIDAD DE MEDIDA	CONTRATADO			ESTIMADO			VARIACIONES - VOLUMENES NO EJECUTADOS			VARIACIONES + VOLUMENES EXCEDENTES			
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ESTIMACION
A8	ACARREOS Y LIMPIEZAS														
CARGA	CARGA MECANICA CON USO DE RETROEXCAVADORA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO (6 M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION A TIRO LIBRE.	M3	979.64	229.33	224,660.84	1,560.54	229.33	357,878.64		229.33	0.00	580.90	229.33	133,217.80	01(UNO), 02(DOS), 03 (TRES) Y FINIQUITO
33-0528	LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20 MTS.	M2	2,692.81	15.99	43,058.03	2,025.4383	15.99	32,386.76	667.37170	15.99	10,671.27	0.00	15.99	0.00	03 (TRES) Y FINIQUITO
	TOTAL ACARREOS Y LIMPIEZAS				267,718.87			390,265.40			10,671.27			133,217.80	
					4,310,713.33			4,310,713.33			683,825.38			683,825.38	
					689,714.13			689,714.13			109,412.06			109,412.06	
					5,000,427.46			5,000,427.46			793,237.44			793,237.44	

SE EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

ACAPULCO, DE JUAREZ, GRO. A 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Q. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ
SIDENTE DE OBRA H. AYUNTAMIENTO
P R E S E N T E :

POR MEDIO DE LA PRESENTE, SOLICITO A UD. DE LA MANERA MAS ATENTA LA REVISION Y LA AUTORIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS EXCEDENTES DE OBRA DENOMINADA "**REHABILITACION DE LA CALLE FELIPE II TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES"**, UBICADO EN **ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO,** CON EL NUMERO DE CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP.**

Código	Concepto	Unidad	P.U.	Cantidad Original	Cantidad por Estimar	Excedente
31-0454	AFINE Y COMPACTACION DE SUB RASANTE AL 90% PROCTOR MINIMO, POR MEDIOS MECANICOS.	M2	$ 40.15	1471.35	1637.51	166.16
REG-AUX	REGISTRO AUXILIAR PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 50X60X65 MTS, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28 CMS. CON 14 CMS. DE ESPESOR ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 INCUYE: PLANTILLA DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR F¨C=100 KG/CM2, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X 16" CONCRETO F¨C=200 KG/CM2 EN TAPA Y FIJACION DE MARCO, DREN DE GRAVA DE 20 CMS DE ESPESOR, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	$ 3,554.46	8.00	11.00	3.00
TUB-PESA50	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO 50 MM DE DIAMETRO INCLUYE: CONEXIÓN, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, CAMA DE ARENA, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M	$ 201.24	200.00	221.20	21.20
32-0475A	PAVIMENTO PREMEZCLADO F¨C= 300 KG/CM2, T.A.M. 3/4" DE 20 CM. DE ESPESOR RESISTENCIA NORMAL, ACABADO A REGLA INCLUYE: JUNTA CONSTRUCTIVA CON CHAFLAN DE 1/2", EN CADA JUNTA FRIA (AL TERMINO DEL COLADO) SE PROCEDERA A COLOCAR 8 CONECTORES CON VARILLA DE 1/2" A CADA 60 CMS 30-30 CMS. FIBRA MICROSINTETICA, CURADO CON CURACRETO, VIBRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 1RA. ESTACION.	M2	$ 976.95	1471.35	1637.51	166.16
SUMPOL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO CALIBRE 600 PARA EVITAR DESHIDRATACION DEL CONCRETO, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	$ 57.02	1471.35	1637.51	166.16
CORTE01	CORTE DE JUNTAS EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA MANUAL DE DISCO DIAMANTADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA.	ML	$ 36.40	522.00	693.42	171.42
32-0484	CALAFATEO EN LOSAS Y GUARNICIONES A BASE DE ASFALTO OXIDADO INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, ACARREOS A PRIMERA ESTACION Y MANO DE OBRA.	ML	$ 28.53	522.00	693.42	171.42
CARGA	CARGA MECANICA CON USO DE RETROEXCAVADORA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO (6 M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION A TIRO LIBRE.	M3	$ 229.33	979.64	54.00	54.00

SIN MÁS POR EL MOMENTO, NOS PONEMOS A SUS ORDENES, PARA CUALQUIER DUDA Y/O ACLARACION, ASI MISMO LE ENVIAMOS UN CORDIAL SALUDO

ATENTAMENTE

ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01
CEL. 744 3171644 E-MAIL: imexa@telmexmail.com, gno_0301@hotmail.com

OFICIO: DOP/5152-1/2023
ASUNTO: Autorización de Excedentes
Acapulco, Gro. a 15 de Noviembre del 2023

ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
IMEXA CONSTRUCTORES S.A DE C.V.

En relación a su similar de fecha 13 de noviembre del 2023 mediante el cual solicita la autorización de los volumenes adicionales a 8 (Ocho) conceptos de obra, referentes al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado: No. MAJ-FAISMUN/426-2023/LP. Formalizada a favor de su representada con fecha del 15 de Agosto del 2023, Por medio del presente en total apego a lo establecido en los Art. 50, párrafo onceavo de la ley de Obras Públicas y sus Servicios Relacionados con las mismas. Art. 105 y 106 del reglamento de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, los cuales señalan:

Artículo 105.- Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la dependencia o entidad de que se trate, para que ésta resuelva lo conducente. El contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Artículo 106.- Cuando la dependencia o entidad requiera de la ejecución de cantidades adicionales no previstas en el catálogo original del contrato, se haya formalizado o no el convenio respectivo, una vez ejecutados los trabajos, el contratista elaborará sus estimaciones y las presentará a la residencia en la fecha de corte más cercana.

En cumplimiento a mis funciones estipuladas en el Articulo 113, 114 y 115 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios Relacionados con las Mismas, en mi carácter de Residente de Obra, una vez realizado el dictamen Técnico que fundamenta y sustenta la solicitud presentada.

Se considera Procedente autorizar la ejecución de cantidades adicionales a los 8 (Ocho) conceptos de obra, así mismo se especifica que son totalmente necesarios durante el proceso constructivo del contrato de obra pública en cuestión y que no existe la necesidad de modificar el importe contratado y el tiempo de ejecución originalmente pactados

ATENTAMENTE
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

C.c.p. .- Arq. Carlos Alejandro Rodríguez Robles.– Jefe del departamento de supervisión de obra zona urbana
C.c.p. Archivo.

DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE CANTIDADES ADICIONALES NO PREVISTAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS ORIGINAL

1.- ANTECEDENTES

De acuerdo al oficio de autorización de recursos por parte de la **Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico,** No. SEPLADE/321/2023 de fecha 08 de Mayo de 2023, correspondiente al **Ramo 33, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), ejercicio 2023,** mediante el cual fue autorizada la obra denominada, **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, UBICADA EN ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO,** por un importe de Contrato de **$ 5,000,427.46 (Cinco millones cuatrocientos veintisiete Pesos 46/100 M.N.).**

Con fecha 15 de agosto del 2023, fue formalizado el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado de No. **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**, entre la **Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas** y la empresa contratista **"IMEXA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V."** para la ejecución de la obra **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, UBICADA EN ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO.** con un plazo de ejecución del 15 de Agosto al 12 de diciembre de 2023.

Con fecha 13 de noviembre del 2023, fue realizada la solicitud por parte de la empresa contratista **"IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V."**, para la ejecución de los volúmenes adicionales en 08 (Ocho) conceptos de obra incluidos en el catálogo de conceptos del contrato de obra pública de No**. MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**, solicitud que se anexa al presente como anexo 1.

2.- JUSTIFICACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE CANTIDADES ADICIONALES

2.1.- CONSIDERACIONES TECNICAS

A. Fundamento No. 1

Considerando que los trabajos ejecutados durante el proceso de la obra y por razones de funcionalidad y seguridad se enlisto una serie de conceptos que serán afectados en sus volúmenes originales esto llevara a nivelar de forma conjunta las necesidades

resultado de la tempestad "Huracan OTIS" que afecto al puerto de acapulco la noche del 24 de octubre y se consideró para prever desperfectos futuros y no afecten la circulación, esto dependerá de la buena ejecución de los trabajos que se mencionan, de la obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES,

1. Los trabajos que se realizaran y que exceden los volúmenes de catálogo, son resultado de una gran movilidad de vehículos de carga que saturan la vialidad y para no entorpecer la circulación de ésta calle que es un desahogo muy importante de la vialidad principal y distribuye para evitar la saturación vehicular, dando como resultado una ampliación de la vialidad, esto traerá que se libere del congestionamiento dicha arterias vecinas.

2. Por lo por consiguiente se desarrollarán trabajos adicionales en las terracerías, afectando por consiguiente los pavimentos.

- Con fecha 13 Noviembre del 2023 a través de la nota de bitácora No. 30, la contratista informó a la Residencia de obras que presenta volúmenes excedentes de los programados en el presupuesto, por lo que se le solicita la autorización de la ejecución de estos volúmenes ya que son necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, para poder realizar el cierre al monto de contrato.

- A través de la nota de bitácora No. 31 con fecha 15 de Noviembre del 2023, la Residencia y Supervisión de obras, le informa que los conceptos con volúmenes excedentes serán autorizados, para la conclusión de obra, mismo que fue revisado directamente en el sitio de los trabajos durante la conciliación.

2.2.- CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Fundamento. - Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Artículo 59, Párrafo 11.- Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, las dependencias y entidades podrán autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Fundamento. - Artículo 105 y 106 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Artículo 105.- Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la dependencia o entidad de que se trate, para que ésta resuelva lo conducente. El contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Artículo 106.- Cuando la dependencia o entidad requiera de la ejecución de cantidades adicionales no previstas en el catálogo original del contrato, se haya formalizado o no el convenio respectivo, una vez ejecutados los trabajos, el contratista elaborará sus estimaciones y las presentará a la residencia en la fecha de corte más cercana.

Una vez realizada la revisión y procedencia de las cantidades adicionales en los 8 (Ocho) conceptos de obra, se determina que se cuenta con la suficiencia presupuestal total para su ejecución, por lo que no será necesario realizar una modificación al contrato de obra pública de No. MAJ-FAISMUN/426-2023/LP.

3.- DESCRIPCIÓN DEL OBJETO

Derivado del proceso constructivo de la obra en cuestión y una vez analizada la necesidad de la ejecución de las cantidades adicionales (excedentes) en los 8 (Ocho) conceptos de obra. Se determina que son totalmente necesarios para la terminación y continuación del proceso de ejecución de los trabajos al amparo del contrato de obra pública de No. MAJ-FAISMUN/426-2023/LP.

Las cantidades adicionales necesarias por ejecutarse, dentro de los 8 (Ocho) conceptos de obra, se anexan al presente como anexo 2.

4.- DICTAMEN

Una vez expuestas las motivaciones anteriores y en total apego a lo dispuesto en el **artículo 59, párrafo onceavo** de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas**, y los **artículos 105 y 106** de su Reglamento, se dictamina procedente la ejecución de cantidades adicionales para los 8 (Ocho) conceptos de obra mencionados en el **anexo 2**.

Así lo dictaminó el Residente de la Obra, con base a sus funciones, establecidas en los **Artículos 112 y 113** del **Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas**. Se anexa Bitácora fotográfica de cada concepto con cantidades excedentes como **anexo 3.**

ATENTAMENTE
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. Uriel Mauricio Salmerón Jiménez.

C.c.p.- Arq. Carlos Alejandro Rodríguez Robles.- Jefe del departamento de supervisión de obra zona urbana
C.c.p.- Archivo.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

BIENESTAR

CANTIDADES ADICIONALES ANEXO No. 2

CONTRATO: MAJ-FAISMUN/426-2023/LP

OBRA: REHABILITACION DE LA CALLE FELIPE II TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES

UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.

EXCEDENTES

Código	Concepto	Unidad	P.U.	Cantidad Original	Cantidad por Estimar	Excedente	Importe del Volumen
31-0454	AFINE Y COMPACTACION DE SUB RASANTE AL 90% PROCTOR MINIMO, POR MEDIOS MECANICOS.	M2	$ 40.15	1471.35	1637.51	166.16	$ 6,671.32
REG-AUX	REGISTRO AUXILIAR PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 50X60X65 MTS, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28 CMS. CON 14 CMS. DE ESPESOR ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 INCUYE: PLANTILLA DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR F'C=100 KG/CM2, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X 16" CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN TAPA Y FIJACION DE MARCO, DREN DE GRAVA DE 20 CMS DE ESPESOR, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	$ 3,554.46	8.00	11.00	3.00	$ 10,663.38
TUB-PESA50	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO 50 MM DE DIAMETRO INCLUYE: CONEXIÓN, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, CAMA DE ARENA, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M	$ 201.24	200.00	221.20	21.20	$ 4,266.29
32-0475A	PAVIMENTO PREMEZCLADO F'C= 300 KG/CM2, T.A.M. 3/4" DE 20 CM. DE ESPESOR RESISTENCIA NORMAL, ACABADO A REGLA INCLUYE: JUNTA CONSTRUCTIVA CON CHAFLAN DE 1/2", EN CADA JUNTA FRIA (AL TERMINO DEL COLADO) SE PROCEDERA A COLOCAR 8 CONECTORES CON VARILLA DE 1/2" A CADA 60 CMS 30-30 CMS. FIBRA MICROSINTETICA, CURADO CON CURACRETO, VIBRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 1RA. ESTACION.	M2	$ 976.95	1471.35	1637.51	166.16	$ 162,330.01
SUMPOL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO CALIBRE 600 PARA EVITAR DESHIDRATACION DEL CONCRETO, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	$ 57.02	1471.35	1637.51	166.16	$ 9,474.44
CORTE01	CORTE DE JUNTAS EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA MANUAL DE DISCO DIAMANTADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA.	ML	$ 36.40	522.00	693.42	171.42	$ 6,239.69
32-0484	CALAFATEO EN LOSAS Y GUARNICIONES A BASE DE ASFALTO OXIDADO INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, ACARREOS A PRIMERA ESTACION Y MANO DE OBRA.	ML	$ 28.53	522.00	693.42	171.42	$ 4,890.61
CARGA	CARGA MECANICA CON USO DE RETROEXCAVADORA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO (6 M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION A TIRO LIBRE.	M3	$ 229.33	979.64	54.00	54.00	$ 12,383.82

REVISÓ Y APROBÓ

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS


DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

EJERCICIO FISCAL 2023

BITACORA FOTOGRAFICA DE EXCEDENTES DE OBRA


OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES		
CONTRATISTA	IMEXA CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	PERIODO CONTRACTUAL: 15 DE AGOSTO AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	
CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/426-2023/LP	IMPORTE DE CONTRATO	$5,000,427.46
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO	PERIODO: DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	

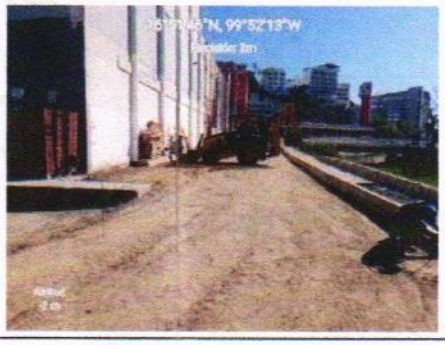


31-0454.- AFINE Y COMPACTACION DE SUB RASANTE AL 90% PROCTOR MINIMO, POR MEDIOS MECANICOS.
166.16 M2



REG-AUX.- REGISTRO AUXILIAR PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 50X60X65 MTS, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28 CMS. CON 14 CMS. DE ESPESOR ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 INCUYE: PLANTILLA DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR F¨C=100 KG/CM2, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X 16" CONCRETO F¨C=200 KG/CM2 EN TAPA Y FIJACION DE MARCO, DREN DE GRAVA DE 20 CMS DE ESPESOR, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES Y MANO DE OBRA.
3.00 PZA

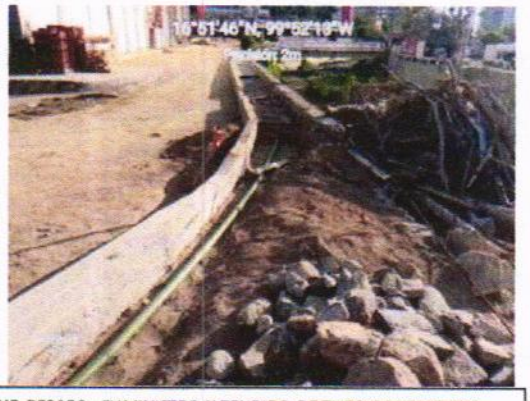

TUB-PESA50.- SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO 50 MM DE DIAMETRO INCLUYE: CONEXIÓN, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, CAMA DE ARENA, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. **21.20 M**

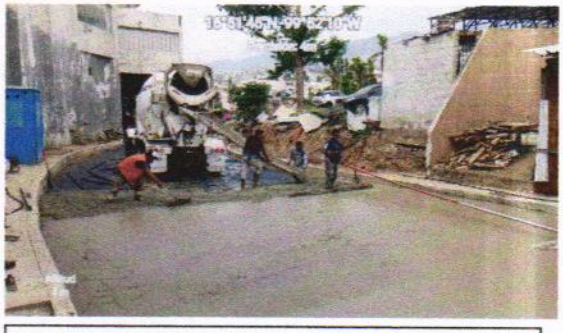

32-0475A.- PAVIMENTO PREMEZCLADO F¨C= 300 KG/CM2, T.A.M. 3/4" DE 20 CM. DE ESPESOR RESISTENCIA NORMAL, ACABADO A REGLA INCLUYE: JUNTA CONSTRUCTIVA CON CHAFLAN DE 1/2", EN CADA JUNTA FRIA (AL TERMINO DEL COLADO) SE PROCEDERA A COLOCAR 8 CONECTORES CON VARILLA DE 1/2" A CADA 60 CMS 30-30 CMS. FIBRA MICROSINTETICA, CURADO CON CURACRETO, VIBRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 1RA. ESTACION. **166.16 M2**



SUMPOL.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO CALIBRE 600 PARA EVITAR DESHIDRATACION DEL CONCRETO, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
166.16 M2

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

EJERCICIO FISCAL 2023

BITACORA FOTOGRAFICA DE EXEDENTES DE OBRA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES		
CONTRATISTA	IMEXA CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	PERIODO CONTRACTUAL: 15 DE AGOSTO AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	
CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/426-2023/LP	IMPORTE DE CONTRATO	$5,000,427.46
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	PERIODO: DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	



CORTE01.- CORTE DE JUNTAS EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA MANUAL DE DISCO DIAMANTADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA. **171.42 ML**



32-0484.- CALAFATEO EN LOSAS Y GUARNICIONES A BASE DE ASFALTO OXIDADO INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, ACARREOS A PRIMERA ESTACION Y MANO DE OBRA.
171.42 ML



CARGA.- CARGA MECÁNICA CON USO DE RETROEXCAVADORA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A TIRO LIBRE.
54.00 M3

REVISÓ Y APROBÓ

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

FOLIO Nº 308644

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II TRAMO PARALELA AV. UNIVERSIDAD FRACC. MARQUESES ACAPULCO DE

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 JUAREZ, GUERRERO.

NOTA No 29

CON ESTA FECHA Y No DE NOTA LA CONTRATISTA DE OBRA INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA DEL CAMBIO DE No DE FOLIO DEL 306920 A No 308644. TAMBIEN DE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE TUBO PVC CONDUIT DE 2" FABRICACION DE REGISTROS

ARQ. JEREC MAURICIO SALMERON JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. VICENTE ALARCON DEVERDINO
SUPERINTENDENTE

NOTA No 30

13 DE NOVIEMBRE DEL 2023

CON ESTA FECHA Y No DE NOTA LA CONTRATISTA LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA LA AUTORIZACION DE VOLUMENES (EXEDENTES) EXCEDENTES QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN.

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	P.U	CANTIDAD ESTIMADA	CANTIDAD EXCEDENTE	IMPORTE DEL VOLUMEN
(CODIGO 51-0434)	TRAZO Y NIVELACION DE SUBRASANTE DE 90% PROCTOR MEDIANTE EQUIPO MECANICOS	M2	40.15	14411.05	1697.51	166.16	6671.32

(CONTINUA NOTA 30...)

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. JEREC MAURICIO SALMERON JIMENEZ

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
ARQ. VICENTE ALARCON DEVERDINO

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 308645

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FRACCION 1 ZV. UNIVERSIDAD, FRACC. MOCAUSTLE, ACAPULCO DE

FECHA: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 JUAREZ, GUERRERO

CONTINUACION NOTA 30

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD PRECIO	CANTIDAD PRESTIMA	EXCEDENTE	IMPORTE DEL DOCUMENTO
REG-02	REGISTRO AUXILIAR PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 50X60X65 MTS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7M4X28CMS. CON 14 CMS DE ESPESOR ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 INCLUYE PLANTILLA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR F'c=100 KG/CM2 HOMBRO Y CONTRAHOMBRO DE ANGULO DE 1/2" X 1/16" CONCRETO F'c=200 KG/CM2 EN TAPA Y FIJACION DE MARCO, DREN DE GRAVA DE 20 CMS DE ESPESOR, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	3554.16	8.0	11.0	3.00	10,663.38
TUBERIA	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PG PESADO DE 50 MM DE DIAMETRO INCLUYE CONEXION, RELLENO, CAMA DE ARENA HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M	201.24	200.00	221.20	21.20	4,264.24

CONTINUA NOTA 30A...

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MADRIGAL JIMENEZ

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
ARQ. VICENTE ALARCON DELGADILLO

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 308646

REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON

OBRA: AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MACADAMIAS, ACAPULCO DE JUAREZ

FECHA: 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023 GUERRERO

CONTINUA NOTA 30

CODIGO	CONCEPTO	(P.U) PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CONTRATO ORIGINAL	CANTIDAD POR ESTIMAR	EXCEDENTE	IMPORTE DEL VOLUMEN
	PAV. MEZCLA PREMEZCLADO (F'C=300 KG/CM2 TMA. 3/4") DE 10 CMS DE ESPESOR RESISTENCIA NORMAL, VIBRADO					
32-OA TSA	AREA INCLUYE JUNTA CONSTRUCTIVA con cimbra	M2	976.75	1471.35	1637.51	166.16	162,330.01
	DE 1/2" EN CADA JUNTA FRIA (AL TERMINO DE CADA COLADO) DE PROCEDERA A COLOCAR 8 CONECTORES CON VARILLA DE 1/2" A CADA 60 CMS. 30-30 CMS. FIBRA MICRO SINTETICA CUANDO CONCRETO, VIBRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 1ra ESTACION					
SUM PAV	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO CALIBRE 600 PARA EVITAR DESHIDRATACION DEL CONCRETO, INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	57.02	M1 1.35	(1673) 1637.51	166.16	P.U.N.A.
CORTE	CORTE DE JUNTAS EN PISO ML DE CONCRETO CON CORTADORA MANUAL DE DISCO DIAMANTADO, INCLUYE LAVADO DE JUNTA		30.40	522.00	693.42	171.42	(4,113.93) + 6,239.41

CONTINUA NOTA 30

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. ORIEL MAURICIO ORDOÑEZ JIMENEZ

SUPERVISOR
ARQ. VICENTE ANDRADE DELGADO

SUPERINTENDENTE

FOLIO Nº 308647

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II TRAMO FARALLON - AV. UNIVERSIDAD. FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

FECHA: 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023

CONTINUA NOTA 30

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	P.U	CANTIDAD CONTRATO	CANTIDAD POR ESTIMAR	EXCEDENTE	IMPORTE DE VOLUMEN
32-0484	CALAFATEO EN LOSAS Y CUARTELACIONES A BASE DE ASFALTO OXIDADO INCLUYE MATERIAL DESPERDICIOS ACARREOS A PRIMERA ESTACION Y MANO DE OBRA.	ML	28.53	522.0	693.42	171.42	4890.62
CARGA	CARGA MECANICA CON DOS DE RETROEXCAVADORA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO (6 M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION A TIRO LIBRE	M3	229.33	979.64	54.00	54.00	12,383.82

ARQ. URIEL MAURICIO
DALMERON JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. VICENTE ALBERTO
OSEGUERA
SUPERINTENDENTE

NOTA NO 31

15 DE NOVIEMBRE DEL 2023

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA ESTA RESIDENCIA DE OBRA AUTORIZA A LA CONTRATISTA PRESENTE LOS VOLUMENES EXCEDENTES DE OBRA.

RESIDENTE DE OBRA
ARQ URIEL MAURICIO
DALMERON JIMENEZ

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
ARQ VICENTE ALBERTO OSEGUERA

ESOR-02
REV.02

2021-2024

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN Y FINIQUITO DE OBRA PÚBLICA

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA **12 DE DICIEMBRE DE 2023** Y HABIÉNDOSE VERIFICADO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP,** CONSISTENTES EN **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD. FRACC. MAGALLANES,** UBICADA EN. **ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO,** DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.

SE PROCEDE A LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRA BAJO LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES: LOS TRABAJOS, OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ANTES CITADO, FUERON REALIZADOS POR LA EMPRESA DENOMINADA: **IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.,** HABIENDO ESTADO COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA Y RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS MISMOS POR PARTE DE DICHA EMPRESA, EL (LA): **C. ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO ,** POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, ESTUVO COMO RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN Y VERIFICIACIÓN DE LA CORRECTA REALIZACIÓN DE LA OBRA EL (LA): **ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ,** EL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO FUE DE **$ 5,000,427.46 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 46/100 M.N.)** I.V.A INCLUIDO SIN HABER EXISTIDO NINGUN CONVENIO ADICIONAL.

EL PERIODO ORIGINAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ESPECIFICADO EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA FUE EL SIGUIENTE: FECHA DE INICIO: **15 DE AGOSTO DE 2023**
FECHA DE TERMINACION: **12 DE DICIEMBRE DE 2023.**

EL PERIODO REAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL CONVENIO ADICIONAL FUE DE EL SIGUIENTE : FECHA DE INICIO: **15 DE AGOSTO DE 2023.**
FECHA DE TER,MINACION : **12 DE DICIEMBRE DE 2023**

LAS ESTIMACIONES DE OBRA QUE SE REALIZARON A LA FECHA DE ESTA ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION SON LOS SIGUIENTES:

ESTIMACION No.: 0**1 (UNO)** FECHA DE INICIO: **15/08/2023**
FECHA DE TERMINACIÓN: 01/10/2023
$ 1,741,396.90 IVA INCLUIDO

ESTIMACION No.: 0**2 (DOS)** FECHA DE INICIO: 02/10/2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 31/10/2023
$ 736,472.24 IVA INCLUIDO

ESTIMACION No.: 0**3 (TRES) Y** FINIQUITO FECHA DE INICIO: 01/11/2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 12/12/2023
$ 2,522,558.32 IVA INCLUIDO

SE HACE CONSTAR EN ESTA ACTA POR AMBAS PARTES, QUE TODOS LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SE ENCUENTRAN EN PODER DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ.

ASÍ TAMBIÉN, SE MANIFIESTA QUE CON ESTA FECHA, INICIA EL PLAZO DE DOCE MESES EN EL QUE LA EMPRESA: **IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.** QUEDA OBLIGADA A RESPONDER DE LOS

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR
2021-2024

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN Y FINIQUITO DE OBRA PÚBLICA

DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO NUM.: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP,** DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE, QUEDANDO COMO GARANTÍA DE LO ANTES SEÑALADO, LA FIANZA NUM. **23A42208,** EXPEDIDA POR LA AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO, DEMOLICION A MAQUINA DE CARPETA ASFALTICA, DEMOLICION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN MAL ESTADO DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS PARA CIMENTACION DE MURO DE PIEDRA BRAZA DE LA REGION, FILTRO DE GRAVA, RELLENO EN CEPAS DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC., APERTURA DE CAJA POR MEDIOS MECANICOS, AFINE Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE, EXCAVACION A MANO PARA TUB. DE 3" DE PVC HIDRAULICO, COLOCACION DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE CEPAS, AFINE Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE, ELABORACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, FORMACION DE BASE AL 90% PROCTOR, SUM. Y COLOC. DE HULE CAL.600, COLOCACION DE PAVIMENTO PREMEZCLADO F´C=300 KG/CM2 DE 20 CM DE ESP., CORTE EN LOSAS Y CALAFATEO EN LAS MISMAS, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, DEMOLICIONES Y EXCAVACION, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL MÁRGEN Y AL CALCE LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
IRINA SALGADO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

POR EL H. AYUNTAMIENTO:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA.

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ROBERTO POSADA Y COMONFORT S/N COL. CENTRO C.P.39300 ACAPULCO DE JUAREZ

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

CON FUNDAMENTO EN EL PARRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTICULO 172 DE SU REGLAMENTO; SE PROCEDE A LEVANTAR ESTA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA CUAL SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA No. **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**, Y CONVENIO No._____ RELATIVO A LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD. FRACC. MAGALLANES,** UBICADA EN: **ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO.**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
INFORMACION BASICA INICIAL

ÁREA ENCARGADA DE LA OBRA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

OBJETO DEL CONTRATO: " EL ORGANISMO " encomienda a **" EL CONTRATISTA"** la realización de una obra consistente en la **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD. FRACC. MAGALLANES**, UBICADA EN: **ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO** y este se obliga a realizar hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en la declaración II.8 del apartado de Declaraciones de **" EL CONTRATISTA "**, apegándose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, así como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos.

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS: GUERRERO.

ANTECEDENTES:

NÚMERO DEL OFICIO DE AUTORIZACION:

FECHA DE ADJUDICACION: 15 DE AGOSTO DE 2023.

NUMERO DE CONTRATO: MAJ-FAISMUN/426-2023/LP

FECHA INICIACIÓN SEGÚN BITÁCORA DE OBRA: 15 DE AGOSTO DE 2023

FECHA TERMINACIÓN SEGÚN BITÁCORA DE OBRA: 12 DE DICIEMBRE DE 2023.

I.- EN LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. SIENDO LAS **9:00** HORAS DEL DIA **27 DE DICIEMBRE DE 2023**, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA RESIDENCIA DE OBRA, CITA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, EN ROBERTO POSADA Y COMONFORT S/N COL. CENTRO C.P. 39300, ACAPULCO,GRO.

II.- QUE PARA REALIZAR EL ACTO SEÑALADO SE ENCUENTRA REUNIDAS LAS PERSONAS ADSCRITAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, LOS SERVIDORES PUBLICOS DEBIDAMENTE ACREDITADOS EN SU PERSONALIDAD Y ACTUANDO CONFORME A LA DELEGACION DE FACULTADES EN PRESENTACION DE LA DIRECCION **", M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES**, JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA. **Y POR LA OTRA PARTE PERSONA FISICA O MORAL IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. REPRESSENTADA POR EL C. ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ** EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ROBERTO POSADA Y COMONFORT S/N COL. CENTRO C.P.39300 ACAPULCO DE JUAREZ

III.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN.

INFRAESTRUCTURA: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION CON MAQUINA, CONSTRUCCION DE MUROS DE PIEDRA BRAZA DE LA REGION, DREN A BASE DE TUBO DE 4", FILTRO DE GRAVA, RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.

SUB-ESTRUCTURA:

SUPERESTRUCTURA:

TERRACERIAS: TRAZO Y NIVELACION, APERTURA DE CAJA POR MEDIOS MECANICOS, AFINE Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE, FORMACION DE BASE COMPACTADA AL 90% PROCTOR MINIMO, AFINE Y COMPACTACION DEL AREA PARA BANQUETAS.

PAVIMENTOS: ELABORACION DE GUARNICION DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15X20X40 CM., BANQUETA DE F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, SUM. Y COLOCACION DE HULE NEGRO CALIBRE 600, PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 300 KG/CM2 DE 20 CM DE ESP. CON FIBRA MICROSINTETICA, CORTE DE JUNTAS EN PISO DE CONCRETO, CALAFATEO EN JUNTAS, PINTURA ESMALTE AMARILLO TRAFICO, ELABORACION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO.

OBRAS COMPLEMENTARIAS: DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MAL ESTADO, REGISTROS SANITARIOS, TOMAS DOMICILIARIAS, INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 3" RD-26 Y LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE P.V.C. DE 8", LIMPIEZA GENERAL DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES FUERA DE LA OBRA EN CAMION DE VOLTEO.

IV.- DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES.

MEDIANTE ESCRITO DE FECHA_____, LA EMPRESA CONTRATISTA SOLICITA MEDIANTE OFICIO, SE LE AUTORICE LA EJECUCION DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, NO CONTEMPLADOS EN EL CATALAGO DE CONCEPTOS ORIGINAL DEL CUAL SE AUTORIZO MEDIANTE NOTA DE BITACORA _____., REFERENTE.. _____ ,ASI COMO TAMBIEN, OBRA ADICIONAL EN LOS CONCEPTOS _____.

RELACION DE OBLIGACIONES Y FECHA EN QUE SE CUMPLIERON.

FIRMA DE CONTRATO:
FIRMA DE CONVENIO_____.

ANTICIPO:
FIANZAS:

CONTRATO

- DE CUMPLIMIENTO: 23A42208 DE FECHA **15 DE AGOSTO DE 2023**
- DE ANTICIPO: **23A42203** DE FECHA **15 DE AGOSTO DE 2023**
- DE VICIOS OCULTOS: **23A42208** DE FECHA **15 DE AGOSTO DE 2023**

CONVENIO

- DE CUMPLIMIENTO: _____ DE FECHA _____
- DE ANTICIPO: _____ DE FECHA _____
- DE VICIOS OCULTOS: _____ DE FECHA _____

2021-2024

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ROBERTO POSADA Y COMONFORT S/N COL. CENTRO C.P.39300 ACAPULCO DE JUAREZ

TERMINACION DE TRABAJOS: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023

FINIQUITO: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
ENTREGA - RECEPCION: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023

MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL: $ 5,000.427.46 **I.V.A INCLUIDO.**

MONTO DE LAS AMPLIACIONES:

MONTOS DE LAS AMPLIACIONES:

MONTO TOTAL CONTRATADO: $ 5,000.427.46 **I.V.A INCLUIDO.**
SANCIONES: NO SE PRESENTARON

V.- **LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS** DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR CUANTO A LAS FIANZAS No. **23A42208** DE FECHA **15 DE AGOSTO DEL 2023** POR CONCEPTO DE VICIOS OCULTOS POR SU PARTE LA PERSONA FISICA O MORAL **IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.** , **REPRESENTADA POR LA C. IRINA SALGADO HERANDEZ** , EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, MANIFIESTA QUE NO SE RESERVA ACCION NI TIENE RECLAMACION ALGUNA CON POSTERIORIDAD A LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA, POR LO CUAL SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA No. **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP** Y CONVENIO No._____.

SIN OTRO ASUNTO EN PARTICULAR QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, SIENDO LAS **12:30** HORAS DEL DIA **27 DE DICIEMBRE DEL 2023** FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2021-2024

POR LA EMPRESA

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A.DEC.V.

REPRESENTANTE LEGAL

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA

ARQ.CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DORAMA

Datos de la Fianza

FOLIO 1827931

Movimiento :	POLIZA	**R.F.C. Fiado :**	ICO091216UUA	**Monto Afianzado del Movimiento**	**$1,500,128.24**
Fianza :	23A42203	**Endoso :**	23A42203	**Prima :**	**$18,001.54**
Ramo :	ADMINISTRATIVO			Gastos de Expedición y D.I.V. :	$2,630.05
Subramo :	OBRA			Otros Gastos :	$450.00
Obligación :	ANTICIPO			Gasto de Seguro :	$0.00
Moneda :	PESOS	**Código Seguridad:**	1800023A422031827	Gasto de Servicio de Ajuste :	$0.00
Agente :	855350	**C.C. :**	3002070	**Sub Total :**	**$21,081.59**
Nombre :	EFREN JESUS LOPEZ FLORES			I.V.A. 16.00%	$3,373.06
División :	METROPOLITANA			**Prima Total :**	**$24,454.65**
Monto Total de la Fianza:	**$1,500,128.24**				

Dorama, Institución de Garantías, S.A. En ejercicio de la autorización que le fue concedida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas

FIANZA OTORGADA ANTE: EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. CON DOMICILIO EN AV. CUAUHTEMOC S/N INTERIOR PARQUE PAPAGAYO, COL. HORNOS INSURGENTES, C.P. 39350, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO., Y CON RFC: MAJ010101NA3.

PARA GARANTIZAR POR IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN CALLE CORREGIDORA No. 4, COL. MORELOS, C.P. 39530, ACAPULCO, GRO., Y R.F.C. ICO-091216-UUA, LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACIÓN Y EN SU CASO, DEVOLUCION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30% (TREINTA POR CIENTO) PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $1,500,128.24 (UN MILLON QUINIENTOS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 24/100 M.N.) INCLUYE I.V.A. LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO N° 266, Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE LA MATERIA, EN LO QUE NO SE OPONGA A LA CITADA LEY, RESPECTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO N° MAJ-FAISMUN/426-2023/LP DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2023, CELEBRADO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, REPRESENTADA POR EL ING. LUZ MARÍA MERAZA RADILLA EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, CUYO OBJETO CONSISTE EN: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, CON UN IMPORTE TOTAL DE $5,000,427.46 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 46/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. LA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A) LA FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD Y ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, PARA GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSION DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO QUE LA CONTRATANTE OTORGA A LA EMPRESA IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., Y SE COMPROMETE A PAGAR HASTA LA CANTIDAD QUE IMPORTE ESTA FIANZA, EN CASO DE QUE SU FIADO NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN

*Esta Fianza sólo es válida hasta por la cantidad de: $1,500,128.24 (***UN MILLON QUINIENTOS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 24/100 M.N.***)*

z9ldz0vN12pIKdWIRM0VRGinzjkdM9LIHmVRUXNNYBveWLerViimi4ofIsdF7v1lnmZyczrtGykRMmOXbg9XC3bGAN+keGpt6Z7egx+ogPMEQeCs1IBPjKRR/6TgR67B2A+UsiuFNAOVTuEK6JCbqt/ynlUsyei+uD8lj5c=

CINTHYA CRISTINA GARCIA VILLALBA

JEFE DE OFICINA

CUERNAVACA, MORELOS, A 15 DE AGOSTO DE 2023

La presente póliza únicamente será válida si contiene la firma del responsable de su expedición.
Condiciones Generales adjuntas o en www.dorama.mx
Esta Fianza es nula y sin ningún valor si se expide:
a) Como complementaria de otra(s) que ampare(n) la misma obligación.
b) Por la cantidad mayor indicada al margen con la máquina protectora.

Dorama, Institución de Garantías, S.A.
Av. Patriotismo No. 201 Piso 1
Col. San Pedro de los Pinos C.P. 03800.
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México
Tel. 5487 6100 • 01 800 DORAMA 1 (367262-1)
R.F.C. FDO9411098R8

Para validar su fianza ingrese a www.dorama.mx

LÍNEA DE VALIDACIÓN: 1800 023A 4220 3182 7931

DORAMA

Datos de la Fianza

FOLIO 1827931

Movimiento :	POLIZA	**R.F.C. Fiado :**	ICO091216UUA	**Monto Afianzado del Movimiento**	**$1,500,128.24**
Fianza :	23A42203	**Endoso :**	23A42203	**Prima :**	**$18,001.54**
Ramo :	ADMINISTRATIVO			Gastos de Expedición y D.I.V. :	$2,630.05
Subramo :	OBRA			Otros Gastos :	$450.00
Obligación :	ANTICIPO			Gasto de Seguro :	$0.00
Moneda :	PESOS	**Código Seguridad:**	1800023A422031827	Gasto de Servicio de Ajuste :	$0.00
Agente :	855350	**C.C. :**	3002070	**Sub Total :**	**$21,081.59**
Nombre :	EFREN JESUS LOPEZ FLORES			I.V.A. 16.00%	$3,373.06
División :	METROPOLITANA			**Prima Total :**	**$24,454.65**
Monto Total de la Fianza:	**$1,500,128.24**				

Dorama, Institución de Garantías, S.A. En ejercicio de la autorización que le fue concedida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas

O SEA RESCINDIDO EL CONTRATO; B) EN EL CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO, SE DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA POLIZA Y PARA EL CASO DE AMPLIACION DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION O EJECUCION DE LOS TRABAJOS O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORANEAMENTE; C) CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA Y ESTE EFECTUE LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, DEBERA LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA SIEMPRE Y CUANDO SEA PROCEDENTE EN LOS TERMINOS AQUÍ ESTIPULADOS; D) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, QUE LA PRODUCIRA CUANDO EL IMPORTE DEL ANTICIPO HAYA SIDO AMORTIZADO O DEVUELTO EN SU TOTALIDAD Y SE HAYAN PAGADO EN SU CASO LOS ACCESORIOS; E) QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; F) LA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN LOS ARTICULOS Nº 178, 279, 280 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR; OTORGANDO LA AFIANZADORA EL CONSENTIMIENTO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTICULO Nº 179 DEL CITADO ORDENAMIENTO; G) QUE PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO SE SOMETE A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO DE GUERRERO, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRA QUE TUVIERE POR RAZON DE SU DOMICILIO OFICIAL, EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
*** FIN DE
TEXTO ***

Esta Fianza sólo es válida hasta por la cantidad de:
*$1,500,128.24 (***UN MILLON QUINIENTOS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 24/100 M.N.***)*

z9Id20rN12pRdW1RM0VRGlnzjkdM9LJHmVRUXNNYBveWLerVimi4o1IsdF7v1lnmZyczrtGykMmOXbg9XC3hGAN+keGpt6Z7cgx+ogPMEQeCs1IBPjKbR/6TgR67B22A+UaiuFNAOVTuEK6JJCbqUymfUsyei+nD8lj5c=

CINTHYA CRISTINA GARCIA VILLALBA
JEFE DE OFICINA

CUERNAVACA, MORELOS, A 15 DE AGOSTO DE 2023

La presente póliza únicamente será válida si contiene la firma del responsable de su expedición.
Condiciones Generales adjuntas o en www.dorama.mx
Esta Fianza es nula y sin ningún valor si se expide:
a) Como complementaria de otra(s) que ampare(n) la misma obligación.
b) Por la cantidad mayor indicada al margen con la máquina protectora.

Dorama, Institución de Garantías, S.A.
Av. Patriotismo No. 201 Piso 1
Col. San Pedro de los Pinos C.P. 03800,
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México
Tel. 5487 6100 • 01 800 DORAMA 1 (367262-1)
R.F.C. FDO9411098R8

Para validar su fianza ingrese a www.dorama.mx
LÍNEA DE VALIDACIÓN: 1800 023A 4220 3182 7931

DORAMA

Datos de la Fianza

FOLIO 1827937

Movimiento :	POLIZA	**R.F.C. Fiado :**	ICO091216UUA	**Monto Afianzado del Movimiento**	**$500,042.75**
Fianza :	23A42208	**Endoso :**	23A42208	**Prima :**	**$7,973.28**
Ramo :	ADMINISTRATIVO			Gastos de Expedición y D.I.V. :	$2,279.06
Subramo :	OBRA			Otros Gastos :	$0.00
Obligación :	CUMPLIMIENTO Y BUENA CALIDAD			Gasto de Seguro :	$0.00
Moneda :	PESOS	**Código Seguridad:**	1800023A422081827	Gasto de Servicio de Ajuste :	$0.00
Agente :	855350	**C.C. :**	3002070	**Sub Total :**	**$10,252.34**
Nombre :	EFREN JESUS LOPEZ FLORES			I.V.A. 16.00%	$1,640.37
División :	METROPOLITANA			**Prima Total :**	**$11,892.71**
Monto Total de la Fianza:	**$500,042.75**				

Dorama, Institución de Garantías, S.A. En ejercicio de la autorización que le fue concedida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas

FIANZA OTORGADA ANTE: EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. CON DOMICILIO EN AV. CUAUHTEMOC S/N INTERIOR PARQUE PAPAGAYO, COL. HORNOS INSURGENTES, C.P. 39350, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO., Y CON RFC: MAJ010101NA3.

PARA GARANTIZAR POR IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN CALLE CORREGIDORA No. 4, COL. MORELOS, C.P. 39530, ACAPULCO, GRO., Y R.F.C. ICO-091216-UUA, EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO N° MAJ-FAISMUN/426-2023/LP DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2023, CELEBRADO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, REPRESENTADA POR SU TITULAR LA ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA, CUYO OBJETO CONSISTE EN: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, CON UN IMPORTE TOTAL DE $5,000,427.46 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 46/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO N° 266, Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE LA MATERIA, EN LO QUE NO SE OPONGA A LA CITADA LEY. LA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A) LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B) LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C) CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUBSTITUIRA EN EL O LOS SIGUIENTES EJERCICIOS POR OTRO U OTRAS EQUIVALENTES AL IMPORTE DE LOS TRABAJOS FALTANTES POR EJECUTAR, ACTUALIZANDO LOS IMPORTES DE ACUERDO CON LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS Y MODIFICACIONES CONVENIDAS SI LAS HUBIERE; D) EN EL CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO, SE DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA POLIZA Y PARA EL CASO DE AMPLIACION DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION O EJECUCION DE LOS TRABAJOS O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA

*Esta Fianza sólo es válida hasta por la cantidad de: $500,042.75 (***QUINIENTOS MIL CUARENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N.***)*

rk6ca32xjqp5sYFscfxU8qdbYNuAXCCEhkmUD5mofSU/iCizJoLgRuZm6wC/69fIlqWfVUcWUFdQ4+wbksOvk3eVhiqQYLRx5hUOJRx/5b1b1MIT4N2A3UxZHVTHAWEEn5x0jmZL4qQYBkLvxHEaVMF1x/SSrW/QbXr0=

CINTHYA CRISTINA GARCIA VILLALBA

JEFE DE OFICINA

CUERNAVACA, MORELOS, A 15 DE AGOSTO DE 2023

La presente póliza únicamente será válida si contiene la firma del responsable de su expedición.
Condiciones Generales adjuntas o en www.dorama.mx
Esta Fianza es nula y sin ningún valor si se expide:
a) Como complementaria de otra(s) que ampare(n) la misma obligación.
b) Por la cantidad mayor indicada al margen con la máquina protectora.

Dorama, Institución de Garantías, S.A.
Av. Patriotismo No. 201 Piso 1
Col. San Pedro de los Pinos C.P. 03800,
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México
Tel. 5487 6100 • 01 800 DORAMA 1 (367262-1)
R.F.C. FDO9411098R8

Para validar su fianza ingrese a www.dorama.mx

LÍNEA DE VALIDACIÓN: 1800 023A 4220 8182 7937

DORAMA

FOLIO 1827937

Datos de la Fianza

Movimiento :	POLIZA	**R.F.C. Fiado :**	ICO091216UUA	**Monto Afianzado del Movimiento**	**$500,042.75**
Fianza :	23A42208	**Endoso :**	23A42208	**Prima :**	**$7,973.28**
Ramo :	ADMINISTRATIVO			Gastos de Expedición y D.I.V. :	$2,279.06
Subramo :	OBRA			Otros Gastos :	$0.00
Obligación :	CUMPLIMIENTO Y BUENA CALIDAD			Gasto de Seguro :	$0.00
Moneda :	PESOS	**Código Seguridad:**	1800023A422081827	Gasto de Servicio de Ajuste :	$0.00
Agente :	855350	**C.C. :**	3002070	**Sub Total :**	**$10,252.34**
Nombre :	EFREN JESUS LOPEZ FLORES			I.V.A. 16.00%	$1,640.37
División :	METROPOLITANA			**Prima Total :**	**$11,892.71**
Monto Total de la Fianza:	**$500,042.75**				

Dorama, Institución de Garantías, S.A. En ejercicio de la autorización que le fue concedida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas

PRORROGA O ESPERA, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORANEAMENTE; E) LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ; F) ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O DE (LA CONVOCANTE), HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACORTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; G) QUE LA FIANZA SE OTORGA TAMBIEN PARA GARANTIZAR LA CORRECCION DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION QUE RESULTEN, DE LOS VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; H) LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE (LA CONVOCANTE), SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA CONTINUARA VIGENTE; I) CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA Y ESTE EFECTUE LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, DEBERA LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA, SIEMPRE Y CUANDO SEA PROCEDENTE EN LOS TERMINOS AQUÍ ESTIPULADOS; J) LA FIANZA CONTINUARA EN VIGOR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LA OBRA, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO ALGUNA RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA POR DEFECTOS DE LA OBRA, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA, EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCION FISICA DE LA OBRA, EL CONTRATISTA GARANTIZA LOS MISMOS EN LOS TERMINOS DEL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO N° 266 Y 95 DE SU REGLAMENTO, POR LO QUE TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE) MESES, SIN QUE EXISTA RECLAMACION ALGUNA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, LA FIANZA QUEDARA CANCELADA, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD

*Esta Fianza sólo es válida hasta por la cantidad de: $500,042.75 (***QUINIENTOS MIL CUARENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N.***)*

rk8ica52xjqp5sYFxcfU8qJbYNuAXCCIbkatUDSmofSU1CiZoLgRuZm6wC/669IIqWiVUcWUFdQ4+wbksOvk3eVhiqQYL8x5kfOlRx/5b1bIMIT4N2A3IUxZHVTHAWEEn5sQmZL4qQYBIxLvxHEaVfME1x/SSrW/QbXr0=

CINTHYA CRISTINA GARCIA VILLALBA
JEFE DE OFICINA

CUERNAVACA, MORELOS, A 15 DE AGOSTO DE 2023

La presente póliza únicamente será válida si contiene la firma del responsable de su expedición.
Condiciones Generales adjuntas o en www.dorama.mx
Esta Fianza es nula y sin ningún valor si se expide:
a) Como complementaria de otra(s) que ampare(n) la misma obligación.
b) Por la cantidad mayor indicada al margen con la máquina protectora.

Dorama, Institución de Garantías, S.A.
Av. Patriotismo No. 201 Piso 1
Col. San Pedro de los Pinos C.P. 03800.
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México
Tel. 5487 6100 • 01 800 DORAMA 1 (367262-1)
R.F.C. FDO9411098R8

Para validar su fianza ingrese a www.dorama.mx
LÍNEA DE VALIDACIÓN: 1800 023A 4220 8182 7937

DORAMA

Datos de la Fianza

FOLIO 1827937

Movimiento :	POLIZA	**R.F.C. Fiado :**	ICO091216UUA	**Monto Afianzado del Movimiento**	**$500,042.75**
Fianza :	23A42208	**Endoso :**	23A42208	**Prima :**	**$7,973.28**
Ramo :	ADMINISTRATIVO			Gastos de Expedición y D.I.V. :	$2,279.06
Subramo :	OBRA			Otros Gastos :	$0.00
Obligación :	CUMPLIMIENTO Y BUENA CALIDAD			Gasto de Seguro :	$0.00
Moneda :	PESOS	**Código Seguridad:**	1800023A422081827	Gasto de Servicio de Ajuste :	$0.00
Agente :	855350	**C.C. :**	3002070	**Sub Total :**	**$10,252.34**
Nombre :	EFREN JESUS LOPEZ FLORES			I.V.A. 16.00%	$1,640.37
División :	METROPOLITANA			**Prima Total :**	**$11,892.71**
Monto Total de la Fianza:	**$500,042.75**				

Dorama, Institución de Garantías, S.A. En ejercicio de la autorización que le fue concedida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas

EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA, LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE; K) EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS POR PARTE DEL CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO A LA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS A EFECTO DE QUE ESTA NO SEA CANCELADA Y NOTIFICARA POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA FIANZA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO AL CONTRATISTA LA RESOLUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. SI LA CORRECCION O REPOSICION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; L) LA FIANZA SE HARA EFECTIVA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA AL CONTRATISTA LA RESOLUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO; M) LA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS Nº 178, 279, 280 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR; OTORGANDO LA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS EL CONSENTIMIENTO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTICULO Nº 179 DEL CITADO ORDENAMIENTO.
*** FIN DE TEXTO ***

*Esta Fianza sólo es válida hasta por la cantidad de: $500,042.75 (***QUINIENTOS MIL CUARENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N.***)*

rk8fca52xjqn5sYFxcfsU8qJbYNuAXCCEbknnUDSmotSU/1CizJoLgRuZm6wC/69JIqWhVUcWUFdQ4+wbkSOvk3eVhiqQYL8x5kIORx/5b1bMIT4N2A3IUxZHVTHAWEEa5xQmZL4qQYBbxLvxHEaV/bME1x/SSrW/Q6X6=

CINTHYA CRISTINA GARCIA VILLALBA
JEFE DE OFICINA

CUERNAVACA, MORELOS, A 15 DE AGOSTO DE 2023

La presente póliza únicamente será válida si contiene la firma del responsable de su expedición.
Condiciones Generales adjuntas o en www.dorama.mx
Esta Fianza es nula y sin ningún valor si se expide:
a) Como complementaria de otra(s) que ampare(n) la misma obligación.
b) Por la cantidad mayor indicada al margen con la máquina protectora.

Dorama, Institución de Garantías, S.A.
Av. Patriotismo No. 201 Piso 1
Col. San Pedro de los Pinos C.P. 03800.
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México
Tel. 5487 6100 • 01 800 DORAMA 1 (367262-1)
R.F.C. FDO9411098R8

Para validar su fianza ingrese a www.dorama.mx
LÍNEA DE VALIDACIÓN: 1800 023A 4220 8182 7937

ACAPULCO, GRO. A 12 DE DICIEMBRE DEL 2023

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MAS RESPETUOSA ME DIRIJO A USTED, PARA COMUNICARLE LO SIGUIENTE: QUE EL CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP** DE LA EMPRESA **IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.** RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD. FRACC. MAGALLANES,**, UBICADA EN : **ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO,** A SIDO CONCLUIDA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE .

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO NO SIN ANTES MANIFESTARLE QUEDAR A SUS ORDENES PARA CUALQUIER ACLARACION.

A T E N T A M E N T E

C. ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ.
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01
CEL. 744 3171644 E-MAIL: imexa@telmexmail.com, gno_0301@hotmail.com

ACAPULCO, GRO. A 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.

CARTA DE ENTREGA DE ESTIMACION

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E:

POR ESTE CONDUCTO HAGO ENTREGA DE LA ESTIMACION No. 03 (TRES) Y FINIQUITO DE LA OBRA : **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD. FRACC. MAGALLANES,** UBICADA EN: **ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO**, CON NUMERO DE CONTRATO **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP** QUE COMPRENDE EL PERIODO **DEL 15 DE AGOSTO AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO NO SIN ANTES MANIFESTARLE QUEDAR A SUS ORDENES PARA CUALQUIER ACLARACION.

ATENTAMENTE

ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01
CEL. 744 3171644 E-MAIL: imexa@telmexmail.com, gno_0301@hotmail.com



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
SALGADO
HERNANDEZ
IRINA

SEXO M

DOMICILIO
C NUEVO LEON 23
COL. PROGRESO 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE DE ELECTOR SLHRIR67082312M900

CURP
SAHI670823MGRLRR09

AÑO DE REGISTRO
1993 06

FECHA DE NACIMIENTO
23/08/1967

SECCIÓN
0057

VIGENCIA
2023 - 2033



INE

C029767

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2412998667<<0057054805632
6708238M3312315MEX<06<<00253<9
SALGADO<HERNANDEZ<<IRINA<<<<<<

CAPULCO, GRO. A 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E:

POR ESTE CONDUCTO HAGO ENTREGA DE LA ESTIMACION No. **03 (TRES) Y FINIQUITO** DE LA OBRA : **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD. FRACC. MAGALLANES,** UBICADA EN: **ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO.** CON NUMERO DE CONTRATO **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP** QUE COMPRENDE EL PERIODO **DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO NO SIN ANTES MANIFESTARLE QUEDAR A SUS ORDENES PARA CUALQUIER ACLARACION.

ATENTAMENTE

ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO
No DE CEDULA: 2220846

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01
CEL. 744 3171644 E-MAIL: imexa@telmexmail.com, gno_0301@hotmail.com

CÉDULA 2220846
DUPLICADO

SEP

DGP

México D.F. 2 de Julio del 2012



FIRMA DEL TITULAR

02/07/12

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES

CÉDULA 2220846

EN VIRTUD DE QUE

VICENTE
ALARCÓN
SEVERIANO

CURP: AASV681221HGRLVC00

CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL Y SU REGLAMENTO, SE LE EXPIDE


EN EDUCACIÓN DE TIPO SUPERIOR LA

CÉDULA

PERSONAL CON EFECTOS DE PATENTE PARA EJERCER PROFESIONALMENTE EN EL NIVEL DE

LICENCIATURA EN ARQUITECTURA

VÍCTOR EVERARDO BELTRÁN CORONA
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

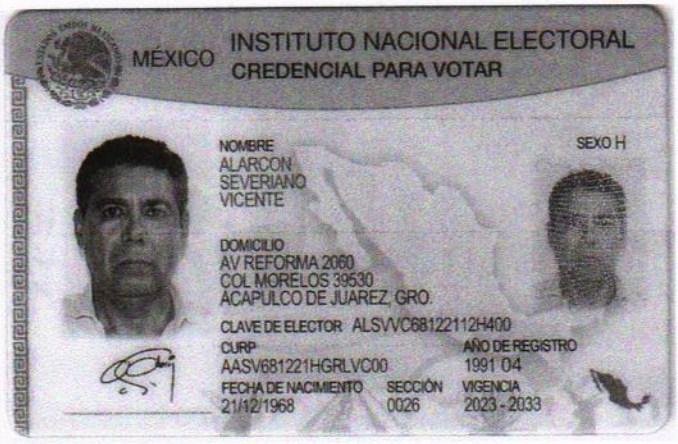
MÉXICO
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
ALARCON
SEVERIANO
VICENTE
SEXO H
DOMICILIO
AV REFORMA 2060
COL MORELOS 39530
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
CLAVE DE ELECTOR ALSVVC68122112H400
CURP
AASV681221HGRLVC00
AÑO DE REGISTRO
1991 04
FECHA DE NACIMIENTO
21/12/1968
SECCIÓN
0026
VIGENCIA
2023 - 2033


INE
IDMEX2414903999<<0026047494258
6812218H3312315MEX<04<<00374<3
ALARCON<SEVERIANO<<VICENTE<<<<

ACAPULCO, GRO. A 08 DE DICIEMBRE DEL 2023

CARTA DE RECEPCION DE FINIQUITO DE LA OBRA

C. IRINA SALGADO HERNANDEZ
IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE SOLICITO QUE SE PRESENTE EL DIA 12 **DE DICIEMBRE DEL 2023** A LAS **12:00 HRS**. EN EL SITIO DE LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD. FRACC. MAGALLANES** UBICADA EN: **ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO,** PARA CONCILIAR VOLUMENES DE LA OBRA PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO. CONFORME AL ARTÍCULO 169 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

SIN MÁS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER ACLARACIÓN.

Atentamente

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION
DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA


Atentamente

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA


C.C.P.- M.I VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN.- Director de Obras Públicas
C.C.P.- Archivo / Minutario.

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023

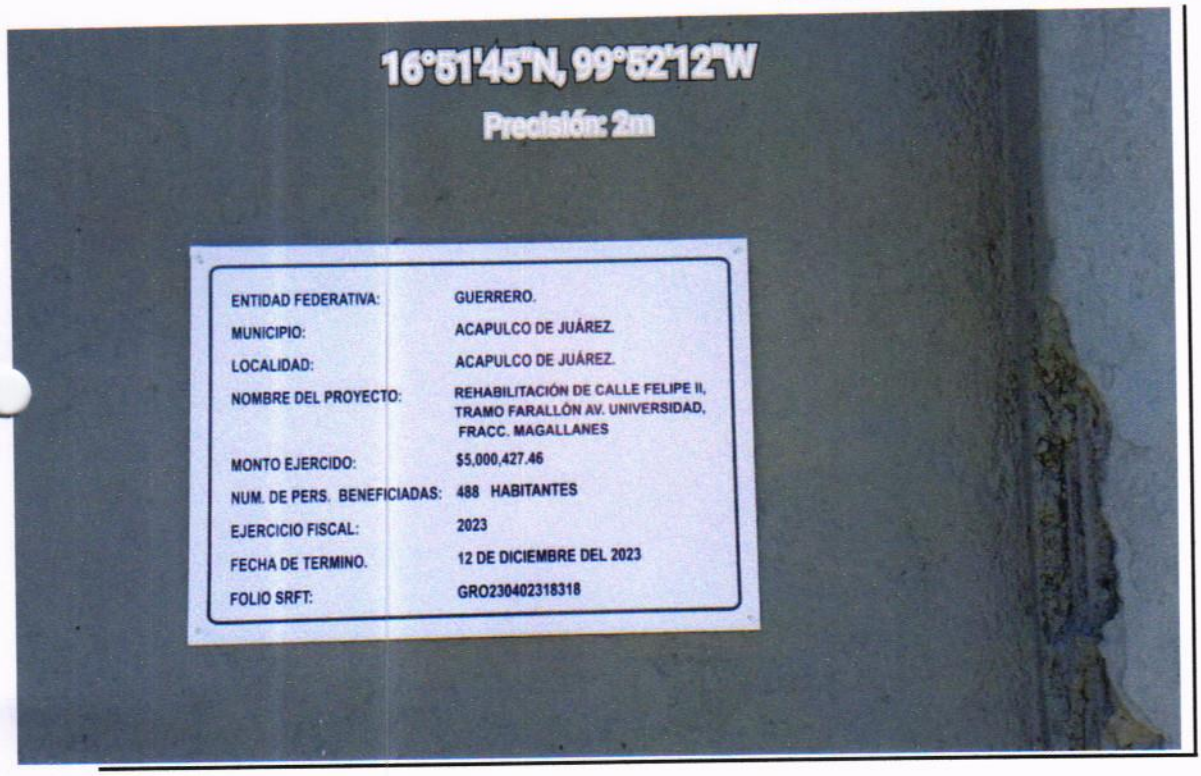

PLACA DE TERMINACION

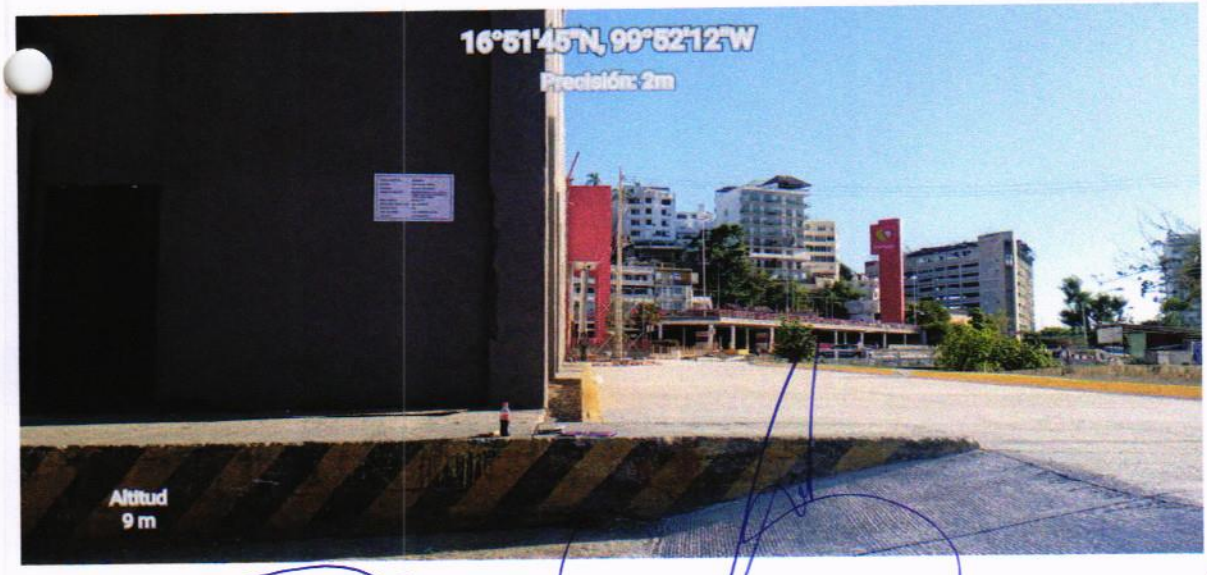


PLACA DE TERMINACION


IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023

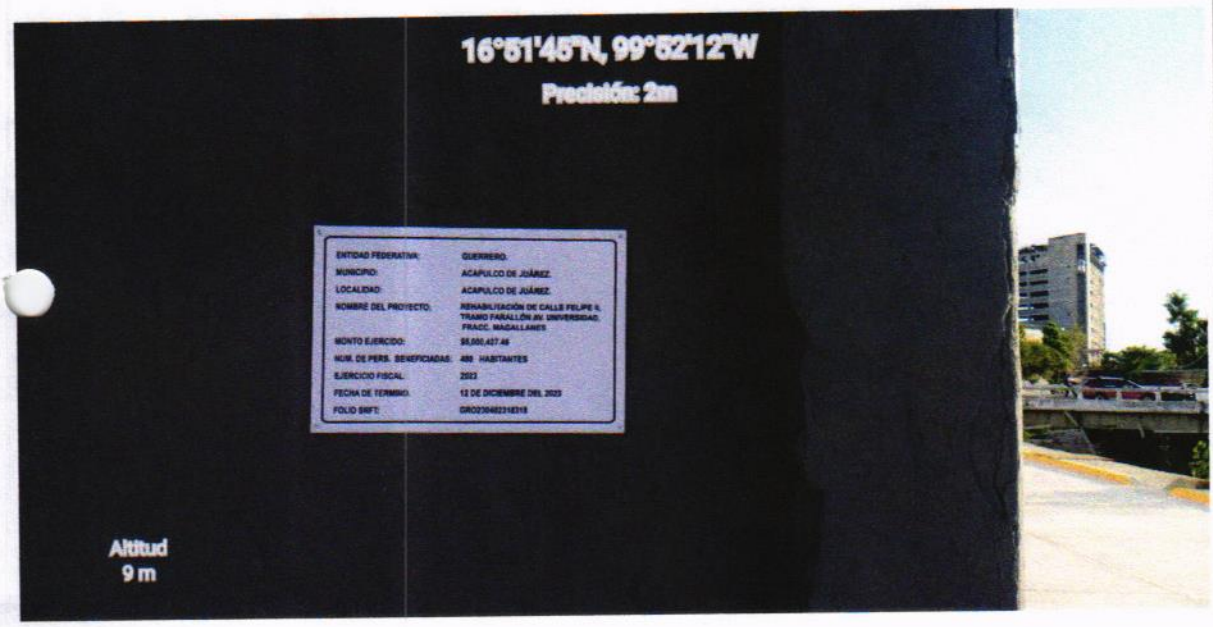

PLACA DE TERMINACION

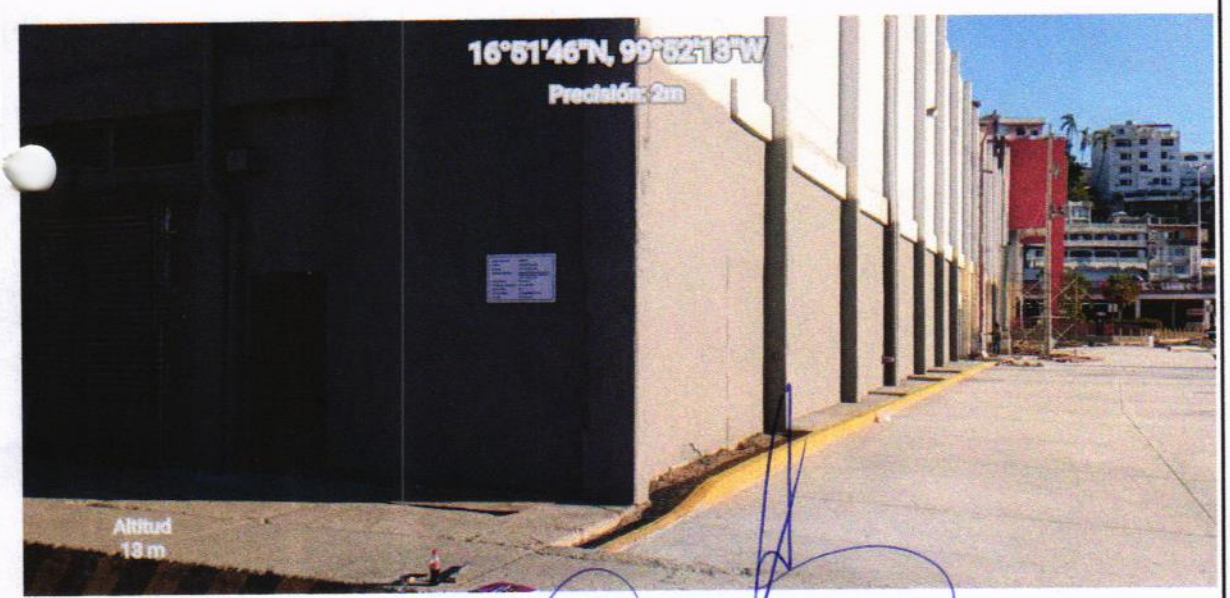

PLACA DE TERMINACION

IMEKA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023



INICIO




INICIO


IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023

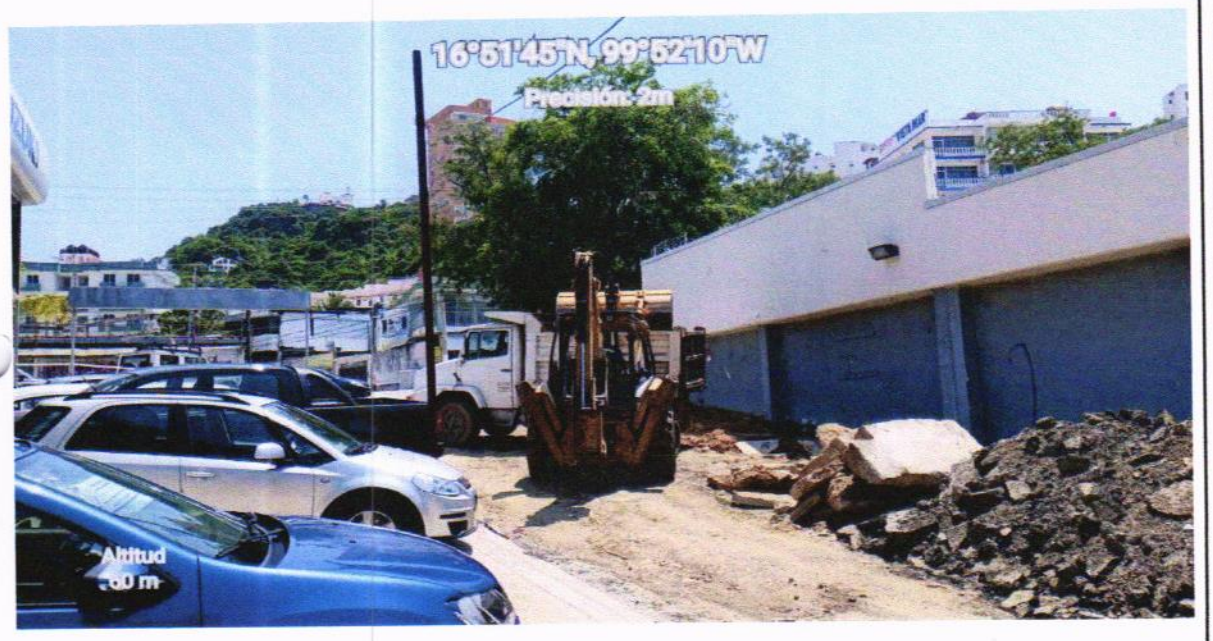

INICIO

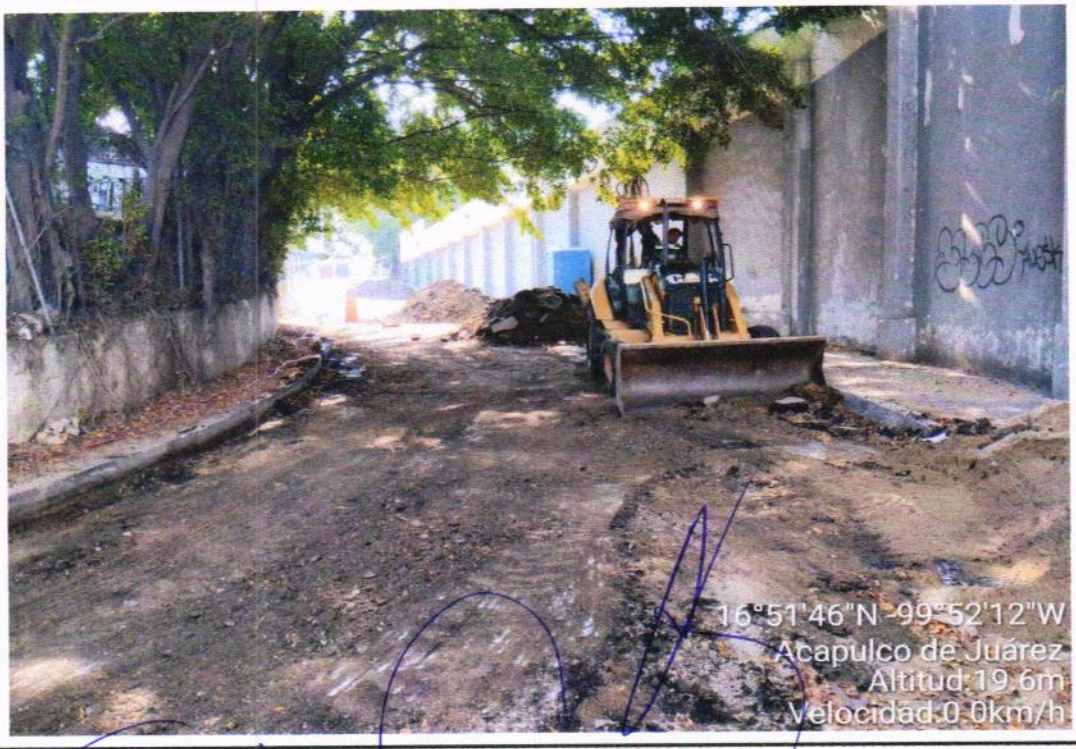


INICIO

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023

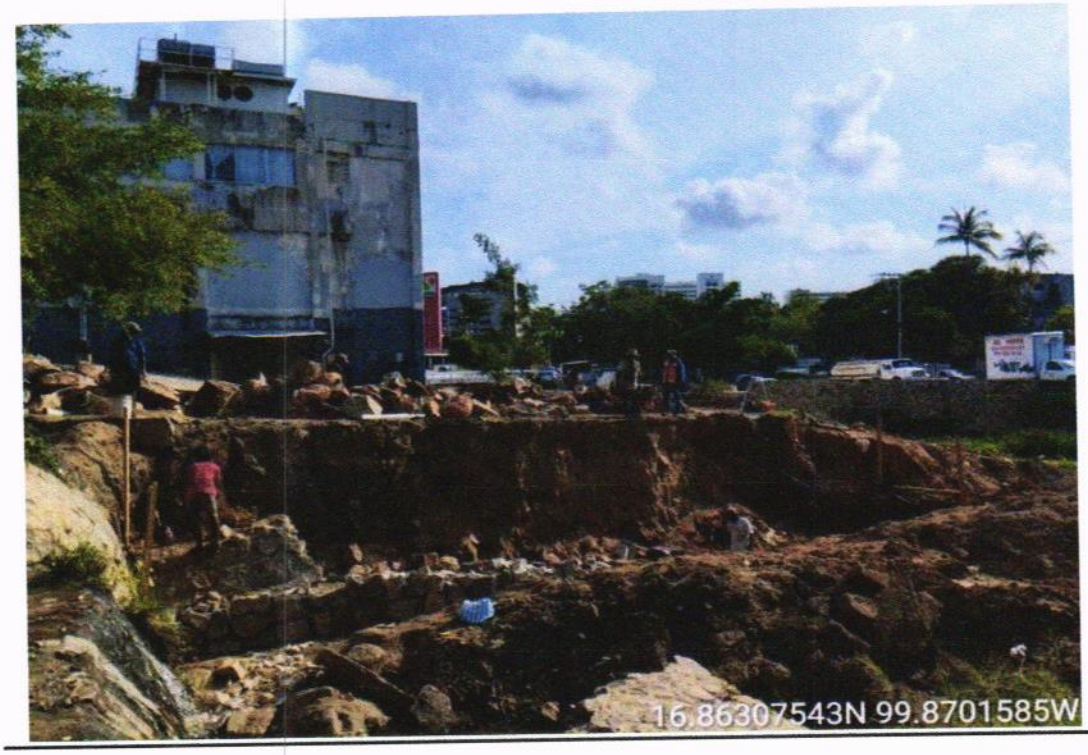

PROCESO




PROCESO

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023

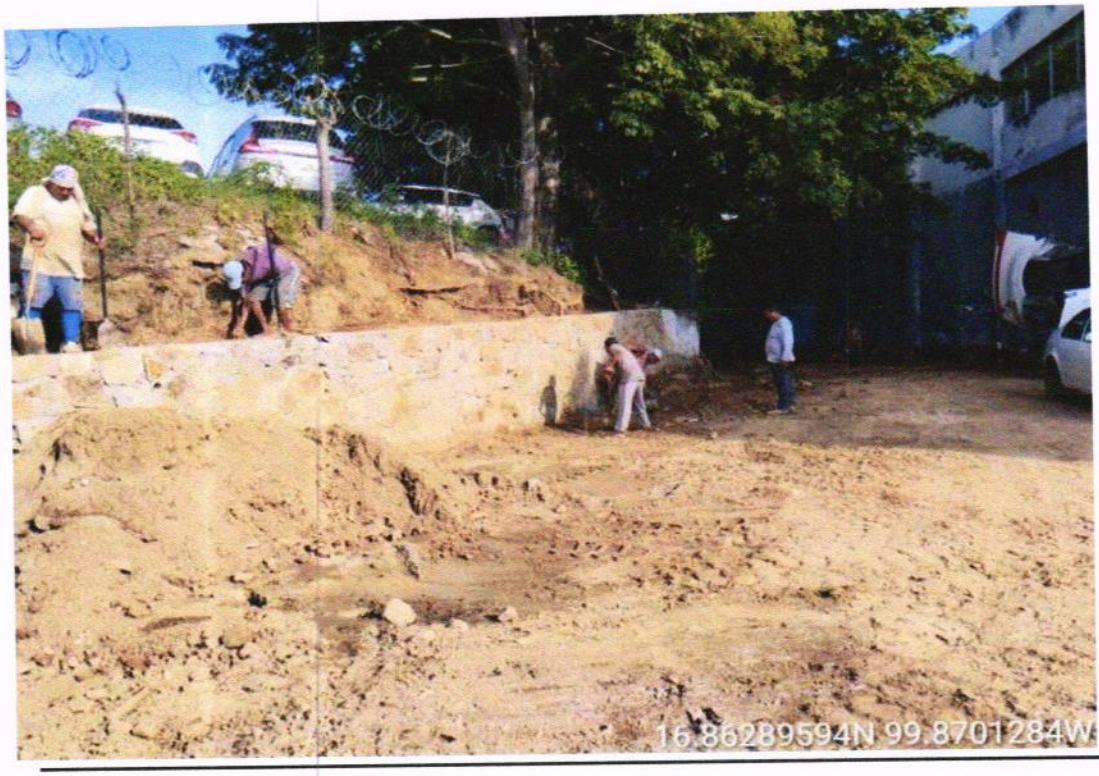

PROCESO




PROCESO

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023

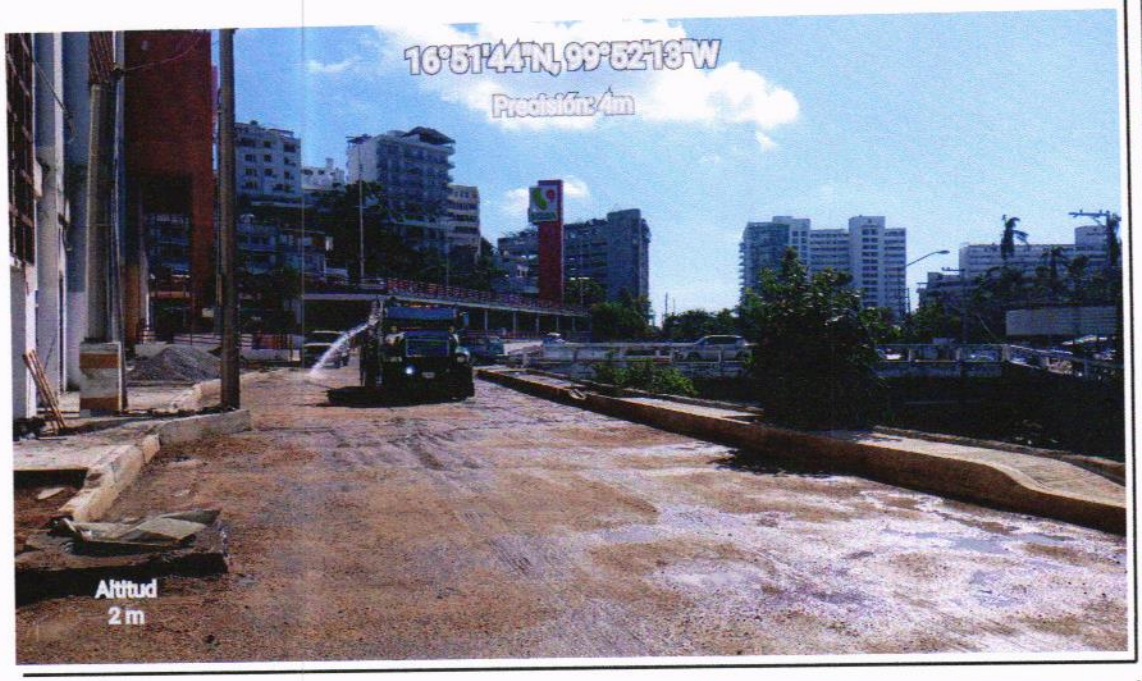

PROCESO




PROCESO

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023

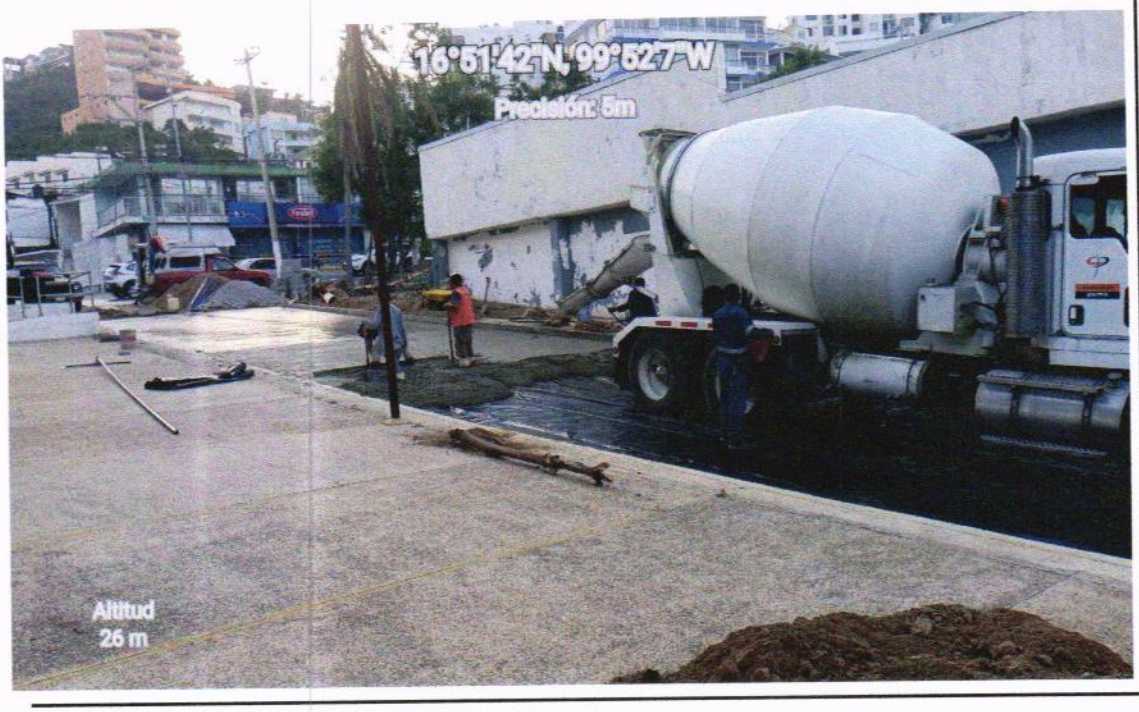

PROCESO



PROCESO


IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023



PROCESO

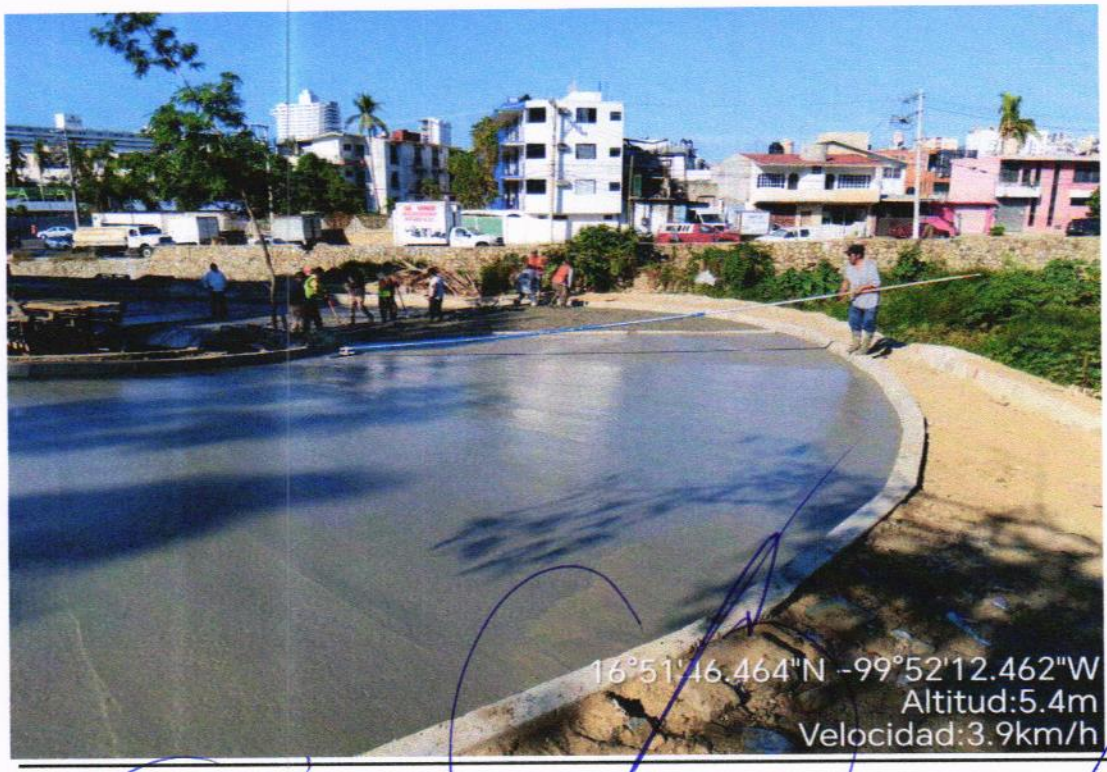


PROCESO


IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023

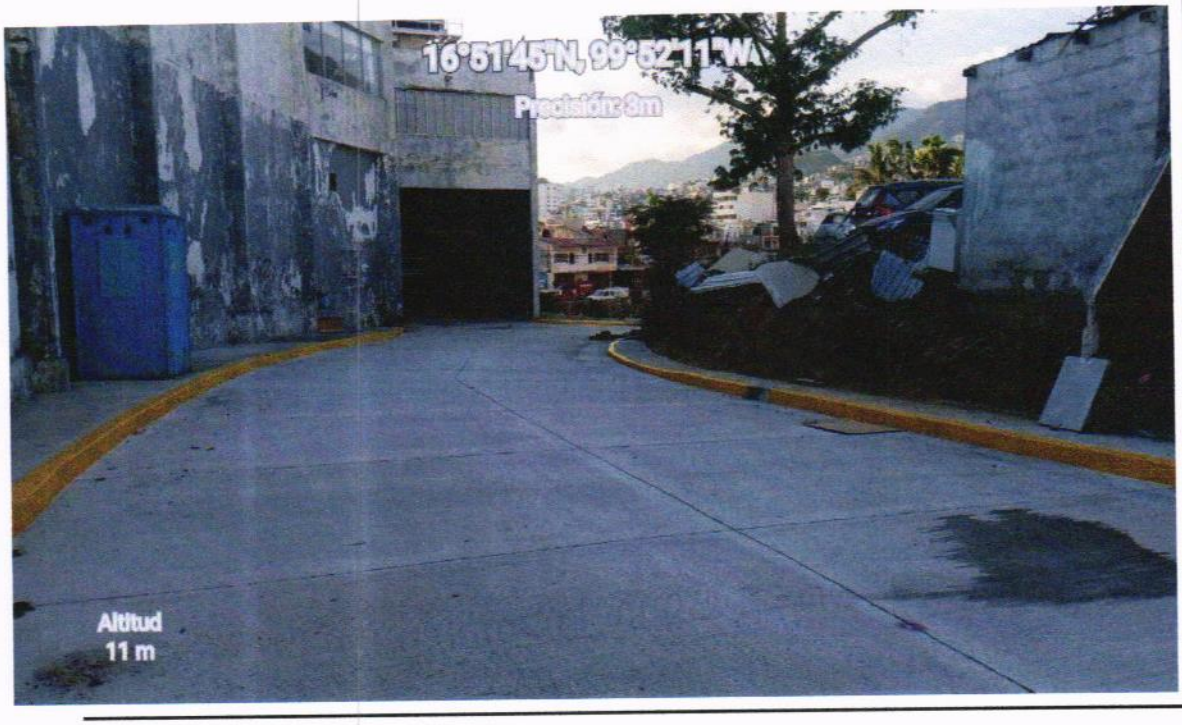

TERMINACION

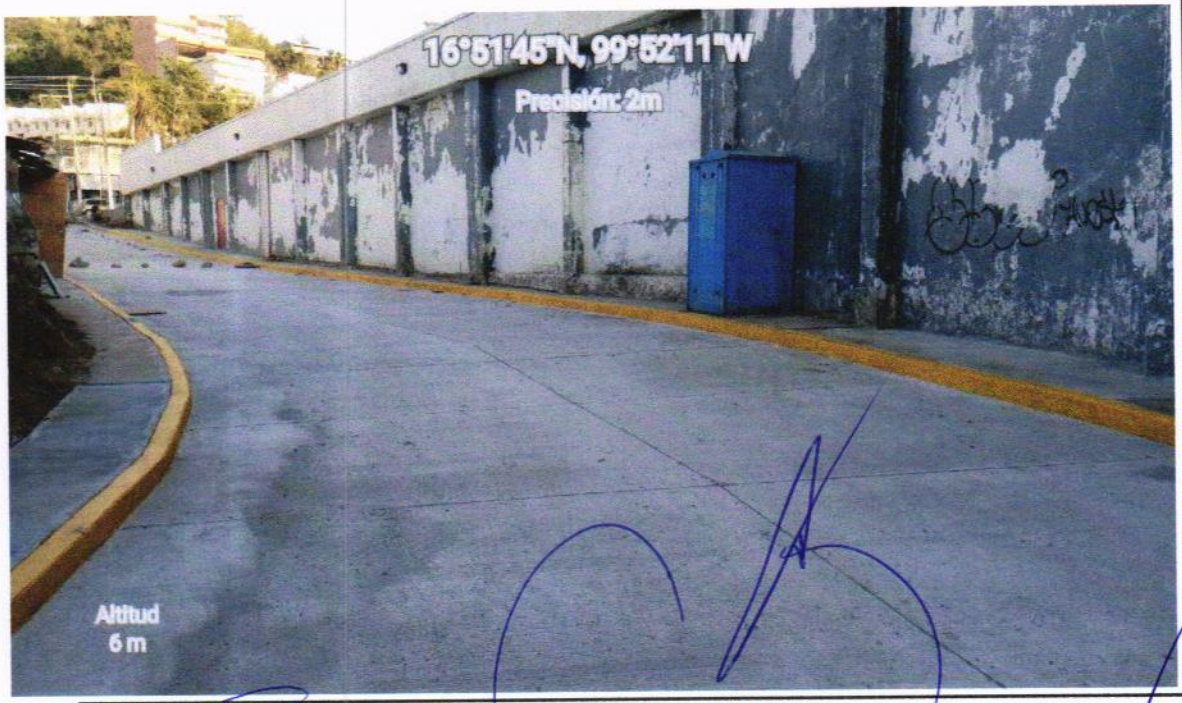


TERMINACION


IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023

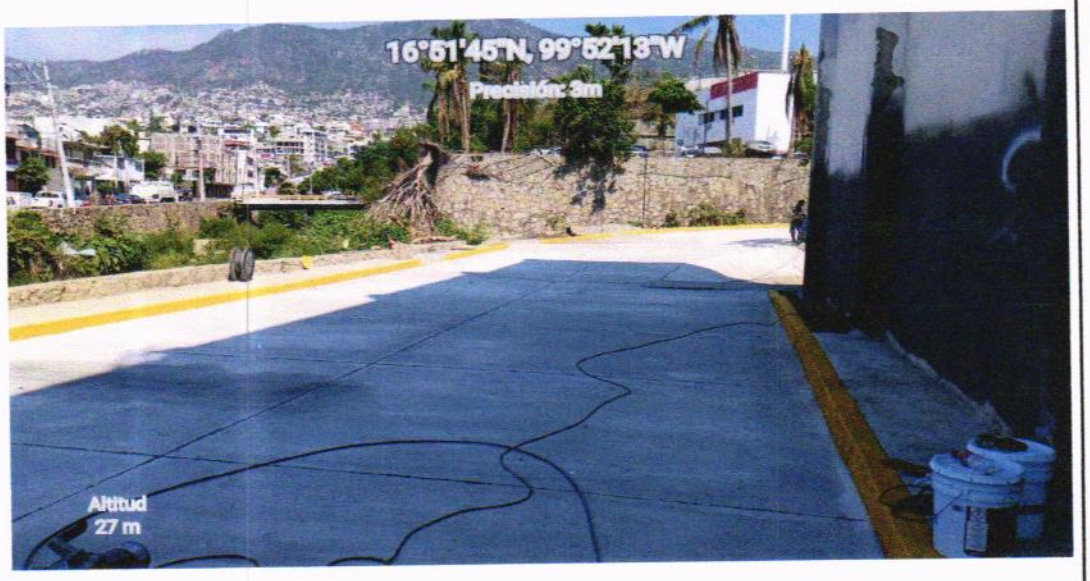

TERMINACION

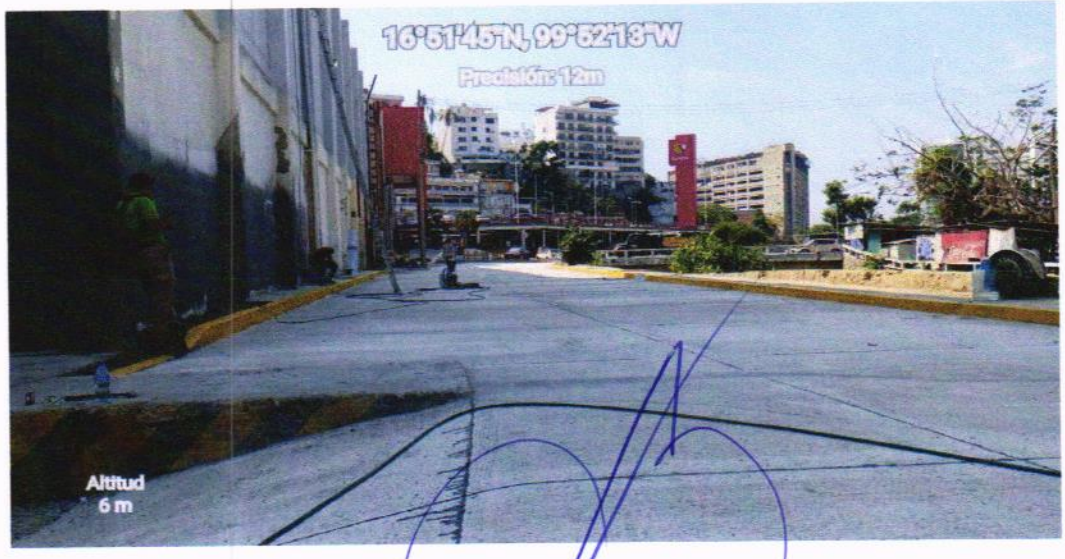

TERMINACION

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	**RESIDENTE DE OBRA** ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA** ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

RAMO XXXIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)
EJERCICIO FISCAL 2023

REPORTE DE SUPERVISIÓN CON SOPORTE FOTOGRÁFICO.

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES**

CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.
CONTRATO No. : MAJ-FAISMUN/426-2023/LP
UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

PERIODO DE CONTRATO: DEL 15-ago-23 AL 12-dic-23
IMPORTE DE CONTRATO: $ 5,000,427.46
PERIODO: DEL 01-nov-23 AL 15-nov-23

AVANCES POR PARTIDAS:

A1	PRELIMINARES	100%
A2	TERRACERIAS	25%
A3	INSTALACION HIDRAULICA	85%
A5	ALBAÑILERIA	85%
A6	INSTALACIONES ELECTRICAS Y LUMINARIAS	75%
A7	PAVIMENTACION	30%
A8	ACARREOS Y LIMPIEZAS	50%

AVANCE TOTAL
64%



GUARNICION




TUBO PVC CONDUIT 2"



GUARNICION



REGISTRO AUXILIAR

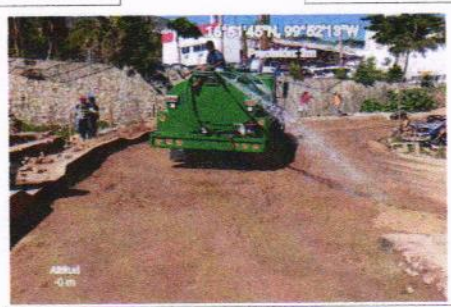

RIEGO

RESIDENTE

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE RESIDENTE

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

RAMO XXXIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)
EJERCICIO FISCAL 2023

REPORTE DE SUPERVISIÓN CON SOPORTE FOTOGRÁFICO.

NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES**				
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	PERIODO DE CONTRATO:	DEL 15-ago-23	AL	12-dic-23
CONTRATO No.:	MAJ-FAISMUN/426-2023/LP	IMPORTE DE CONTRATO:		$	5,000,427.46
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO	PERIODO:	DEL 16-nov-23	AL	30-nov-23

AVANCES POR PARTIDAS:

A1	PRELIMINARES	100%
A2	TERRACERIAS	75%
A3	INSTALACION HIDRAULICA	100%
A5	ALBAÑILERIA	100%
A6	INSTALACIONES ELECTRICAS Y LUMINARIAS	85%
A7	PAVIMENTACION	65%
A8	ACARREOS Y LIMPIEZAS	80%


AVANCE TOTAL
86%



TOMA DOMICILIARIA




EXCAVACION A MANO

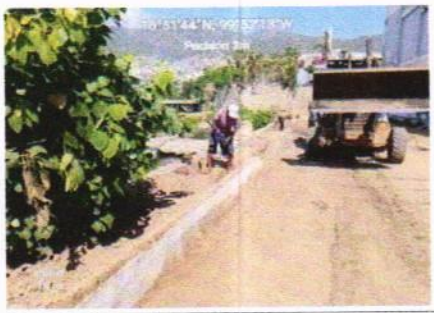

AFINE DE BANQUETA



BANQUETAS

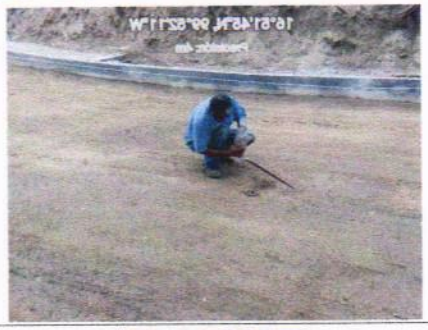

PRUEBA DE LABORATORIO

RESIDENTE

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE RESIDENTE

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

RAMO XXXIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)
EJERCICIO FISCAL 2023

REPORTE DE SUPERVISIÓN CON SOPORTE FOTOGRÁFICO.

NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES**				
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	PERIODO DE CONTRATO:	DEL 15-ago-23	AL	12-dic-23
CONTRATO No. :	MAJ-FAISMUN/426-2023/LP	IMPORTE DE CONTRATO:		$	5,000,427.46
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO	PERIODO:	DEL 01-dic-23	AL	12-dic-23

AVANCES POR PARTIDAS:

A1	PRELIMINARES	100%
A2	TERRACERIAS	100%
A3	INSTALACION HIDRAULICA	100%
A5	ALBAÑILERIA	100%
A6	INSTALACIONES ELECTRICAS Y LUMINARIAS	100%
A7	PAVIMENTACION	100%
A8	ACARREOS Y LIMPIEZAS	100%

AVANCE TOTAL
100%




SUBRASANTE



BASE



HULE

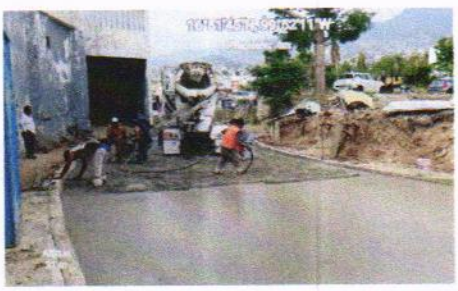

PAVIMENTO



CORTE



CALAFATEO



PINTURA



ACARREOS



LIMPIEZA

RESIDENTE

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE RESIDENTE

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

COCRE CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.

DIVISION, CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

PRIV. PUEBLA 18 COL. PROGRESO. ACAPULCO DE JUAREZ
GUERRERO. MEXICO. C.P. 39350
R.F.C: CCO200525C1A TEL: 7444087873 ecr-cortes@hotmail.com

INFORME DE PRUEBAS DE SUB BASE Y BASE HIDRAULICA

AUTORIZO: IRINA SALGADO HERNANDEZ

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES

REPRESENTANTE LEGAL:
IRINA SALGADO HERNANDEZ

EMPRESA: IMEXA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

CONTRATO: MAJ-FAISMUN/426-2023/LP

CADENAMIENTO: 0+008.00 AL 0 +110.00

GRADO DE COMP. MIN. ESP. P/LA CAPA ENSAYADA: 90.0% DE SU PESO VOLUMETRICO MAX. SECO

PRUEBAS REALIZADAS A NIVEL SUBRASANTE

ENSAYE NO.	ESTACION	LADO	ESPESOR DE LA CAPA ENSAYADA	HUMEDAD %		PESO ESPECIFICO SECO KG/M3		% DE COMPACTACION
				DEL LUGAR	ÓPTIMA	DEL LUGAR	MAXIMO	
*01	0.040	CEN	0.15	9.0	11.0	1834	2011	91.2
*02	0.100	IZQ	0.15	9.0	11.0	1836	2011	91.3

COCRE CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.
R.F.C. CCO-200525C1A
CALLE PUEBLA No. 18
COL. PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO, GRO.

FECHA DE VISITA: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

REPORTE DE CAMPO No. UNO

FECHA DEL RESULTADO: 01 DE DICIEMBRE DEL 2023

INFORME DEL REPORTE: LOS RESULTADOS OBTENIDOS SE ENCUENTRAN ACEPTABLES.

CUMPLEN CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-009-00.

ELABORO:
ARQ. AURORA FLORES CARMONA

REPRESENTANTE LEGAL
ESTEFANIA CORTES RADILLA

COCRE CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.

DIVISION, CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

PRIV. PUEBLA 18 COL. PROGRESO. ACAPULCO DE JUAREZ
GUERRERO. MEXICO. C.P. 39350
R.F.C: CCO200525C1A TEL: 7444087873 ecr-cortes@hotmail.com

INFORME DE PRUEBAS DE SUB BASE Y BASE HIDRAULICA

AUTORIZO: IRINA SALGADO HERNANDEZ

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES

REPRESENTANTE LEGAL:
IRINA SALGADO HERNANDEZ

EMPRESA: IMEXA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

CONTRATO: MAJ-FAISMUN/426-2023/LP

CADENAMIENTO: 0+008.00 AL 0 +110.00

GRADO DE COMP. MIN. ESP. P/LA CAPA ENSAYADA: 95.0% DE SU PESO VOLUMETRICO MAX. SECO

ENSAYE NO.	ESTACION	LADO	ESPESOR DE LA CAPA ENSAYADA	HUMEDAD %		PESO ESPECIFICO SECO KG/M3		% DE COMPACTACION
				DEL LUGAR	ÓPTIMA	DEL LUGAR	MAXIMO	
PRUEBAS REALIZADAS A NIVEL BASE HIDRAÚLICA								
*01	0.030	IZQ.	0.20	8.0	11.0	1916	2011	95.3
*02	0.090	DER.	0.20	8.0	11.0	1914	2011	95.2

COCRE CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.
R.F.C. CCO-200525C1A
CALLE PUEBLA No. 18
COL. PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO, GRO.

FECHA DE VISITA: 04 DE DICIEMBRE DEL 2023

BANCO DE SUMINISTRO: DEL SALTO

REPORTE DE CAMPO No. UNO

FECHA DEL RESULTADO: 05 DE DICIEMBRE DEL 2023

INFORME DEL REPORTE: LOS RESULTADOS OBTENIDOS SE ENCUENTRAN ACEPTABLES.

CUMPLEN CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-009-00.

ELABORO:
ARQ. AURORA. N. FLORES CARMONA

REPRESENTANTE LEGAL
ESTEFANIA CORTES RADILLA

COCRE CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.

DIVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

PRIV. PUEBLA 18 COL. PROGRESO. ACAPULCO DE JUAREZ
GUERRERO. MEXICO. C.P. 39350
R.F.C: CCO200525C1A TEL: 7444087873 ecr-cortes@hotmail.com

INFORME DE PRUEBAS Y CONTROL DEL CONCRETO HIDRAULICO

AUTORIZO: IRINA SALGADO HERNANDEZ

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES

REPRESENTANTE LEGAL:
IRINA SALGADO HERNANDEZ

EMPRESA: IMEXA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

CONTRATO: MAJ-FAISMUN/426-2023/LP

CADENAMIENTO: 0+008.00 AL 0 +110.00

PROCEDIMIENTO DE CURADO: INMERSION TOTAL EN AGUA (PILA)

CILINDRO No.	REMISION No.	REVOLVEDORA (OLLA) No.	FECHA DE COLADO	FECHA DE RUPTURA	EDAD DIAS	REVENIMIENTO cms.	RESISTENCIA kg/cm´2	PORCENTAJE DE f´c
COLADO DE PAVIMENTO								
*01	7367411	RE-3019	06/12/2023	13/12/2023	7 DIAS	10	237.3	79.1
*02	7367411	RE-3019	06/12/2023	20/12/2023	14 DIAS	10	264.9	88.3
*03	7367411	RE-3019	06/12/2023	03/01/2024	28 DIAS	10	304.5	101.5
*04	7367411	RE-3019	06/12/2023	03/01/2024	28 DIAS	10	303.9	101.3

COCRE CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.
R.F.C. CCO-200525C1A
CALLE PUEBLA No. 18
COL. PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO, GRO.

DATOS DE PROYECTO:	f´c= 300 KG/CM2	**OBSERVACIONES: LOS RESULTADOS DE RESISTENCIAS OBTENIDOS SE ENCUENTRAN ACEPTABLES**
	REV. 10.00 +- 2.00 CM.	
CEMENTO:	MARCA: APASCO	**CUMPLE CON NORMA N-CMT-2-02-005/04**
	TIPO: NORMAL	CARACTERISTICAS DE CALIDAD DEL CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS
SUMINISTRO:	CONCRETOS PARMA	**FECHA DEL RESULTADO: 04 DE ENERO DEL 2024**

ELABORO:
ARQ. AURORA N. FLORES CARMONA

REPRESENTANTE LEGAL
ESTEFANIA CORTES RADILLA

COCRE CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.

DIVISION, CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

PRIV. PUEBLA 18 COL. PROGRESO. ACAPULCO DE JUAREZ
GUERRERO. MEXICO. C.P. 39350
R.F.C: CCO200525C1A TEL: 7444087873 ecr-cortes@hotmail.com

INFORME DE PRUEBAS DE SUB BASE Y BASE HIDRAULICA

AUTORIZO: IRINA SALGADO HERNANDEZ

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES

REPRESENTANTE LEGAL: IRINA SALGADO HERNANDEZ

EMPRESA: IMEXA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

CONTRATO: MAJ-FAISMUN/426-2023/LP

CADENAMIENTO: 0+110.00 AL 0 +216.00

GRADO DE COMP. MIN. ESP. P/LA CAPA ENSAYADA: 90.0% DE SU PESO VOLUMETRICO MAX. SECO

ENSAYE NO.	ESTACION	LADO	ESPESOR DE LA CAPA ENSAYADA	HUMEDAD %		PESO ESPECIFICO SECO KG/M3		% DE COMPACTACION
				DEL LUGAR	ÓPTIMA	DEL LUGAR	MAXIMO	
PRUEBAS REALIZADAS A NIVEL SUBRASANTE								
*01	0.140	CEN	0.15	9.0	11.0	1836	2011	91.3
*02	0.190	IZQ	0.15	9.0	11.0	1830	2011	91.0

COCRE CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.
R.F.C. CCO-200525C1A
CALLE PUEBLA No. 18
COL. PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO, GRO.

FECHA DE VISITA: 01 DE DICIEMBRE DEL 2023

REPORTE DE CAMPO No. UNO

FECHA DEL RESULTADO: 02 DE DICIEMBRE DEL 2023

INFORME DEL REPORTE: LOS RESULTADOS OBTENIDOS SE ENCUENTRAN ACEPTABLES.

CUMPLEN CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-009-00.

ELABORO:
ARQ. AURORA N. FLORES CARMONA

REPRESENTANTE LEGAL
ESTEFANIA CORTES RADILLA

COCRE CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.

DIVISION, CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

PRIV. PUEBLA 18 COL. PROGRESO. ACAPULCO DE JUAREZ
GUERRERO. MEXICO. C.P. 39350
R.F.C: CCO200525C1A TEL: 7444087873 ecr-cortes@hotmail.com

INFORME DE PRUEBAS DE SUB BASE Y BASE HIDRAULICA

AUTORIZO: IRINA SALGADO HERNANDEZ

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES

REPRESENTANTE LEGAL:
IRINA SALGADO HERNANDEZ

EMPRESA: IMEXA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

CONTRATO: MAJ-FAISMUN/426-2023/LP

CADENAMIENTO: 0+110.00 AL 0 +216.00

GRADO DE COMP. MIN. ESP. P/LA CAPA ENSAYADA: 95.0% DE SU PESO VOLUMETRICO MAX. SECO

ENSAYE NO.	ESTACION	LADO	ESPESOR DE LA CAPA ENSAYADA	HUMEDAD %		PESO ESPECIFICO SECO KG/M3		% DE COMPACTACION
				DEL LUGAR	ÓPTIMA	DEL LUGAR	MAXIMO	
PRUEBAS REALIZADAS A NIVEL BASE HIDRAÚLICA								
*01	0.150	IZQ.	0.20	8.0	11.0	1914	2011	95.2
*02	0.200	DER.	0.20	8.0	11.0	1918	2011	95.4

COCRE CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.
R.F.C. CCO-200525C1A
CALLE PUEBLA No. 18
COL. PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO, GRO.

FECHA DE VISITA: 05 DE DICIEMBRE DEL 2023
BANCO DE SUMINISTRO: DEL SALTO
REPORTE DE CAMPO No. UNO
FECHA DEL RESULTADO: 06 DE DICIEMBRE DEL 2023

INFORME DEL REPORTE: LOS RESULTADOS OBTENIDOS SE ENCUENTRAN ACEPTABLES.

CUMPLEN CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-009-00.

ELABORO:
ARQ. AURORA . N. FLORES CARMONA

REPRESENTANTE LEGAL
ESTEFANIA CORTES RADILLA

COCRE CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.

DIVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

PRIV. PUEBLA 18 COL. PROGRESO. ACAPULCO DE JUAREZ
GUERRERO. MEXICO. C.P. 39350
R.F.C: CCO200525C1A TEL: 7444087873 ecr-cortes@hotmail.com

INFORME DE PRUEBAS Y CONTROL DEL CONCRETO HIDRAULICO

AUTORIZO: IRINA SALGADO HERNANDEZ

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES

REPRESENTANTE LEGAL:
IRINA SALGADO HERNANDEZ

EMPRESA: IMEXA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

CONTRATO: MAJ-FAISMUN/426-2023/LP

CADENAMIENTO: 0+110.00 AL 0 +216.00

PROCEDIMIENTO DE CURADO: INMERSION TOTAL EN AGUA (PILA)

CILINDRO No.	REMISION No.	REVOLVEDORA (OLLA) No.	FECHA DE COLADO	FECHA DE RUPTURA	EDAD DIAS	REVENIMIENTO cms.	RESISTENCIA kg/cm´2	PORCENTAJE DE f´c
COLADO DE PAVIMENTO								
*01	7367424	RE-3011	07/12/2023	14/12/2023	7 DIAS	10	235.8	78.6
*02	7367424	RE-3011	07/12/2023	21/12/2023	14 DIAS	10	266.1	88.7
*03	7367424	RE-3011	07/12/2023	04/01/2024	28 DIAS	10	304.2	101.4
*04	7367424	RE-3011	07/12/2023	04/01/2024	28 DIAS	10	303.6	101.2

DATOS DE PROYECTO:
f´c= 300 KG/CM2
REV. 10.00 +- 2.00 CM.

OBSERVACIONES: LOS RESULTADOS DE RESISTENCIAS OBTENIDOS SE ENCUENTRAN ACEPTABLES

CEMENTO: MARCA: APASCO

CUMPLE CON NORMA N-CMT-2-02-005/04

TIPO: NORMAL

CARACTERISTICAS DE CALIDAD DEL CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS

SUMINISTRO: CONCRETOS PARMA


FECHA DEL RESULTADO: 05 DE ENERO DEL 2024

ELABORO:
ARQ. AURORA N. FLORES CARMONA


REPRESENTANTE LEGAL
ESTEFANIA CORTES RADILLA

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023

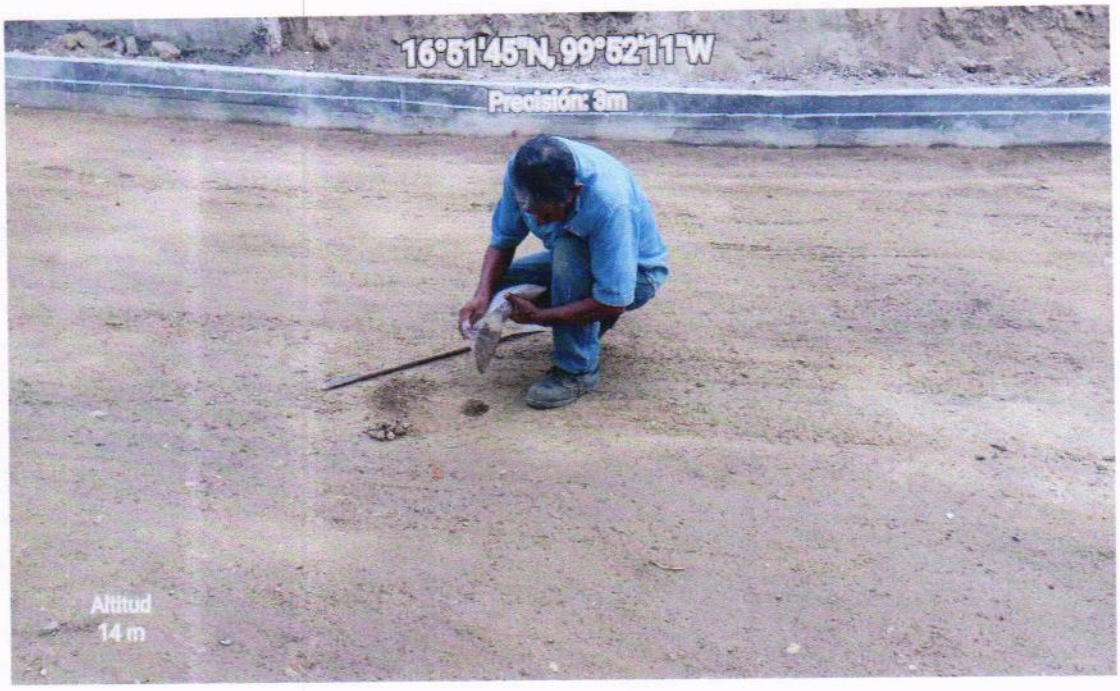

PRUEBAS DE LABORATORIO TERRACERIA

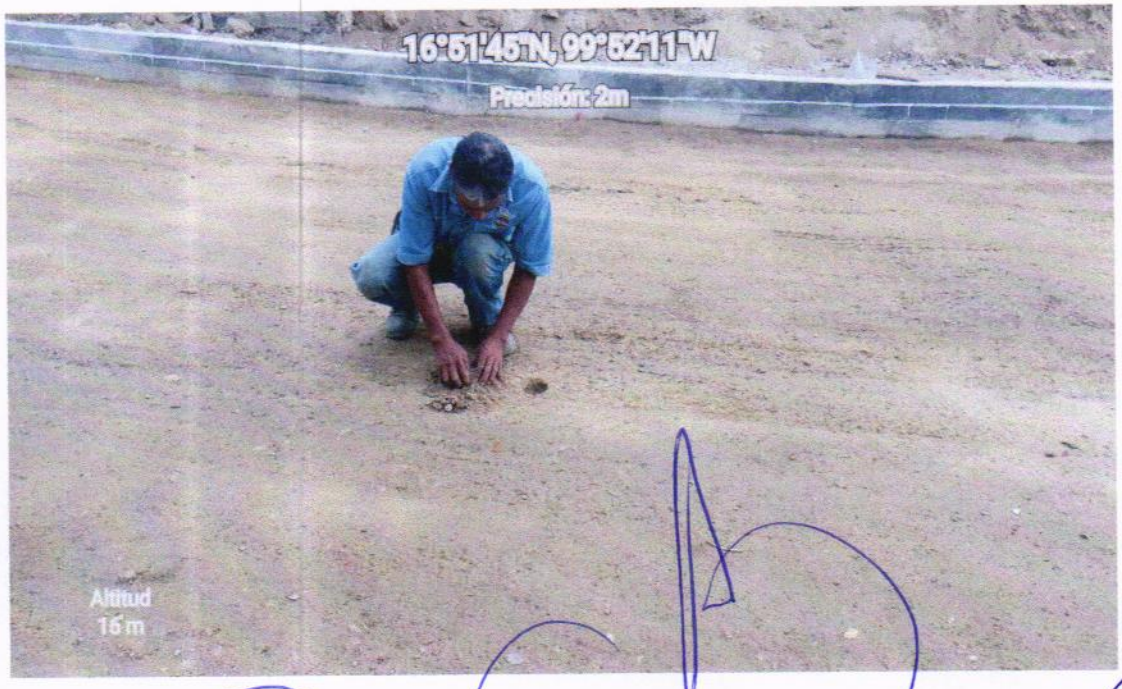


PRUEBAS DE LABORATORIO TERRACERIA


IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023

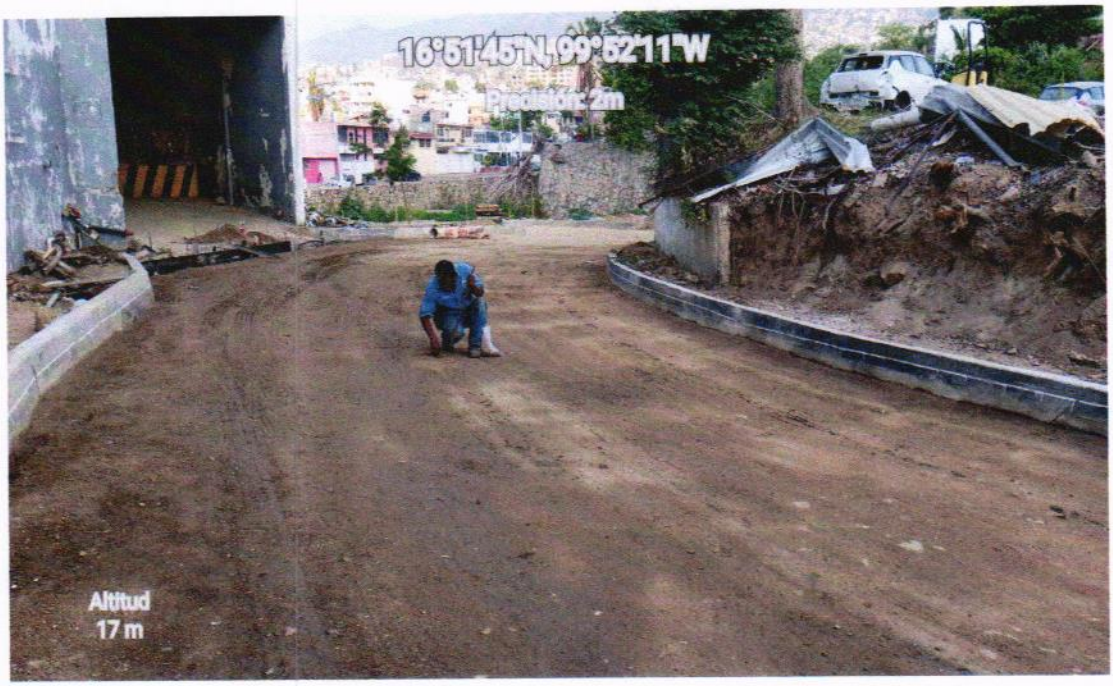

PRUEBAS DE LABORATORIO TERRACERIA.

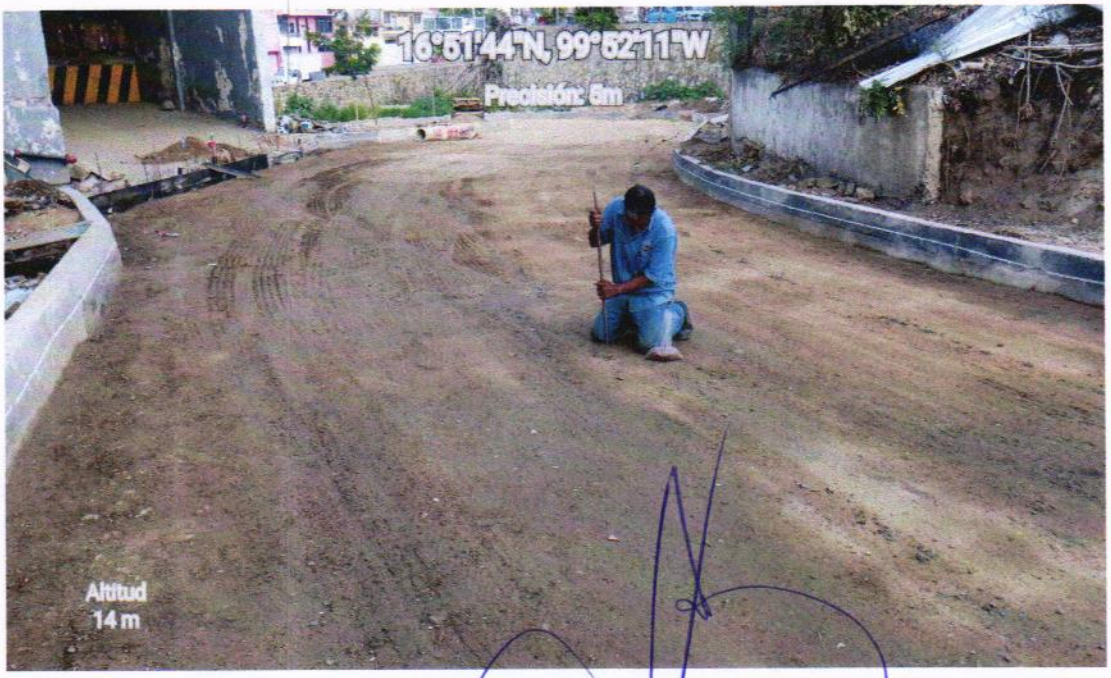


PRUEBAS DE LABORATORIO TERRACERIA.


IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023

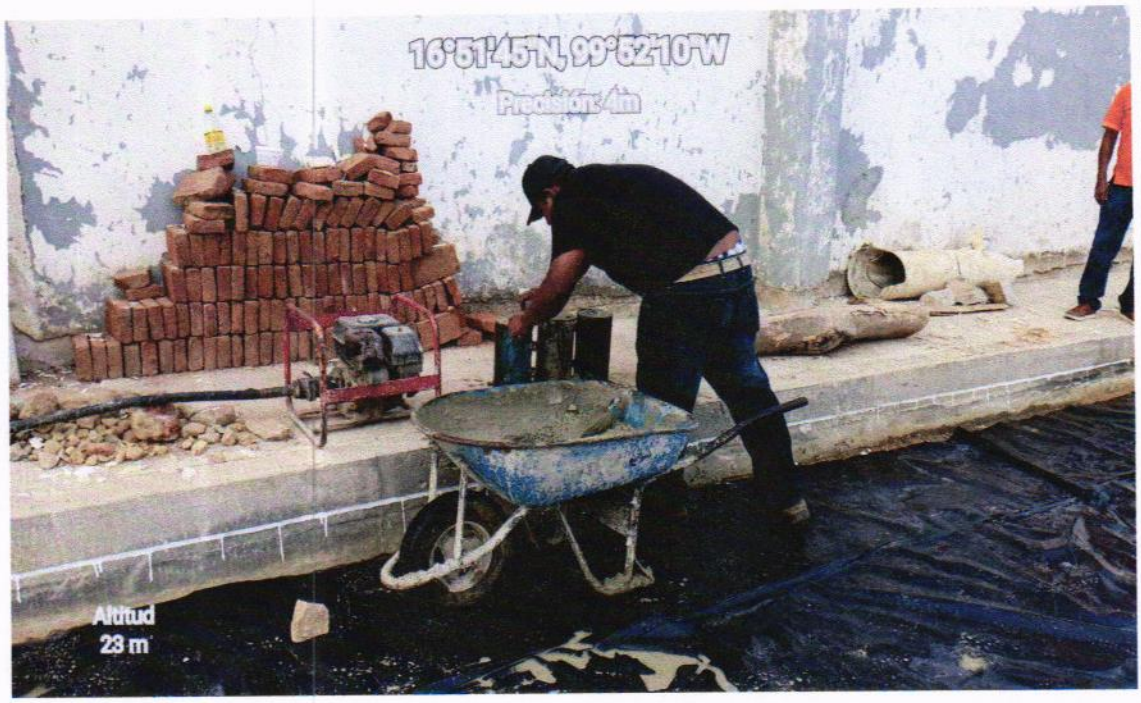

PRUEBAS DE LABORATORIO CONCRETO

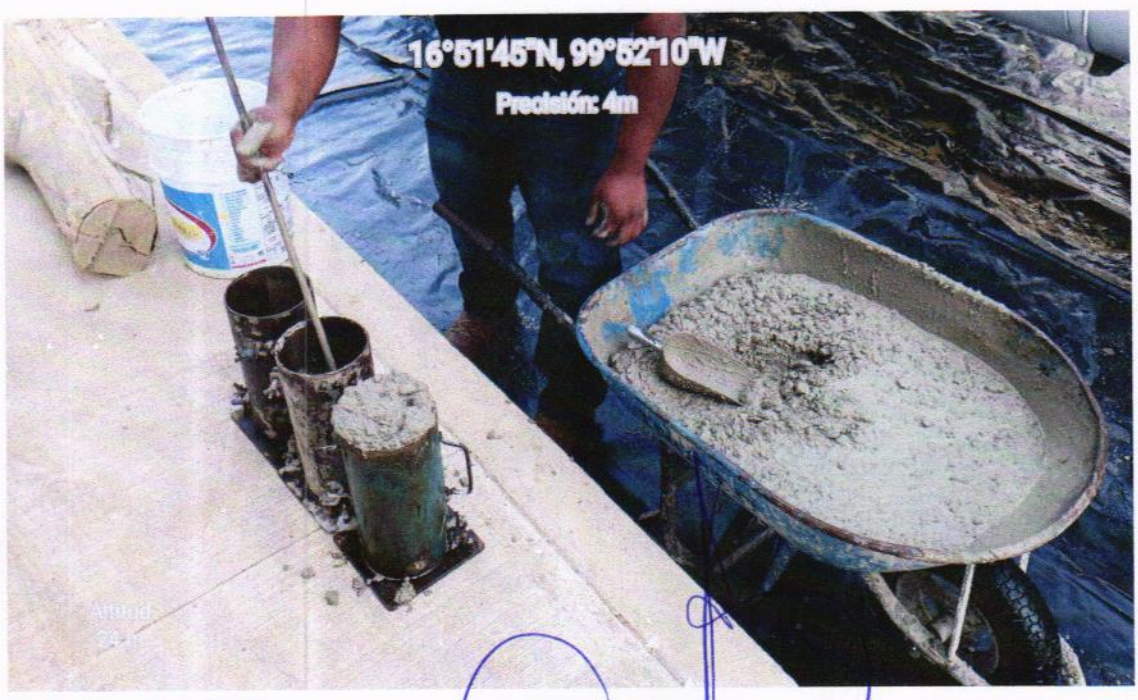


PRUEBAS DE LABORATORIO CONCRETO


IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023

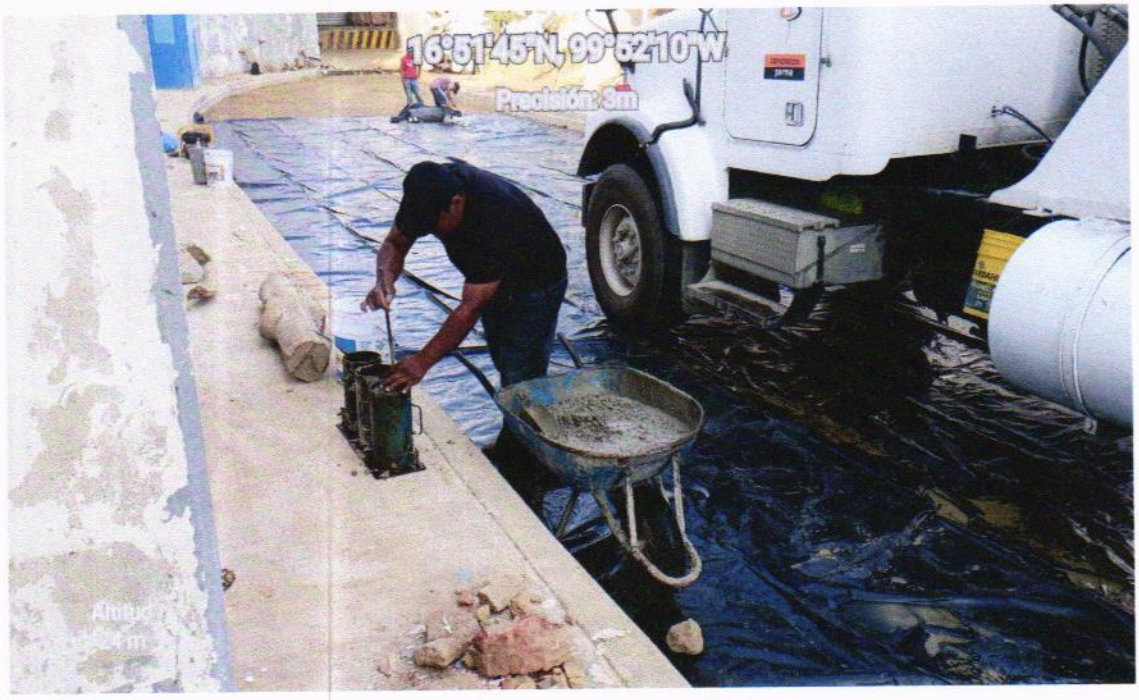

PRUEBAS DE LABORATORIO CONCRETO.

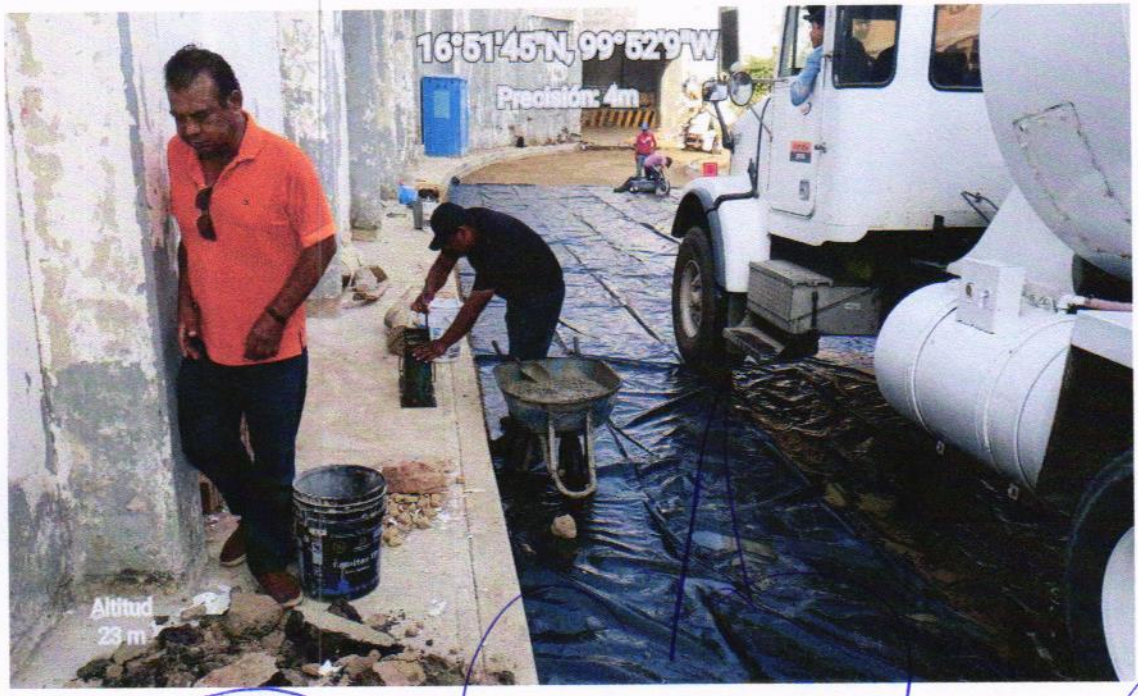

PRUEBAS DE LABORATORIO CONCRETO.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

ACAPULCO

BIENESTAR

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 03 (TRES) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2023	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO	ALTO	LARGO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A2	TERRACERIAS		1		6.55		2.00	M2	**13.10**	0+008-0+010
31-0454	AFINE Y COMPACTACION DE SUB RASANTE AL 90% PROCTOR MINIMO, POR MEDIOS MECANICOS.		2		6.55		10.00	M2	**65.50**	0+010-0+020
			3		6.62		10.00	M2	**66.20**	0+02-0+030
			4		6.72		10.00	M2	**67.20**	0+03-0+040
			5		6.97		10.00	M2	**69.70**	0+040-0+050
		RAMPA ACCESO SUZUKI	TRIANGULOS	2.00	0.55	0.50	1.05	M2	**0.57**	0+040-0+050
			RECTANGULO	1.00	1.75		4.95	M2	**8.66**	0+040-0+050
			6		7.44		10.00	M2	**74.40**	0+050-0+060
			7		7.58		10.00	M2	**75.80**	0+060-0+070
			8		6.98		10.00	M2	**69.80**	0+080-0+080
			9		7.25		10.00	M2	**72.50**	0+080-0+090
		ACCESO DESCARGA SORIANA	TRIANGULO	1.00	1.35	0.50	11.53	M2	**7.78**	0+090-0+100
			TRIANGULO	1.00	2.60	0.50	2.70	M2	**3.51**	0+090-0+100
			10		8.36		10.00	M2	**83.60**	0+090-0+100
			11		8.55		10.00	M2	**85.50**	0+100-0+110
			12		8.08		10.00	M2	**80.80**	0+110-0+120
			13		8.02		10.00	M2	**80.20**	0+120-0+130
			14		8.12		10.00	M2	**81.20**	0+130-0+140
							SUBTOTAL HOJA 1	**M2**	**1,006.02**	

CAD.	ANCHOS		SUMA	ANCHO PROMEDIO 1/2
0+008-0+010	6.55	6.55	13.10	**6.55**
0+010-0+020	6.55	6.55	13.10	**6.55**
0+020-0+030	6.57	6.66	13.23	**6.62**
0+030-0+040	6.66	6.77	13.43	**6.72**
0+040-0+050	6.77	7.17	13.94	**6.97**
0+050-0+060	7.17	7.71	14.88	**7.44**
0+060-0+070	7.71	7.44	15.15	**7.58**
0+080-0+080	7.44	6.52	13.96	**6.98**
0+080-0+090	6.52	7.97	14.49	**7.25**
0+090-0+100	7.97	8.75	16.72	**8.36**
0+100-0+110	8.75	8.38	17.13	**8.57**
0+110-0+120	8.38	7.80	16.18	**8.09**
0+120-0+130	7.80	8.24	16.04	**8.02**
0+130-0+140	8.24	8.00	16.24	**8.12**

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

ACAPULCO SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: MAJ/426	ESTIMACIÓN No. 03 (TRES) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2023	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/426-2023/LP	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO	ALTO	LARGO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A2	TERRACERIAS									
31-0454	AFINE Y COMPACTACION DE SUB RASANTE AL 90% PROCTOR MINIMO, POR MEDIOS MECANICOS.	AREA DE PATIO DE MANIOBRAS (TRIANGULO)		1.00	4.00	0.50	2.30	M2	**4.60**	0+130-0+140
			15		7.87		10.00	M2	**78.70**	0+140-0+150
		(-) AREA DESCARGA		1.00	-2.00		1.35	M2	**-2.70**	0+140-0+150
			16		7.70		10.00	M2	**77.00**	0+150-0+160
			17		7.70		10.00	M2	**77.00**	0+160-0+170
			18		7.89		10.00	M2	**78.90**	0+170-0+180
			19		8.14		10.00	M2	**81.40**	0+180-0+190
		(-) REGISTRO SANITARIO			-1.04		1.30	M2	**-1.35**	0+180-0+190
			20		8.62		10.00	M2	**86.20**	0+190-0+200
		(-) AREA POSTE DE LUZ (TRIANGULO)		2.00	-2.25	0.50	1.20	M2	**-2.70**	0+190-0+200
			21		8.79		10.00	M2	**87.90**	0+200-0+210
			22		8.60		8.00	M2	**68.80**	0+210-0+216.6
		(-) AREA DE POZO DE VISITA		2.00	1.13			M2	**-2.26**	0+175 Y 0+216
							SUBTOTAL HOJA 2	M2	**631.49**	
							SUBTOTAL HOJA 1	M2	**1,006.02**	
							TOTAL	M2	**1,637.51**	

CAD	ANCHOS		SUMA	ANCHO PROMEDIO 1/2	
0+140-0+150	8.00	7.74	15.74	**7.87**	
0+150-0+160	7.74	7.65	15.39	**7.70**	
0+160-0+170	7.65	7.75	15.40	**7.70**	
0+170-0+180	7.75	8.03	15.78	**7.89**	
0+180-0+190	8.03	8.25	16.28	**8.14**	
0+190-0+200	8.25	8.98	17.23	**8.62**	
0+200-0+210	8.98	8.60	17.58	**8.79**	
0+210-0+216.6	9.40 + 6.60 = 16.00 / 2			**8.00**	LONG.
(-) AREA POZO DE VISITA	0.60 X 0.60 = 0.36 X 3.1416 = -1.13 M2				

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No.: 03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A2 **TERRACERIAS**

31-0454 AFINE Y COMPACTACION DE SUB RASANTE AL 90% PROCTOR MINIMO, POR MEDIOS MECANICOS.

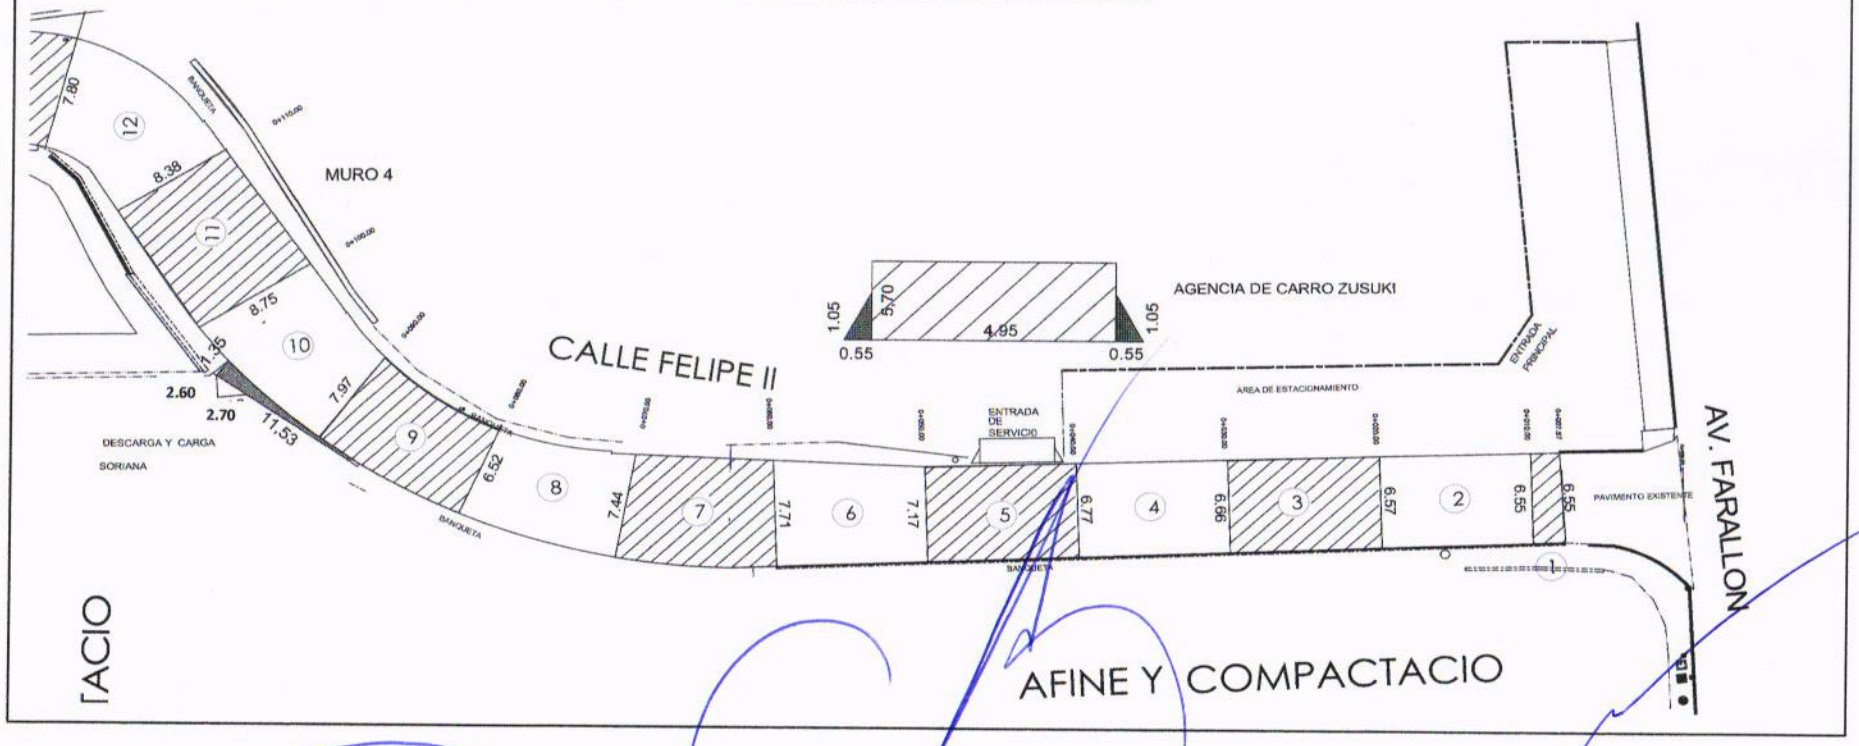

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No.: 03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A2 **TERRACERIAS**

31-0454 AFINE Y COMPACTACION DE SUB RASANTE AL 90% PROCTOR MINIMO, POR MEDIOS MECANICOS.

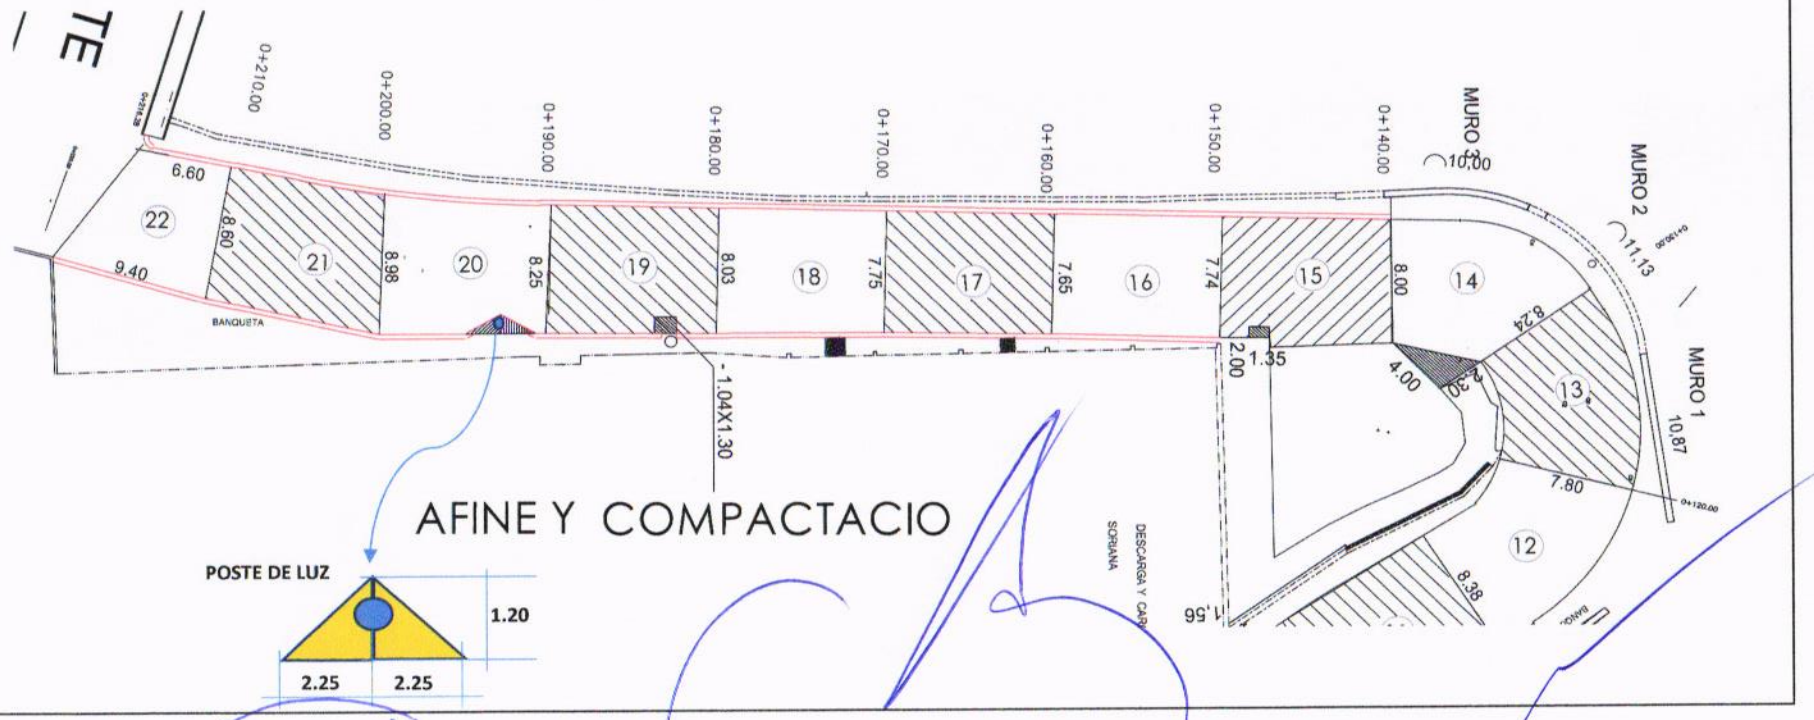

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023

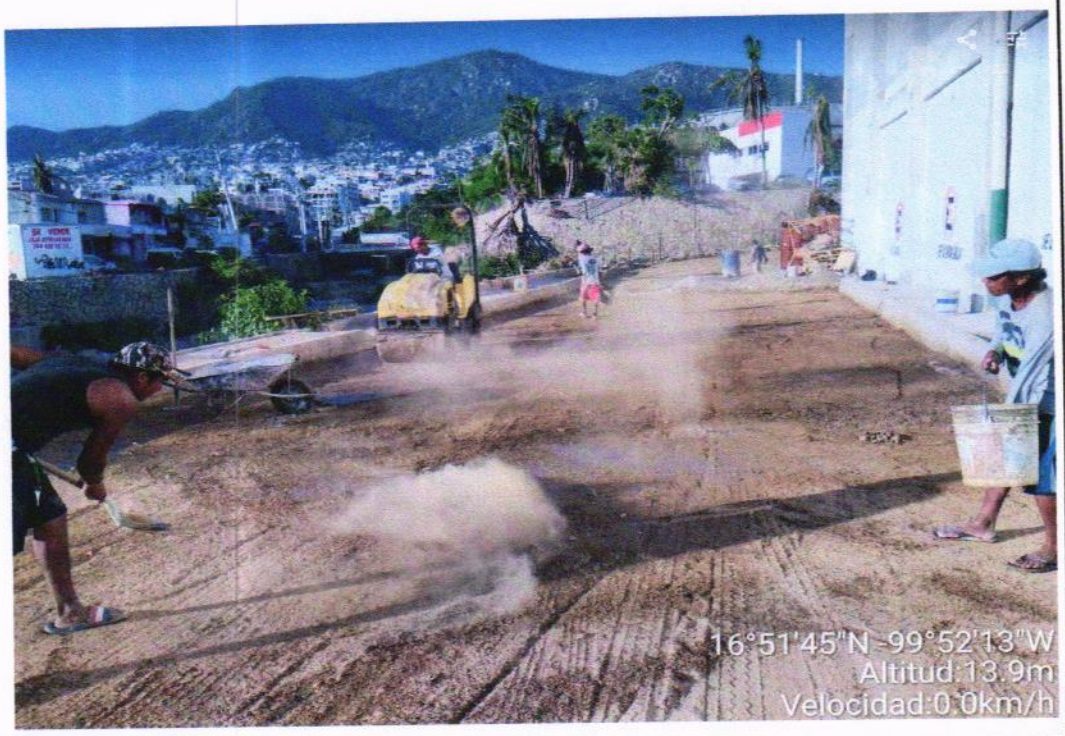

31-0454.- AFINE Y COMPACTACION DE SUB RASANTE AL 90% PROCTOR MINIMO, POR MEDIOS MECANICOS.



31-0454.- AFINE Y COMPACTACION DE SUB RASANTE AL 90% PROCTOR MINIMO, POR MEDIOS MECANICOS.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 03 (TRES) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2023	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A2	**TERRACERIAS**		1		6.55	2.00	0.20	M3	**2.62**	0+008-0+010
31-0457	FORMACION DE BASE DE 30 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO CON EQUIPO MECANICO INCLUYE VERTIDO, AFINE, COMPACTADO AL 95% PROCTOR Y AGUA.		2		6.55	10.00	0.20	M3	**13.10**	0+010-0+020
			3		6.62	10.00	0.20	M3	**13.24**	0+02-0+030
			4		6.72	10.00	0.20	M3	**13.44**	0+03-0+040
			5		6.97	10.00	0.20	M3	**13.94**	0+040-0+050
		RAMPA ACCESO SUZUKI	TRIANGULOS	2.00	=(0.55 X 1.05)/2 = 0.288 M2 X 0.20 ESP = 0.05			M3	**0.10**	0+040-0+050
			RECTANGULO	1.00	1.75	4.95	0.20	M3	**1.73**	0+040-0+050
			6		7.44	10.00	0.20	M3	**14.88**	0+050-0+060
			7		7.58	10.00	0.20	M3	**15.16**	0+060-0+070
			8		6.98	10.00	0.20	M3	**13.96**	0+080-0+080
			9		7.25	10.00	0.20	M3	**14.50**	0+080-0+090
		ACCESO DESCARGA SORIANA	TRIANGULO	1.00	=(1.35 X 11.53)/2 = 7.78 M2 X 0.20 ESP = 1.55			M3	**1.55**	0+090-0+100
			TRIANGULO	1.00	=(2.60 X 2.70)/2 = 3.51 M2 X 0.20 ESP = 0.70			M3	**0.70**	0+090-0+100
			10		8.36	10.00	0.20	M3	**16.72**	0+090-0+100
			11		8.55	10.00	0.20	M3	**17.10**	0+100-0+110
			12		8.08	10.00	0.20	M3	**16.16**	0+110-0+120
			13		8.02	10.00	0.20	M3	**16.04**	0+120-0+130
			14		8.12	10.00	0.20	M3	**16.24**	0+130-0+140
						SUBTOTAL HOJA 1		**M3**	**201.18**	

CAD.	ANCHOS		SUMA	ANCHO PROMEDIO 1/2
0+008-0+010	6.55	6.55	13.10	**6.55**
0+010-0+020	6.55	6.55	13.10	**6.55**
0+020-0+030	6.57	6.66	13.23	**6.62**
0+030-0+040	6.66	6.77	13.43	**6.72**
0+040-0+050	6.77	7.17	13.94	**6.97**
0+050-0+060	7.17	7.71	14.88	**7.44**
0+060-0+070	7.71	7.44	15.15	**7.58**
0+080-0+080	7.44	6.52	13.96	**6.98**
0+080-0+090	6.52	7.97	14.49	**7.25**
0+090-0+100	7.97	8.75	16.72	**8.36**
0+100-0+110	8.75	8.38	17.13	**8.57**
0+110-0+120	8.38	7.80	16.18	**8.09**
0+120-0+130	7.80	8.24	16.04	**8.02**
0+130-0+140	8.24	8.00	16.24	**8.12**

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 03 (TRES) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2023	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A2	**TERRACERIAS**									
31-0457	FORMACION DE BASE DE 30 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO CON EQUIPO MECANICO INCLUYE VERTIDO, AFINE, COMPACTADO AL 95% PROCTOR Y AGUA.	AREA PATIO DE MANIOBRAS (TRIANGULO)		1.00	=(4.00 X 2.30)/2 = 4.60 M2 X 0.20 ESP = 0.92			M3	**0.92**	0+130-0+140
			15		7.87	10.00	0.20	M3	**15.74**	0+140-0+150
		(-) AREA DESCARGA		1.00	-2.00	1.35	0.20	M3	**-0.54**	0+140-0+150
			16		7.70	10.00	0.20	M3	**15.40**	0+150-0+160
			17		7.70	10.00	0.20	M3	**15.40**	0+160-0+170
			18		7.89	10.00	0.20	M3	**15.78**	0+170-0+180
			19		8.14	10.00	0.20	M3	**16.28**	0+180-0+190
		(-) REGISTRO SANITARIO			-1.04	1.30	0.20	M3	**-0.27**	0+180-0+190
			20		8.62	10.00	0.20	M3	**17.24**	0+190-0+200
		(-) AREA POSTE DE LUZ (TRIANGULO)		2.00	=(2.25 X 1.20)/2 = 1.35 M2 X 0.20 ESP = 0.27			M3	**-0.54**	0+190-0+200
			21		8.79	10.00	0.20	M3	**17.58**	0+200-0+210
			22		8.60	8.00	0.20	M3	**13.76**	0+210-0+216.6
		(-) AREA DE POZO DE VISITA		2.00	-1.13		0.20	M3	**-0.45**	0+175 Y 0+216
						SUBTOTAL HOJA 2		M3	**126.30**	
						SUBTOTAL HOJA 1		M3	**201.18**	
							TOTAL	M3	**327.48**	

CAD	ANCHOS		SUMA	ANCHO PROMEDIO 1/2	
0+140-0+150	8.00	7.74	15.74	**7.87**	
0+150-0+160	7.74	7.65	15.39	**7.70**	
0+160-0+170	7.65	7.75	15.40	**7.70**	
0+170-0+180	7.75	8.03	15.78	**7.89**	
0+180-0+190	8.03	8.25	16.28	**8.14**	
0+190-0+200	8.25	8.98	17.23	**8.62**	
0+200-0+210	8.98	8.60	17.58	**8.79**	
0+210-0+216.6	9.40 + 6.60 = 16.00 / 2			**8.00**	LONG.
(-) AREA POZO DE VISITA	0.60 X 0.60 = 0.36 X 3.1416 = -1.13 M2				

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No.: 03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A2 **TERRACERIAS**

31-0457 FORMACION DE BASE DE 30 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO CON EQUIPO MECANICO INCLUYE VERTIDO, AFINE, COMPACTADO AL 95% PROCTOR Y AGUA.

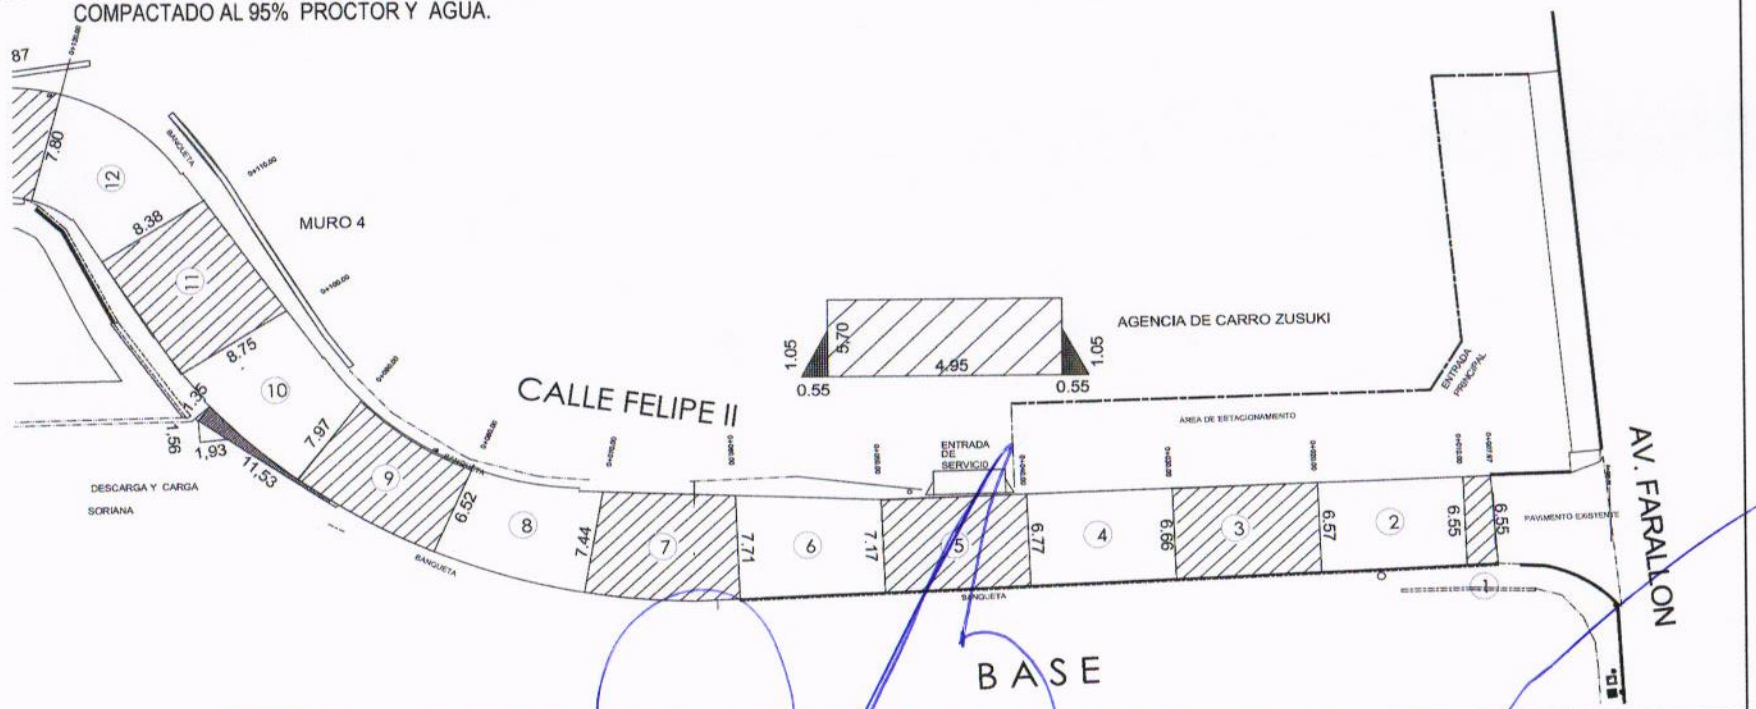

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S				
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	ESTIMACIÓN No.: 03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA:	12 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.			

C R O Q U I S

A2 **TERRACERIAS**

31-0457 FORMACION DE BASE DE 30 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO CON EQUIPO MECANICO INCLUYE VERTIDO, AFINE, COMPACTADO AL 95% PROCTOR Y AGUA.

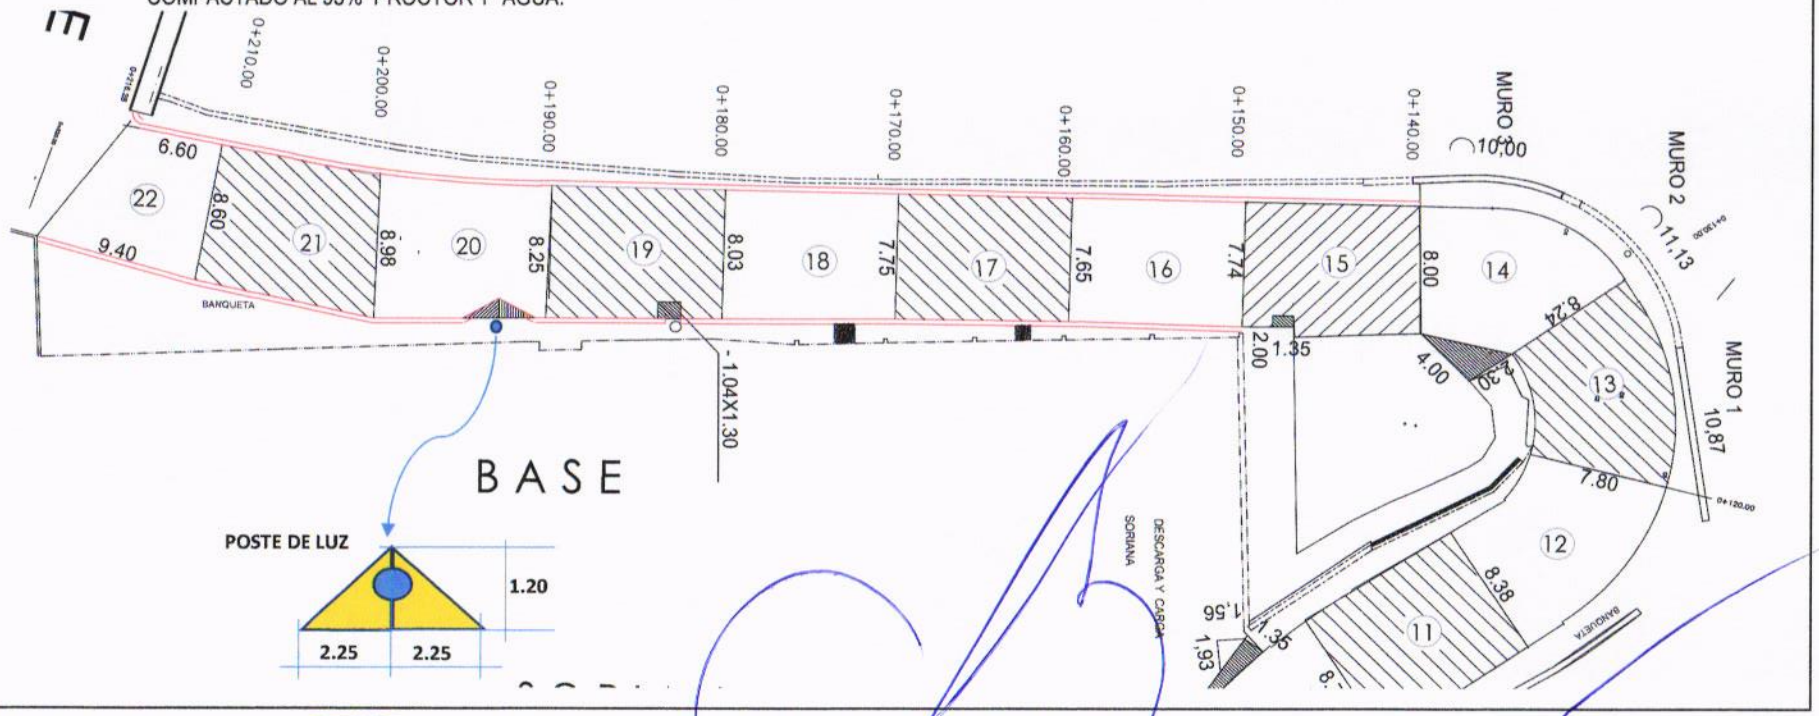

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023



31-0457.- FORMACION DE BASE DE 30 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO CON EQUIPO MECANICO INCLUYE VERTIDO, AFINE, COMPACTADO AL 95% PROCTOR Y AGUA.



31-0457.- FORMACION DE BASE DE 30 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO CON EQUIPO MECANICO INCLUYE VERTIDO, AFINE, COMPACTADO AL 95% PROCTOR Y AGUA.


INEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	**RESIDENTE DE OBRA** ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA** ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023



31-0457.- FORMACION DE BASE DE 30 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO CON EQUIPO MECANICO INCLUYE VERTIDO, AFINE, COMPACTADO AL 95% PROCTOR Y AGUA.

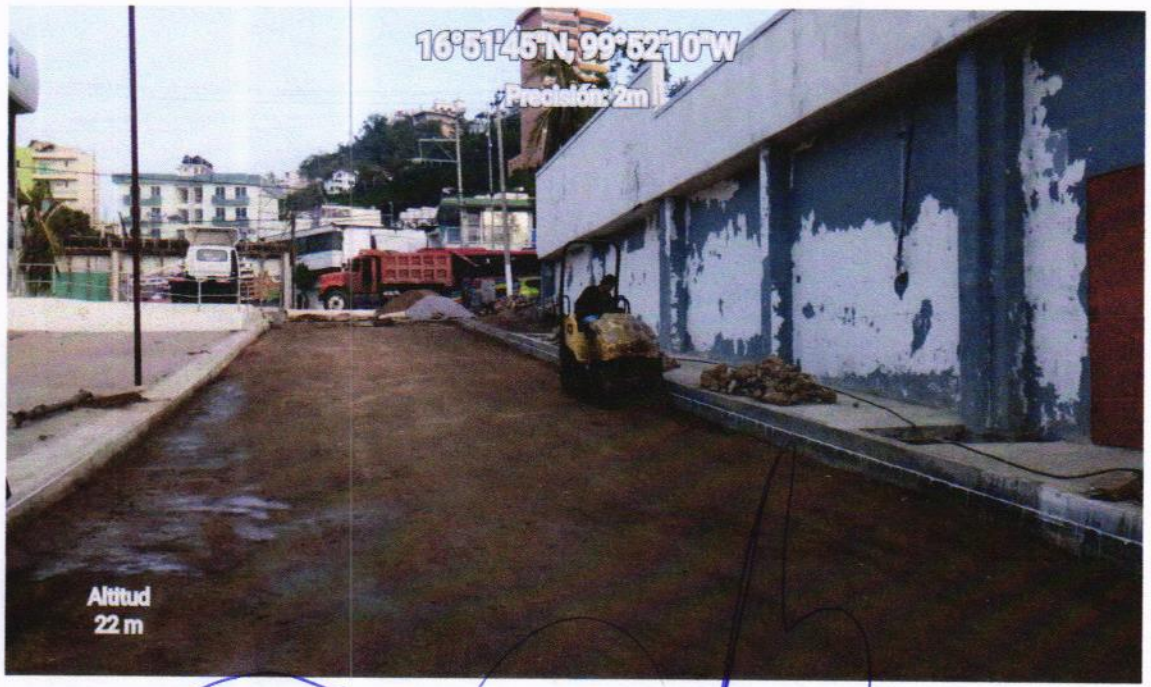

31-0457.- FORMACION DE BASE DE 30 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO CON EQUIPO MECANICO INCLUYE VERTIDO, AFINE, COMPACTADO AL 95% PROCTOR Y AGUA.


IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	**RESIDENTE DE OBRA** ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA** ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023



31-0457.- FORMACION DE BASE DE 30 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO CON EQUIPO MECANICO INCLUYE VERTIDO, AFINE, COMPACTADO AL 95% PROCTOR Y AGUA.

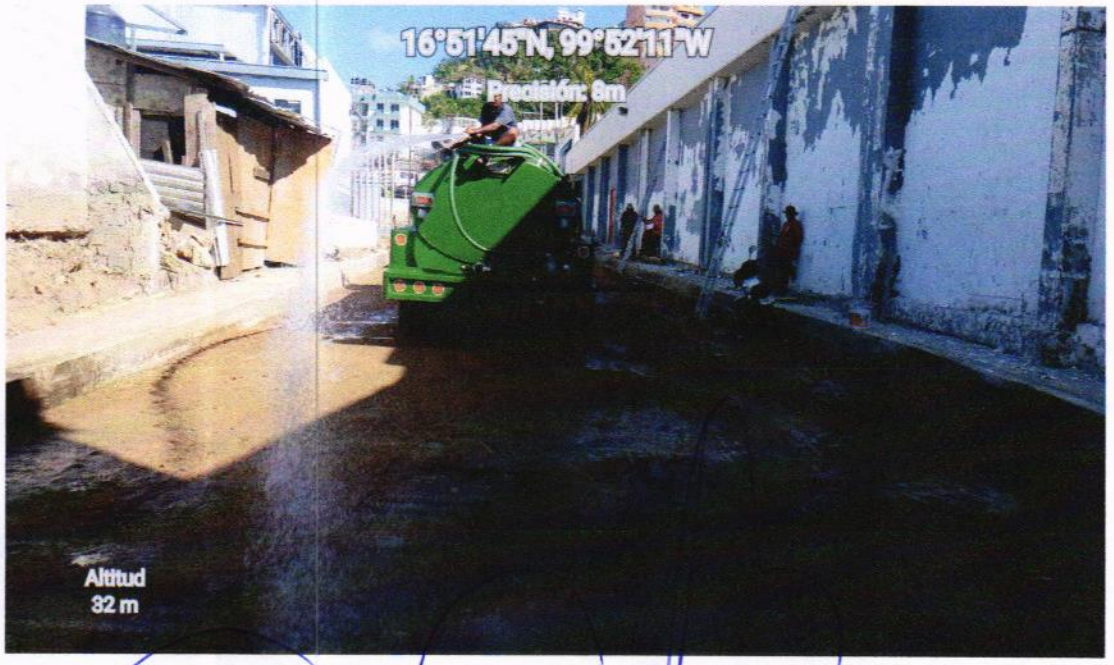


31-0457.- FORMACION DE BASE DE 30 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO CON EQUIPO MECANICO INCLUYE VERTIDO, AFINE, COMPACTADO AL 95% PROCTOR Y AGUA.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	**RESIDENTE DE OBRA** ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA** ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023

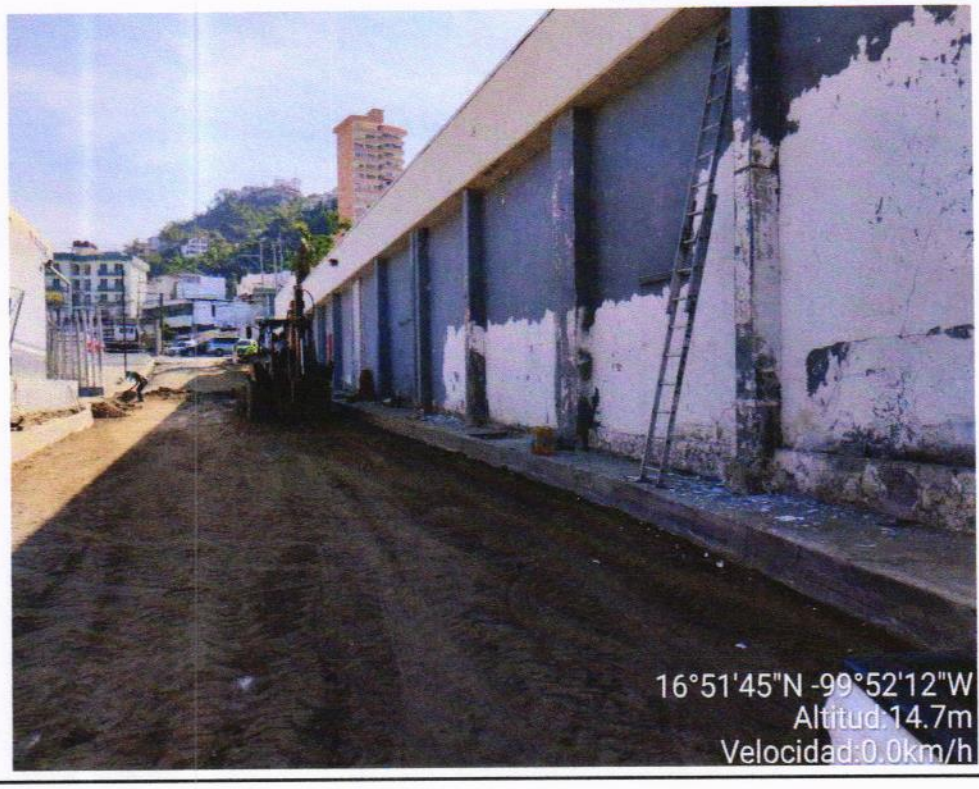

31-0457.- FORMACION DE BASE DE 30 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO CON EQUIPO MECANICO INCLUYE VERTIDO, AFINE, COMPACTADO AL 95% PROCTOR Y AGUA.



31-0457.- FORMACION DE BASE DE 30 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO CON EQUIPO MECANICO INCLUYE VERTIDO, AFINE, COMPACTADO AL 95% PROCTOR Y AGUA.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 03 (TRES) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2023	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A2	**TERRACERIAS**		**BANQUETA IZQUIERDA DE CADENAMIENTO 0+008 A 0+091.09**							
32-0466	AFINE Y COMPACTACION EN BANQUETAS, ANDADORES Y PLAZA A MANO INCLUYE ACARREOS A PRIMERA ESTACION		1		1.48	4.75		M2	7.03	
			2		1.24	3.80		M2	4.71	
			3		1.91	3.55		M2	6.78	
			4		1.75	7.49		M2	13.10	
			5		1.60	4.99		M2	7.98	
			6		1.50	8.11		M2	12.12	
			7		1.32	6.86		M2	9.02	
			8		1.16	5.53		M2	6.41	
			9		0.95	7.33		M2	6.96	
			10		0.90	7.66		M2	6.89	
			11		1.27	4.15		M2	5.24	
			12		1.53	4.35		M2	6.65	
			13		1.57	5.56		M2	8.72	
			14		1.55	5.76		M2	8.92	
			15		0.99	3.20		M2	3.15	
		(-) REGISTROS ELECTRICOS		-4.00	0.90	0.70		M2	-2.52	
		(-) COLUMNAS EXISTENTES SORIANA		-15.00	0.30	0.31		M2	-1.39	
						SUBTOTAL HOJA 1		M2	109.77	

REFERENCIA	ANCHOS		SUMA	ANCHO PROMEDIO 1/2
1	1.68	1.28	2.96	**1.48**
2	1.28	1.20	2.48	**1.24**
3	1.92	1.90	3.82	**1.91**
4	1.90	1.60	3.50	**1.75**
5	1.60	1.60	3.20	**1.60**
6	1.60	1.39	2.99	**1.50**
7	1.39	1.24	2.63	**1.32**
8	1.24	1.08	2.32	**1.16**
9	1.08	0.82	1.90	**0.95**
10	0.82	0.98	1.80	**0.90**
11	0.98	1.55	2.53	**1.27**
12	1.55	1.51	3.06	**1.53**
13	1.51	1.63	3.14	**1.57**
14	1.63	1.47	3.10	**1.55**
15	1.47	0.50	1.97	**0.99**

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: MAJ/426	ESTIMACIÓN No. 03 (TRES) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/426-2023/LP	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A2	TERRACERIAS		BANQUETA DERECHA DE CADENAMIENTO 0+008 A 0+110							2
32-0466	AFINE Y COMPACTACION EN BANQUETAS, ANDADORES Y PLAZA A MANO INCLUYE ACARREOS A PRIMERA ESTACION		16		0.09	5.37		M2	0.48	
			17		0.22	20.80		M2	4.57	
			18		0.60	5.57		M2	3.34	
			19		1.00	3.00		M2	3.00	
			20		0.95	18.00		M2	17.10	
			21		0.67	7.00		M2	4.69	
			22		0.61	1.10		M2	0.67	
			23		0.72	2.45		M2	1.76	
			24		0.77	2.48		M2	1.90	
			25		0.81	2.45		M2	1.98	
			26		0.87	6.45		M2	5.61	
			27		1.32	12.04		M2	15.89	
			BANQUETA IZQUIERDA DE CADENAMIENTO 0+091.09 A 0+0+135							
			28		1.37	7.40		M2	10.13	
			29		1.57	1.56		M2	2.44	
			30		1.06	7.84		M2	8.31	
			31		0.70	1.43		M2	1.00	
			32		0.46	2.00		M2	0.92	
						SUBTOTAL HOJA 2		M2	83.79	

REFERENCIA	ANCHOS		SUMA	ANCHO PROMEDIO 1/2
16	0.04	0.15	0.19	**0.09**
17	0.20	0.25	0.45	**0.22**
18	0.35	0.86	1.21	**0.60**
19	0.86	1.15	2.01	**1.00**
20	1.15	0.76	1.91	**0.95**
21	0.76	0.58	1.34	**0.67**
22	0.58	0.65	1.23	**0.61**
23	0.65	0.80	1.45	**0.72**
24	0.80	0.75	1.55	**0.77**
25	0.75	0.88	1.63	**0.81**
26	0.88	0.86	1.74	**0.87**
27	0.86	1.78	2.64	**1.32**
28	0.90	1.85	2.75	**1.37**
29	1.85	1.30	3.15	**1.57**
30	1.30	0.83	2.13	**1.06**
31	0.83	0.58	1.41	**0.70**
32	0.58	0.35	0.93	**0.46**

IMEXA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 03 (TRES) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2023	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A2	**TERRACERIAS**		**BANQUETA DERECHA DE CADENAMIENTO 0+110 A 0+160**							
32-0466	AFINE Y COMPACTACION EN BANQUETAS, ANDADORES Y PLAZA A MANO INCLUYE ACARREOS A PRIMERA ESTACION		33		1.79	2.53		M2	4.52	
			34		1.90	3.04		M2	5.77	
			35		2.00	2.52		M2	5.04	
							SUB TOTAL ESTA HOJA 3 =	M2	15.33	
							SUB TOTAL HOJA 2 =	M2	83.79	
							SUB TOTAL HOJA 1 =	M2	109.77	
							TOTAL M2 DE AFINE Y COMPACTACION EN AREA DE BANQUETAS =	M2	208.89	
							(-) ML COBRADOS EN ESTIMACION 01 =	M2	-179.55	
									29.34	
							TOTAL	M2	29.34	

REFERENCIA	ANCHOS		SUMA	ANCHO PROMEDIO 1/2
33	1.78	1.81	3.59	**1.79**
34	1.81	2.00	3.81	**1.90**
35	2.00	2.00	4.00	**2.00**

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No.: 03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A2 **TERRACERIAS**

32-0466 AFINE Y COMPACTACION EN BANQUETAS, ANDADORES Y PLAZA A MANO INCLUYE ACARREOS A PRIMERA ESTACION

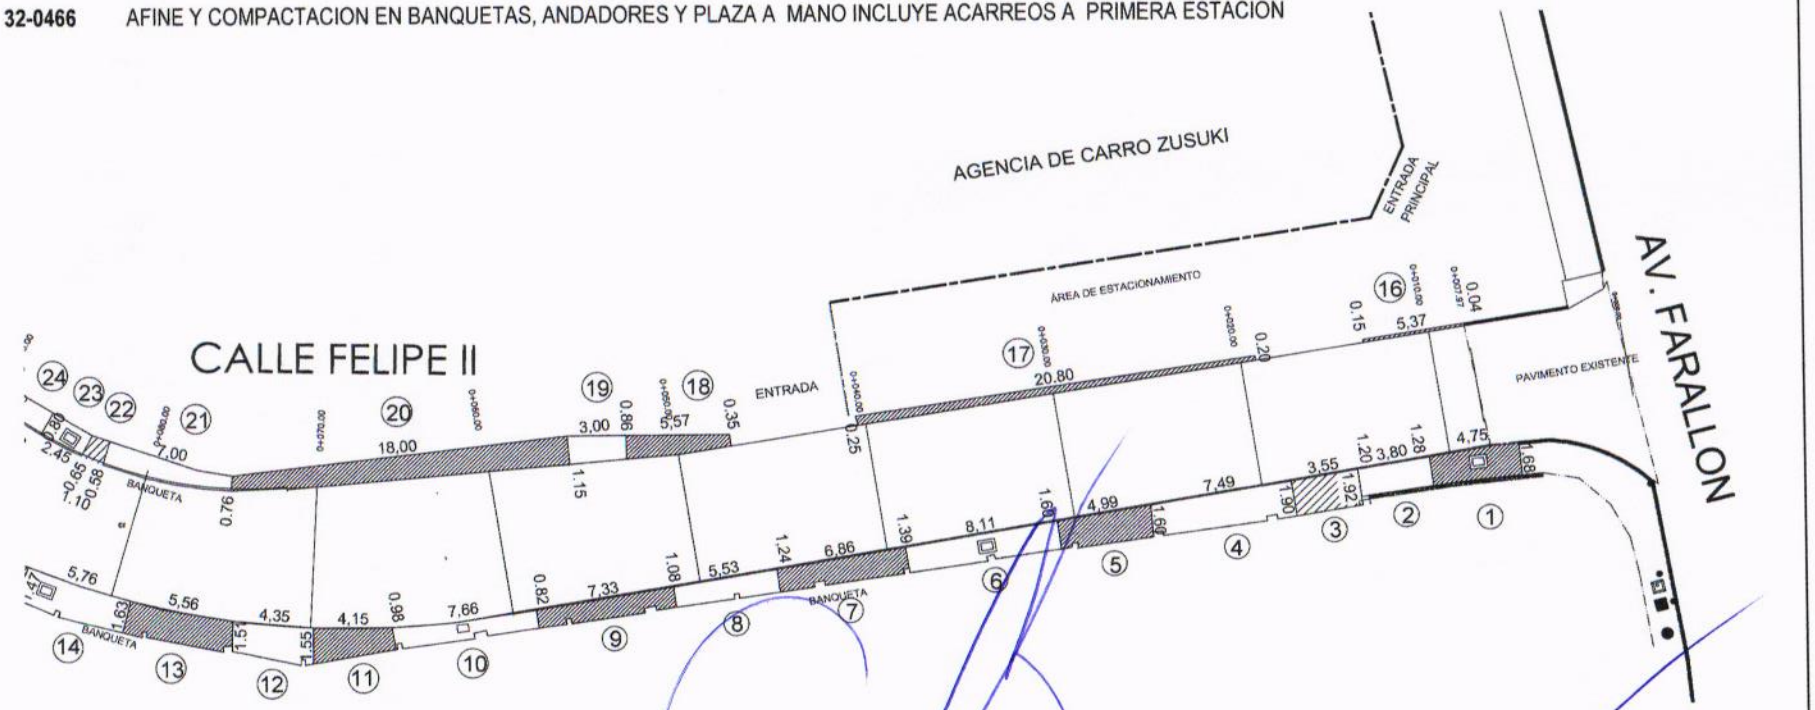

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMÉNEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S				
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	ESTIMACIÓN No.: 03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA:	12 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.			

C R O Q U I S

A2 **TERRACERIAS**

32-0466 AFINE Y COMPACTACION EN BANQUETAS, ANDADORES Y PLAZA A MANO INCLUYE ACARREOS A PRIMERA ESTACION

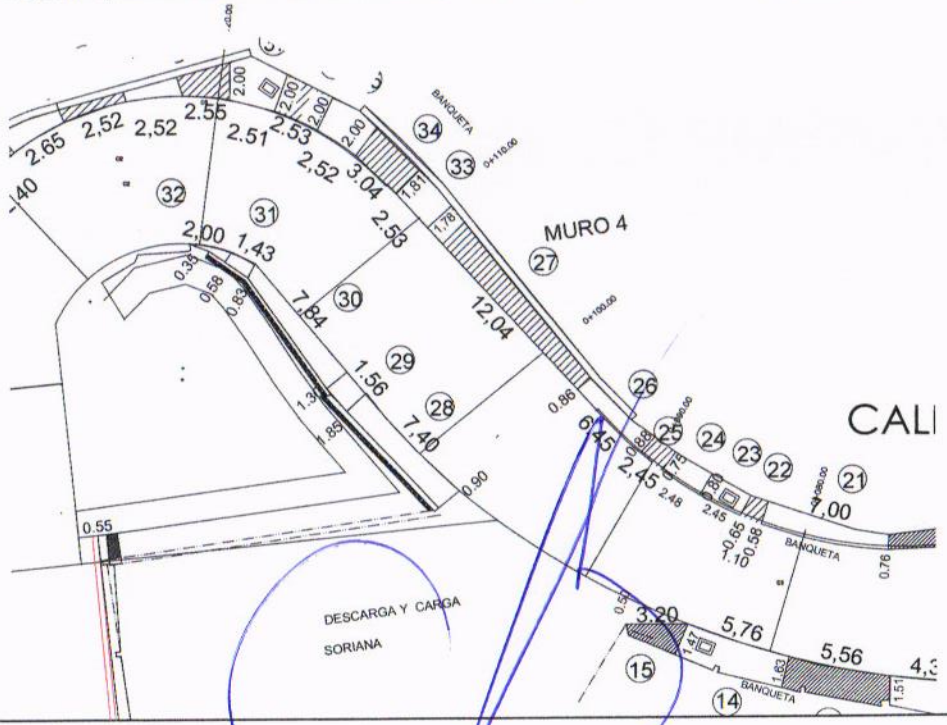

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023

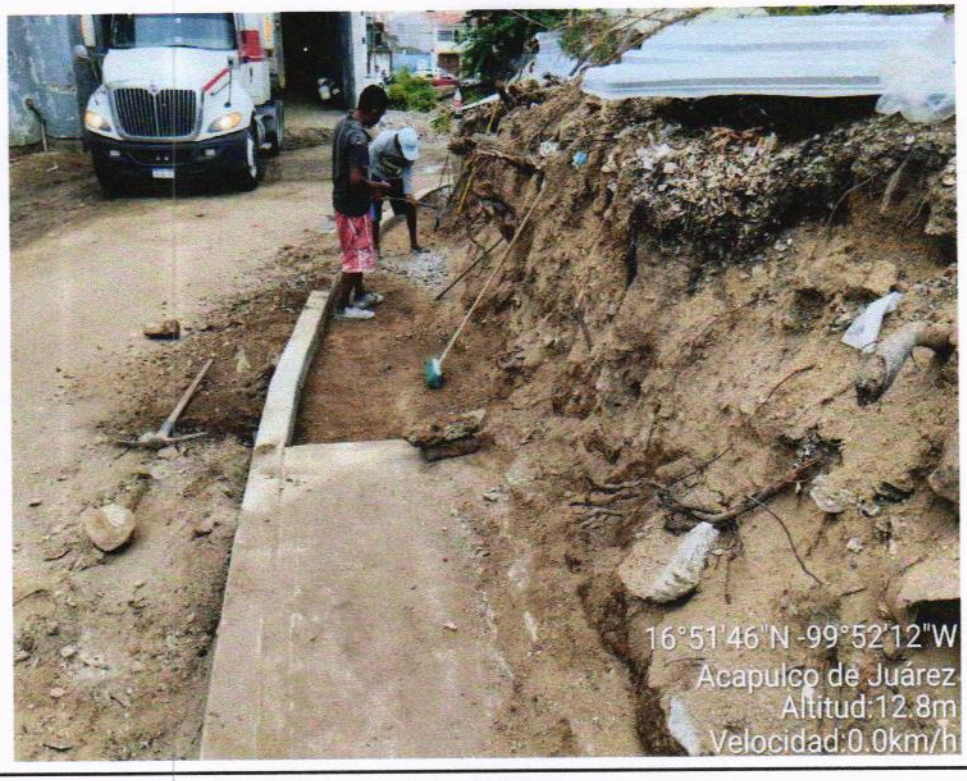

32-0466.- AFINE Y COMPACTACION EN BANQUETAS, ANDADORES Y PLAZAS A MANO INCLUYE ACARREOS A PRIMERA EXTERIOR.

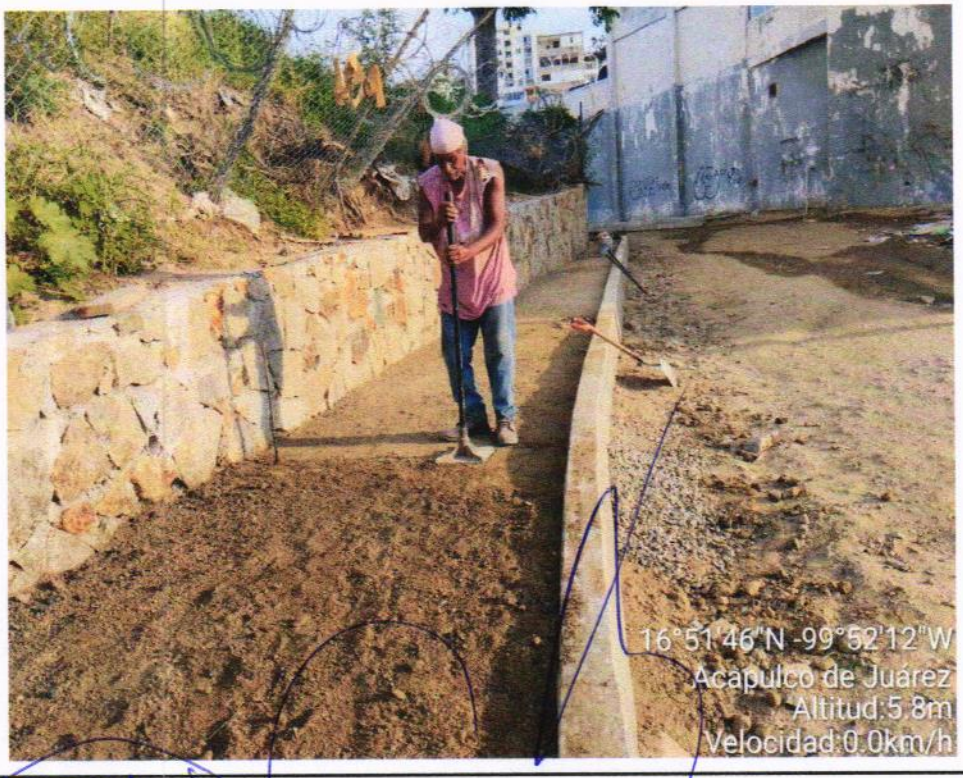

32-0466.- AFINE Y COMPACTACION EN BANQUETAS, ANDADORES Y PLAZAS A MANO INCLUYE ACARREOS A PRIMERA EXTERIOR.


IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023



32-0466.- AFINE Y COMPACTACION EN BANQUETAS, ANDADORES Y PLAZAS A MANO INCLUYE ACARREOS A PRIMERA EXTERIOR.

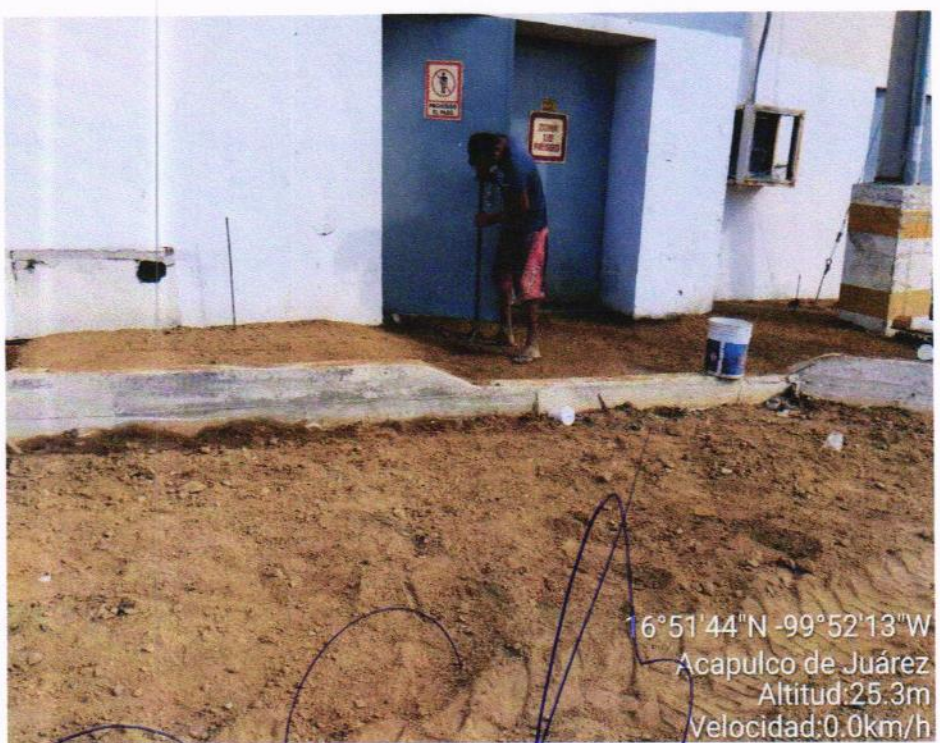

32-0466.- AFINE Y COMPACTACION EN BANQUETAS, ANDADORES Y PLAZAS A MANO INCLUYE ACARREOS A PRIMERA EXTERIOR.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023



32-0466.- AFINE Y COMPACTACION EN BANQUETAS, ANDADORES Y PLAZAS A MANO INCLUYE ACARREOS A PRIMERA EXTERIOR.



32-0466.- AFINE Y COMPACTACION EN BANQUETAS, ANDADORES Y PLAZAS A MANO INCLUYE ACARREOS A PRIMERA EXTERIOR.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 03 (TRES) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A3	**INSTALACION HIDRAULICA**									CADENAMIENTO
TOMDOM*	TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CON TUBO DE CPCV DE 13 MM. DE 6 MTS. DE LONGITUD, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, VALVULA DE INSERCION, ABRAZADERA DE 4", ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.			1.00				PZA	1.00	0+008
				1.00				PZA	1.00	0+086
							TOTAL	**PZA**	**2.00**	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No.: 03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A3 **INSTALACION HIDRAULICA**

TOMDOM* TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CON TUBO DE CPCV DE 13 MM. DE 6 MTS. DE LONGITUD, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, VALVULA DE INSERCION, ABRAZADERA DE 4", ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

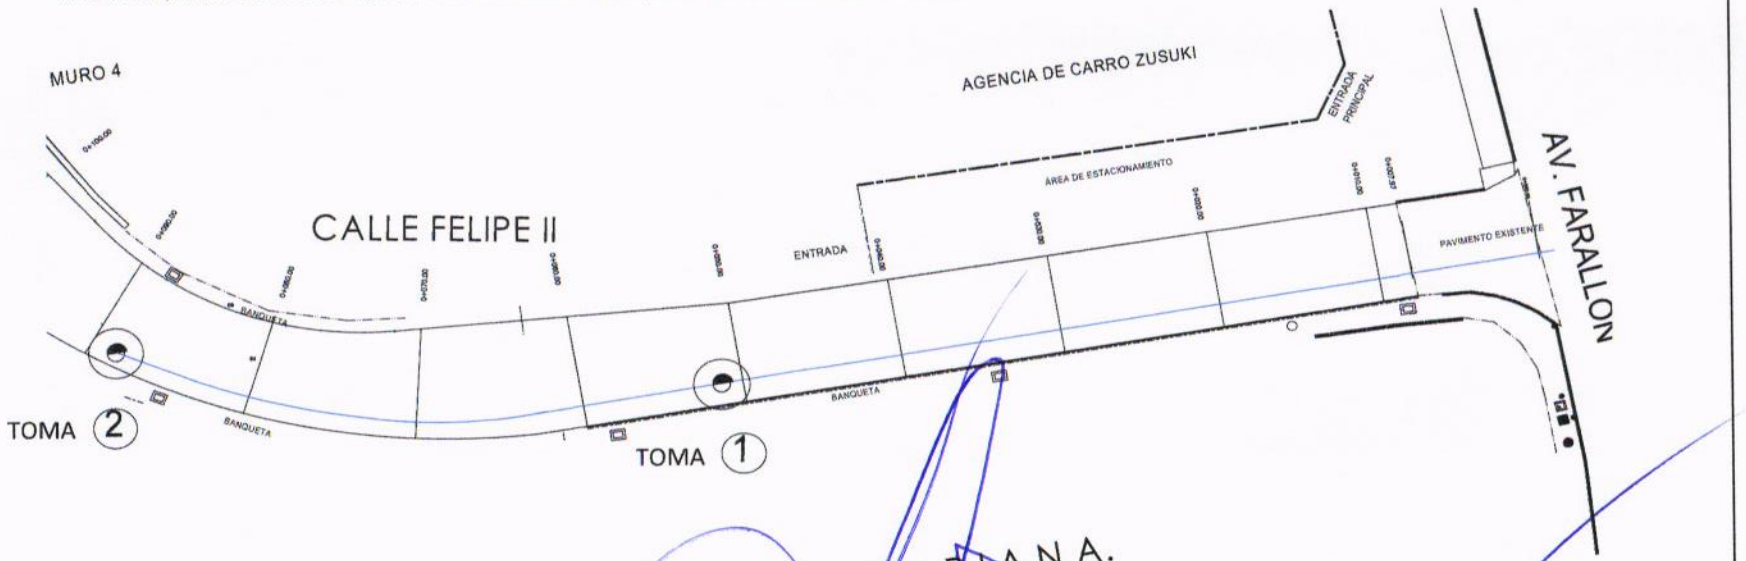

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERÓN JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023

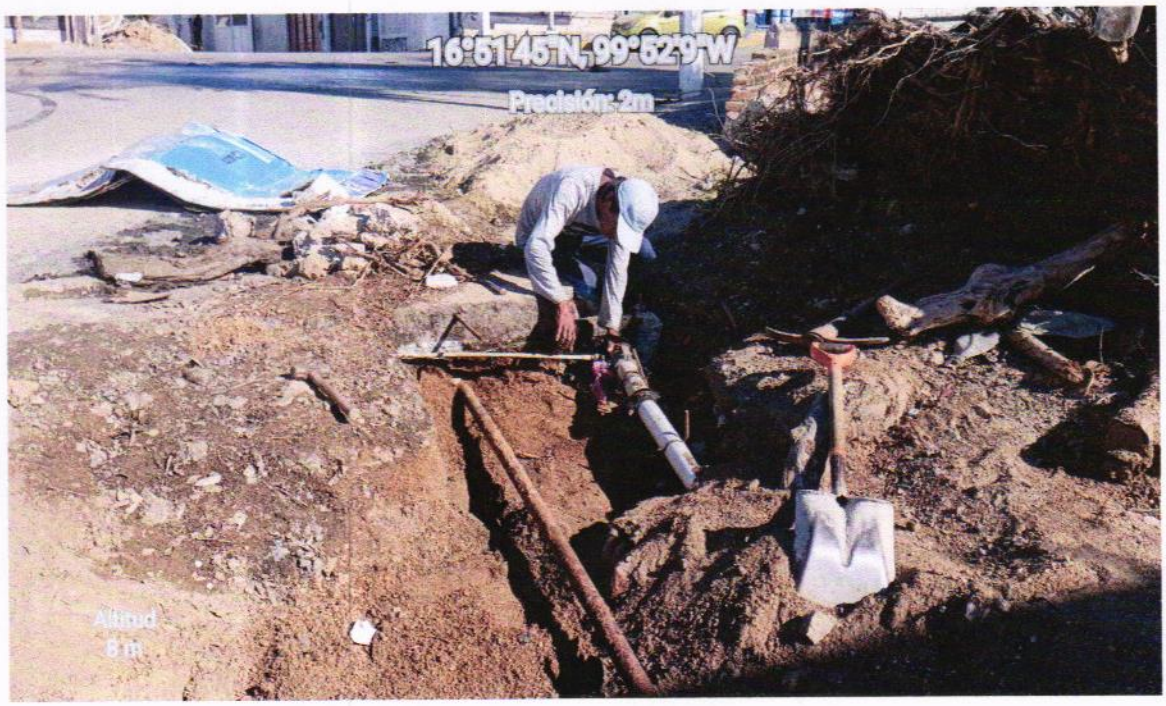

TOMDOM*.- TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CON TUBO DE CPCV DE 13 MM. DE 6 MTS. DE LONGITUD, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, VALVULA DE INSERCION, ABRAZADERA DE 4", ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

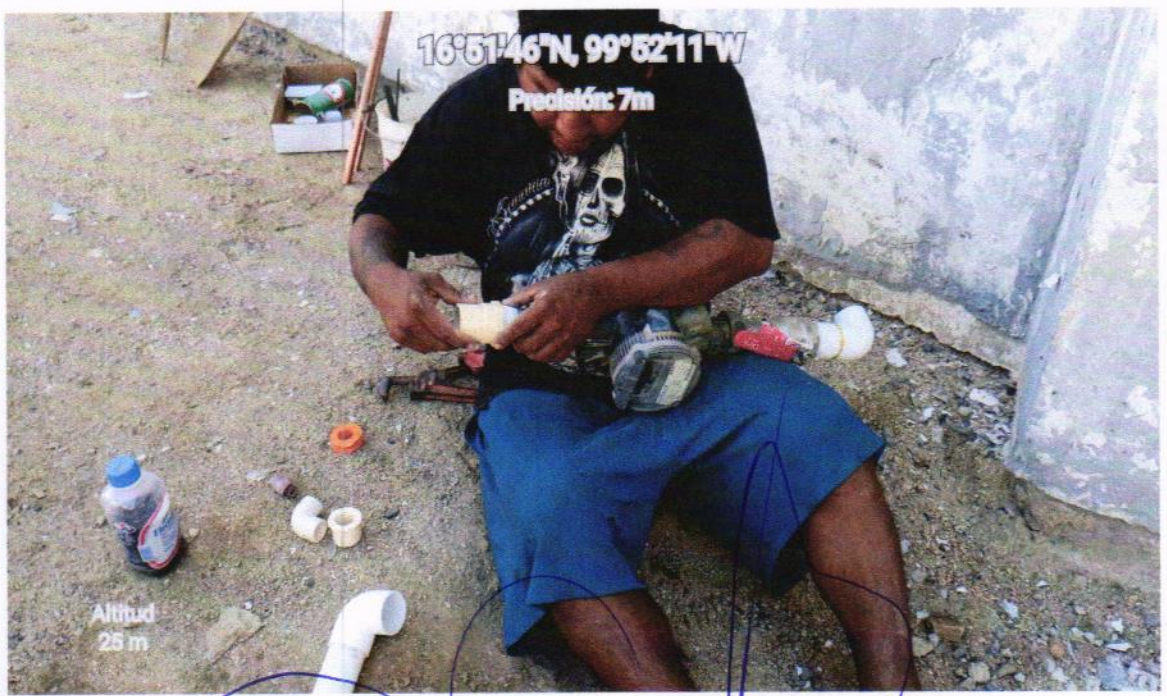

TOMDOM*.- TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CON TUBO DE CPCV DE 13 MM. DE 6 MTS. DE LONGITUD, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, VALVULA DE INSERCION, ABRAZADERA DE 4", ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.


IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	**RESIDENTE DE OBRA** ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA** ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023



TOMDOM*.- TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CON TUBO DE CPCV DE 13 MM. DE 6 MTS. DE LONGITUD, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, VALVULA DE INSERCION, ABRAZADERA DE 4", ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

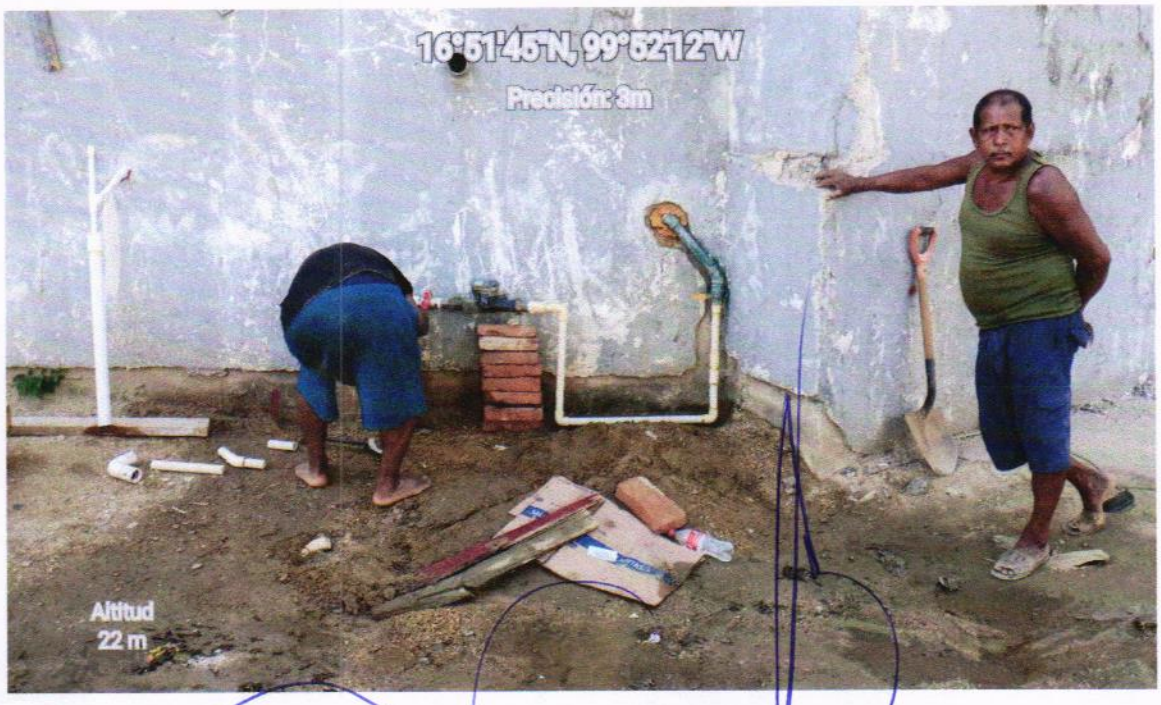

TOMDOM*.- TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CON TUBO DE CPCV DE 13 MM. DE 6 MTS. DE LONGITUD, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, VALVULA DE INSERCION, ABRAZADERA DE 4", ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 03 (TRES) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2023	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A3	**INSTALACION HIDRAULICA**									CADENAMIENTO
BOTA01	CAJA PARA LLAVE DE BANQUETYA (BOTA) INCLUYE: LLAYE DE CUADRO ROSCABLE 1/2" , HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO			1.00				PZA	1.00	0 + 052
							TOTAL	PZA	1.00	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No.: 03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A3 **INSTALACION HIDRAULICA**

BOTA01 CAJA PARA LLAVE DE BANQUETYA (BOTA) INCLUYE: LLAYE DE CUADRO ROSCABLE 1/2" , HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO

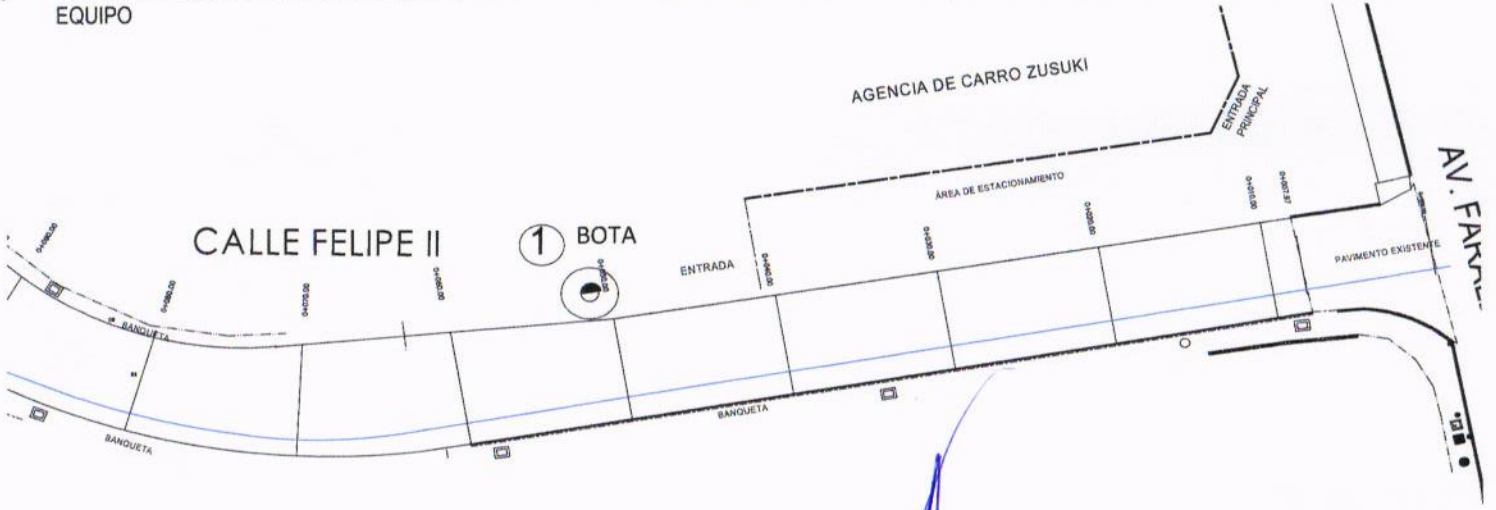

SORIANA.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023

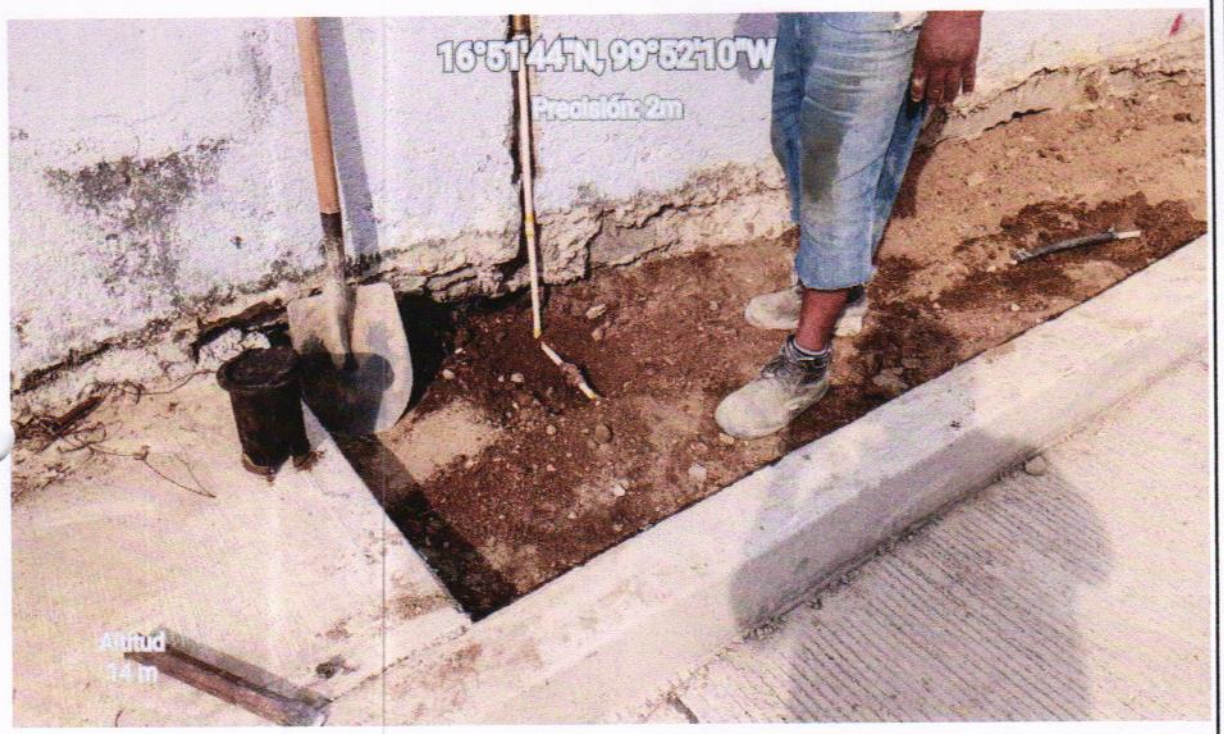

BOTA01.- CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA (BOTA) INCLUYE LLAVE DE CUADRO ROSCABLE 1/2", HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.

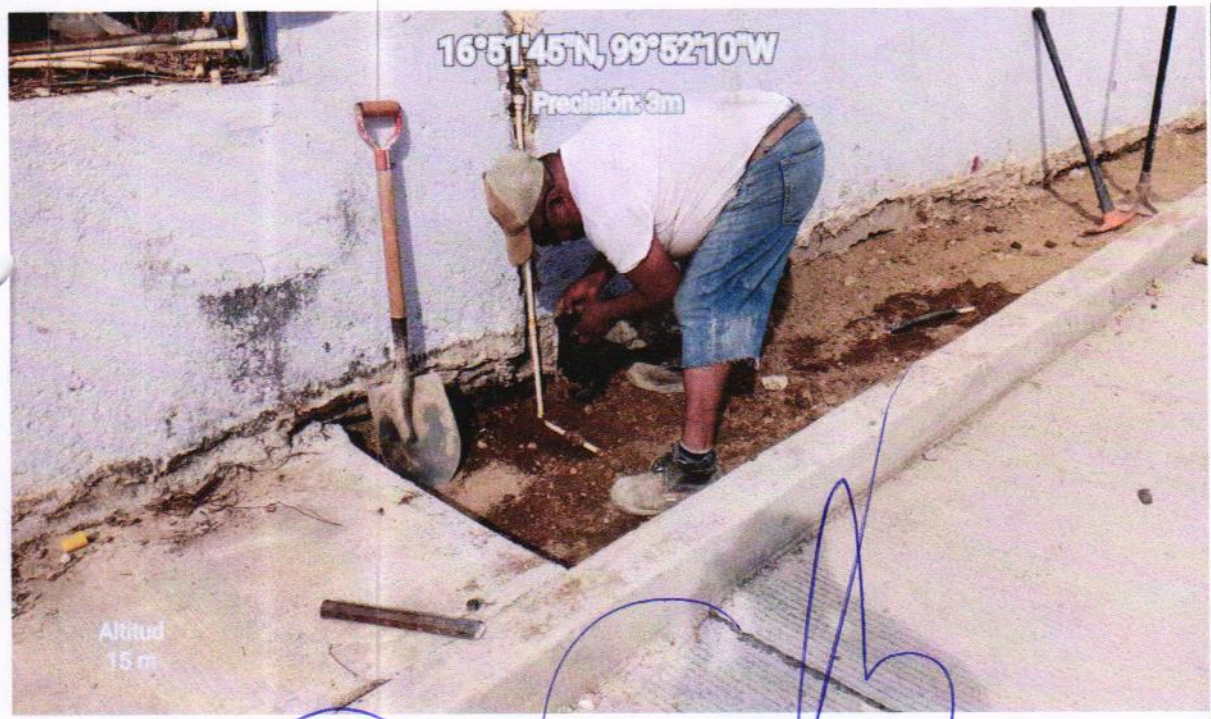


BOTA01.- CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA (BOTA) INCLUYE LLAVE DE CUADRO ROSCABLE 1/2", HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.


IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023

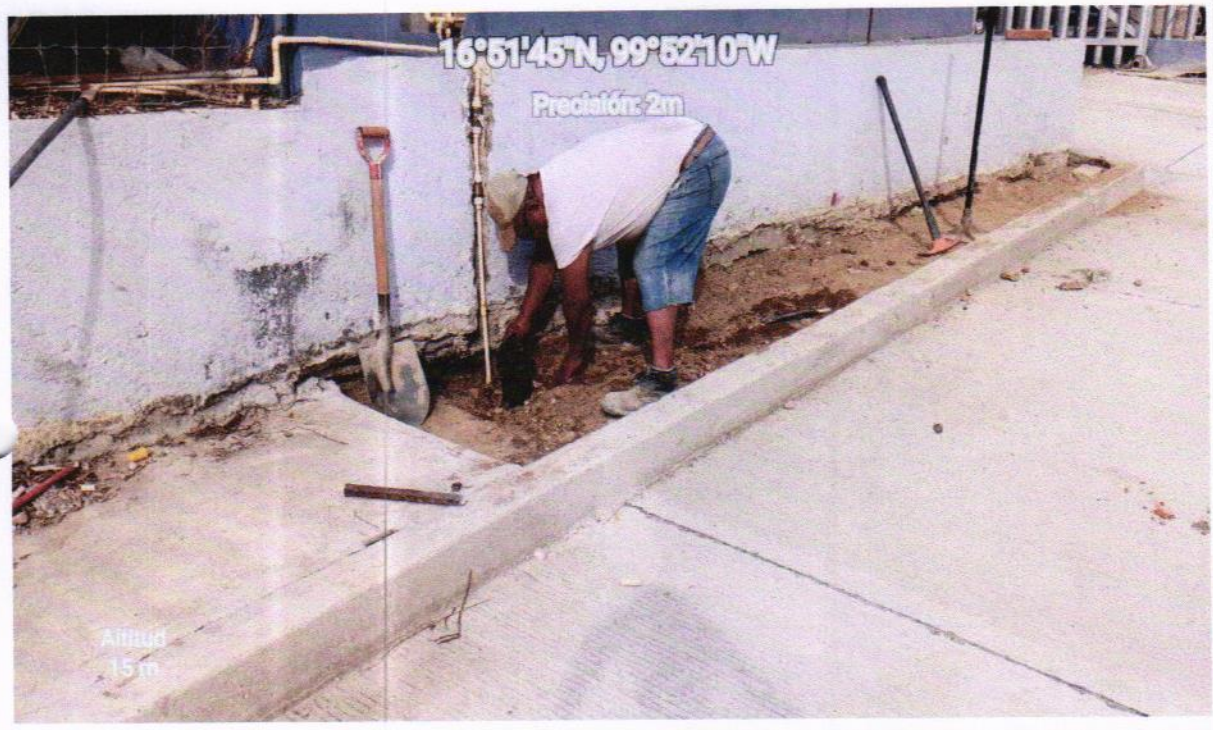

BOTA01.- CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA (BOTA) INCLUYE LLAVE DE CUADRO ROSCABLE 1/2", HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.

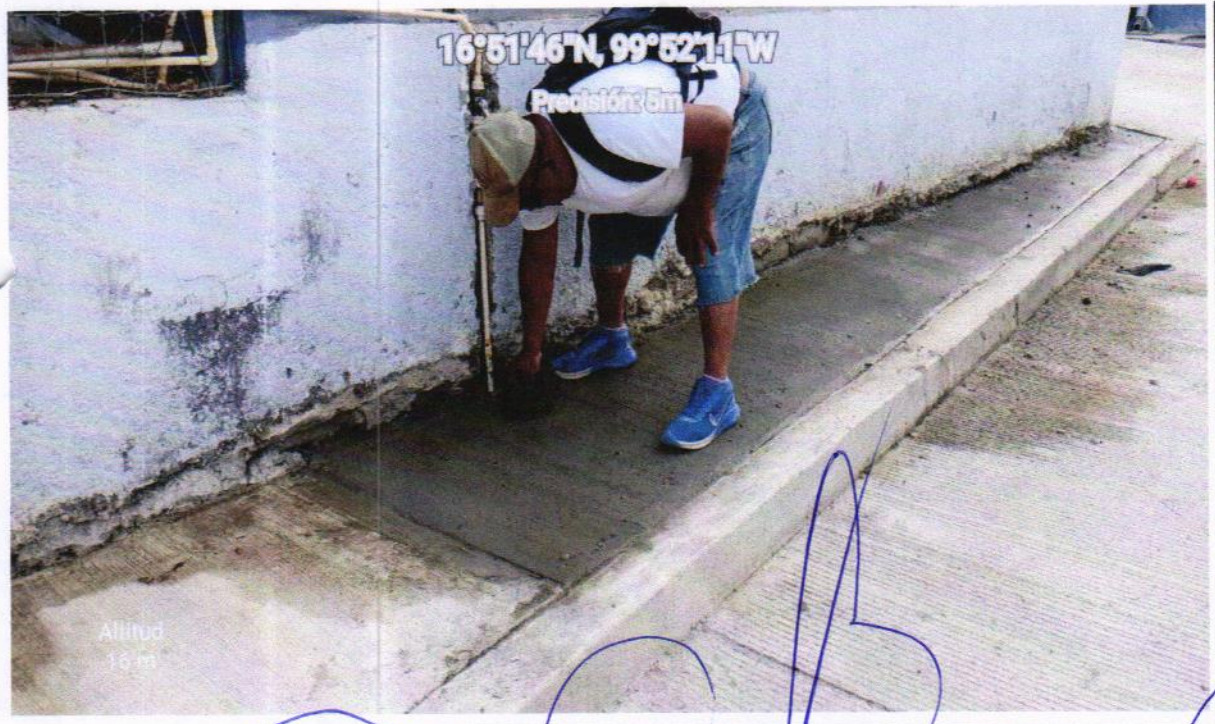

BOTA01.- CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA (BOTA) INCLUYE LLAVE DE CUADRO ROSCABLE 1/2", HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	N Ú M E R O S G E N E R A D O R E S		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 03 (TRES) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A6	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y LUMINARIAS**									CADENAMIENTO
REG-AUX	REGISTRO AUXILIAR PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE 50X60X65MTS., DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28 CMS., CON 14 CMS. DE ESPESOR ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR F´C=100KG/CM2, MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/2"X3/16" CONCRETO F´C=200KG/CM2 EN TAPA Y FIJACIÓN DE MARCO, DRÉN DE GRAVA DE 20 CMS DE ESPESOR, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES Y MANO DE OBRA..			1.00				PZA	1.00	0+007.50
				1.00				PZA	1.00	0+035
				1.00				PZA	1.00	0+058
				1.00				PZA	1.00	0+085
				1.00				PZA	1.00	0+088
				1.00				PZA	1.00	0+120
				1.00				PZA	1.00	0+140
				1.00				PZA	1.00	0+070
				1.00				PZA	1.00	0+194
				1.00				PZA	1.00	0+195
				1.00				PZA	1.00	0+203
							TOTAL	PZA	11.00	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No.: 03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A6 **INSTALACIONES ELECTRICAS Y LUMINARIAS**

REG-AUX

REGISTRO AUXILIAR PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE 50X60X65MTS., DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28 CMS., CON 14 CMS. DE ESPESOR ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR F´C=100KG/CM2, MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/2"X3/16" CONCRETO F´C=200KG/CM2 EN TAPA Y FIJACIÓN DE MARCO, DRÉN DE GRAVA DE 20 CMS DE ESPESOR, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES Y MANO DE OBRA..

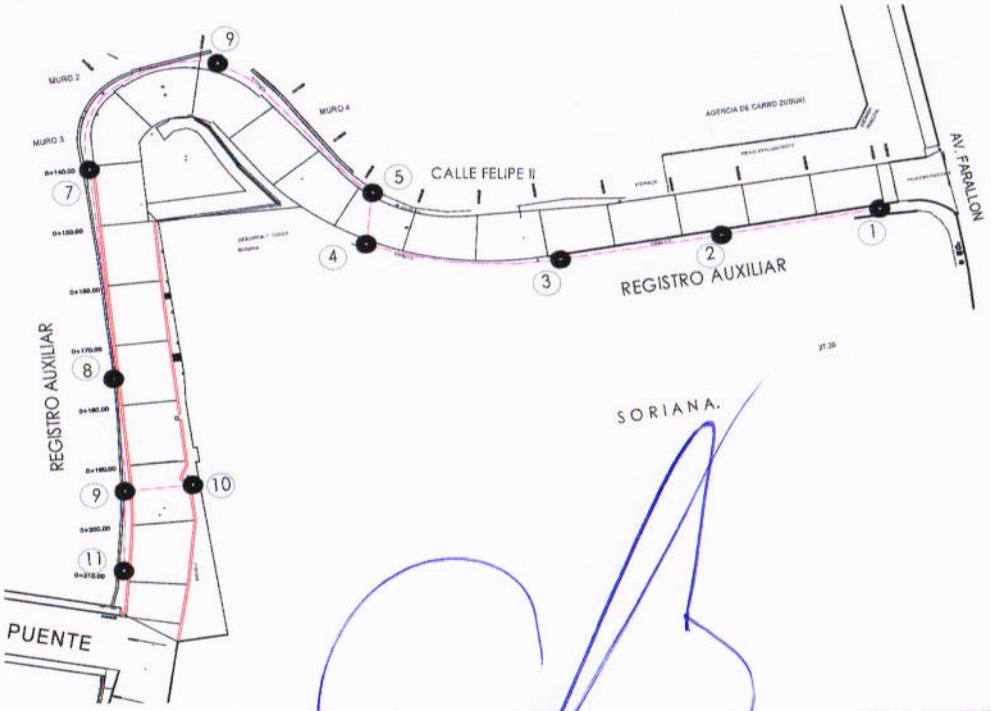

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023

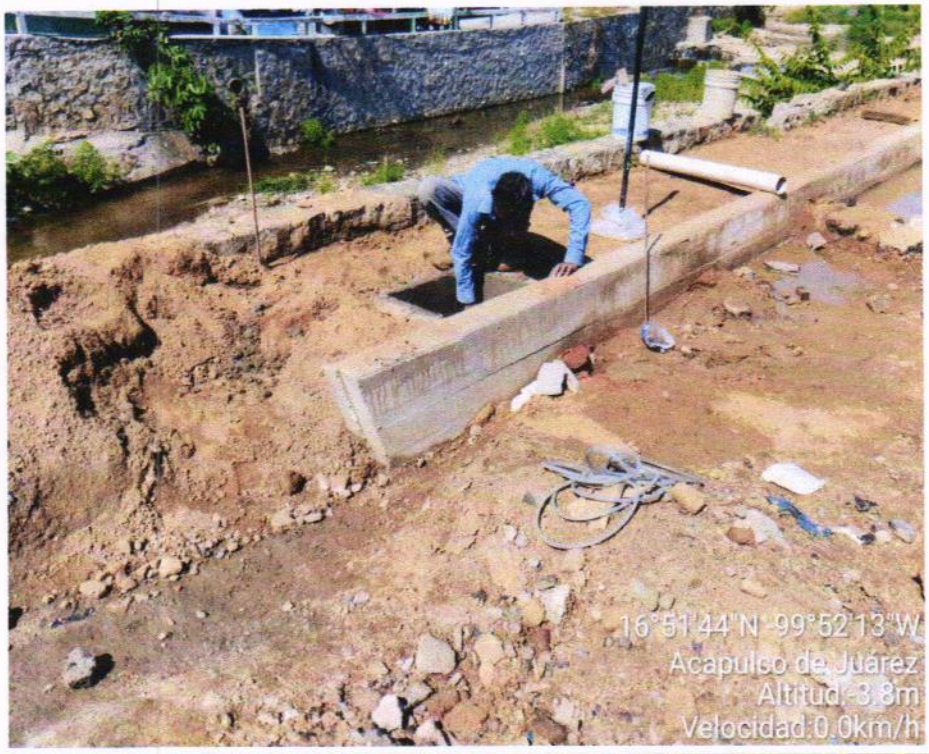

REG-AUX.- REGISTRO AUXILIAR PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 50X60X65MTS, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28 CMS. CON 14 CMS. DE ESPESOR ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 INCUYE: PLANTILLA DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR F´C=100 KG/CM2, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X 3/16" CONCRETO F´C=200 KG/CM2 EN TAPA Y FIJACION DE MARCO, DREN DE GRAVA DE 20 CMS DE ESPESOR, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES Y MANO DE OBRA.

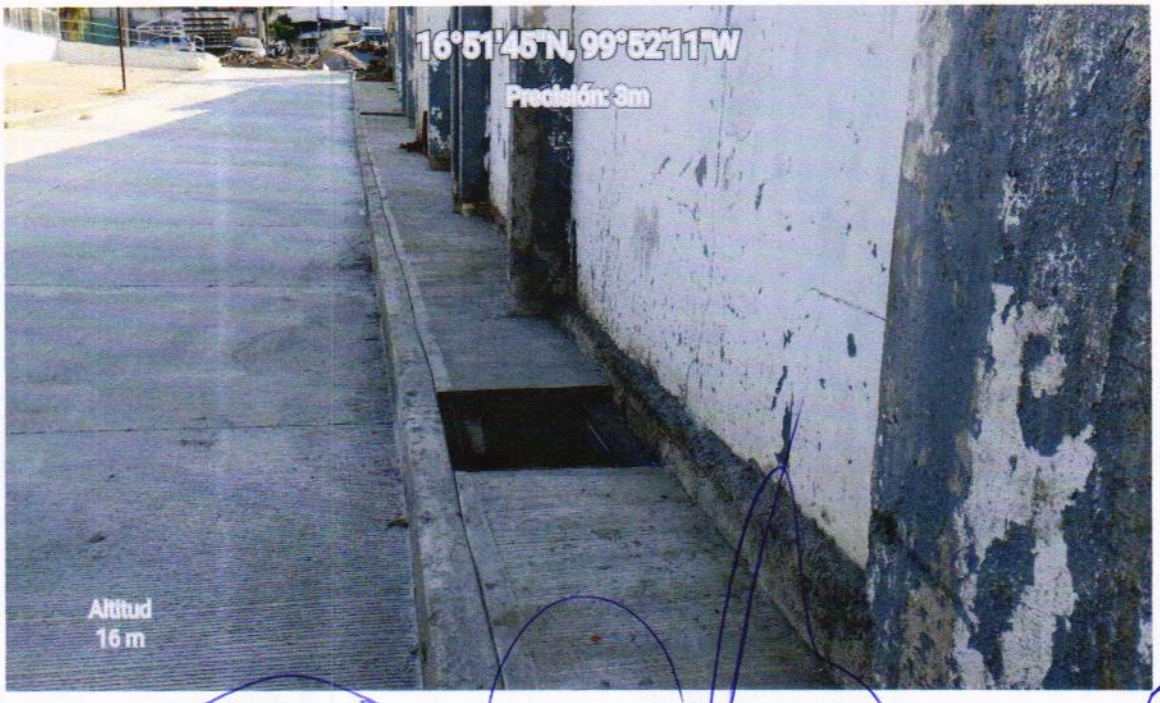


REG-AUX.- REGISTRO AUXILIAR PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 50X60X65MTS, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28 CMS. CON 14 CMS. DE ESPESOR ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 INCUYE: PLANTILLA DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR F´C=100 KG/CM2, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X 3/16" CONCRETO F´C=200 KG/CM2 EN TAPA Y FIJACION DE MARCO, DREN DE GRAVA DE 20 CMS DE ESPESOR, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES Y MANO DE OBRA.


IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023

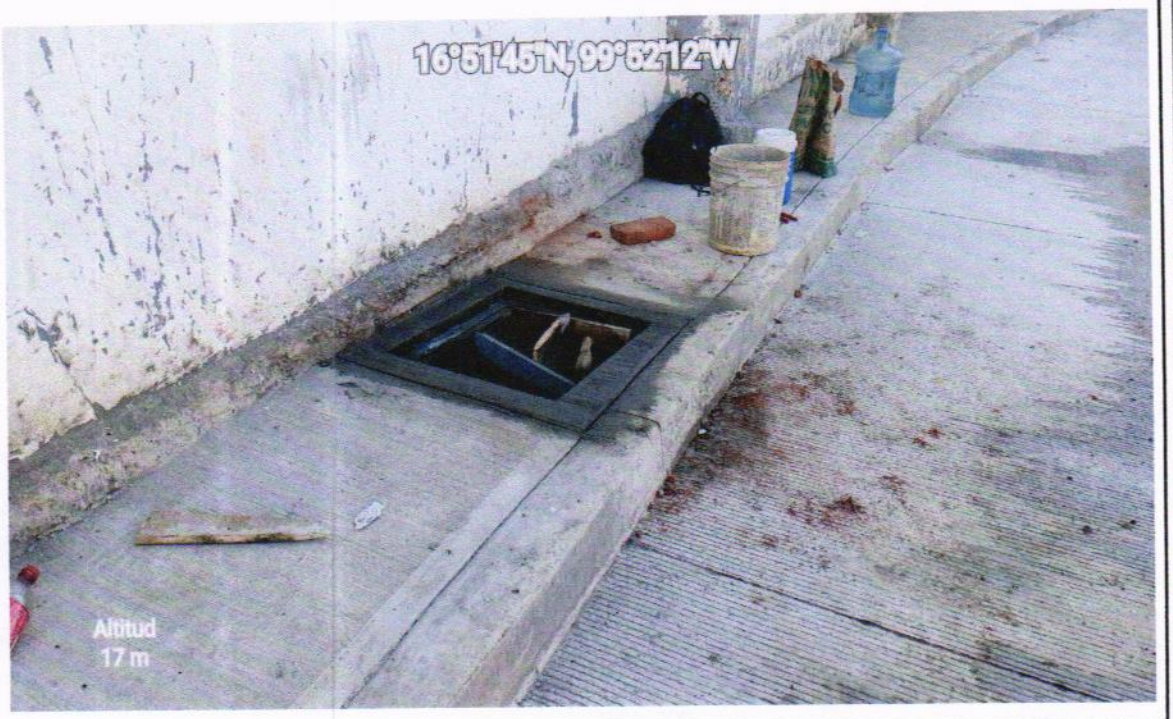

REG-AUX .- REGISTRO AUXILIAR PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 50X60X65MTS, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28 CMS. CON 14 CMS. DE ESPESOR ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 INCUYE: PLANTILLA DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR F´C=100 KG/CM2, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X 3/16" CONCRETO F´C=200 KG/CM2 EN TAPA Y FIJACION DE MARCO, DREN DE GRAVA DE 20 CMS DE ESPESOR, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES Y MANO DE OBRA.

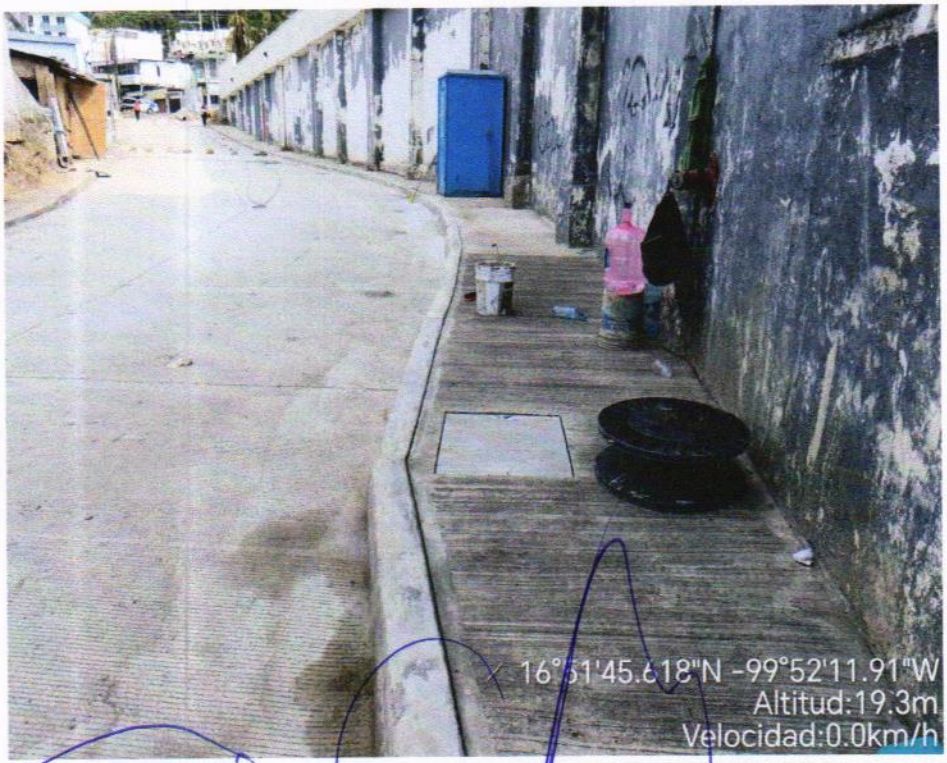

REG-AUX .- REGISTRO AUXILIAR PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 50X60X65MTS, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28 CMS. CON 14 CMS. DE ESPESOR ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 INCUYE: PLANTILLA DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR F´C=100 KG/CM2, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X 3/16" CONCRETO F´C=200 KG/CM2 EN TAPA Y FIJACION DE MARCO, DREN DE GRAVA DE 20 CMS DE ESPESOR, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES Y MANO DE OBRA.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	N Ú M E R O S G E N E R A D O R E S		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 03 (TRES) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A6	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y LUMINARIAS**									
TUB-PESA50	Suministro y tendido de tubo conduit pvc pesado 50 mm de diámetro incluye conexión, trazo, excavación, relleno, cama de arena, herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra.		1			26.00		M	26.00	
			2			23.60		M	23.60	
			3			26.00		M	26.00	
			4			7.53		M	7.53	
			5			33.60		M	33.60	
			6			30		M	30.00	
			7			34.90		M	34.90	
			8			18.00		M	18.00	
			9			8.95		M	8.95	
			10			12.62		M	12.62	
						TOTAL M DE TUBO CONDUIT PESADO DE 50 MM =		M	221.20	
						(-) M COBRADOS EN ESTIMACION 01 (UNO) =		M	-70.72	
						TOTAL ESTA ESTIMACION =		M	150.48	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No.: 03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 12 DE DICIEMBREBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A6 **INSTALACIONES ELECTRICAS Y LUMINARIAS**

TUB-PESA50 Suministro y tendido de tubo conduit pvc pesado 50 mm de diámetro incluye conexión, trazo, excavación, relleno, cama de arena, herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra.

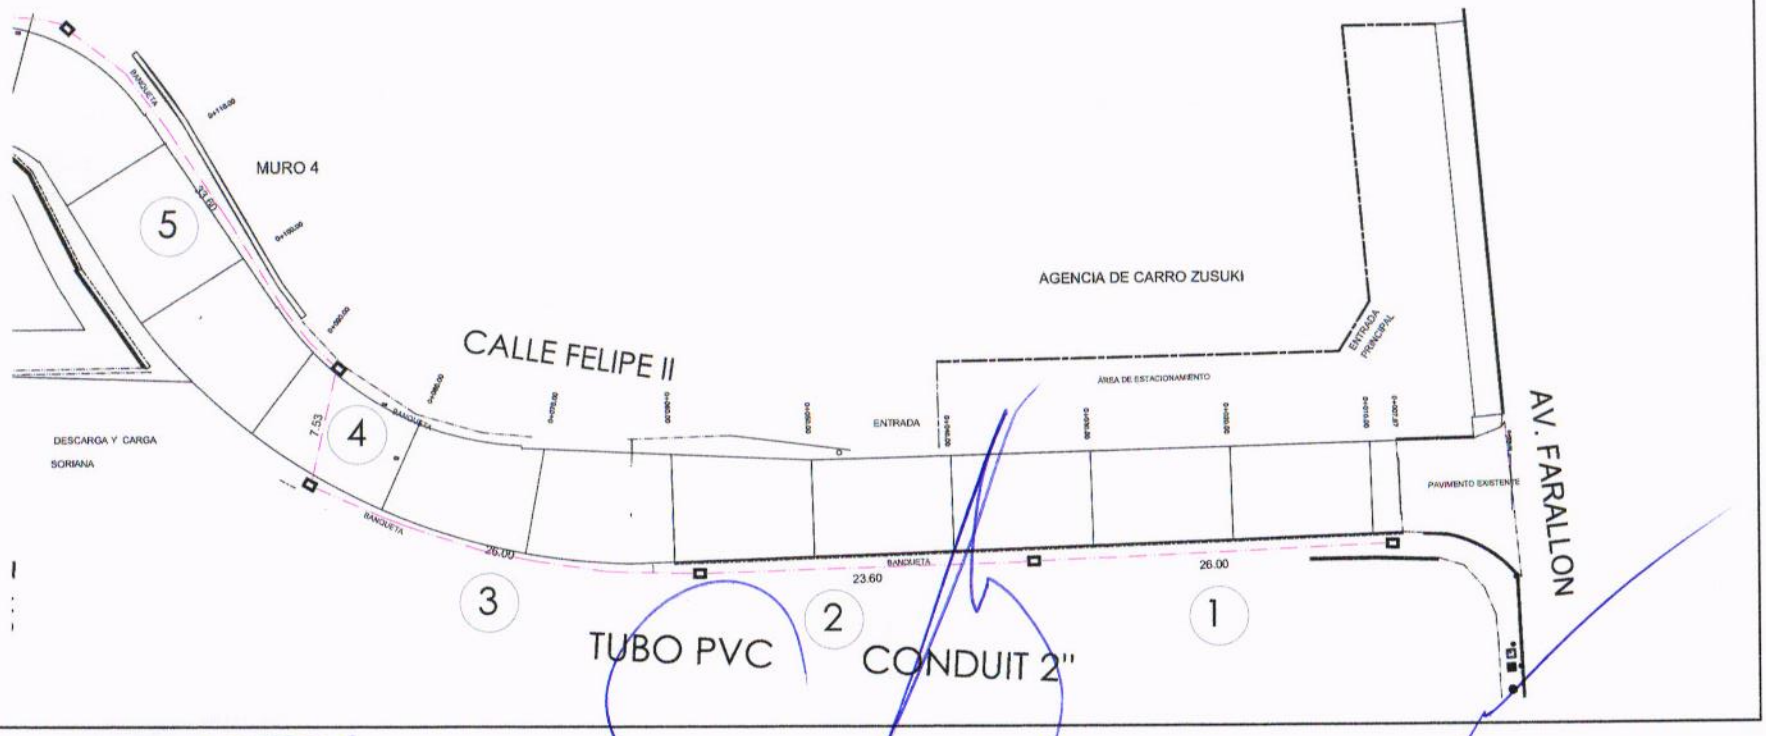

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023

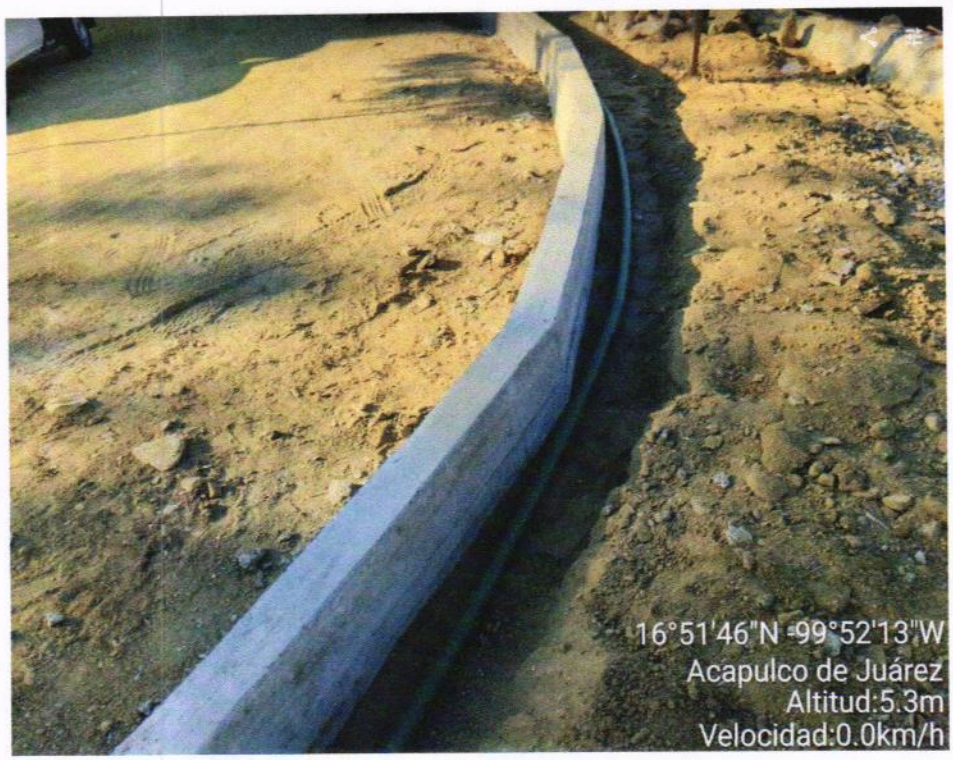

TUB-PESA50 .- SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO 50 MM DE DIAMETRO INCLUYE: CONEXIÓN, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, CAMA DE ARENA, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.




TUB-PESA50 .- SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO 50 MM DE DIAMETRO INCLUYE: CONEXIÓN, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, CAMA DE ARENA, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.


IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	**RESIDENTE DE OBRA** ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA** ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023

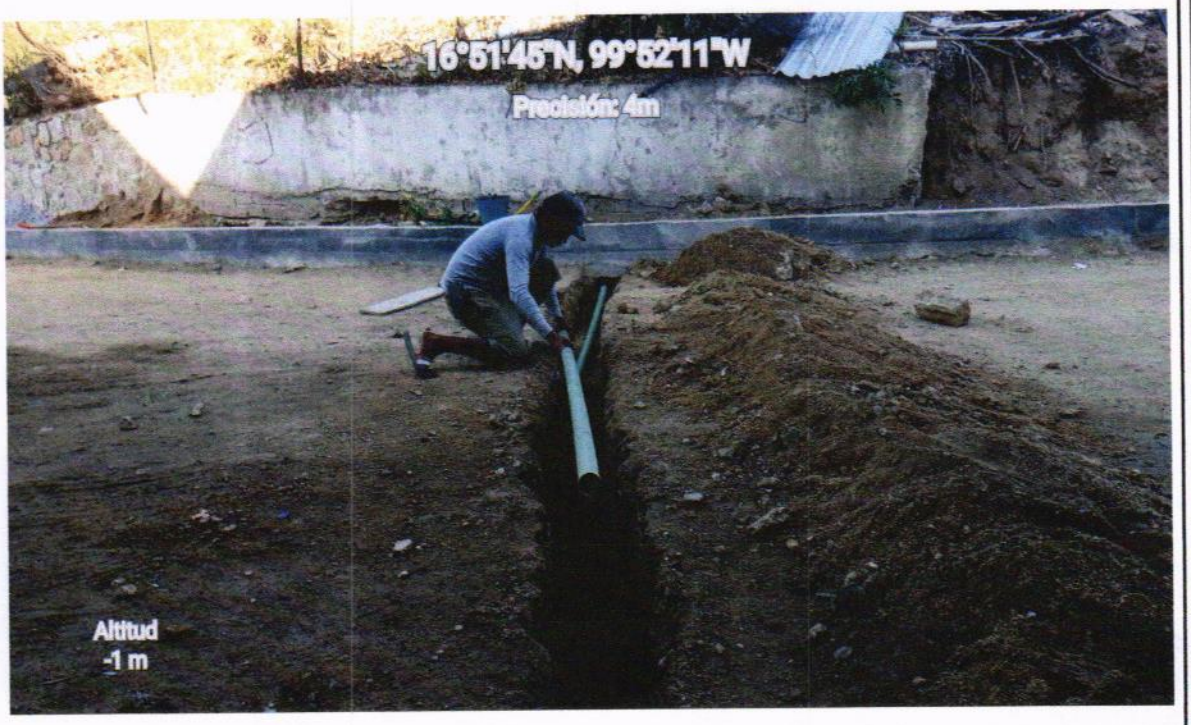

TUB-PESA50 .- SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO 50 MM DE DIAMETRO INCLUYE: CONEXIÓN, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, CAMA DE ARENA, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

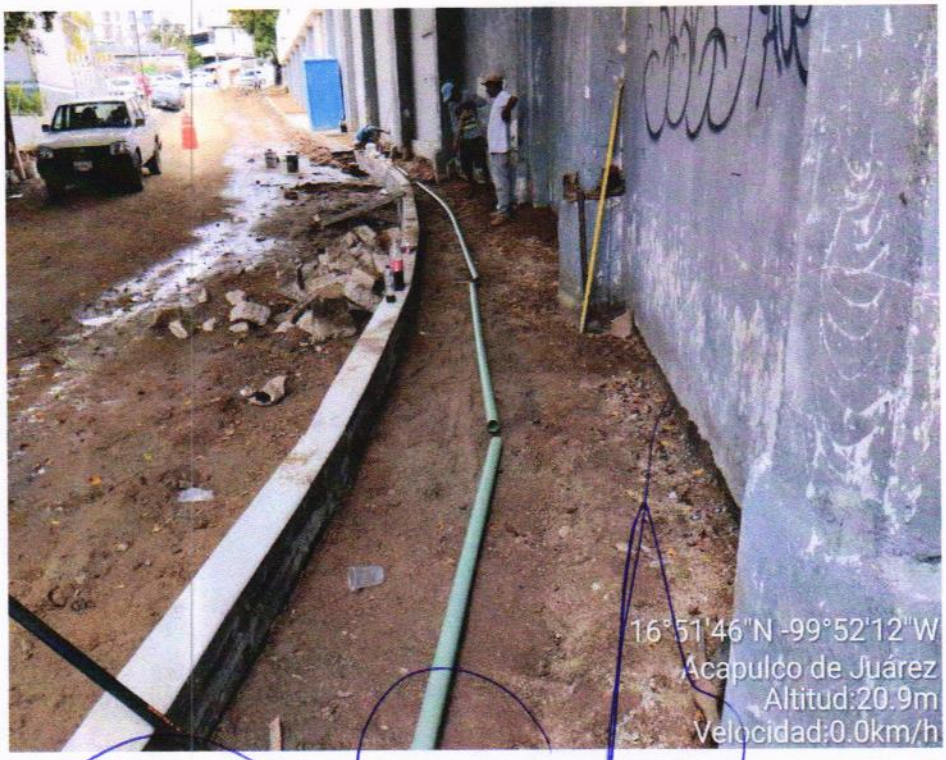

TUB-PESA50 .- SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO 50 MM DE DIAMETRO INCLUYE: CONEXIÓN, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, CAMA DE ARENA, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 03 (TRES) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A7	**PAVIMENTACIÓN**		1		0.40	30.00	0.25	M3	3.00	INICIO GUARNICION IZQUIERDA
4-0080	Excavacion a mano en material tipo II-A, en seco y barreta de 0.00 a 2.00 mts, de profundidad depositando el producto de excavacion a orilla de cepa, cualquier zona.		2		0.40	24.79	0.25	M3	2.47	
			3		0.40	2.50	0.25	M3	0.25	
			4		0.40	2.50	0.25	M3	0.25	
			5		0.40	2.74	0.25	M3	0.27	
			6		0.40	2.28	0.25	M3	0.22	
			7		0.40	2.38	0.25	M3	0.23	
			8		0.40	2.65	0.25	M3	0.26	
			9		0.40	2.54	0.25	M3	0.25	
			10		0.40	2.50	0.25	M3	0.25	
			11		0.40	3.28	0.25	M3	0.32	
			12		0.40	2.51	0.25	M3	0.25	
			13		0.40	1.04	0.25	M3	0.10	
			14		0.40	32.88	0.25	M3	3.28	INICIO GUARNICION DERECHA
			15		0.40	1.05	0.25	M3	0.10	
			16		0.40	1.10	0.25	M3	0.11	
			17		0.40	13.17	0.25	M3	1.31	
			18		0.40	10.91	0.25	M3	1.09	
			19		0.40	3.35	0.25	M3	0.33	
			20		0.40	2.42	0.25	M3	0.24	
			21		0.40	2.50	0.25	M3	0.25	
			22		0.40	2.54	0.25	M3	0.25	
			23		0.40	2.45	0.25	M3	0.24	
			24		0.40	2.49	0.25	M3	0.24	
						SUBTOTAL HOJA 1		**M3**	**12.56**	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 03 (TRES) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A7	**PAVIMENTACIÓN**									
4-0080	Excavacion a mano en material tipo II-A, en seco y barreta de 0.00 a 2.00 mts, de profundidad depositando el producto de excavacion a orilla de cepa, cualquier zona.		25		0.40	2.45	0.25	M3	0.24	
			26		0.40	1.22	0.25	M3	0.12	INICIO GUARNICION IZQUIERDA
			26'		0.40	15.10	0.25	M3	1.51	
			27		0.40	1.59	0.25	M3	0.15	
			28		0.40	1.48	0.25	M3	0.14	
			29		0.40	1.04	0.25	M3	0.10	
			30		0.40	1.03	0.25	M3	0.10	
			31		0.40	0.71	0.25	M3	0.07	
			32		0.40	2.44	0.25	M3	0.24	
			33		0.40	2.50	0.25	M3	0.25	
			34		0.40	17.52	0.25	M3	1.75	INICIO GUARNICION DERECHA
			35		0.40	2.53	0.25	M3	0.25	
			36		0.40	3.04	0.25	M3	0.30	
			37		0.40	2.52	0.25	M3	0.25	
			38		0.40	2.53	0.25	M3	0.25	
			39		0.40	2.51	0.25	M3	0.25	
			40		0.40	2.55	0.25	M3	0.25	
			41		0.40	2.52	0.25	M3	0.25	
			42		0.40	2.52	0.25	M3	0.25	
			43		0.40	2.75	0.25	M3	0.27	
			44		0.40	2.40	0.25	M3	0.24	
			45		0.40	2.52	0.25	M3	0.25	
			46		0.40	2.52	0.25	M3	0.25	
			47		0.40	2.52	0.25	M3	0.25	
						SUBTOTAL HOJA 2		**M3**	**7.98**	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 03 (TRES) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A7	**PAVIMENTACIÓN**									
4-0080	Excavacion a mano en material tipo II-A, en seco y barreta de 0.00 a 2.00 mts, de profundidad depositando el producto de excavacion a orilla de cepa, cualquier zona.		48		0.40	2.52	0.25	M3	0.25	
			49		0.40	2.52	0.25	M3	0.25	
			50		0.40	33.37	0.25	M3	3.33	INICIO DE TRAMO IZQUIERDO
			51		0.40	11.23	0.25	M3	1.12	
			52		0.40	2.61	0.25	M3	0.26	
			53		0.40	2.54	0.25	M3	0.25	
			54		0.40	8.35	0.25	M3	0.83	
			55		0.40	16.55	0.25	M3	1.65	
			56		0.40	20.93	0.25	M3	2.09	INICIO GUARNICION DERECHA
			57		0.40	19.20	0.25	M3	1.92	
			58		0.40	9.93	0.25	M3	0.99	
			59		0.40	6.39	0.25	M3	0.63	
			60		0.40	13.51	0.25	M3	1.35	
			61		0.40	2.51	0.25	M3	0.25	
			62		0.40	2.00	0.25	M3	0.20	
							SUB TOTAL ESTA HOJA 3 =	M3	15.37	
							SUB TOTAL HOJA 2 =	M3	7.98	
							SUB TOTAL HOJA 1 =	M3	12.56	
							TOTAL M3 DE EXCAVACION =	M3	35.91	
							(-) M3 COBRADOS EN ESTIMACION 01 Y 02 =	M3	-26.01	
							TOTAL	ML	9.90	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No.: 03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A7 **PAVIMENTACION**

4-0080 Excavacion a mano en material tipo II-A, en seco y barreta de 0.00 a 2.00 mts, de profundidad depositando el producto de excavacion a orilla de cepa, cualquier zona.

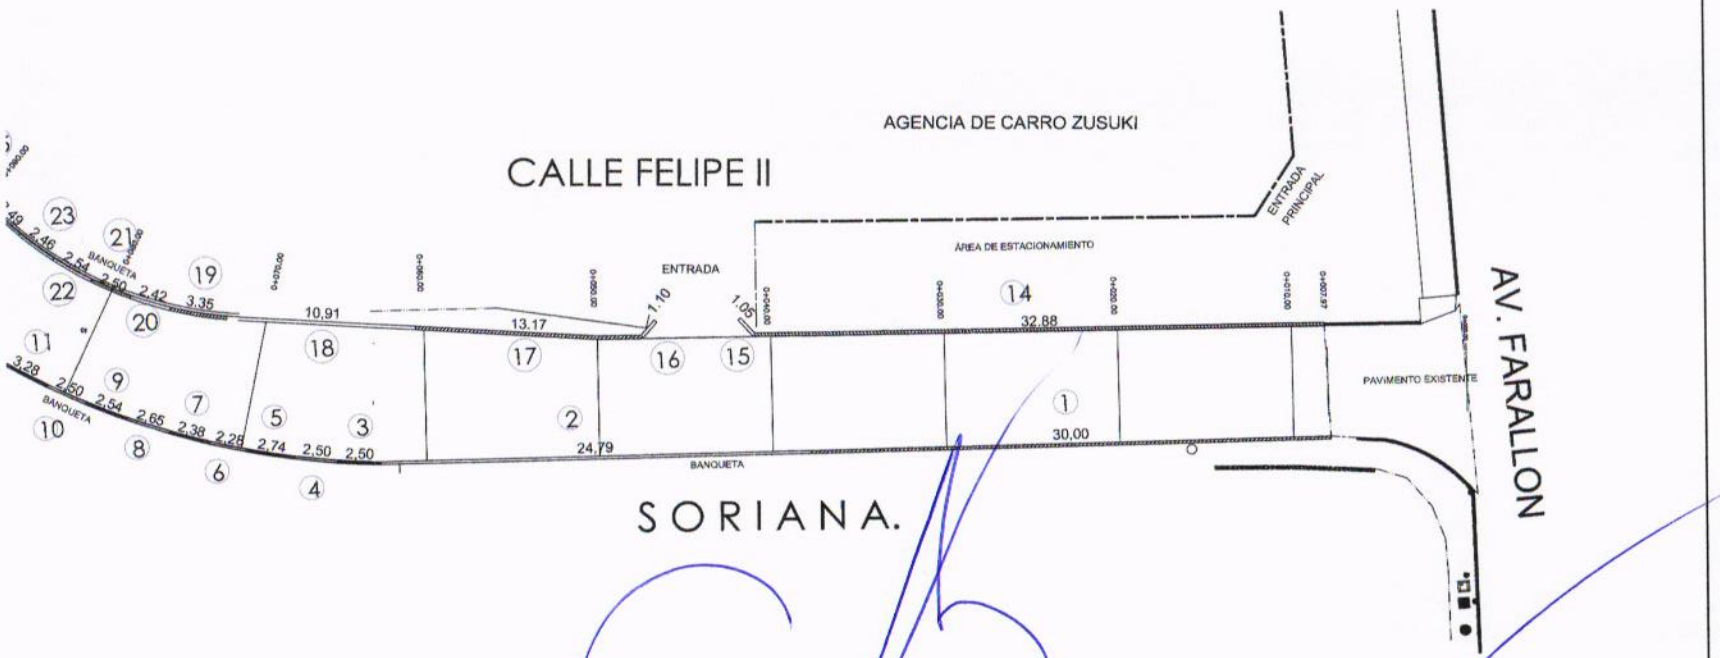

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S				
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	MAJ/426	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	ESTIMACIÓN No.: 03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA:	12 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/426-2023/LP	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.			

C R O Q U I S

A7 **PAVIMENTACION**

4-0080 Excavacion a mano en material tipo II-A, en seco y barreta de 0.00 a 2.00 mts, de profundidad depositando el producto de excavacion a orilla de cepa, cualquier zona.

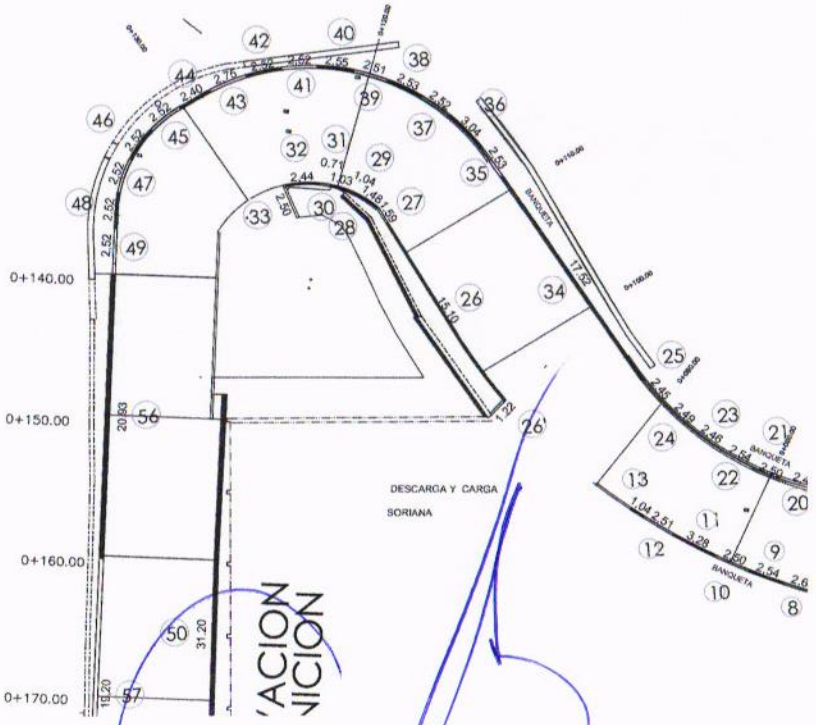

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A.DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No.: 03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A7 **PAVIMENTACION**

4-0080 Excavacion a mano en material tipo II-A, en seco y barreta de 0.00 a 2.00 mts, de profundidad depositando el producto de excavacion a orilla de cepa, cualquier zona.



IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023



4-0080 .- EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II-A, EN SECO Y BARRETA DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, DEPOSITANDO EL PRODUCTO DE EXCAVACION A ORILLA DE CEPA, CUALQUIER ZONA.




4-0080 .- EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II-A, EN SECO Y BARRETA DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, DEPOSITANDO EL PRODUCTO DE EXCAVACION A ORILLA DE CEPA, CUALQUIER ZONA.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023

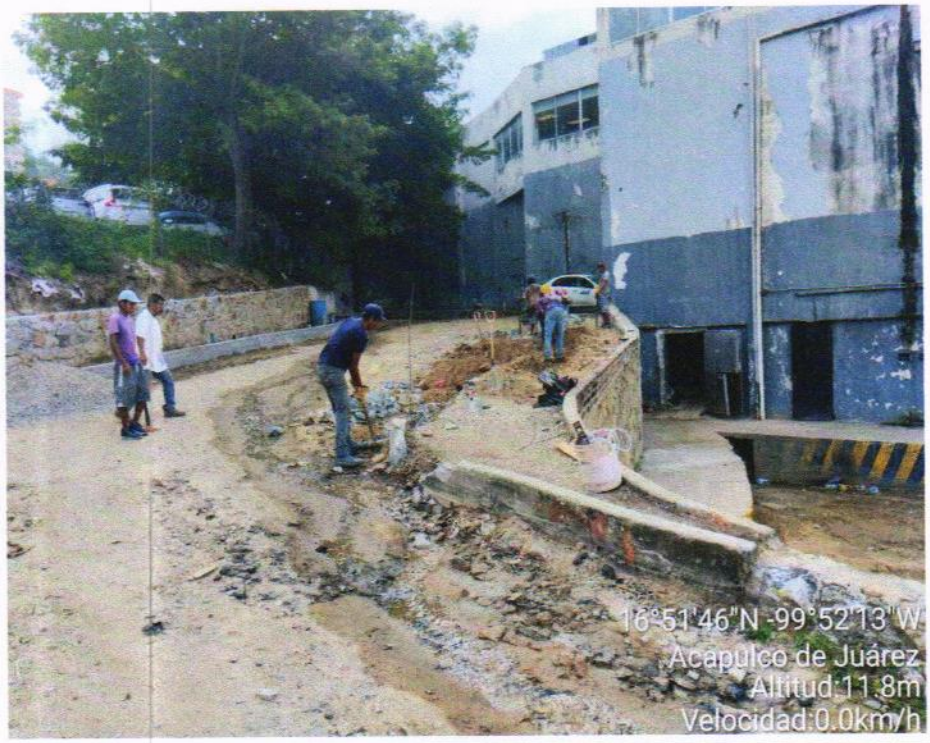

4-0080 .- EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II-A, EN SECO Y BARRETA DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, DEPOSITANDO EL PRODUCTO DE EXCAVACION A ORILLA DE CEPA, CUALQUIER ZONA.



4-0080 .- EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II-A, EN SECO Y BARRETA DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, DEPOSITANDO EL PRODUCTO DE EXCAVACION A ORILLA DE CEPA, CUALQUIER ZONA.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 03 (TRES) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A7	PAVIMENTACIÓN		1			30.00		ML	30.00	INICIO GUARNICION IZQUIERDA
32-0471	Guarnición de concreto simple de f´c=200 kg/cm2 de 15x20x40cm, de seccion T.M.A. 3/4" incluye cimbrado, decimbrado, materiales y mano de obra.		2			24.79		ML	24.79	
			3			2.50		ML	2.50	
			4			2.50		ML	2.50	
			5			2.74		ML	2.74	
			6			2.28		ML	2.28	
			7			2.38		ML	2.38	
			8			2.65		ML	2.65	
			9			2.54		ML	2.54	
			10			2.50		ML	2.50	
			11			3.28		ML	3.28	
			12			2.51		ML	2.51	
			13			1.04		ML	1.04	
			14			32.88		ML	32.88	INICIO GUARNICION DERECHA
			15			1.05		ML	1.05	
			16			1.10		ML	1.10	
			17			13.17		ML	13.17	
			18			10.91		ML	10.91	
			19			3.35		ML	3.35	
			20			2.42		ML	2.42	
			21			2.50		ML	2.50	
			22			2.54		ML	2.54	
			23			2.45		ML	2.45	
			24			2.49		ML	2.49	
						SUBTOTAL HOJA 1		**ML**	**156.57**	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 03 (TRES) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A7	**PAVIMENTACIÓN**									
32-0471	Guarnición de concreto simple de f'c=200 kg/cm2 de 15x20x40cm, de seccion T.M.A. 3/4" incluye cimbrado, decimbrado, materiales y mano de obra.		25			2.45		ML	2.45	INICIO GUARNICION IZQUIERDA
			26			1.22		ML	1.22	
			26'			15.10		ML	15.10	
			27			1.59		ML	1.59	
			28			1.48		ML	1.48	
			29			1.04		ML	1.04	
			30			1.03		ML	1.03	
			31			0.71		ML	0.71	
			32			2.44		ML	2.44	
			33			2.50		ML	2.50	INICIO GUARNICION DERECHA
			34			17.52		ML	17.52	
			35			2.53		ML	2.53	
			36			3.04		ML	3.04	
			37			2.52		ML	2.52	
			38			2.53		ML	2.53	
			39			2.51		ML	2.51	
			40			2.55		ML	2.55	
			41			2.52		ML	2.52	
			42			2.52		ML	2.52	
			43			2.75		ML	2.75	
			44			2.40		ML	2.40	
			45			2.52		ML	2.52	
			46			2.52		ML	2.52	
			47			2.52		ML	2.52	
						SUBTOTAL HOJA 2		**ML**	**80.51**	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

ACAPULCO SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 03 (TRES) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2023	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A7	**PAVIMENTACIÓN**									
32-0471	Guarnición de concreto simple de f´c=200 kg/cm2 de 15x20x40cm, de seccion T.M.A. 3/4" incluye cimbrado, decimbrado, materiales y mano de obra.		48			2.52		ML	2.52	
			49			2.52		ML	2.52	
			50			33.37		ML	33.37	INICIO DE TRAMO IZQUIERDO
			51			11.23		ML	11.23	
			52			2.61		ML	2.61	
			53			2.54		ML	2.54	
			54			8.35		ML	8.35	
			55			16.55		ML	16.55	
			56			20.93		ML	20.93	INICIO GUARNICION DERECHA
			57			19.20		ML	19.20	
			58			9.93		ML	9.93	
			59			6.39		ML	6.39	
			60			13.51		ML	13.51	
			61			2.51		ML	2.51	
			62			2.00		ML	2.00	
						SUB TOTAL ESTA HOJA 3 =		ML	154.16	
						SUB TOTAL HOJA 2 =		ML	80.51	
						SUB TOTAL HOJA 1 =		ML	156.57	
						TOTAL ML DE GUARNICION =		ML	391.24	
						(-) ML COBRADOS EN ESTIMACION 01 Y 02 =		ML	-340.70	
						TOTAL ML ESTA ESTIMACION =		ML	50.54	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No.: 03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A7 **PAVIMENTACION**

32-0471 Guarnición de concreto simple de f´c=200 kg/cm2 de 15x20x40cm, de seccion T.M.A. 3/4" incluye cimbrado, decimbrado, materiales y mano de obra.



IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S				
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	ESTIMACIÓN No.: 03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA:	12 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.			

C R O Q U I S

A7 **PAVIMENTACION**

32-0471 Guarnición de concreto simple de f´c=200 kg/cm2 de 15x20x40cm, de seccion T.M.A. 3/4" incluye cimbrado, decimbrado, materiales y mano de obra.

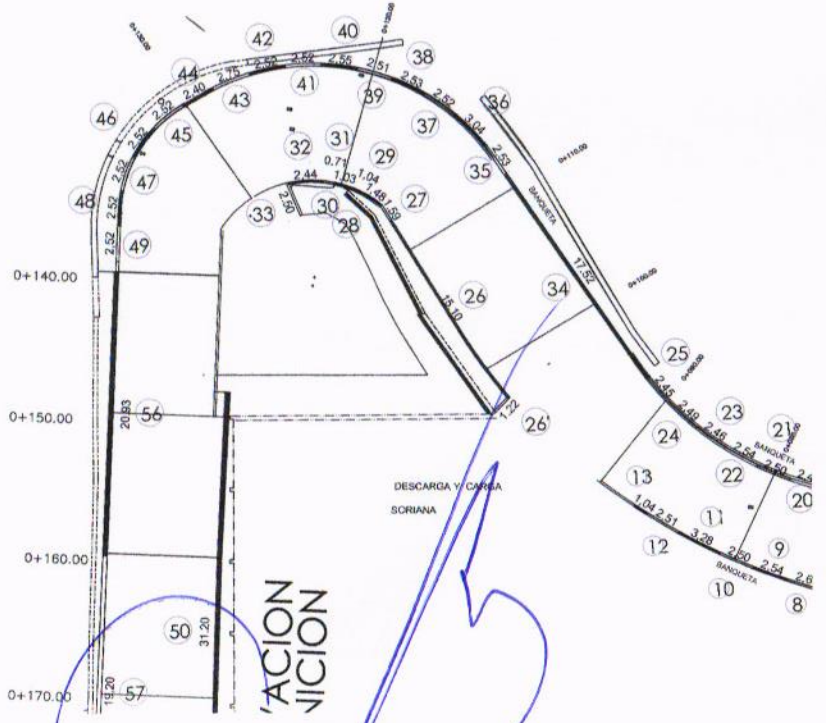

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No.: 03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A7 **PAVIMENTACION**

32-0471 Guarnición de concreto simple de f´c=200 kg/cm2 de 15x20x40cm, de seccion T.M.A. 3/4" incluye cimbrado, decimbrado, materiales y mano de obra. =170*2621.60



IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023



32-0471 .- GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE DE F´C=200 KG/CM2 DE 20X15X40 CM. DE SECCION T.M.A. 3/4" INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.

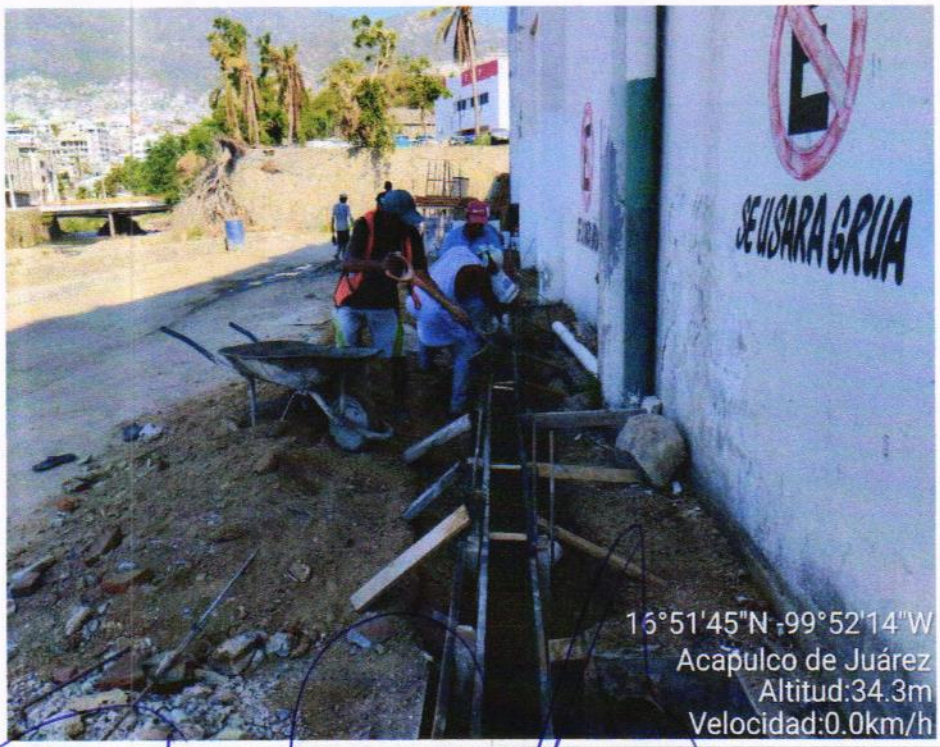


32-0471 .- GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE DE F´C=200 KG/CM2 DE 20X15X40 CM. DE SECCION T.M.A. 3/4" INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023

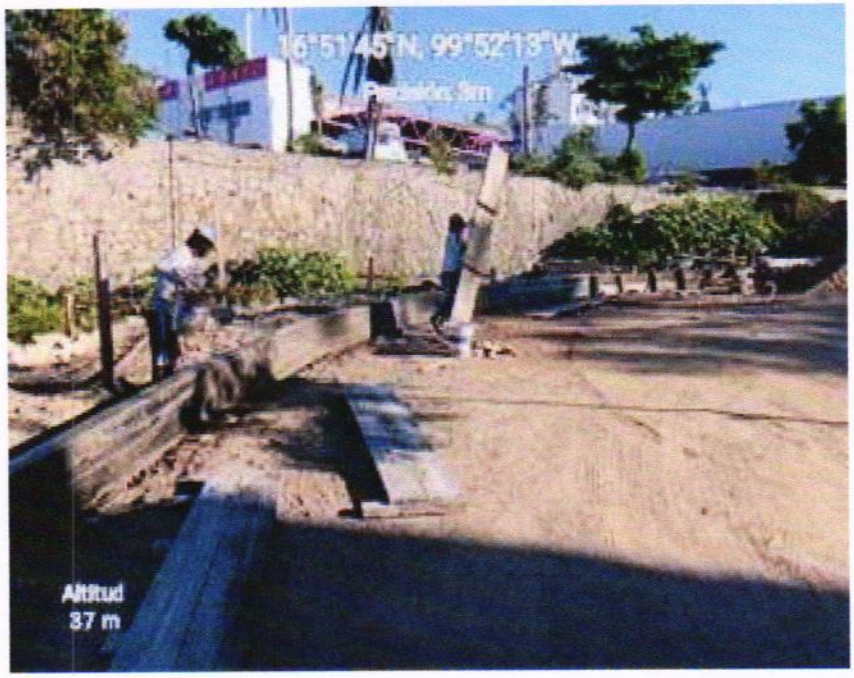

32-0471 .- GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE DE F´C=200 KG/CM2 DE 20X15X40 CM. DE SECCION T.M.A. 3/4" INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.



32-0471 .- GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE DE F´C=200 KG/CM2 DE 20X15X40 CM. DE SECCION T.M.A. 3/4" INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.


IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023



32-0471 .- GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE DE F´C=200 KG/CM2 DE 20X15X40 CM. DE SECCION T.M.A. 3/4" INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.

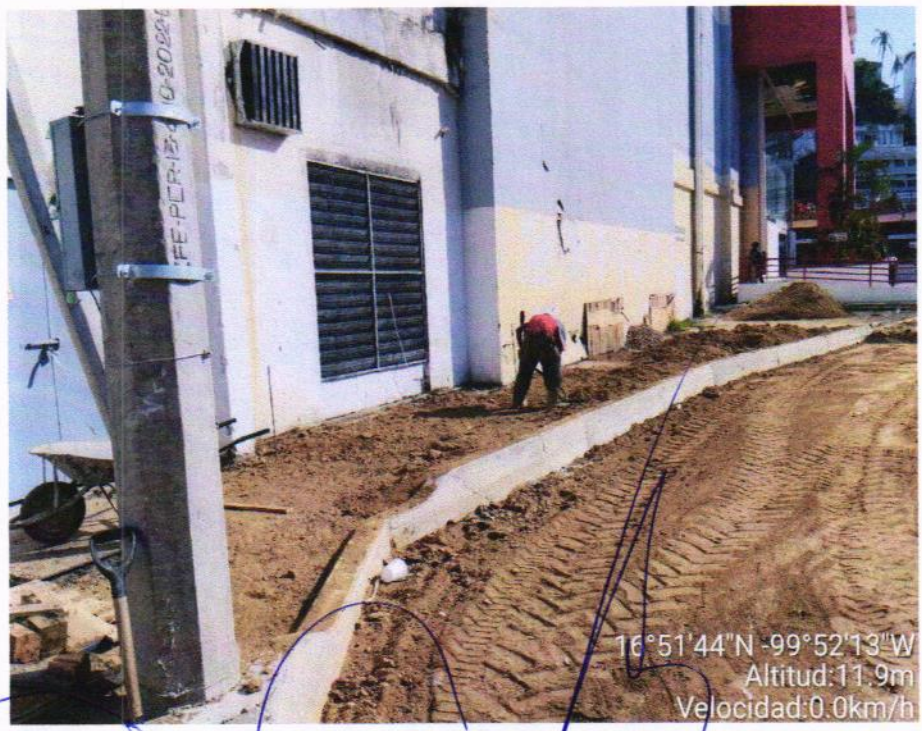

32-0471 .- GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE DE F´C=200 KG/CM2 DE 20X15X40 CM. DE SECCION T.M.A. 3/4" INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 03 (TRES) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO	ALTO	LARGO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A7	**PAVIMENTACIÓN**		1		6.55		2.00	M2	**13.10**	0+008-0+010
32-0475A	PAVIMENTO PREMEZCLADO F'C= 300 KG/CM2, T.A.M. 3/4" DE 20 CM. DE ESPESOR RESISTENCIA NORMAL, ACABADO A REGLA INCLUYE: JUNTA CONSTRUCTIVA CON CHAFLAN DE 1/2", EN CADA JUNTA FRIA (AL TERMINO DEL COLADO) SE PROCEDERA A COLOCAR 8 CONECTORES CON VARILLA DE 1/2" A CADA 60 CMS 30-30 CMS. FIBRA MICROSINTETICA, CURADO CON CURACRETO, VIBRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 1RA. ESTACION.		2		6.55		10.00	M2	**65.50**	0+010-0+020
			3		6.62		10.00	M2	**66.20**	0+02-0+030
			4		6.72		10.00	M2	**67.20**	0+03-0+040
			5		6.97		10.00	M2	**69.70**	0+040-0+050
		RAMPA ACCESO SUZUKI	TRIANGULOS	2.00	0.55	0.50	1.05	M2	**0.57**	0+040-0+050
			RECTANGULO	1.00	1.75		4.95	M2	**8.66**	0+040-0+050
			6		7.44		10.00	M2	**74.40**	0+050-0+060
			7		7.58		10.00	M2	**75.80**	0+060-0+070
			8		6.98		10.00	M2	**69.80**	0+080-0+080
			9		7.25		10.00	M2	**72.50**	0+080-0+090
		ACCESO DESCARGA SORIANA	TRIANGULO	1.00	1.35	0.50	11.53	M2	**7.78**	0+090-0+100
			TRIANGULO	1.00	2.60	0.50	2.70	M2	**3.51**	0+090-0+100
			10		8.36		10.00	M2	**83.60**	0+090-0+100
			11		8.55		10.00	M2	**85.50**	0+100-0+110
			12		8.08		10.00	M2	**80.80**	0+110-0+120
			13		8.02		10.00	M2	**80.20**	0+120-0+130
			14		8.12		10.00	M2	**81.20**	0+130-0+140
						SUBTOTAL HOJA 1		M2	1,006.02	

CAD.	ANCHOS		SUMA	ANCHO PROMEDIO 1/2
0+008-0+010	6.55	6.55	13.10	**6.55**
0+010-0+020	6.55	6.55	13.10	**6.55**
0+020-0+030	6.57	6.66	13.23	**6.62**
0+030-0+040	6.66	6.77	13.43	**6.72**
0+040-0+050	6.77	7.17	13.94	**6.97**
0+050-0+060	7.17	7.71	14.88	**7.44**
0+060-0+070	7.71	7.44	15.15	**7.58**
0+080-0+080	7.44	6.52	13.96	**6.98**
0+080-0+090	6.52	7.97	14.49	**7.25**
0+090-0+100	7.97	8.75	16.72	**8.36**
0+100-0+110	8.75	8.38	17.13	**8.57**
0+110-0+120	8.38	7.80	16.18	**8.09**
0+120-0+130	7.80	8.24	16.04	**8.02**
0+130-0+140	8.24	8.00	16.24	**8.12**

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 03 (TRES) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO	ALTO	LARGO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A7	**PAVIMENTACIÓN**									
32-0475A	PAVIMENTO PREMEZCLADO F´C= 300 KG/CM2, T.A.M. 3/4" DE 20 CM. DE ESPESOR RESISTENCIA NORMAL, ACABADO A REGLA INCLUYE: JUNTA CONSTRUCTIVA CON CHAFLAN DE 1/2", EN CADA JUNTA FRIA (AL TERMINO DEL COLADO) SE PROCEDERA A COLOCAR 8 CONECTORES CON VARILLA DE 1/2" A CADA 60 CMS 30-30 CMS. FIBRA MICROSINTETICA, CURADO CON CURACRETO, VIBRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 1RA. ESTACION.	AREA DE PATIO DE MANIOBRAS (TRIANGULO)		1.00	4.00	0.50	2.30	M2	**4.60**	0+130-0+140
			15		7.87		10.00	M2	**78.70**	0+140-0+150
		(-) AREA DESCARGA		1.00	-2.00		1.35	M2	**-2.70**	0+140-0+150
			16		7.70		10.00	M2	**77.00**	0+150-0+160
			17		7.70		10.00	M2	**77.00**	0+160-0+170
			18		7.89		10.00	M2	**78.90**	0+170-0+180
			19		8.14		10.00	M2	**81.40**	0+180-0+190
		(-) REGISTRO SANITARIO			-1.04		1.30	M2	**-1.35**	0+180-0+190
			20		8.62		10.00	M2	**86.20**	0+190-0+200
		(-) AREA POSTE DE LUZ (TRIANGULO)		2.00	-2.25	0.50	1.20	M2	**-2.70**	0+190-0+200
			21		8.79		10.00	M2	**87.90**	0+200-0+210
			22		8.60		8.00	M2	**68.80**	0+210-0+216.6
		(-) AREA DE POZO DE VISITA		2.00	-1.13			M2	**-2.26**	0+175 Y 0+216
							SUBTOTAL HOJA 2	M2	**631.49**	
							SUBTOTAL HOJA 1	M2	**1,006.02**	
							TOTAL	M2	**1,637.51**	

CAD	ANCHOS		SUMA	ANCHO PROMEDIO 1/2	
0+140-0+150	8.00	7.74	15.74	**7.87**	
0+150-0+160	7.74	7.65	15.39	**7.70**	
0+160-0+170	7.65	7.75	15.40	**7.70**	
0+170-0+180	7.75	8.03	15.78	**7.89**	
0+180-0+190	8.03	8.25	16.28	**8.14**	
0+190-0+200	8.25	8.98	17.23	**8.62**	
0+200-0+210	8.98	8.60	17.58	**8.79**	
0+210-0+216.6	9.40 + 6.60 = 16.00 / 2			**8.00**	LONG.
(-) AREA POZO DE VISITA	0.60 X 0.60 = 0.36 X 3.1416 = -1.13 M2				

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No.: 03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A7 **PAVIMENTACION**

32-0475A PAVIMENTO PREMEZCLADO F´C= 300 KG/CM2, T.A.M. 3/4" DE 20 CM. DE ESPESOR RESISTENCIA NORMAL, ACABADO A REGLA INCLUYE: JUNTA CONSTRUCTIVA CON CHAFLAN DE 1/2", EN CADA JUNTA FRIA (AL TERMINO DEL COLADO) SE PROCEDERA A COLOCAR 8 CONECTORES CON VARILLA DE 1/2" A CADA 60 CMS 30-30 CMS. FIBRA MICROSINTETICA, CURADO CON CURACRETO, VIBRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 1RA. ESTACION.

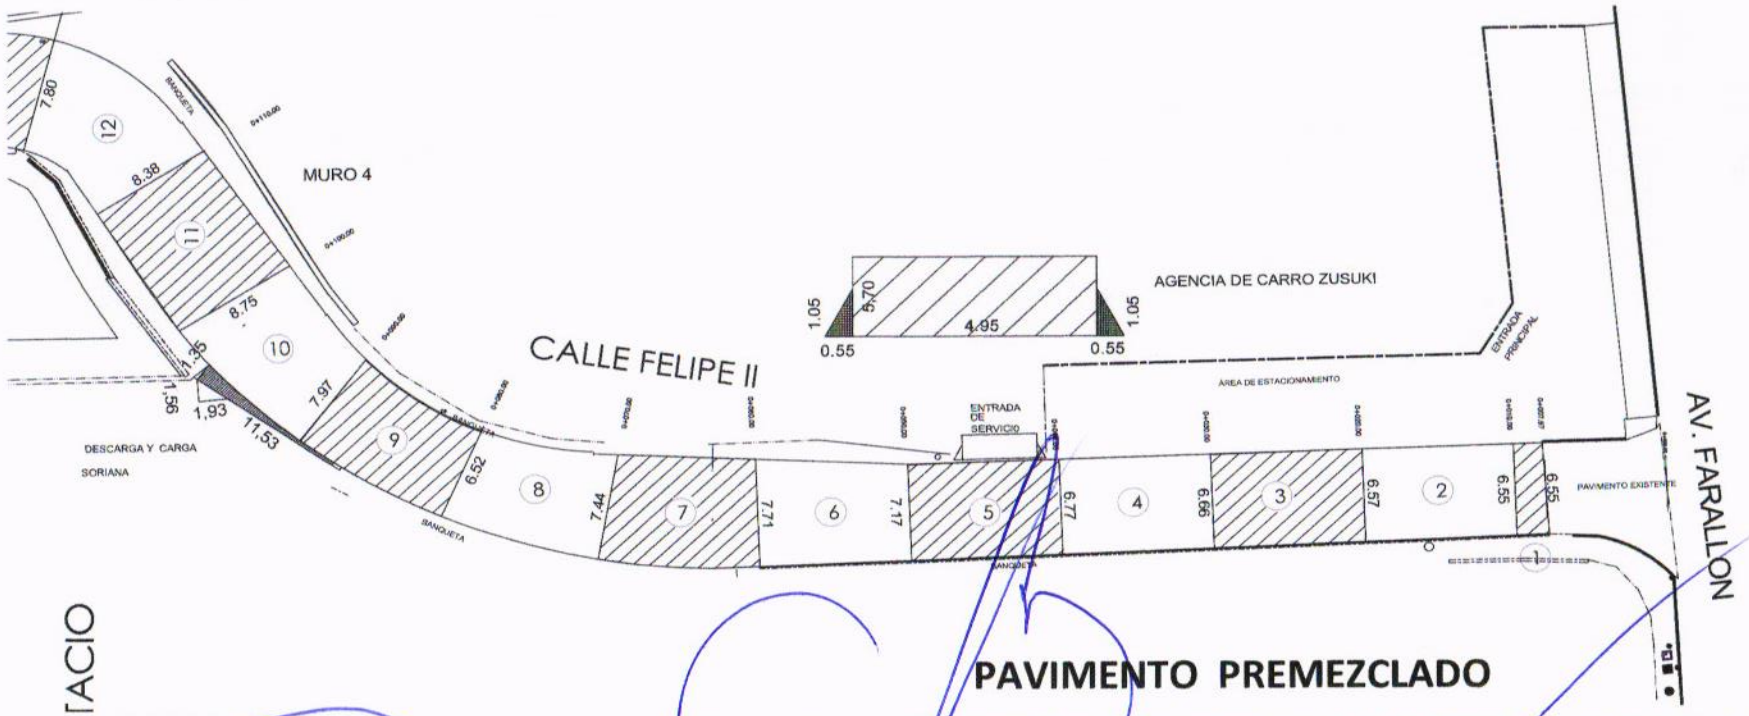

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No.: 03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A7 **PAVIMENTACION**

32-0475A PAVIMENTO PREMEZCLADO F¨C= 300 KG/CM2, T.A.M. 3/4" DE 20 CM. DE ESPESOR RESISTENCIA NORMAL, ACABADO A REGLA INCLUYE: JUNTA CONSTRUCTIVA CON CHAFLAN DE 1/2", EN CADA JUNTA FRIA (AL TERMINO DEL COLADO) SE PROCEDERA A COLOCAR 8 CONECTORES CON VARILLA DE 1/2" A CADA 60 CMS 30-30 CMS. FIBRA MICROSINTETICA, CURADO CON CURACRETO, VIBRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 1RA. ESTACION.



IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES)
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023

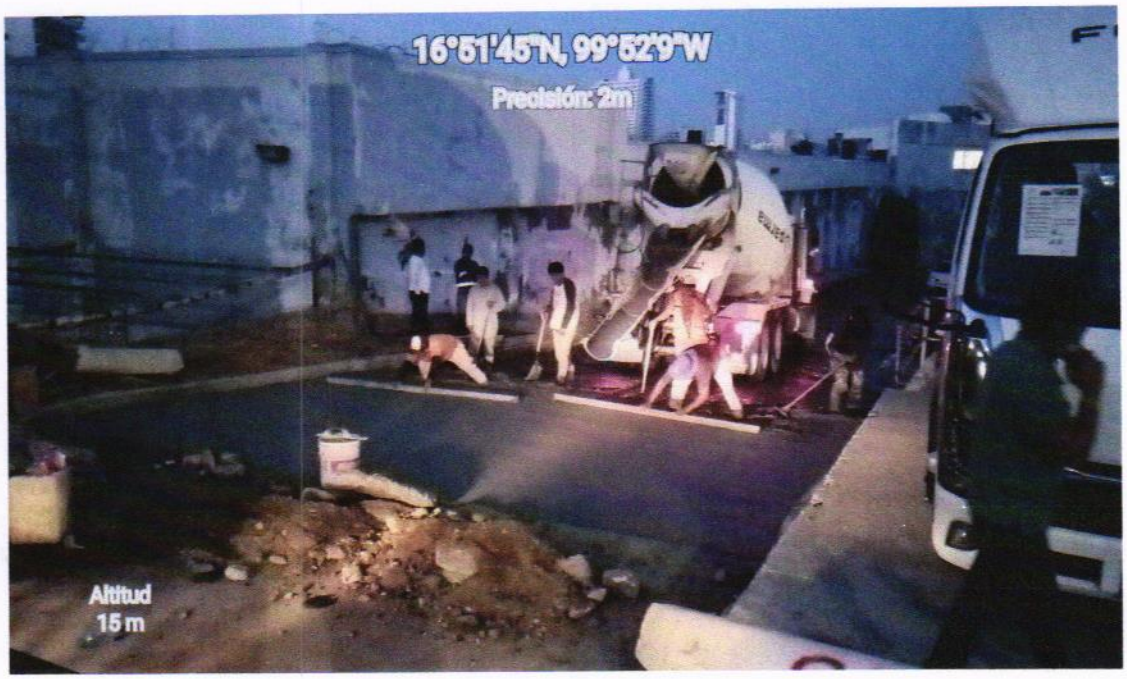

32-0475A.- PAVIMENTO PREMEZCLADOF'C= 300 KG/CM2, T.A.M. 3/4" DE 20 CM. DE ESPESOR RESISTENCIA NORMAL, ACABADO A REGLA INCLUYE: JUNTA CONSTRUCTIVA CON CHAFLAN DE 1/2", EN CADA JUNTA FRIA (AL TERMINO DEL COLADO) SE PROCEDERA A COLOCAR 8 CONECTORES CON VARILLA DE 1/2" A CADA 60 CMS 30-30 CMS. FIBRA MICROSINTETICA, CURADO CON CURACRETO, VIBRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 1RA. ESTACION.



32-0475A.- PAVIMENTO PREMEZCLADOF'C= 300 KG/CM2, T.A.M. 3/4" DE 20 CM. DE ESPESOR RESISTENCIA NORMAL, ACABADO A REGLA INCLUYE: JUNTA CONSTRUCTIVA CON CHAFLAN DE 1/2", EN CADA JUNTA FRIA (AL TERMINO DEL COLADO) SE PROCEDERA A COLOCAR 8 CONECTORES CON VARILLA DE 1/2" A CADA 60 CMS 30-30 CMS. FIBRA MICROSINTETICA, CURADO CON CURACRETO, VIBRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 1RA. ESTACION.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES)
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023



32-0475A.- PAVIMENTO PREMEZCLADO F'C= 300 KG/CM2, T.A.M. 3/4" DE 20 CM. DE ESPESOR RESISTENCIA NORMAL, ACABADO A REGLA INCLUYE: JUNTA CONSTRUCTIVA CON CHAFLAN DE 1/2", EN CADA JUNTA FRIA (AL TERMINO DEL COLADO) SE PROCEDERA A COLOCAR 8 CONECTORES CON VARILLA DE 1/2" A CADA 60 CMS 30-30 CMS. FIBRA MICROSINTETICA, CURADO CON CURACRETO, VIBRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 1RA. ESTACION.




32-0475A.- PAVIMENTO PREMEZCLADO F'C= 300 KG/CM2, T.A.M. 3/4" DE 20 CM. DE ESPESOR RESISTENCIA NORMAL, ACABADO A REGLA INCLUYE: JUNTA CONSTRUCTIVA CON CHAFLAN DE 1/2", EN CADA JUNTA FRIA (AL TERMINO DEL COLADO) SE PROCEDERA A COLOCAR 8 CONECTORES CON VARILLA DE 1/2" A CADA 60 CMS 30-30 CMS. FIBRA MICROSINTETICA, CURADO CON CURACRETO, VIBRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 1RA. ESTACION.


IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES)
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023

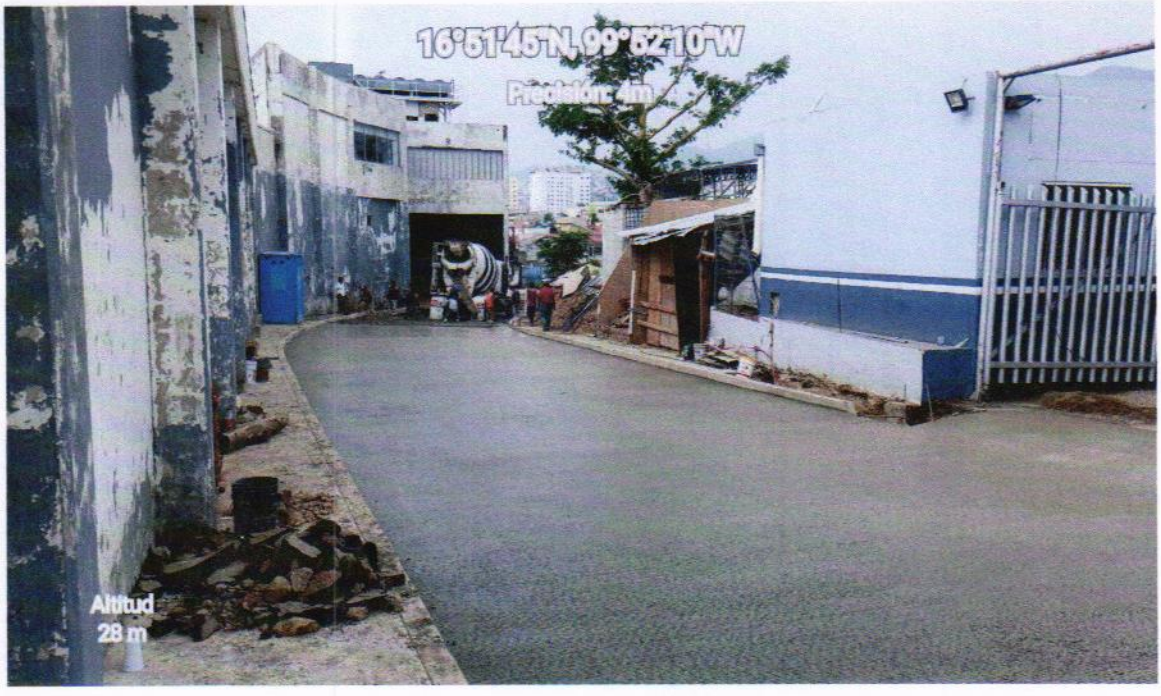

32-0475A.- PAVIMENTO PREMEZCLADO F'C= 300 KG/CM2, T.A.M. 3/4" DE 20 CM. DE ESPESOR RESISTENCIA NORMAL, ACABADO A REGLA INCLUYE: JUNTA CONSTRUCTIVA CON CHAFLAN DE 1/2", EN CADA JUNTA FRIA (AL TERMINO DEL COLADO) SE PROCEDERA A COLOCAR 8 CONECTORES CON VARILLA DE 1/2" A CADA 60 CMS 30-30 CMS. FIBRA MICROSINTETICA, CURADO CON CURACRETO, VIBRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 1RA. ESTACION.

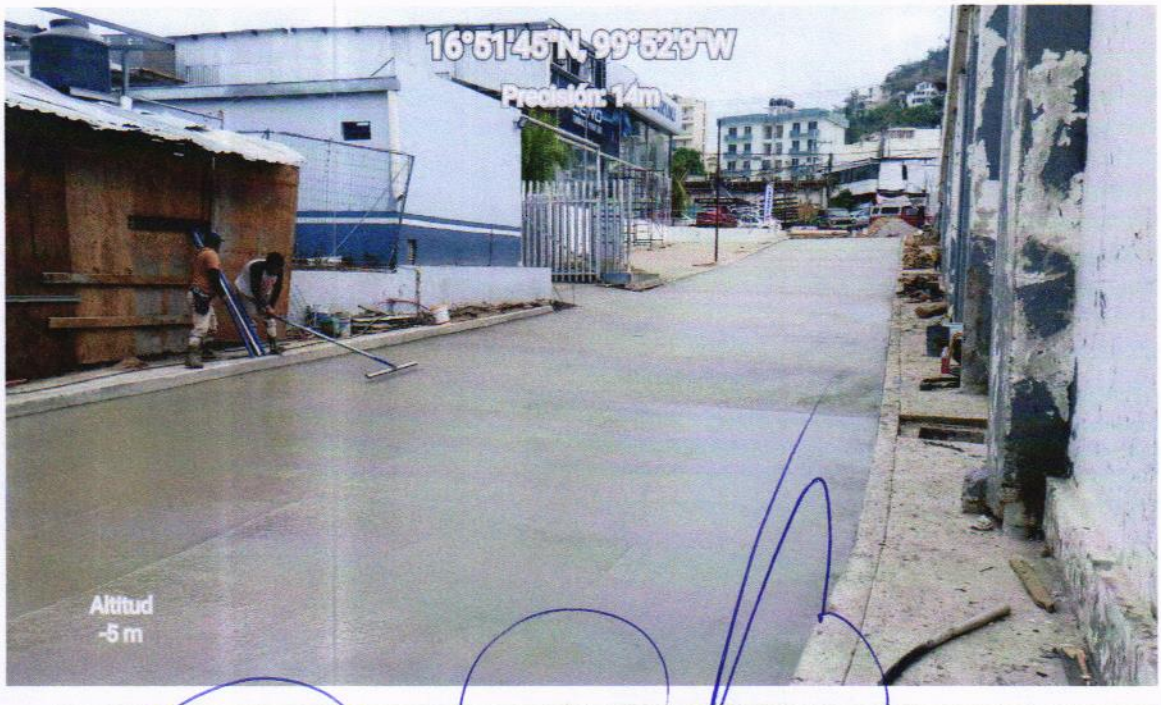

32-0475A.- PAVIMENTO PREMEZCLADO F'C= 300 KG/CM2, T.A.M. 3/4" DE 20 CM. DE ESPESOR RESISTENCIA NORMAL, ACABADO A REGLA INCLUYE: JUNTA CONSTRUCTIVA CON CHAFLAN DE 1/2", EN CADA JUNTA FRIA (AL TERMINO DEL COLADO) SE PROCEDERA A COLOCAR 8 CONECTORES CON VARILLA DE 1/2" A CADA 60 CMS 30-30 CMS. FIBRA MICROSINTETICA, CURADO CON CURACRETO, VIBRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 1RA. ESTACION.


IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES)
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023



32-0475A.- PAVIMENTO PREMEZCLADOF'C= 300 KG/CM2, T.A.M. 3/4" DE 20 CM. DE ESPESOR RESISTENCIA NORMAL, ACABADO A REGLA INCLUYE: JUNTA CONSTRUCTIVA CON CHAFLAN DE 1/2", EN CADA JUNTA FRIA (AL TERMINO DEL COLADO) SE PROCEDERA A COLOCAR 8 CONECTORES CON VARILLA DE 1/2" A CADA 60 CMS 30-30 CMS. FIBRA MICROSINTETICA, CURADO CON CURACRETO, VIBRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 1RA. ESTACION.

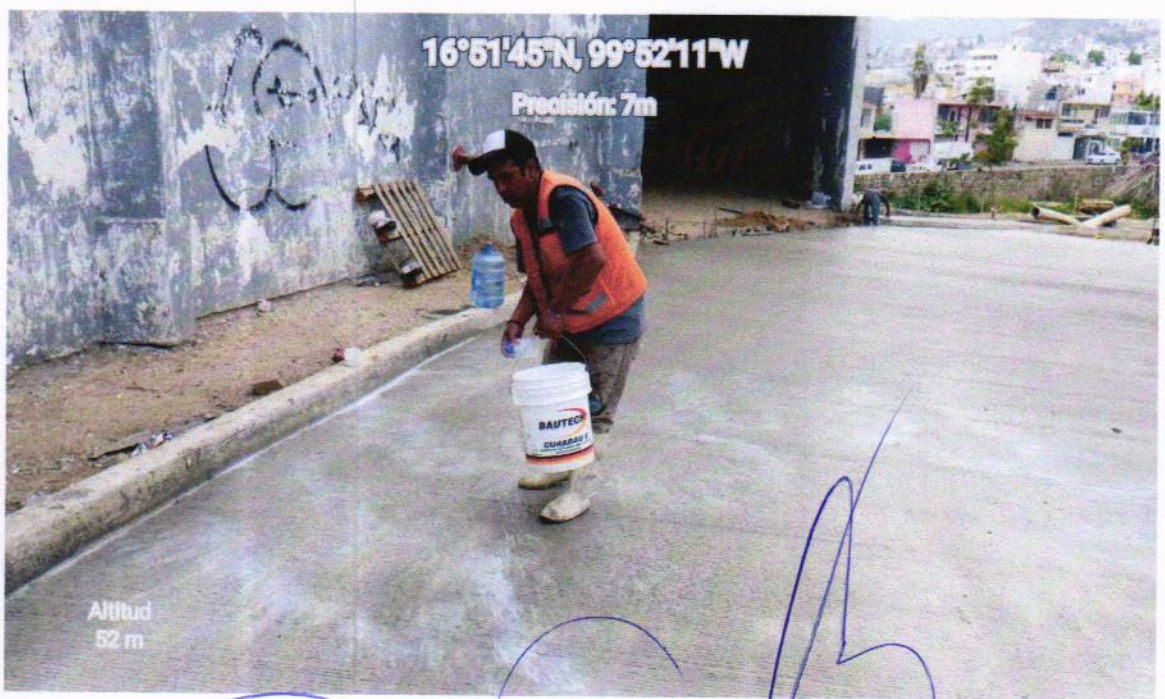

32-0475A.- PAVIMENTO PREMEZCLADOF'C= 300 KG/CM2, T.A.M. 3/4" DE 20 CM. DE ESPESOR RESISTENCIA NORMAL, ACABADO A REGLA INCLUYE: JUNTA CONSTRUCTIVA CON CHAFLAN DE 1/2", EN CADA JUNTA FRIA (AL TERMINO DEL COLADO) SE PROCEDERA A COLOCAR 8 CONECTORES CON VARILLA DE 1/2" A CADA 60 CMS 30-30 CMS. FIBRA MICROSINTETICA, CURADO CON CURACRETO, VIBRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 1RA. ESTACION.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023



32-0475A.- PAVIMENTO PREMEZCLADOF'C= 300 KG/CM2, T.A.M. 3/4" DE 20 CM. DE ESPESOR RESISTENCIA NORMAL, ACABADO A REGLA INCLUYE: JUNTA CONSTRUCTIVA CON CHAFLAN DE 1/2", EN CADA JUNTA FRIA (AL TERMINO DEL COLADO) SE PROCEDERA A COLOCAR 8 CONECTORES CON VARILLA DE 1/2" A CADA 60 CMS 30-30 CMS. FIBRA MICROSINTETICA, CURADO CON CURACRETO, VIBRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 1RA. ESTACION.



32-0475A.- PAVIMENTO PREMEZCLADOF'C= 300 KG/CM2, T.A.M. 3/4" DE 20 CM. DE ESPESOR RESISTENCIA NORMAL, ACABADO A REGLA INCLUYE: JUNTA CONSTRUCTIVA CON CHAFLAN DE 1/2", EN CADA JUNTA FRIA (AL TERMINO DEL COLADO) SE PROCEDERA A COLOCAR 8 CONECTORES CON VARILLA DE 1/2" A CADA 60 CMS 30-30 CMS. FIBRA MICROSINTETICA, CURADO CON CURACRETO, VIBRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 1RA. ESTACION.

IMEKA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023



32-0475A.- PAVIMENTO PREMEZCLADOF'C= 300 KG/CM2, T.A.M. 3/4" DE 20 CM. DE ESPESOR RESISTENCIA NORMAL, ACABADO A REGLA INCLUYE: JUNTA CONSTRUCTIVA CON CHAFLAN DE 1/2", EN CADA JUNTA FRIA (AL TERMINO DEL COLADO) SE PROCEDERA A COLOCAR 8 CONECTORES CON VARILLA DE 1/2" A CADA 60 CMS 30-30 CMS. FIBRA MICROSINTETICA, CURADO CON CURACRETO, VIBRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 1RA. ESTACION.



32-0475A.- PAVIMENTO PREMEZCLADOF'C= 300 KG/CM2, T.A.M. 3/4" DE 20 CM. DE ESPESOR RESISTENCIA NORMAL, ACABADO A REGLA INCLUYE: JUNTA CONSTRUCTIVA CON CHAFLAN DE 1/2", EN CADA JUNTA FRIA (AL TERMINO DEL COLADO) SE PROCEDERA A COLOCAR 8 CONECTORES CON VARILLA DE 1/2" A CADA 60 CMS 30-30 CMS. FIBRA MICROSINTETICA, CURADO CON CURACRETO, VIBRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 1RA. ESTACION.


IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	**RESIDENTE DE OBRA** ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA** ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023



32-0475A.- PAVIMENTO PREMEZCLADOF'C= 300 KG/CM2, T.A.M. 3/4" DE 20 CM. DE ESPESOR RESISTENCIA NORMAL, ACABADO A REGLA INCLUYE: JUNTA CONSTRUCTIVA CON CHAFLAN DE 1/2", EN CADA JUNTA FRIA (AL TERMINO DEL COLADO) SE PROCEDERA A COLOCAR 8 CONECTORES CON VARILLA DE 1/2" A CADA 60 CMS 30-30 CMS. FIBRA MICROSINTETICA, CURADO CON CURACRETO, VIBRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 1RA. ESTACION.

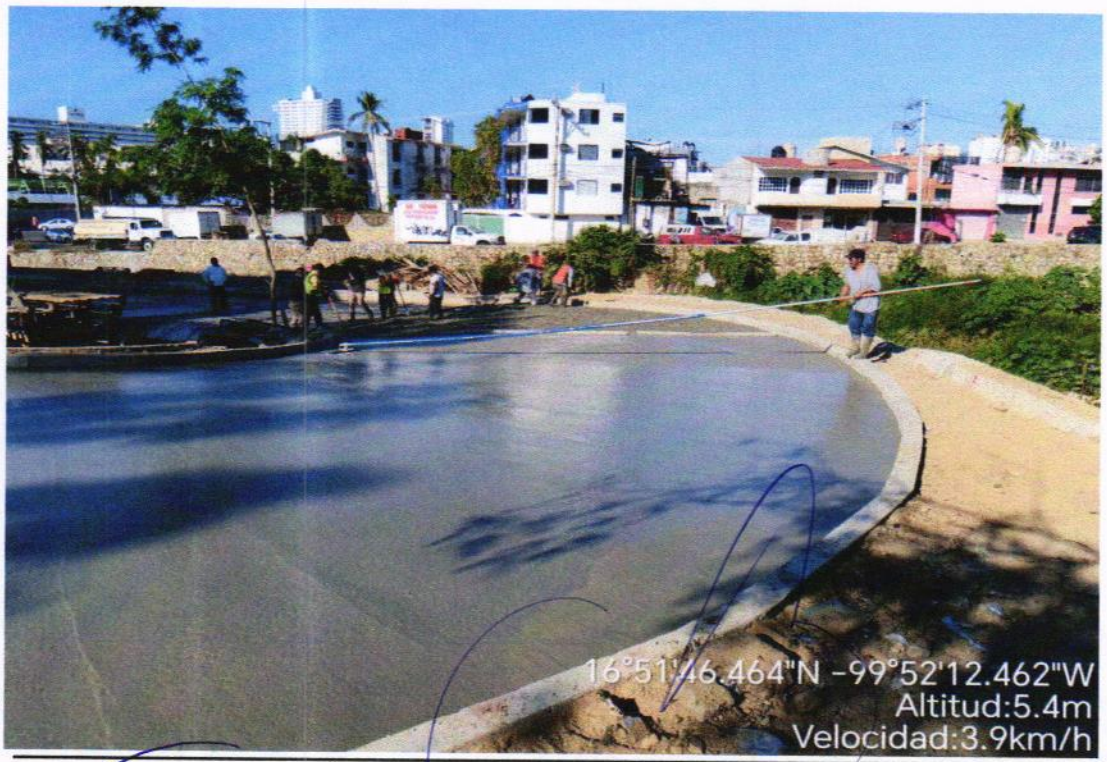

32-0475A.- PAVIMENTO PREMEZCLADOF'C= 300 KG/CM2, T.A.M. 3/4" DE 20 CM. DE ESPESOR RESISTENCIA NORMAL, ACABADO A REGLA INCLUYE: JUNTA CONSTRUCTIVA CON CHAFLAN DE 1/2", EN CADA JUNTA FRIA (AL TERMINO DEL COLADO) SE PROCEDERA A COLOCAR 8 CONECTORES CON VARILLA DE 1/2" A CADA 60 CMS 30-30 CMS. FIBRA MICROSINTETICA, CURADO CON CURACRETO, VIBRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 1RA. ESTACION.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 03 (TRES) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO	ALTO	LARGO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A7	**PAVIMENTACIÓN**		1		6.55		2.00	M2	**13.10**	0+008-0+010
SUMPOL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO CALIBRE 600 PARA EVITAR DESHIDRATACION DEL CONCRETO, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.		2		6.55		10.00	M2	**65.50**	0+010-0+020
			3		6.62		10.00	M2	**66.20**	0+02-0+030
			4		6.72		10.00	M2	**67.20**	0+03-0+040
			5		6.97		10.00	M2	**69.70**	0+040-0+050
		RAMPA ACCESO SUZUKI	TRIANGULOS	2.00	0.55	0.50	1.05	M2	**0.57**	0+040-0+050
			RECTANGULO	1.00	1.75		4.95	M2	**8.66**	0+040-0+050
			6		7.44		10.00	M2	**74.40**	0+050-0+060
			7		7.58		10.00	M2	**75.80**	0+060-0+070
			8		6.98		10.00	M2	**69.80**	0+080-0+080
			9		7.25		10.00	M2	**72.50**	0+080-0+090
		ACCESO DESCARGA SORIANA	TRIANGULO	1.00	1.35	0.50	11.53	M2	**7.78**	0+090-0+100
			TRIANGULO	1.00	2.60	0.50	2.70	M2	**3.51**	0+090-0+100
			10		8.36		10.00	M2	**83.60**	0+090-0+100
			11		8.55		10.00	M2	**85.50**	0+100-0+110
			12		8.08		10.00	M2	**80.80**	0+110-0+120
			13		8.02		10.00	M2	**80.20**	0+120-0+130
			14		8.12		10.00	M2	**81.20**	0+130-0+140
					SUBTOTAL HOJA 1			M2	1,006.02	

CAD.	ANCHOS		SUMA	ANCHO PROMEDIO 1/2
0+008-0+010	6.55	6.55	13.10	**6.55**
0+010-0+020	6.55	6.55	13.10	**6.55**
0+020-0+030	6.57	6.66	13.23	**6.62**
0+030-0+040	6.66	6.77	13.43	**6.72**
0+040-0+050	6.77	7.17	13.94	**6.97**
0+050-0+060	7.17	7.71	14.88	**7.44**
0+060-0+070	7.71	7.44	15.15	**7.58**
0+080-0+080	7.44	6.52	13.96	**6.98**
0+080-0+090	6.52	7.97	14.49	**7.25**
0+090-0+100	7.97	8.75	16.72	**8.36**
0+100-0+110	8.75	8.38	17.13	**8.57**
0+110-0+120	8.38	7.80	16.18	**8.09**
0+120-0+130	7.80	8.24	16.04	**8.02**
0+130-0+140	8.24	8.00	16.24	**8.12**

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 03 (TRES) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2023	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO	ALTO	LARGO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A7	**PAVIMENTACIÓN**									
SUMPOL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO CALIBRE 600 PARA EVITAR DESHIDRATACION DEL CONCRETO, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	AREA DE PATIO DE MANIOBRAS (TRIANGULO)		1.00	4.00	0.50	2.30	M2	**4.60**	0+130-0+140
			15		7.87		10.00	M2	**78.70**	0+140-0+150
		(-) AREA DESCARGA		1.00	-2.00		1.35	M2	**-2.70**	0+140-0+150
			16		7.70		10.00	M2	**77.00**	0+150-0+160
			17		7.70		10.00	M2	**77.00**	0+160-0+170
			18		7.89		10.00	M2	**78.90**	0+170-0+180
			19		8.14		10.00	M2	**81.40**	0+180-0+190
		(-) REGISTRO SANITARIO			-1.04		1.30	M2	**-1.35**	0+180-0+190
			20		8.62		10.00	M2	**86.20**	0+190-0+200
		(-) AREA POSTE DE LUZ (TRIANGULO)		2.00	-2.25	0.50	1.20	M2	**-2.70**	0+190-0+200
			21		8.79		10.00	M2	**87.90**	0+200-0+210
			22		8.60		8.00	M2	**68.80**	0+210-0+216.6
		(-) AREA DE POZO DE VISITA		2.00	-1.13			M2	**-2.26**	0+175 Y 0+216
						SUBTOTAL HOJA 2		M2	**631.49**	
						SUBTOTAL HOJA 1		M2	**1,006.02**	
							TOTAL	M2	**1,637.51**	

CAD	ANCHOS		SUMA	ANCHO PROMEDIO 1/2	
0+140-0+150	8.00	7.74	15.74	**7.87**	
0+150-0+160	7.74	7.65	15.39	**7.70**	
0+160-0+170	7.65	7.75	15.40	**7.70**	
0+170-0+180	7.75	8.03	15.78	**7.89**	
0+180-0+190	8.03	8.25	16.28	**8.14**	
0+190-0+200	8.25	8.98	17.23	**8.62**	
0+200-0+210	8.98	8.60	17.58	**8.79**	
0+210-0+216.6	9.40 + 6.60 = 16.00 / 2			**8.00**	LONG.
(-) AREA POZO DE VISITA	0.60 X 0.60 = 0.36 X 3.1416 = -1.13 M2				

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No.: 03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A7 **PAVIMENTACION**

SUMPOL SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO CALIBRE 600 PARA EVITAR DESHIDRATACION DEL CONCRETO, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

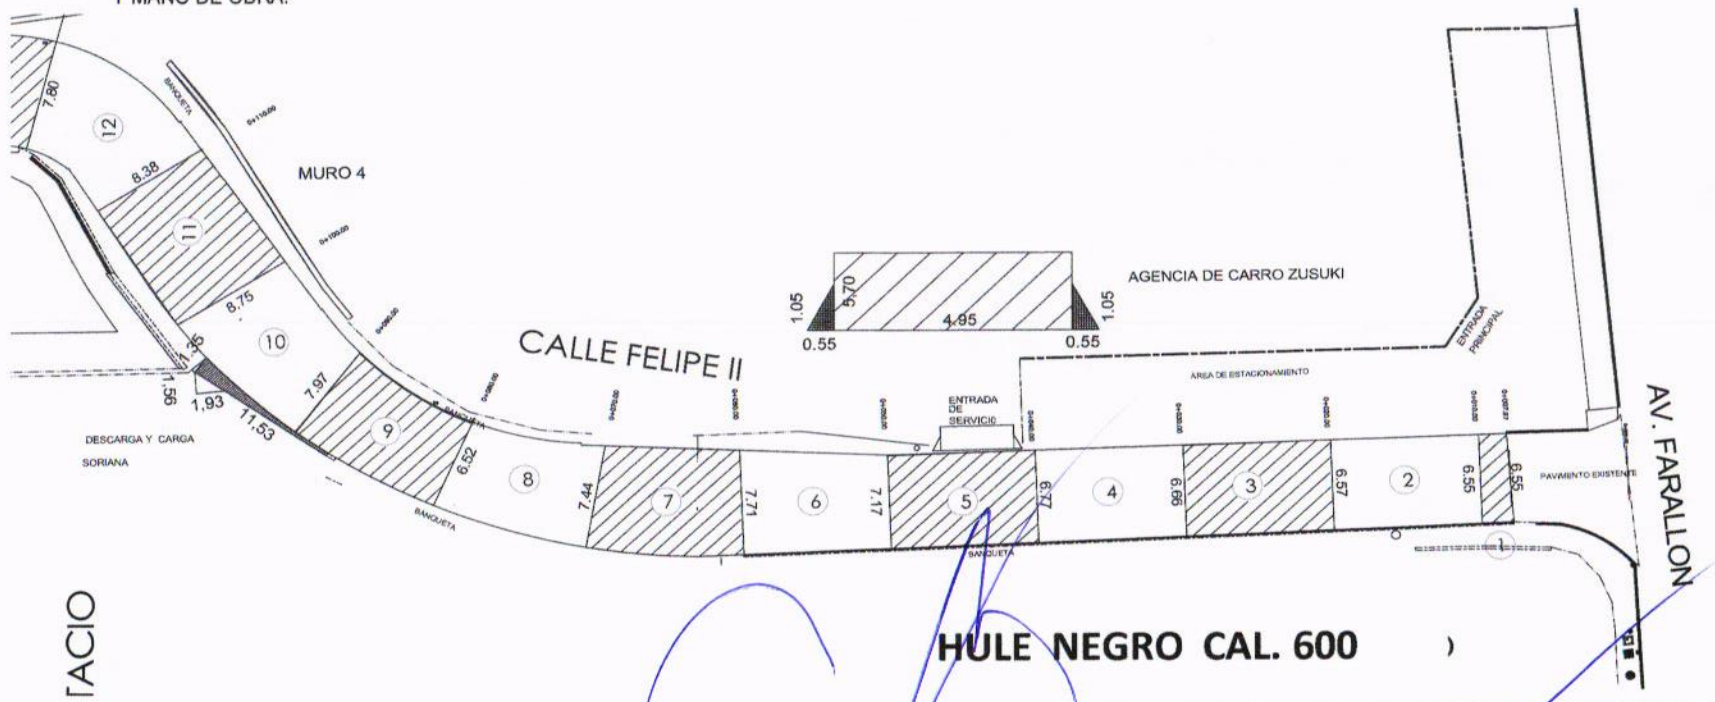

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No.: 03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A7 **PAVIMENTACION**

SUMPOL SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO CALIBRE 600 PARA EVITAR DESHIDRATACION DEL CONCRETO, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

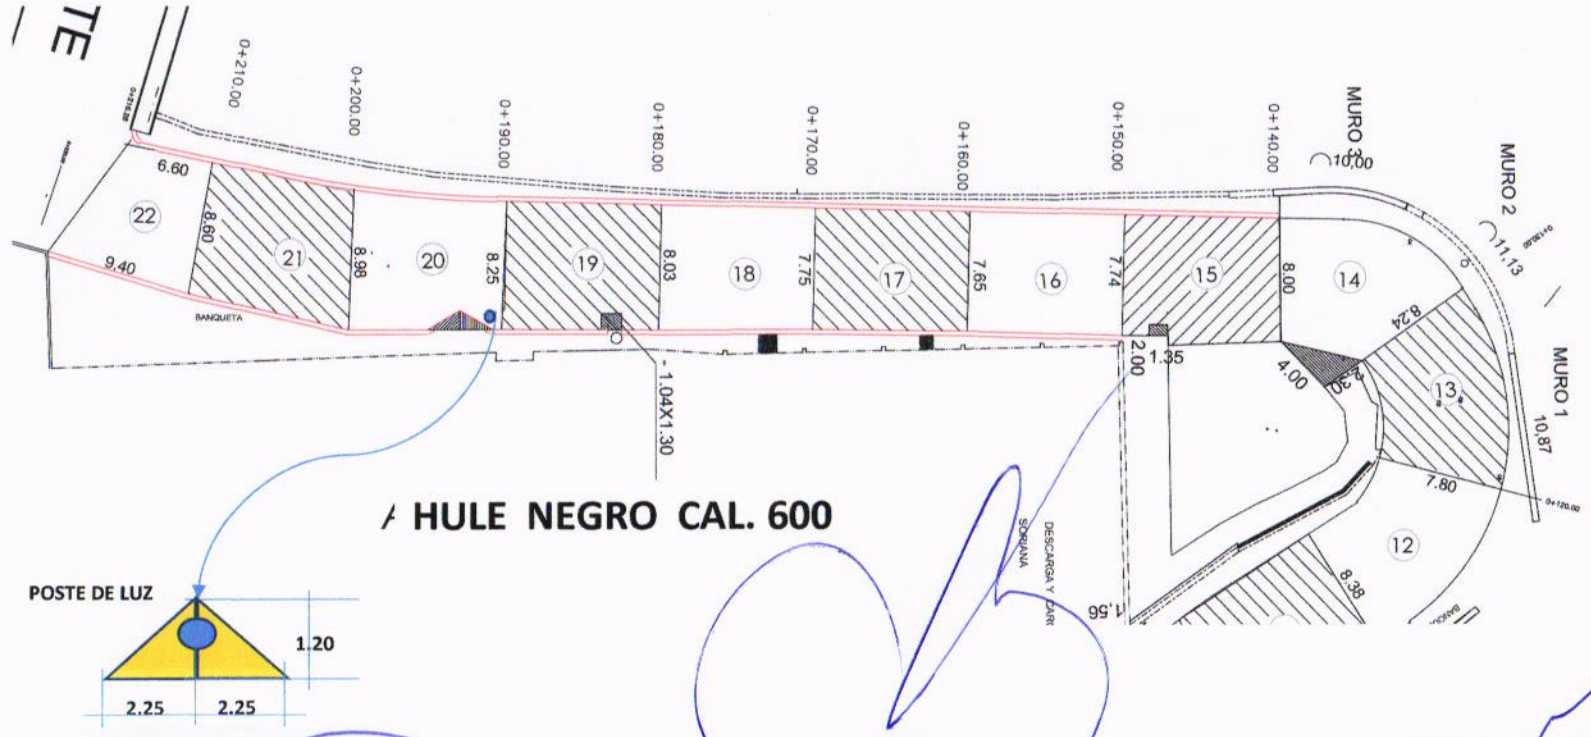

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES)
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023



SUMPOL.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO CALIBRE 600 PARA EVITAR DESHIDRATACION DEL CONCRETO, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.




SUMPOL.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO CALIBRE 600 PARA EVITAR DESHIDRATACION DEL CONCRETO, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.


IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES)
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023

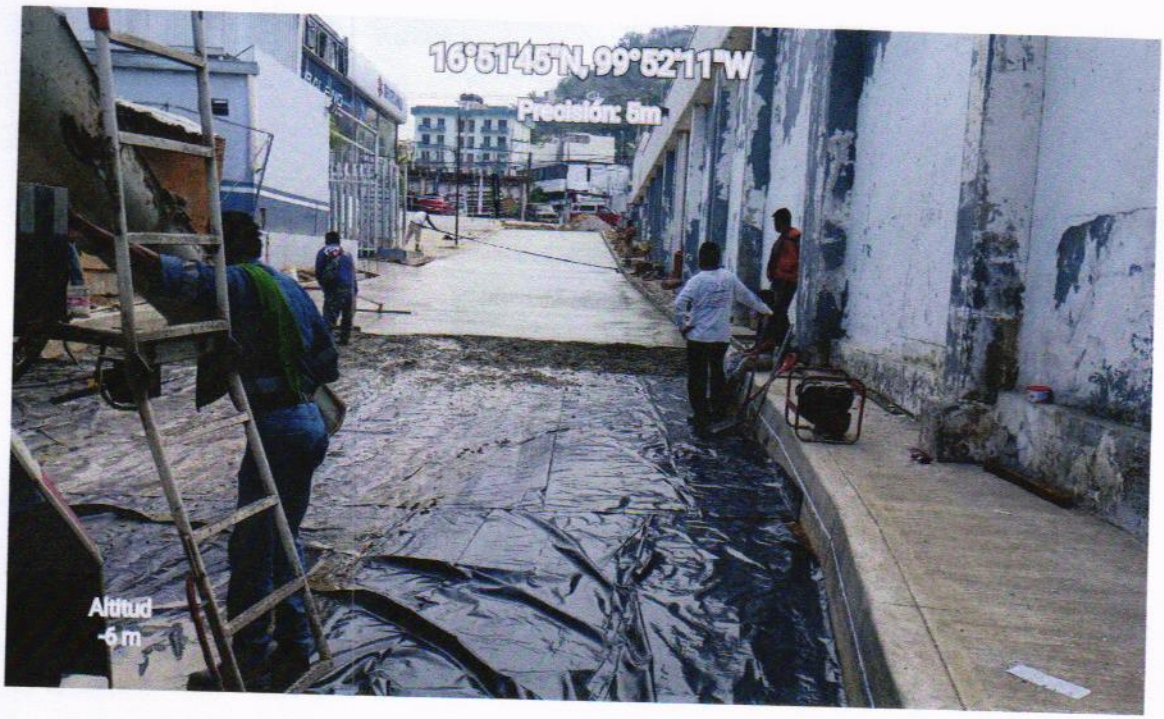

SUMPOL.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO CALIBRE 600 PARA EVITAR DESHIDRATACION DEL CONCRETO, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

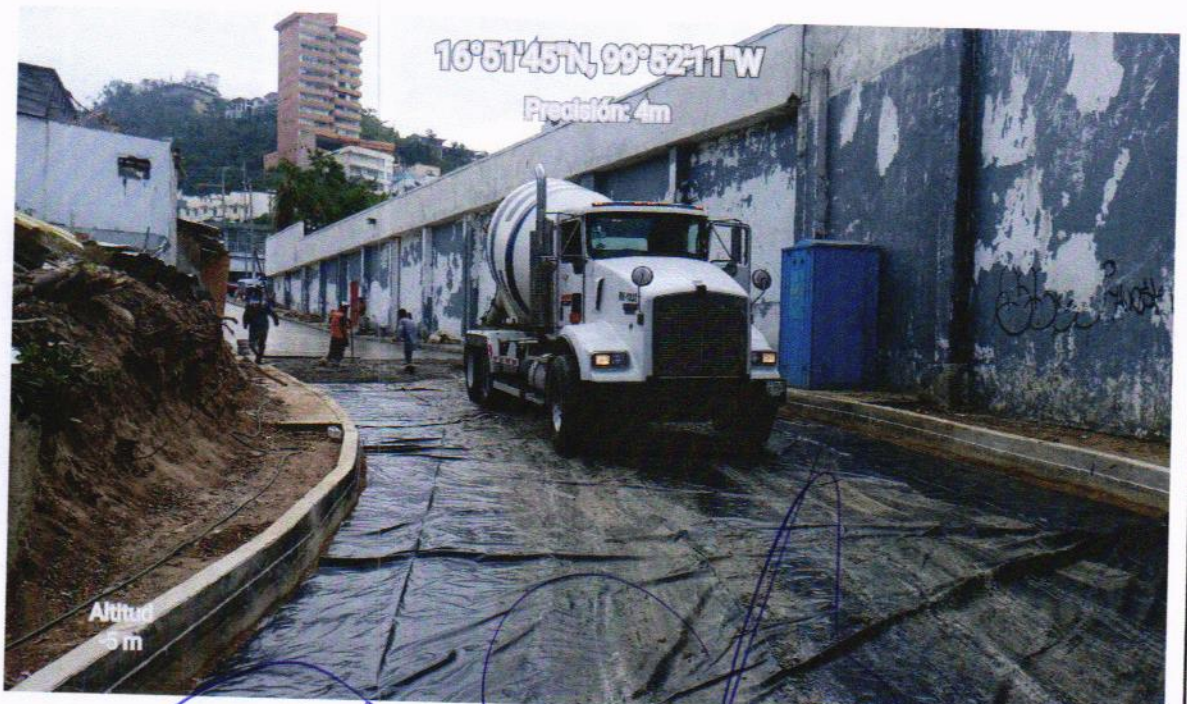


SUMPOL.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO CALIBRE 600 PARA EVITAR DESHIDRATACION DEL CONCRETO, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES)
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023

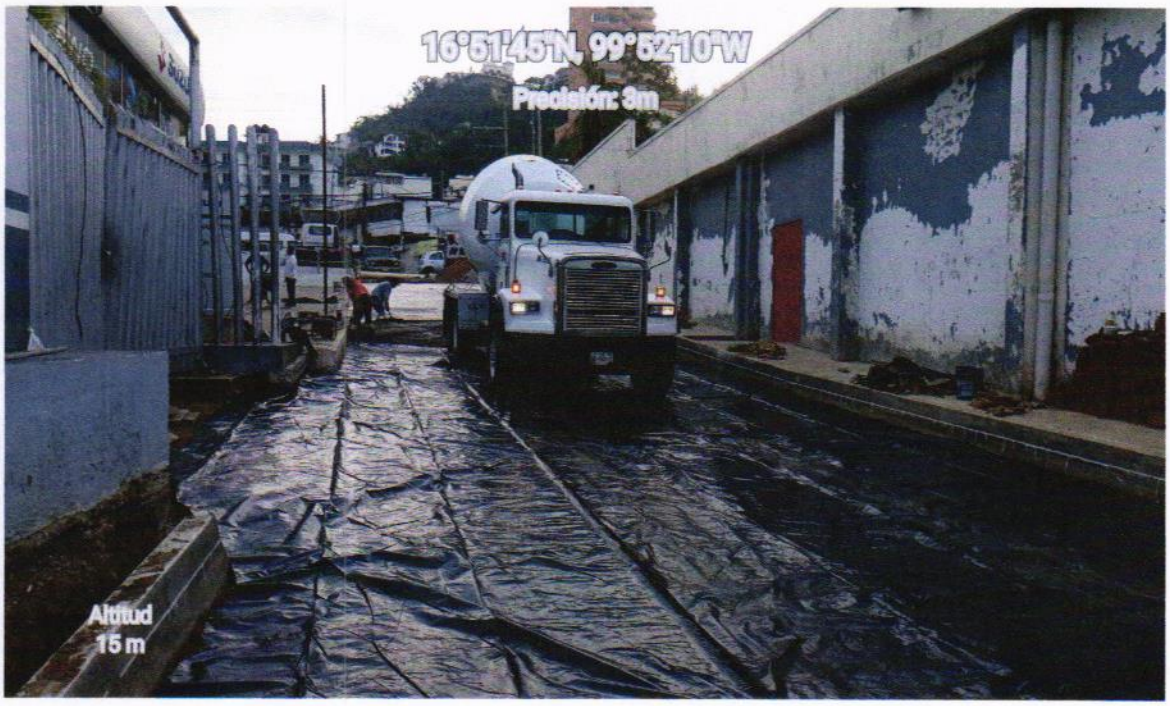

SUMPOL.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO CALIBRE 600 PARA EVITAR DESHIDRATACION DEL CONCRETO, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.




SUMPOL.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO CALIBRE 600 PARA EVITAR DESHIDRATACION DEL CONCRETO, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.


IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023

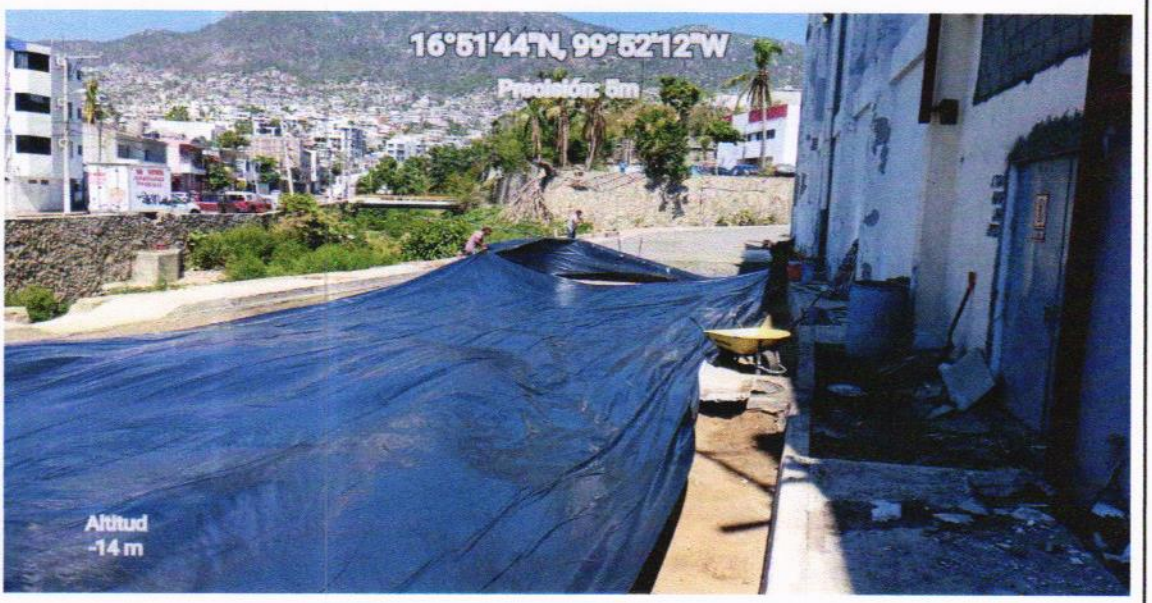

SUMPOL.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO CALIBRE 600 PARA EVITAR DESHIDRATACION DEL CONCRETO, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

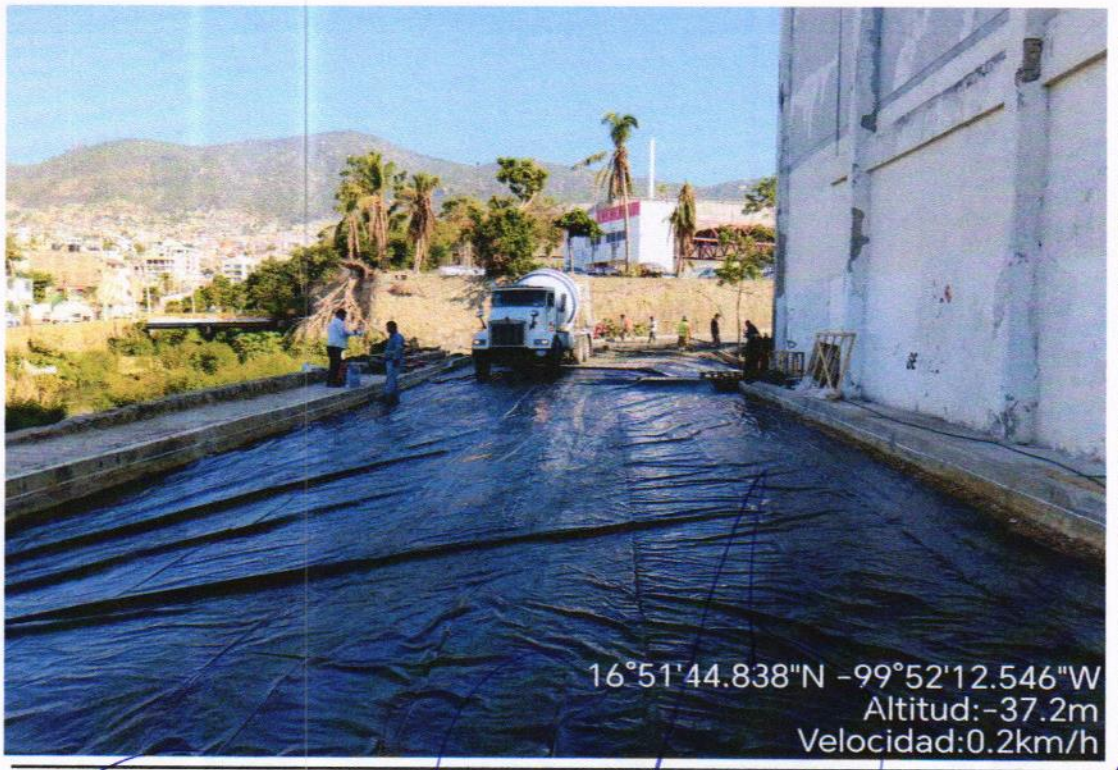

SUMPOL.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO CALIBRE 600 PARA EVITAR DESHIDRATACION DEL CONCRETO, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 03 (TRES) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2023	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A7	**PAVIMENTACIÓN**									
CORTE01	CORTE DE JUNTAS EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA MANUAL DE DISCO DIAMANTADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA.				6.55			ML	6.55	0+010
					6.55			ML	6.55	
					6.6			ML	6.60	
					6.57			ML	6.57	0+020
					6.62			ML	6.62	
					6.65			ML	6.65	
					6.65			ML	6.65	0+030
					6.68			ML	6.68	
					6.72			ML	6.72	
					6.77			ML	6.77	0+040
					6.85			ML	6.85	
					6.96			ML	6.96	
					7.15			ML	7.15	
					7.30			ML	7.30	0+050
					7.46			ML	7.46	
					7.64			ML	7.64	
					7.80			ML	7.80	0+060
					7.83			ML	7.83	
					7.64			ML	7.64	
					7.28			ML	7.28	0+070
					7.00			ML	7.00	
					6.68			ML	6.68	
					6.51			ML	6.51	0+080
					6.52			ML	6.52	
					7.30			ML	7.30	
						SUBTOTAL HOJA 1		ML	174.28	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 03 (TRES) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2023	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A7	**PAVIMENTACIÓN**									
CORTE01	CORTE DE JUNTAS EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA MANUAL DE DISCO DIAMANTADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA.				7.98			ML	7.98	0+080
					8.01			ML	8.01	0+090
					8.34			ML	8.34	
					7.80			ML	7.80	
					8.11			ML	8.11	0+100
					7.95			ML	7.95	
					7.84			ML	7.84	
					7.68			ML	7.68	0+110
					7.69			ML	7.69	
					7.87			ML	7.87	0+120
					8.10			ML	8.10	
					8.20			ML	8.20	
					7.80			ML	7.80	0+130
					7.70			ML	7.70	
					8.00			ML	8.00	0+140
					8.00			ML	8.00	
					5.55			ML	5.55	
					7.70			ML	7.70	0+150
					7.69			ML	7.69	
					7.67			ML	7.67	
					7.63			ML	7.63	0+160
					7.67			ML	7.67	
					7.69			ML	7.69	
					7.74			ML	7.74	
						SUBTOTAL HOJA 2		**ML**	**186.41**	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 03 (TRES) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2023	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A7	**PAVIMENTACIÓN**									
CORTE01	CORTE DE JUNTAS EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA MANUAL DE DISCO DIAMANTADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA.					7.78		ML	7.78	0+170
						7.88		ML	7.88	
						7.95		ML	7.95	
						8.03		ML	8.03	0+180
						8.07		ML	8.07	
						8.13		ML	8.13	
						8.23		ML	8.23	0+190
						7.17		ML	7.17	
						8.62		ML	8.62	
						8.92		ML	8.92	
						9.32		ML	9.32	0+200
						9.07		ML	9.07	
						8.74		ML	8.74	
						8.27		ML	8.27	0+216.60
						7.95		ML	7.95	
				CORTE LONGITUDINAL		208.60		ML	208.60	
					TOTAL ML ESTA HOJA HOJA 3 =			**ML**	**332.73**	
					SUB-TOTAL ML HOJA 2 =			**ML**	**186.41**	
					SUB-TOTAL ML HOJA 1 =			**ML**	**174.28**	
							TOTAL	**ML**	**693.42**	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No.: 03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A7 **PAVIMENTACION**

CORTE01 CORTE DE JUNTAS EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA MANUAL DE DISCO DIAMANTADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA.

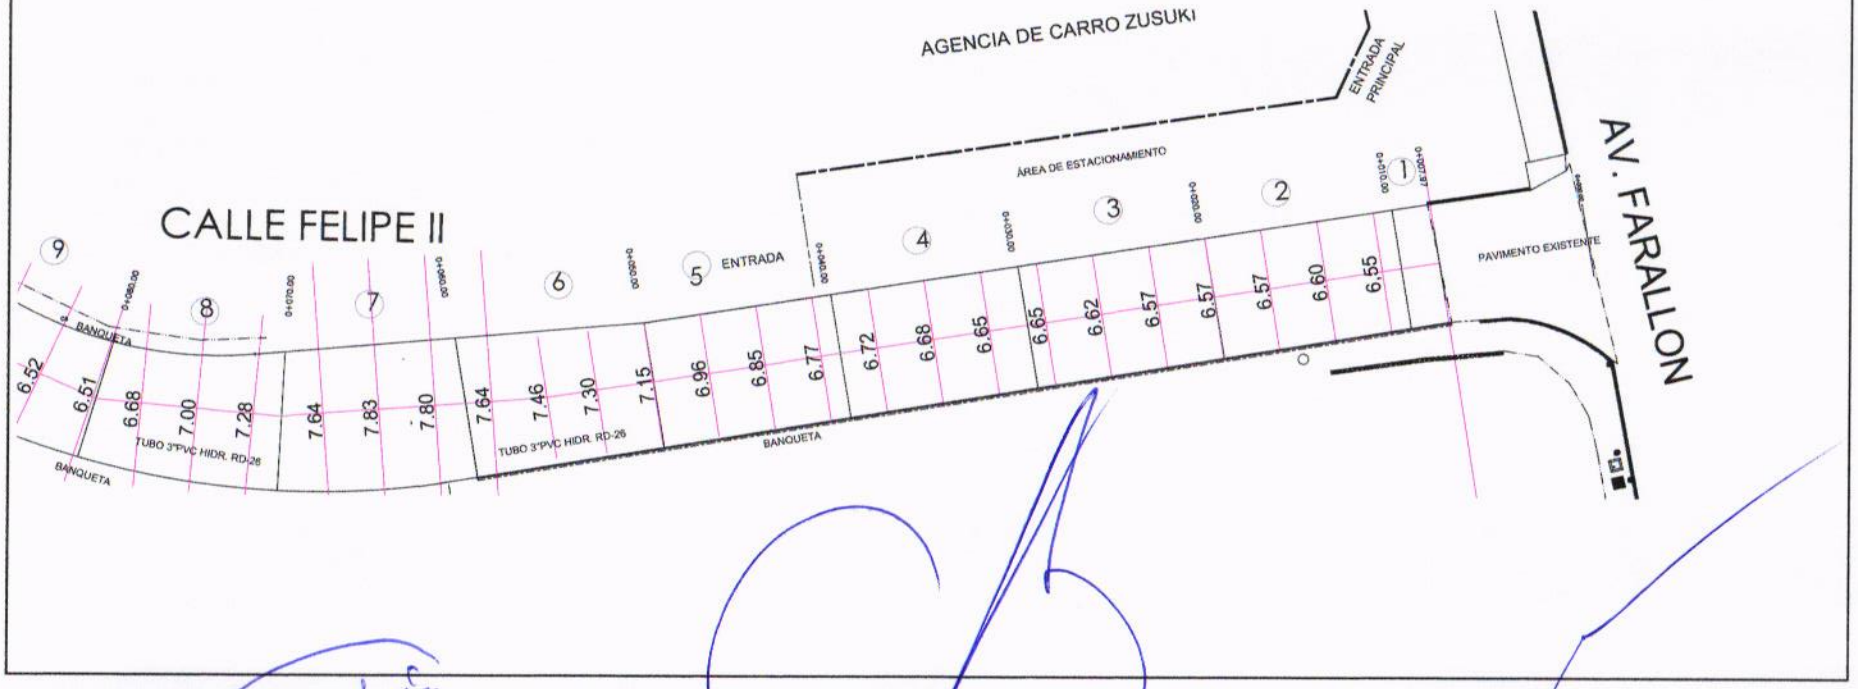

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S				
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	ESTIMACIÓN No.: 03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA:	12 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.			

C R O Q U I S

A7 **PAVIMENTACION**

CORTE01 CORTE DE JUNTAS EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA MANUAL DE DISCO DIAMANTADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA.

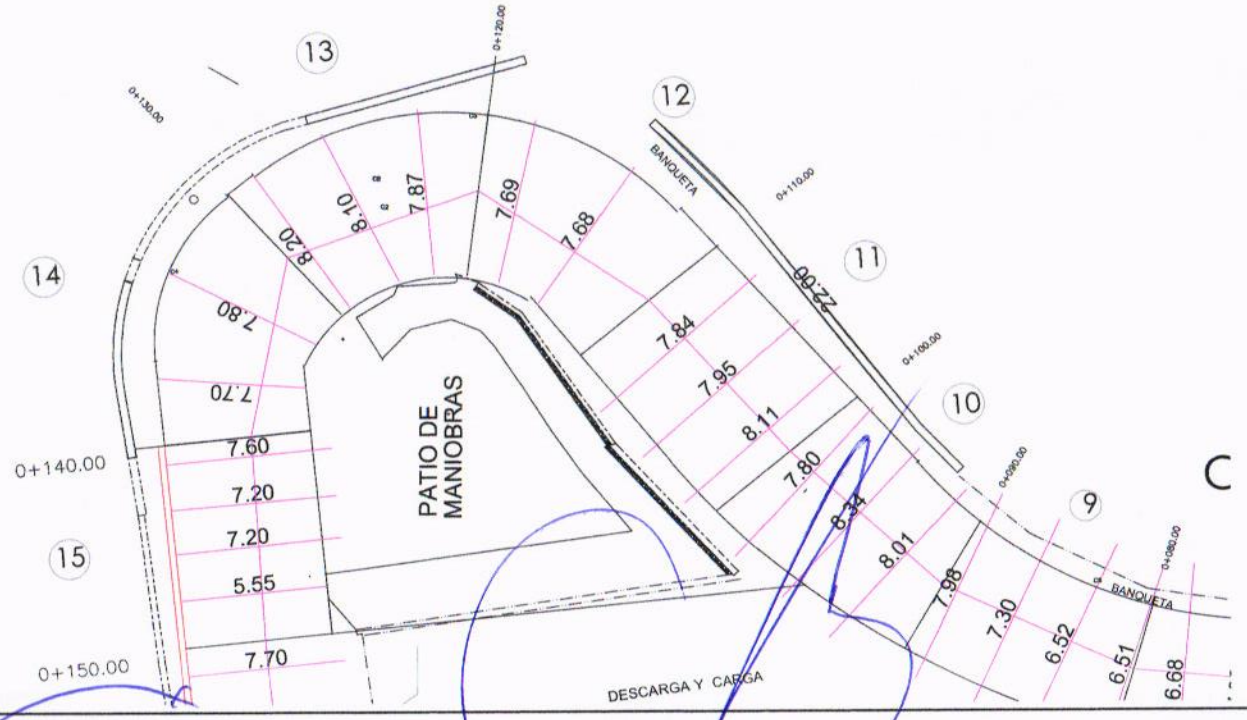

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No.: 03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A7 **PAVIMENTACION**

CORTE01 CORTE DE JUNTAS EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA MANUAL DE DISCO DIAMANTADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA.

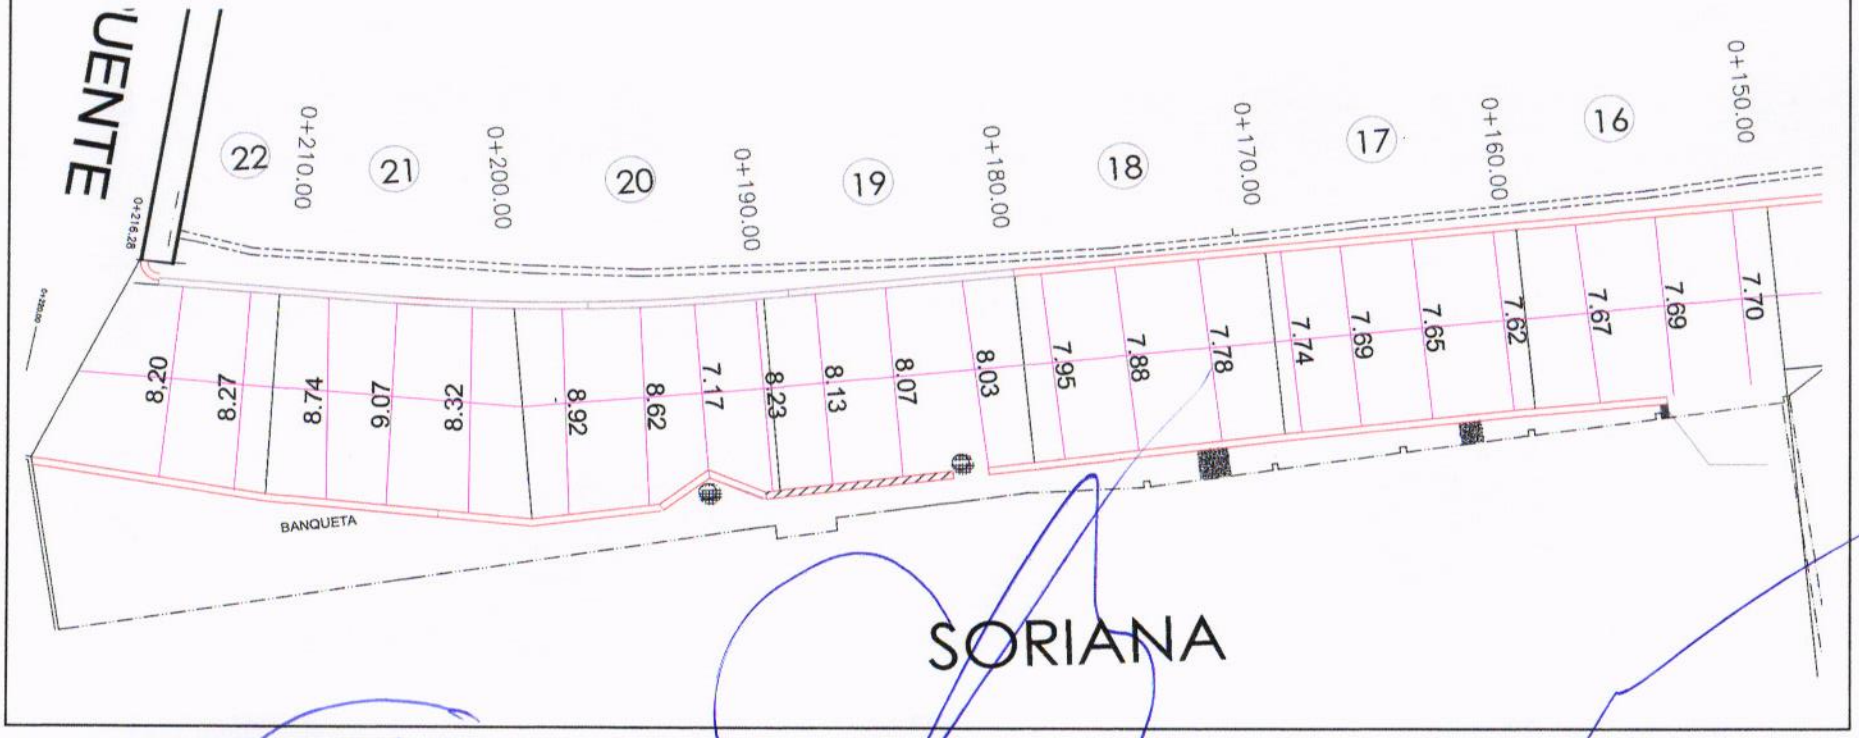

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMÉNEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES)
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023



CORTE01.- CORTE DE JUNTAS EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA MANUAL DE DISCO DIAMANTADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA.

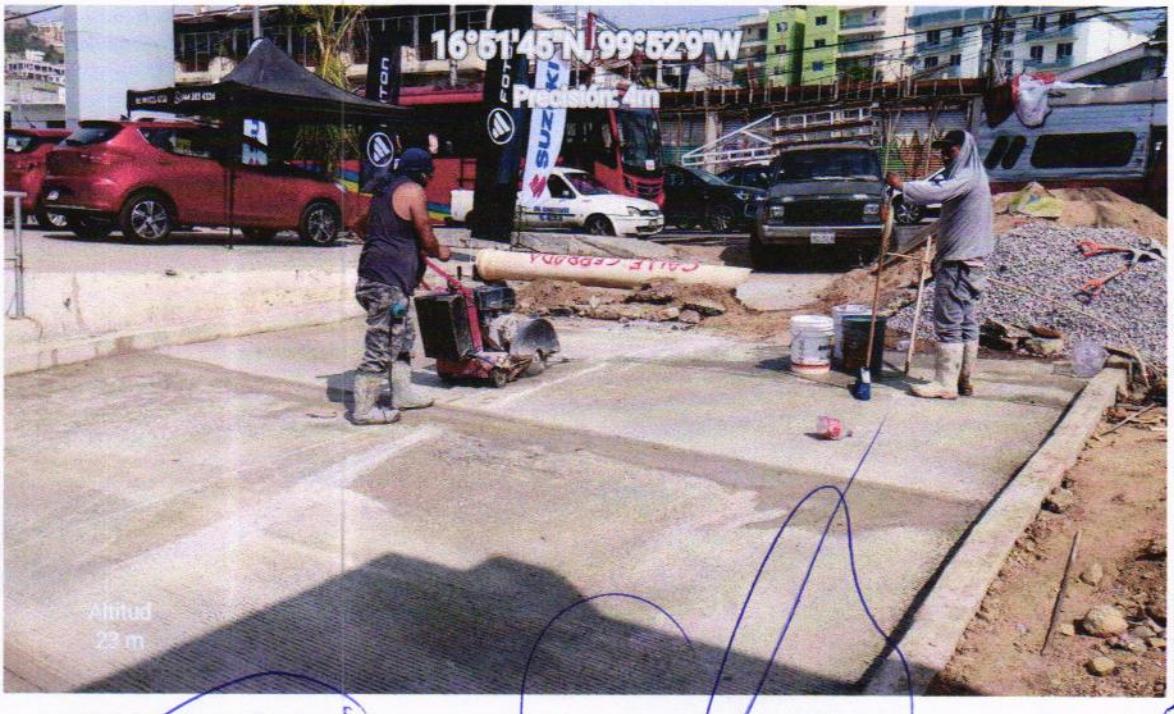

CORTE01.- CORTE DE JUNTAS EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA MANUAL DE DISCO DIAMANTADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES)
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023



CORTE01.- CORTE DE JUNTAS EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA MANUAL DE DISCO DIAMANTADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA.




CORTE01.- CORTE DE JUNTAS EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA MANUAL DE DISCO DIAMANTADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	**RESIDENTE DE OBRA** ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA** ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES)
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023

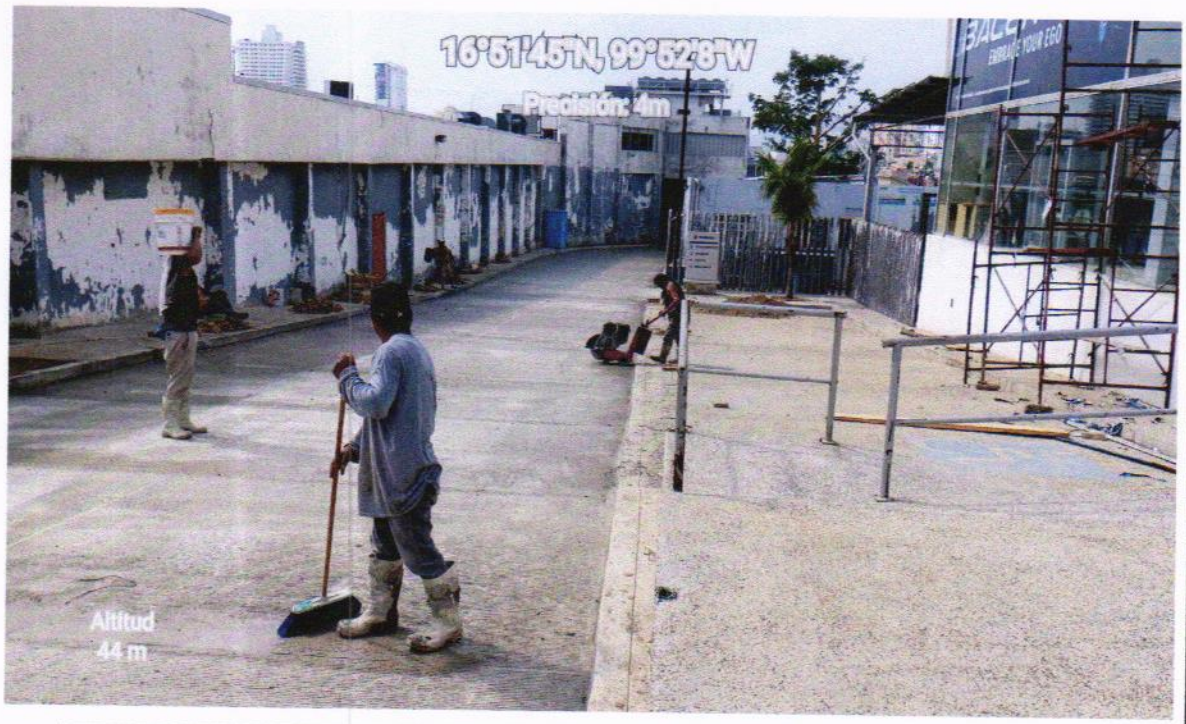

CORTE01.- CORTE DE JUNTAS EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA MANUAL DE DISCO DIAMANTADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA.



CORTE01.- CORTE DE JUNTAS EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA MANUAL DE DISCO DIAMANTADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA.


IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023



CORTE01.- CORTE DE JUNTAS EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA MANUAL DE DISCO DIAMANTADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA.

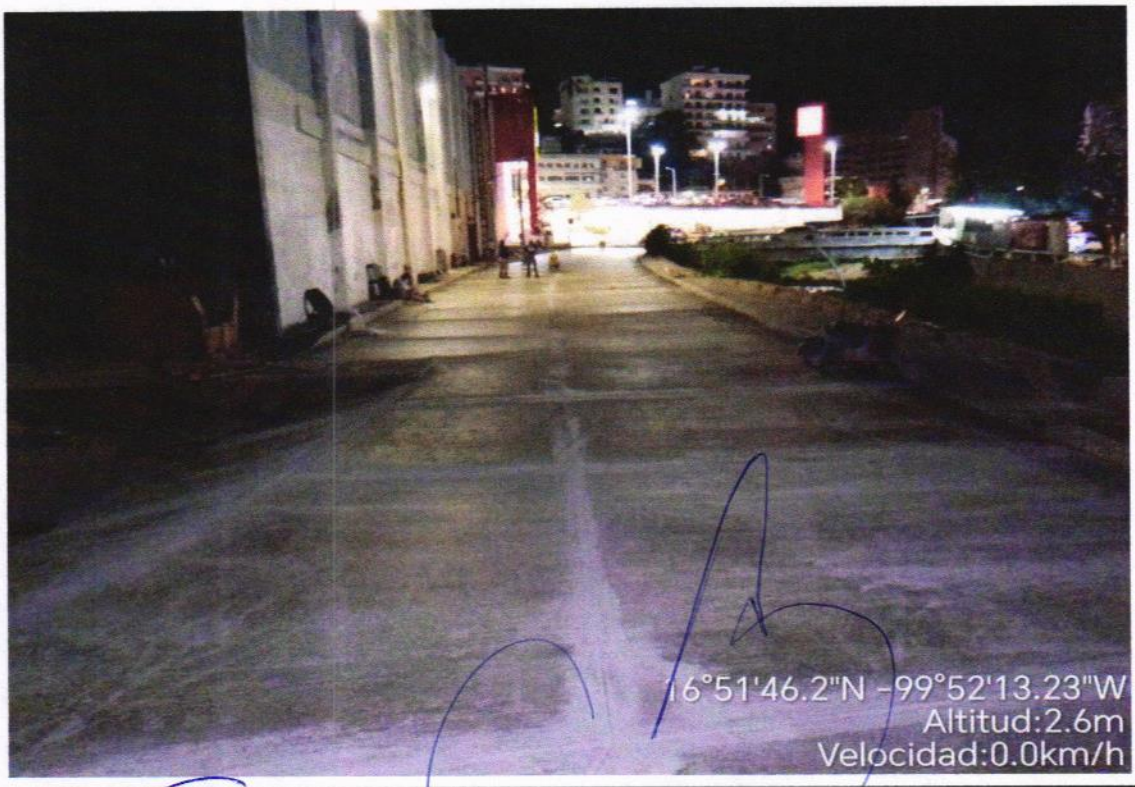

CORTE01.- CORTE DE JUNTAS EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA MANUAL DE DISCO DIAMANTADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA.


IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023



CORTE01.- CORTE DE JUNTAS EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA MANUAL DE DISCO DIAMANTADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA.

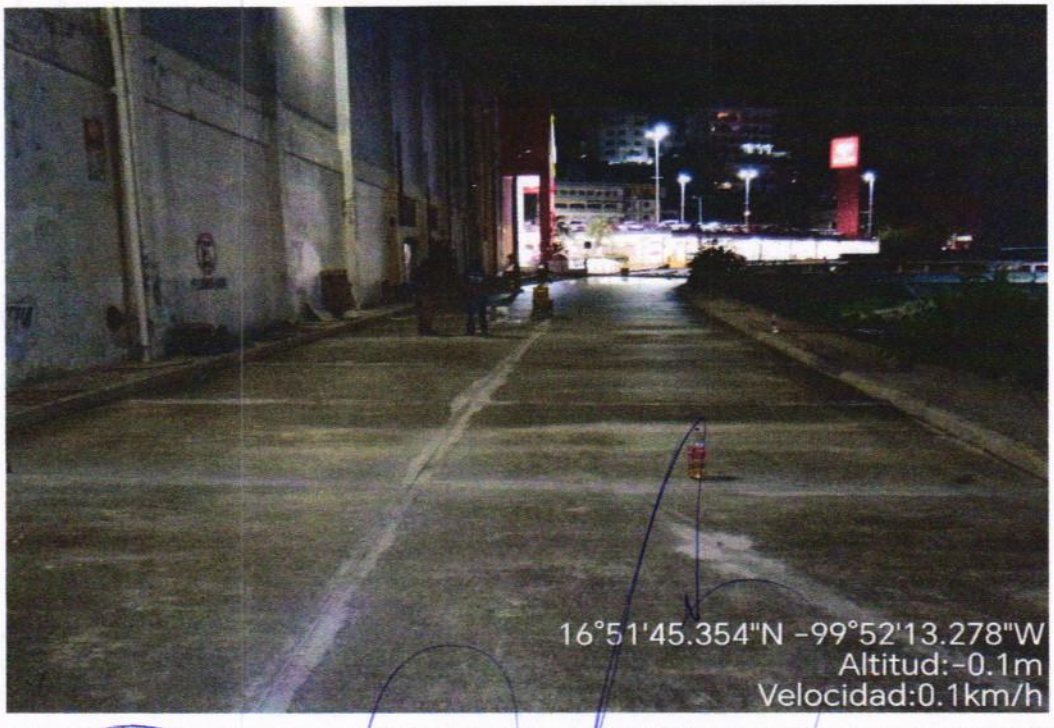

CORTE01.- CORTE DE JUNTAS EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA MANUAL DE DISCO DIAMANTADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	**RESIDENTE DE OBRA** ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA** ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 03 (TRES) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2023	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A7	**PAVIMENTACIÓN**									
32-0484	CALAFATEO EN LOSAS Y GUARNICIONES A BASE DE ASFALTO OXIDADO INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, ACARREOS A PRIMERA ESTACION Y MANO DE OBRA.				6.55			ML	6.55	0+010
					6.55			ML	6.55	
					6.6			ML	6.60	
					6.57			ML	6.57	0+020
					6.62			ML	6.62	
					6.65			ML	6.65	
					6.65			ML	6.65	0+030
					6.68			ML	6.68	
					6.72			ML	6.72	
					6.77			ML	6.77	0+040
					6.85			ML	6.85	
					6.96			ML	6.96	
					7.15			ML	7.15	
					7.30			ML	7.30	0+050
					7.46			ML	7.46	
					7.64			ML	7.64	
					7.80			ML	7.80	0+060
					7.83			ML	7.83	
					7.64			ML	7.64	
					7.28			ML	7.28	0+070
					7.00			ML	7.00	
					6.68			ML	6.68	
					6.51			ML	6.51	0+080
					6.52			ML	6.52	
					7.30			ML	7.30	
						SUBTOTAL HOJA 1		**ML**	**174.28**	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA

ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

NÚMEROS GENERADORES			ESTADO: GUERRERO
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/426	ESTIMACIÓN No. 03 (TRES) Y FINIQUITO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2023	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/426-2023/LP	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A7	PAVIMENTACIÓN									
32-0484	CALAFATEO EN LOSAS Y GUARNICIONES A BASE DE ASFALTO OXIDADO INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, ACARREOS A PRIMERA ESTACION Y MANO DE OBRA.				7.98			ML	7.98	0+080
					8.01			ML	8.01	0+090
					8.34			ML	8.34	
					7.80			ML	7.80	
					8.11			ML	8.11	0+100
					7.95			ML	7.95	
					7.84			ML	7.84	
					7.68			ML	7.68	0+110
					7.69			ML	7.69	
					7.87			ML	7.87	0+120
					8.10			ML	8.10	
					8.20			ML	8.20	
					7.80			ML	7.80	0+130
					7.70			ML	7.70	
					8.00			ML	8.00	0+140
					8.00			ML	8.00	
					5.55			ML	5.55	
					7.70			ML	7.70	0+150
					7.69			ML	7.69	
					7.67			ML	7.67	
					7.63			ML	7.63	0+160
					7.67			ML	7.67	
					7.69			ML	7.69	
					7.74			ML	7.74	
						SUBTOTAL HOJA 2		ML	186.41	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 03 (TRES) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2023	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A7	**PAVIMENTACIÓN**									
32-0484	CALAFATEO EN LOSAS Y GUARNICIONES A BASE DE ASFALTO OXIDADO INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, ACARREOS A PRIMERA ESTACION Y MANO DE OBRA.					7.78		ML	7.78	0+170
						7.88		ML	7.88	
						7.95		ML	7.95	
						8.03		ML	8.03	0+180
						8.07		ML	8.07	
						8.13		ML	8.13	
						8.23		ML	8.23	0+190
						7.17		ML	7.17	
						8.62		ML	8.62	
						8.92		ML	8.92	
						9.32		ML	9.32	0+200
						9.07		ML	9.07	
						8.74		ML	8.74	
						8.27		ML	8.27	0+216.60
						7.95		ML	7.95	
				CORTE LONGITUDINAL		208.60		ML	208.60	
					TOTAL ML ESTA HOJA HOJA 3 =			**ML**	**332.73**	
					SUB-TOTAL ML HOJA 2 =			**ML**	**186.41**	
					SUB-TOTAL ML HOJA 1 =			**ML**	**174.28**	
							TOTAL	**ML**	**693.42**	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No.: 03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A7 **PAVIMENTACION**

32-0484 CALAFATEO EN LOSAS Y GUARNICIONES A BASE DE ASFALTO OXIDADO INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, ACARREOS A PRIMERA ESTACION Y MANO DE OBRA.



IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMÉNEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No.: 03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A7 **PAVIMENTACION**

32-0484 CALAFATEO EN LOSAS Y GUARNICIONES A BASE DE ASFALTO OXIDADO INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, ACARREOS A PRIMERA ESTACION Y MANO DE OBRA.

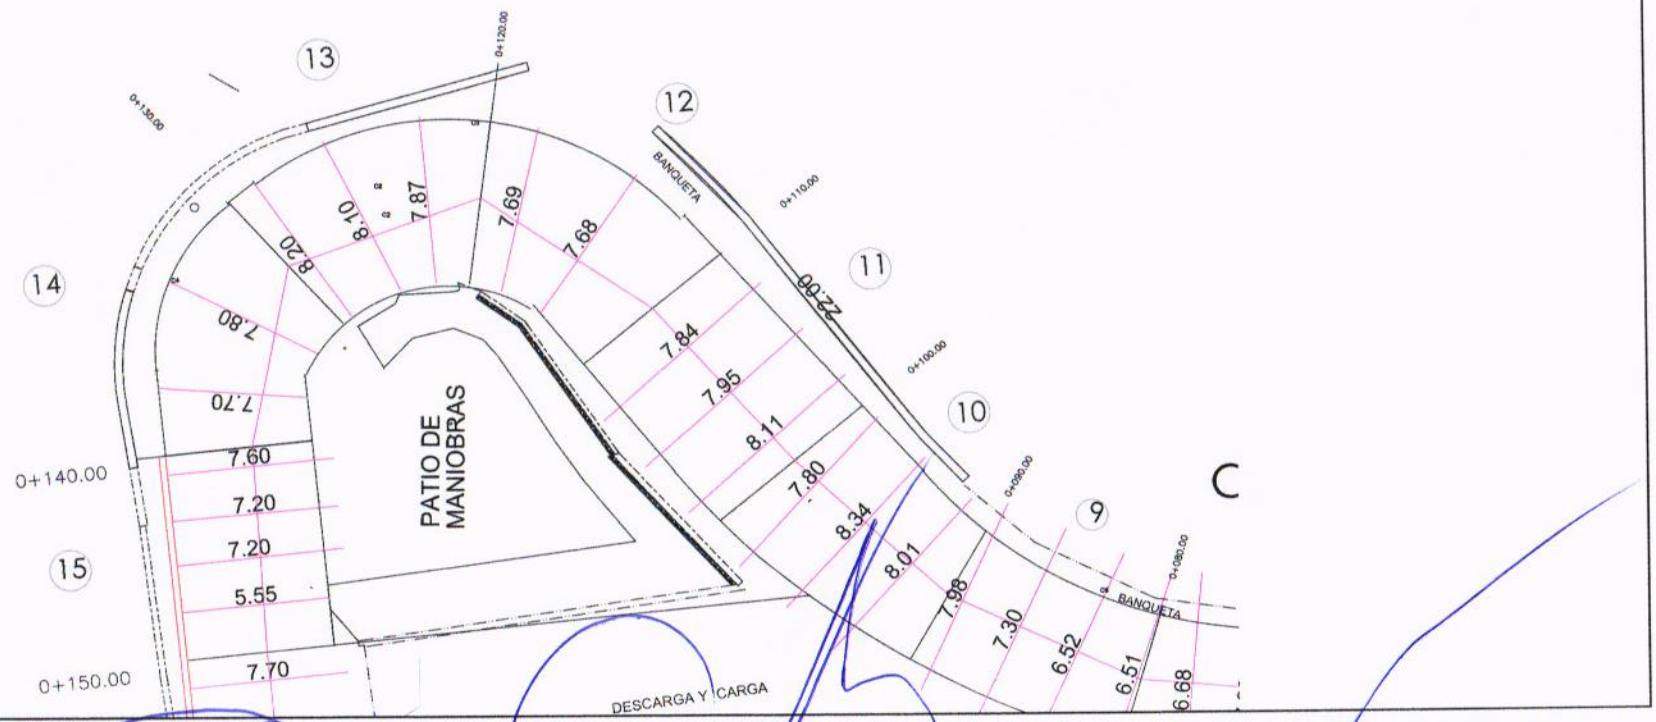

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No.: 03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A7 **PAVIMENTACION**

32-0484 CALAFATEO EN LOSAS Y GUARNICIONES A BASE DE ASFALTO OXIDADO INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, ACARREOS A PRIMERA ESTACION Y MANO DE OBRA.

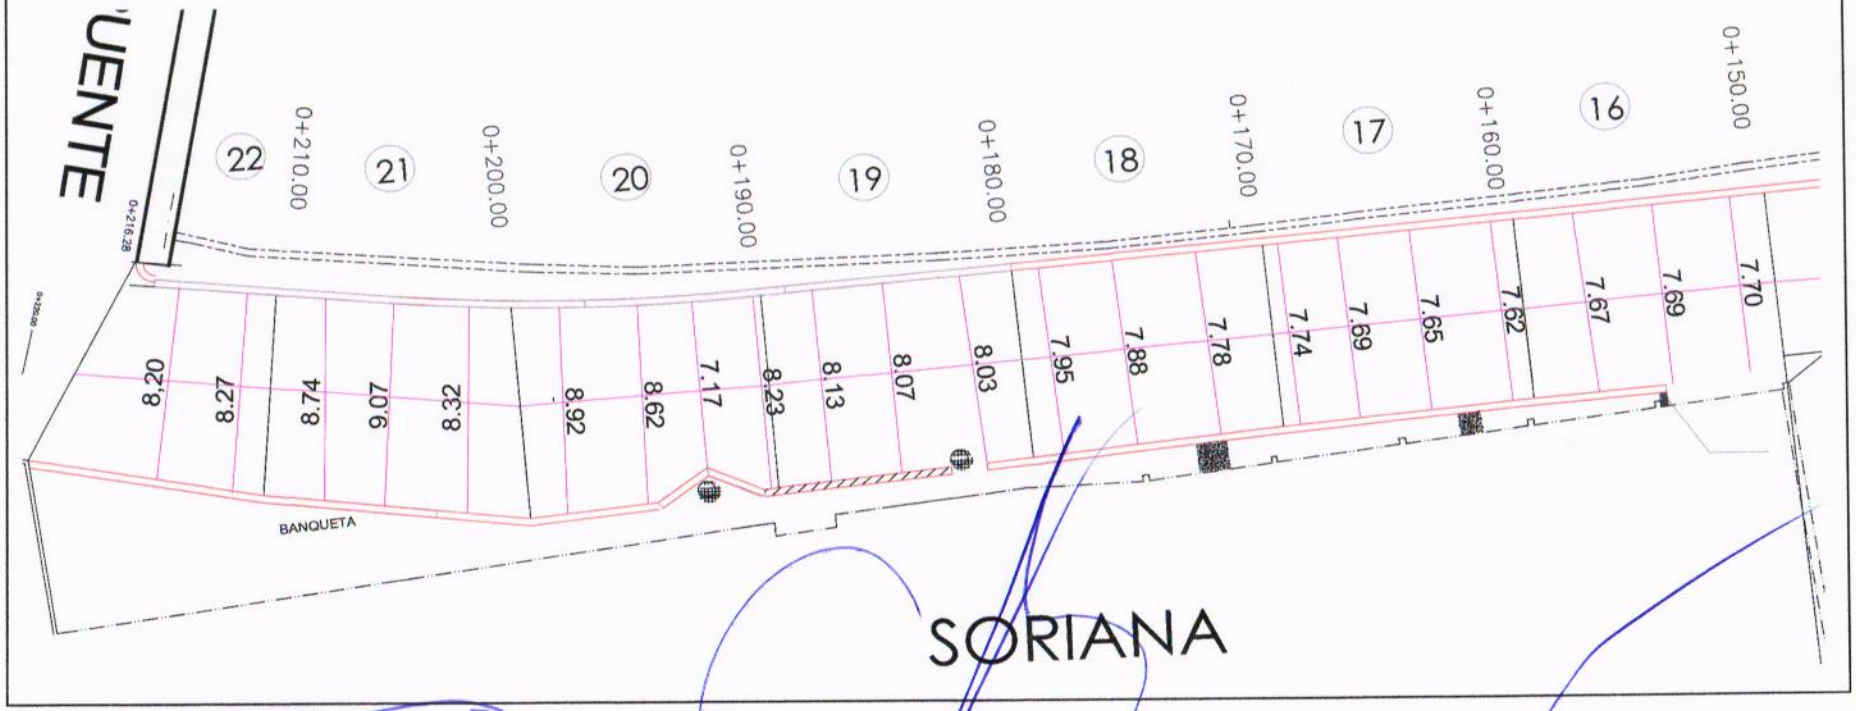

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES)
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023

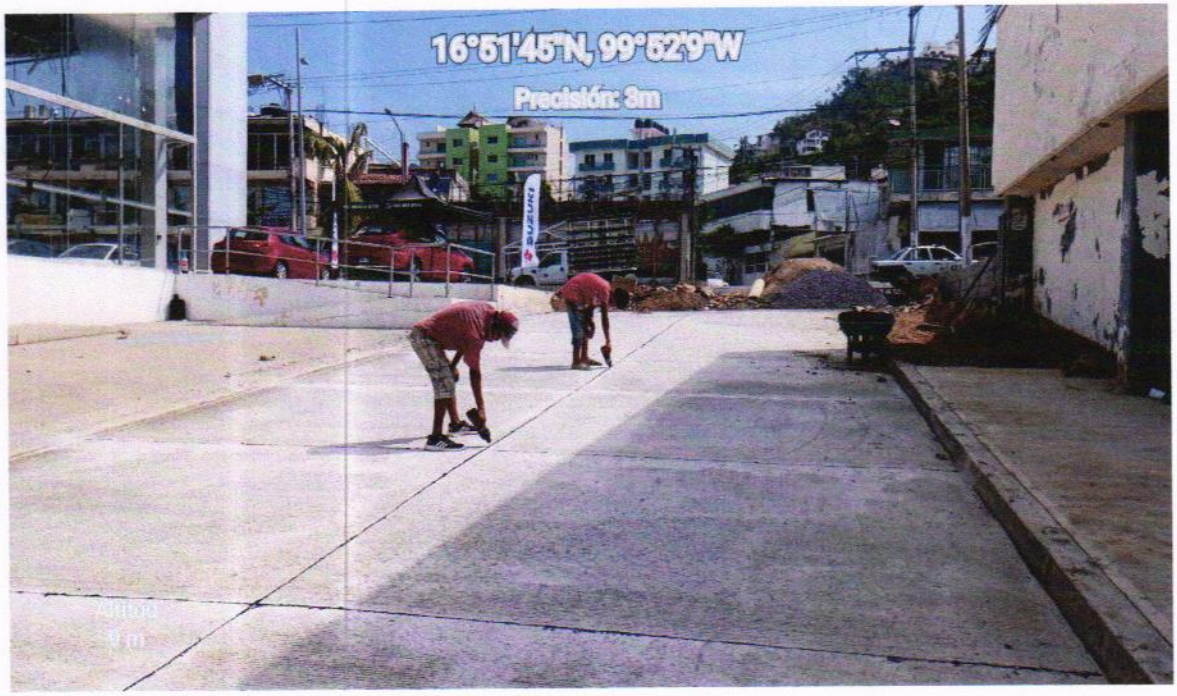

32-0484.- CALAFATEO EN LOSAS Y GUARNICIONES A BASE DE ASFALTO OXIDADO INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, ACARREOS A PRIMERA ESTACION Y MANO DE OBRA.

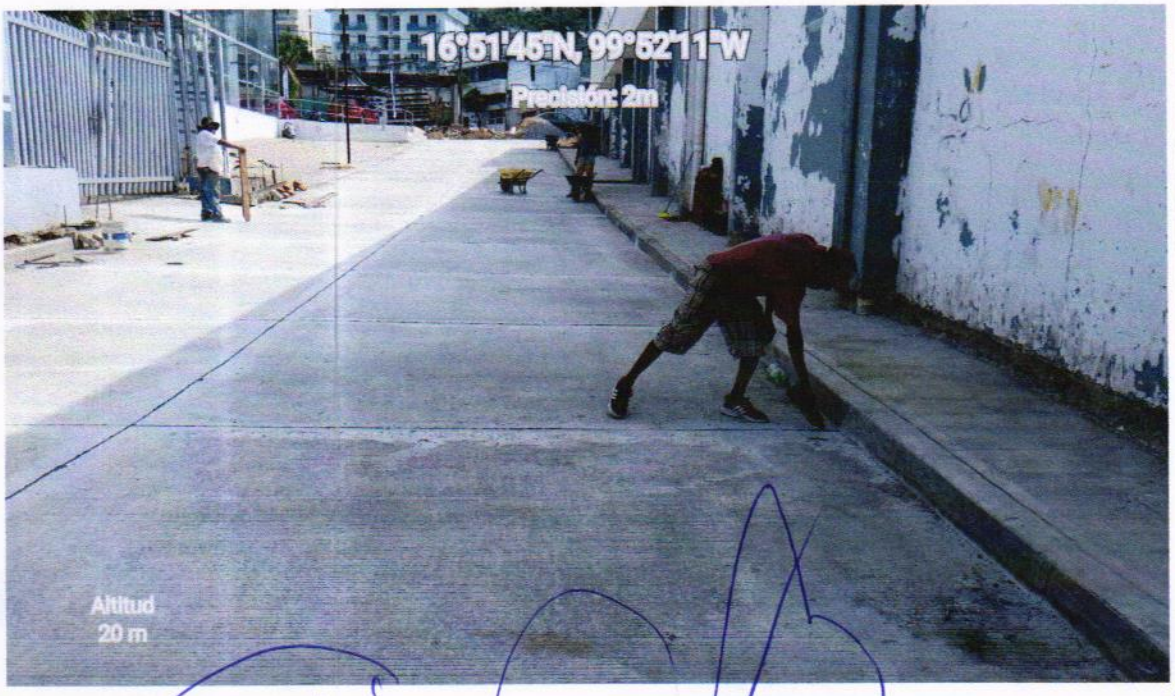


32-0484.- CALAFATEO EN LOSAS Y GUARNICIONES A BASE DE ASFALTO OXIDADO INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, ACARREOS A PRIMERA ESTACION Y MANO DE OBRA.


IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES)
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023

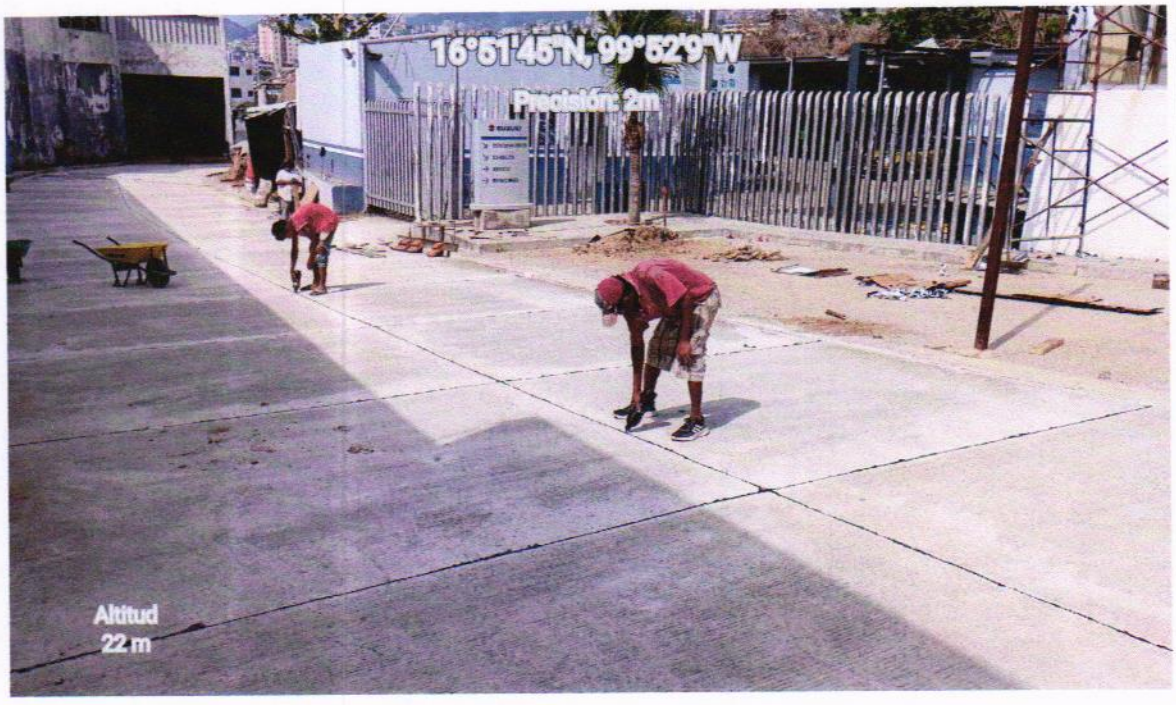

32-0484.- CALAFATEO EN LOSAS Y GUARNICIONES A BASE DE ASFALTO OXIDADO INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, ACARREOS A PRIMERA ESTACION Y MANO DE OBRA.

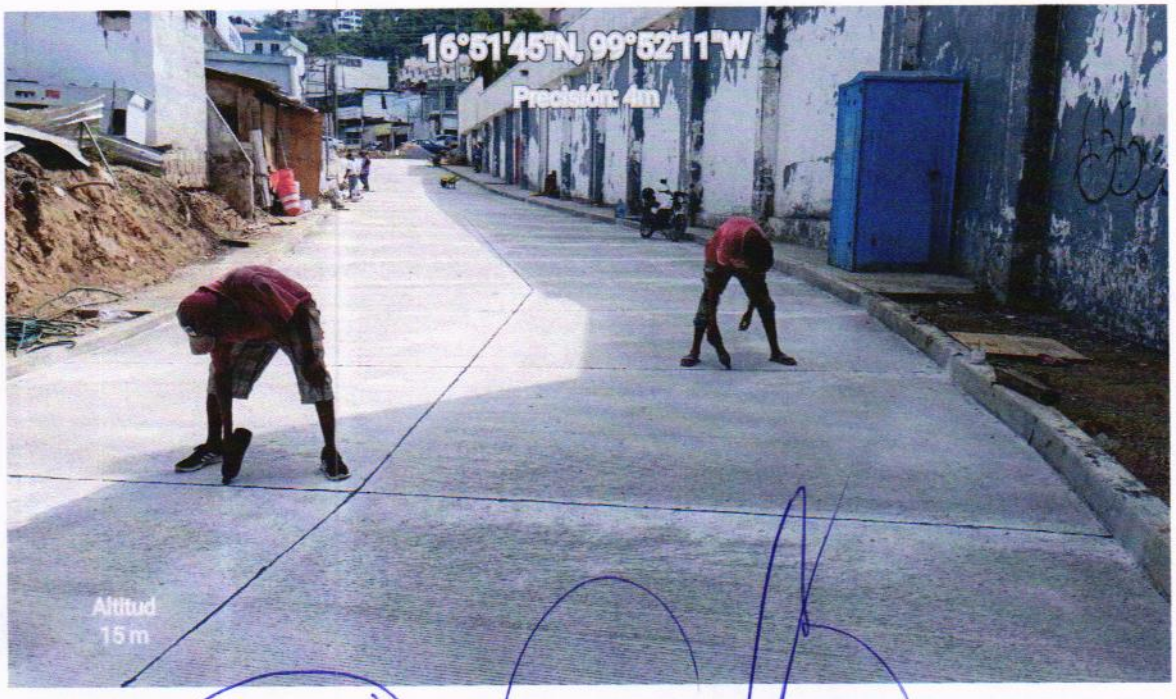


32-0484.- CALAFATEO EN LOSAS Y GUARNICIONES A BASE DE ASFALTO OXIDADO INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, ACARREOS A PRIMERA ESTACION Y MANO DE OBRA.


IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	**RESIDENTE DE OBRA** ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA** ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES)
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023

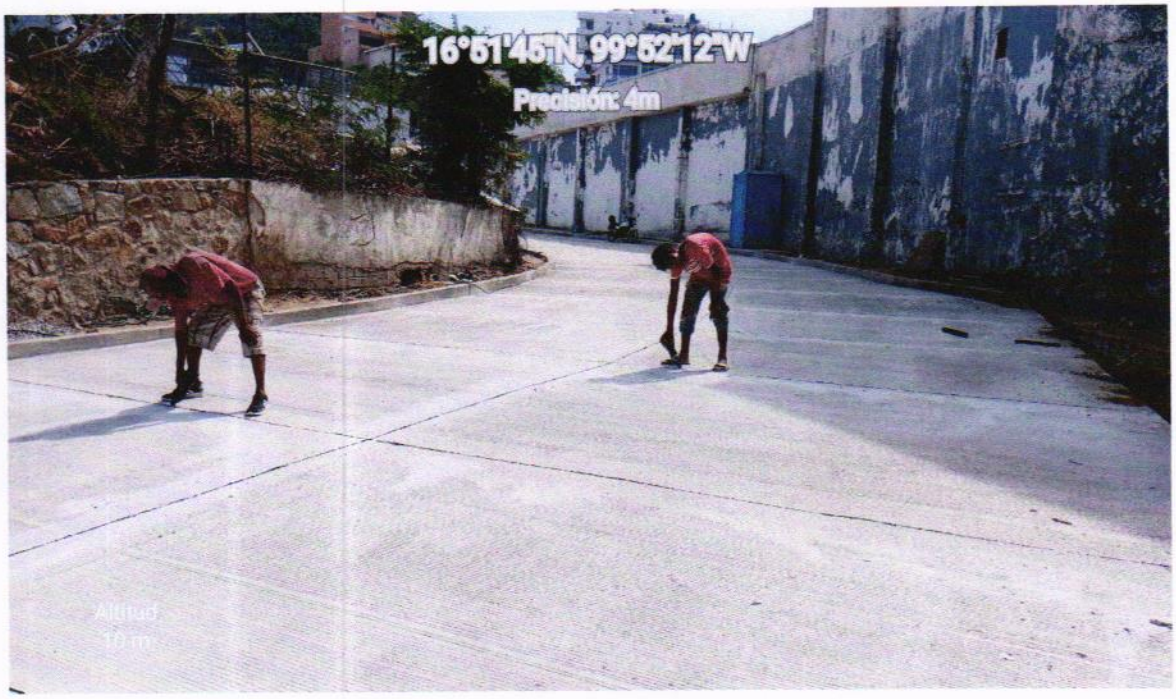

32-0484.- CALAFATEO EN LOSAS Y GUARNICIONES A BASE DE ASFALTO OXIDADO INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, ACARREOS A PRIMERA ESTACION Y MANO DE OBRA.

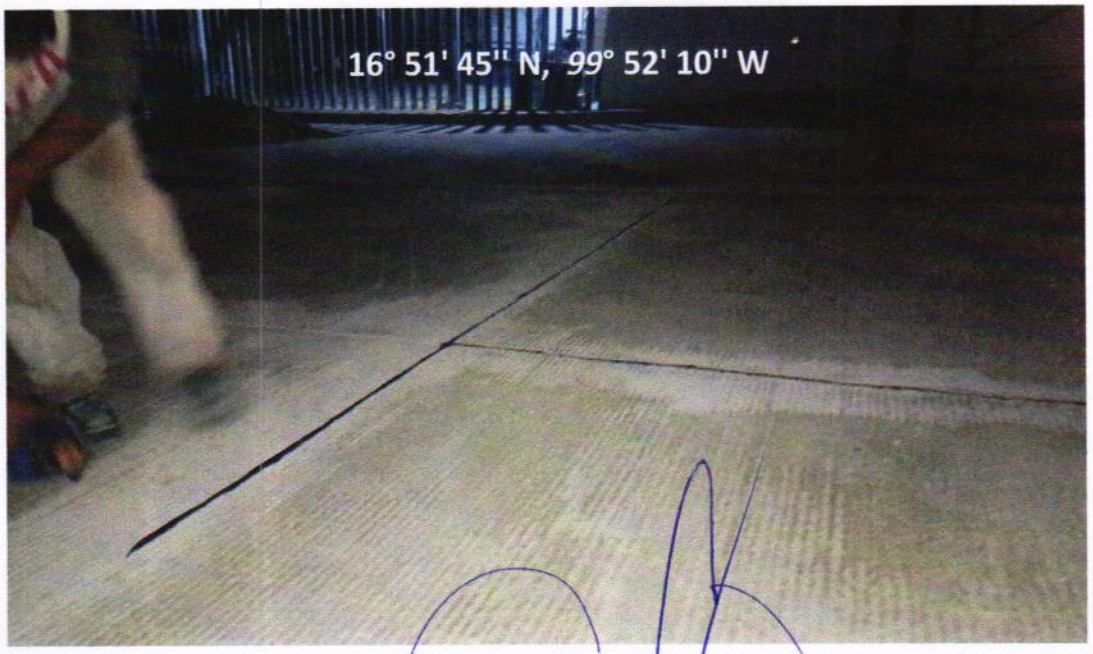

32-0484.- CALAFATEO EN LOSAS Y GUARNICIONES A BASE DE ASFALTO OXIDADO INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, ACARREOS A PRIMERA ESTACION Y MANO DE OBRA.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	**RESIDENTE DE OBRA** ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA** ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	N Ú M E R O S G E N E R A D O R E S		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 03 (TRES) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2023	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A7	**PAVIMENTACIÓN**									1
22-0333*	PINTURA ESMALTE AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES CON DESARROLLO DE 30.00 CM. INCL. MATERIAL MANO DE OBRA Y ACARREOS A PRIMERA ESTACION.		1			30.00		ML	30.00	INICIO GUARNICION IZQUIERDA
			2			24.79		ML	24.79	
			3			2.50		ML	2.50	
			4			2.50		ML	2.50	
			5			2.74		ML	2.74	
			6			2.28		ML	2.28	
			7			2.38		ML	2.38	
			8			2.65		ML	2.65	
			9			2.54		ML	2.54	
			10			2.50		ML	2.50	
			11			3.28		ML	3.28	
			12			2.51		ML	2.51	
			13			1.04		ML	1.04	
			14			32.88		ML	32.88	INICIO GUARNICION DERECHA
			15			1.05		ML	1.05	
			16			1.10		ML	1.10	
			17			13.17		ML	13.17	
			18			10.91		ML	10.91	
			19			3.35		ML	3.35	
			20			2.42		ML	2.42	
			21			2.50		ML	2.50	
			22			2.54		ML	2.54	
			23			2.45		ML	2.45	
			24			2.49		ML	2.49	
						SUBTOTAL HOJA 1		**ML**	**156.57**	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 03 (TRES) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2023	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
										2
A7	**PAVIMENTACIÓN**									
22-0333*	PINTURA ESMALTE AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES CON DESARROLLO DE 30.00 CM. INCL. MATERIAL MANO DE OBRA Y ACARREOS A PRIMERA ESTACION.		25			2.45		ML	2.45	INICIO GUARNICION IZQUIERDA
			26			1.22		ML	1.22	
			26'			15.10		ML	15.10	
			27			1.59		ML	1.59	
			28			1.48		ML	1.48	
			29			1.04		ML	1.04	
			30			1.03		ML	1.03	
			31			0.71		ML	0.71	
			32			2.44		ML	2.44	
			33			2.50		ML	2.50	INICIO GUARNICION DERECHA
			34			17.52		ML	17.52	
			35			2.53		ML	2.53	
			36			3.04		ML	3.04	
			37			2.52		ML	2.52	
			38			2.53		ML	2.53	
			39			2.51		ML	2.51	
			40			2.55		ML	2.55	
			41			2.52		ML	2.52	
			42			2.52		ML	2.52	
			43			2.75		ML	2.75	
			44			2.40		ML	2.40	
			45			2.52		ML	2.52	
			46			2.52		ML	2.52	
			47			2.52		ML	2.52	
						SUBTOTAL HOJA 2		**ML**	**80.51**	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 03 (TRES) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2023	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A7	**PAVIMENTACIÓN**									3
22-0333*	PINTURA ESMALTE AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES CON DESARROLLO DE 30.00 CM. INCL. MATERIAL MANO DE OBRA Y ACARREOS A PRIMERA ESTACION.		48			2.52		ML	2.52	
			49			2.52		ML	2.52	
			50			33.37		ML	33.37	INICIO DE TRAMO IZQUIERDO
			51			11.23		ML	11.23	
			52			2.61		ML	2.61	
			53			2.54		ML	2.54	
			54			8.35		ML	8.35	
			55			16.55		ML	16.55	
			56			20.93		ML	20.93	INICIO GUARNICION DERECHA
			57			19.20		ML	19.20	
			58			9.93		ML	9.93	
			59			6.39		ML	6.39	
			60			13.51		ML	13.51	
			61			2.51		ML	2.51	
			62			2.00		ML	2.00	
						SUB TOTAL ESTA HOJA 3 =		ML	154.16	
						SUB TOTAL HOJA 2 =		ML	80.51	
						SUB TOTAL HOJA 1 =		ML	156.57	
						TOTAL ML DE PINTURA EN GUARNICION =		ML	391.24	
							TOTAL	ML	391.24	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S				
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	ESTIMACIÓN No.: 03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA:	12 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.			

C R O Q U I S

A7 **PAVIMENTACION**

22-0333* PINTURA ESMALTE AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES CON DESARROLLO DE 30.00 CM. INCL. MATERIAL MANO DE OBRA Y ACARREOS A PRIMERA ESTACION.



IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No.: 03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A7 **PAVIMENTACION**

22-0333* PINTURA ESMALTE AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES CON DESARROLLO DE 30.00 CM. INCL. MATERIAL MANO DE OBRA Y ACARREOS A PRIMERA ESTACION.

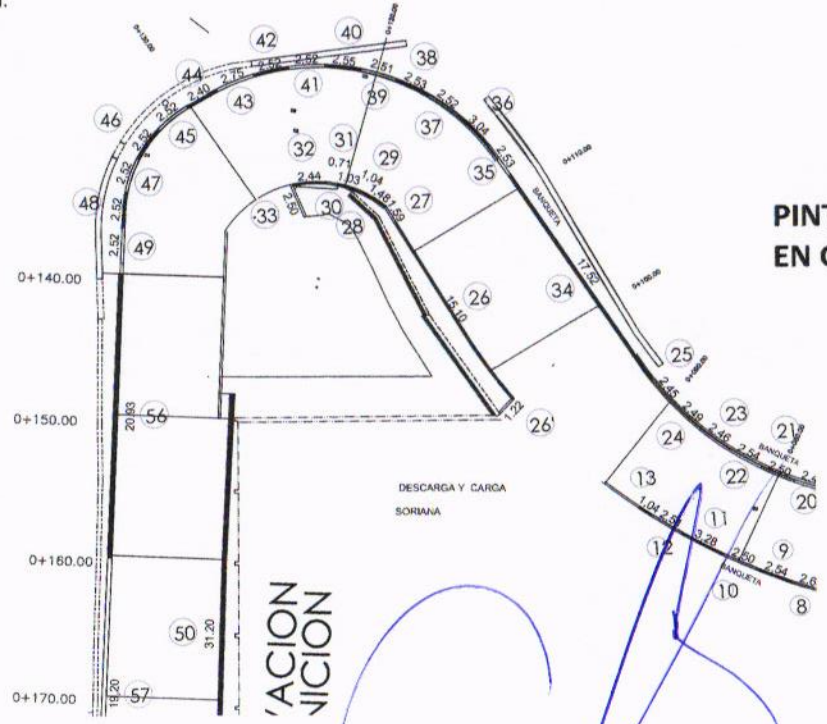

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No.: 03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A7 **PAVIMENTACION**

22-0333* PINTURA ESMALTE AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES CON DESARROLLO DE 30.00 CM. INCL. MATERIAL MANO DE OBRA Y ACARREOS A PRIMERA ESTACION.



IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES)
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023

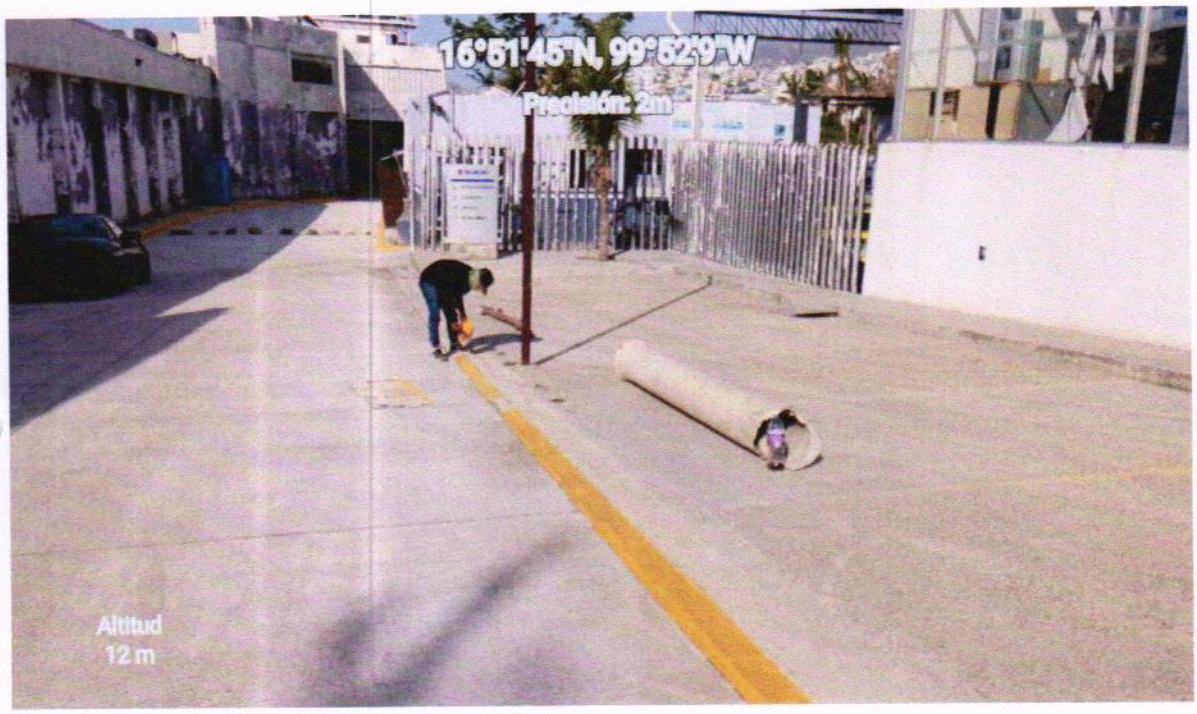

22-0333*.- PINTURA ESMALTE AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES CON DESARROLLO DE 30.0 CM., INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y ACARREOS A PRIMERA ESTACION.




22-0333*.- PINTURA ESMALTE AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES CON DESARROLLO DE 30.0 CM., INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y ACARREOS A PRIMERA ESTACION.


IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES)
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023

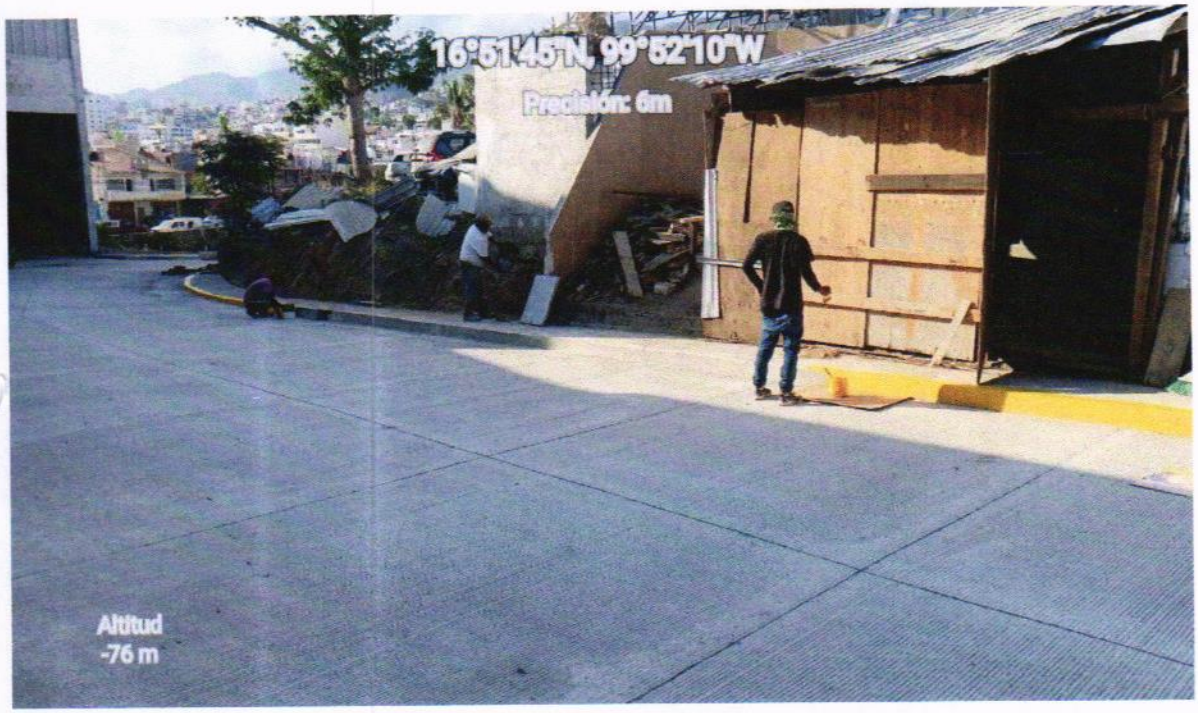

22-0333*.- PINTURA ESMALTE AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES CON DESARROLLO DE 30.0 CM., INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y ACARREOS A PRIMERA ESTACION.

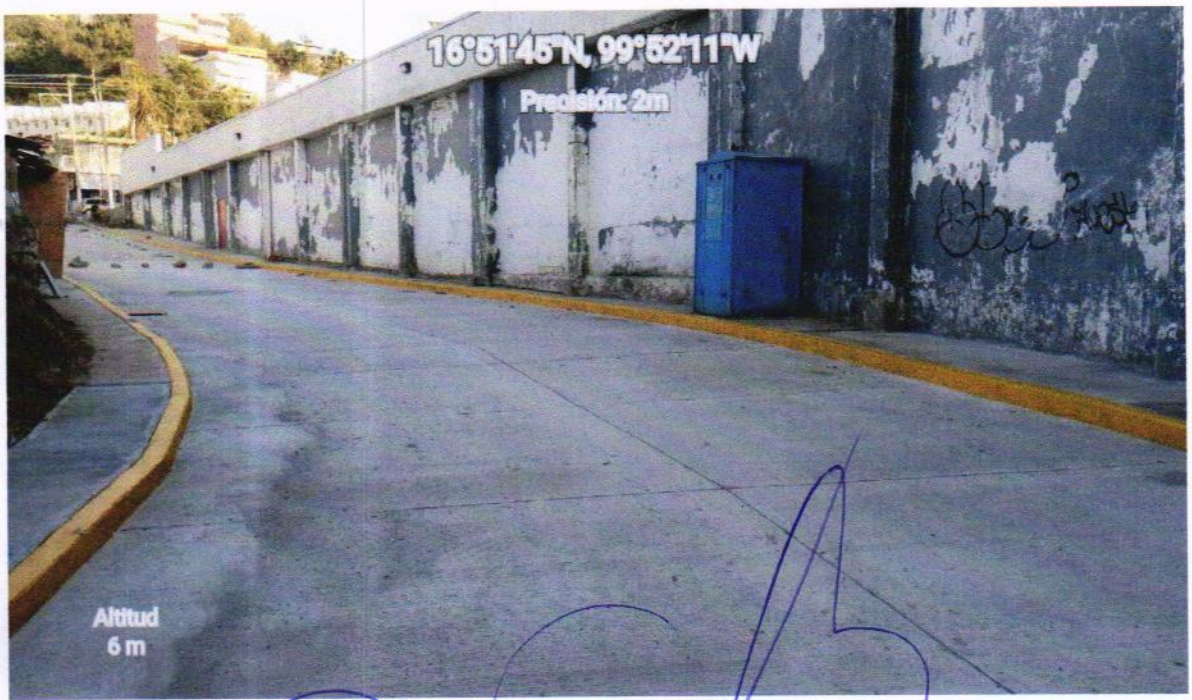

22-0333*.- PINTURA ESMALTE AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES CON DESARROLLO DE 30.0 CM., INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y ACARREOS A PRIMERA ESTACION.


IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES)
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023



22-0333*.- PINTURA ESMALTE AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES CON DESARROLLO DE 30.0 CM., INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y ACARREOS A PRIMERA ESTACION.

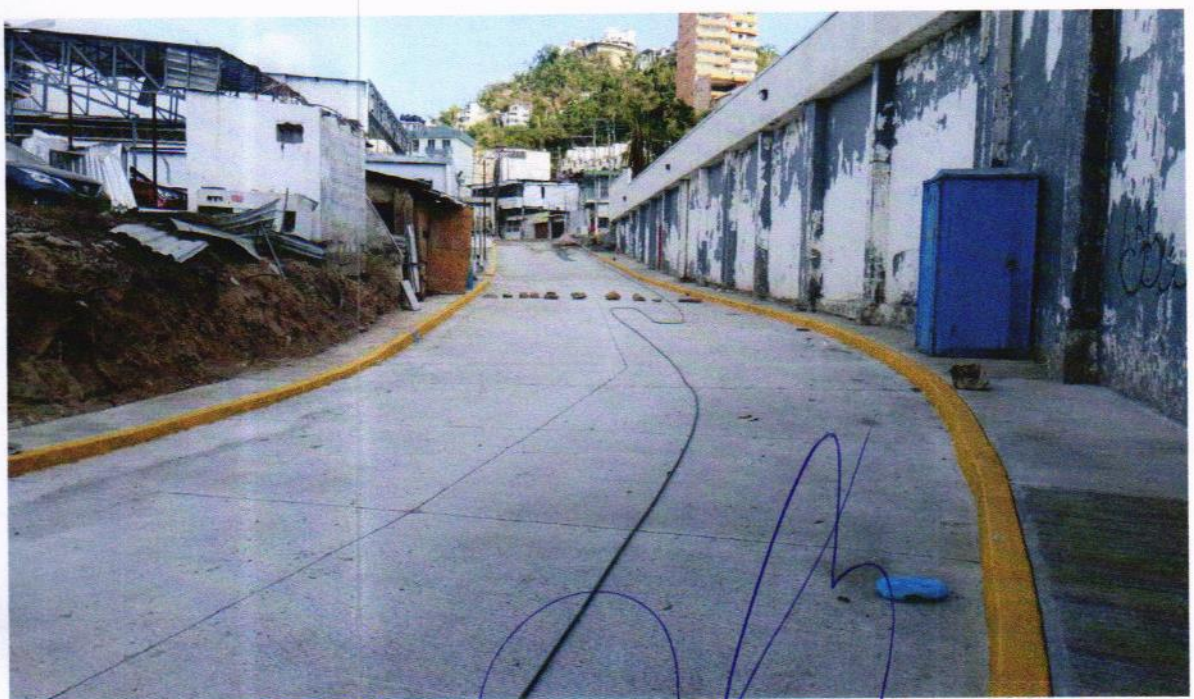

22-0333*.- PINTURA ESMALTE AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES CON DESARROLLO DE 30.0 CM., INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y ACARREOS A PRIMERA ESTACION.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 03 (TRES) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2023	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A7	**PAVIMENTACIÓN**		**BANQUETA IZQUIERDA DE CADENAMIENTO 0+008 A 0+091.09**							
32-0468	BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE F´C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, T.M.A. 3/4", INCLUYE CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.		1		1.48	4.75		M2	7.03	
			2		1.24	3.80		M2	4.71	
			3		1.91	3.55		M2	6.78	
			4		1.75	7.49		M2	13.10	
			5		1.60	4.99		M2	7.98	
			6		1.50	8.11		M2	12.12	
			7		1.32	6.86		M2	9.02	
			8		1.16	5.53		M2	6.41	
			9		0.95	7.33		M2	6.96	
			10		0.90	7.66		M2	6.89	
			11		1.27	4.15		M2	5.24	
			12		1.53	4.35		M2	6.65	
			13		1.57	5.56		M2	8.72	
			14		1.55	5.76		M2	8.92	
			15		0.99	3.20		M2	3.15	
		(-) REGISTROS ELECTRICOS		-4.00	0.90	0.70		M2	-2.52	
		(-) COLUMNAS EXISTENTES SORIANA		-15.00	0.30	0.31		M2	-1.39	
						SUBTOTAL HOJA 1		M2	109.77	

REFERENCIA	ANCHOS		SUMA	ANCHO PROMEDIO 1/2
1	1.68	1.28	2.96	**1.48**
2	1.28	1.20	2.48	**1.24**
3	1.92	1.90	3.82	**1.91**
4	1.90	1.60	3.50	**1.75**
5	1.60	1.60	3.20	**1.60**
6	1.60	1.39	2.99	**1.50**
7	1.39	1.24	2.63	**1.32**
8	1.24	1.08	2.32	**1.16**
9	1.08	0.82	1.90	**0.95**
10	0.82	0.98	1.80	**0.90**
11	0.98	1.55	2.53	**1.27**
12	1.55	1.51	3.06	**1.53**
13	1.51	1.63	3.14	**1.57**
14	1.63	1.47	3.10	**1.55**
15	1.47	0.50	1.97	**0.99**

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 03 (TRES) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A7	**PAVIMENTACIÓN**		**BANQUETA DERECHA DE CADENAMIENTO 0+008 A 0+110**							2
32-0468	BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, T.M.A. 3/4", INCLUYE CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.		16		0.09	5.37		M2	0.48	
			17		0.22	20.80		M2	4.57	
			18		0.60	5.57		M2	3.34	
			19		1.00	3.00		M2	3.00	
			20		0.95	18.00		M2	17.10	
			21		0.67	7.00		M2	4.69	
			22		0.61	1.10		M2	0.67	
			23		0.72	2.45		M2	1.76	
			24		0.77	2.48		M2	1.90	
			25		0.81	2.45		M2	1.98	
			26		0.87	6.45		M2	5.61	
			27		1.32	12.04		M2	15.89	
			BANQUETA IZQUIERDA DE CADENAMIENTO 0+091.09 A 0+0+135							
			28		1.37	7.40		M2	10.13	
			29		1.57	1.56		M2	2.44	
			30		1.06	7.84		M2	8.31	
			31		0.70	1.43		M2	1.00	
			32		0.46	2.00		M2	0.92	
						SUBTOTAL HOJA 2		M2	83.79	

REFERENCIA	ANCHOS		SUMA	ANCHO PROMEDIO 1/2
16	0.04	0.15	0.19	**0.09**
17	0.20	0.25	0.45	**0.22**
18	0.35	0.86	1.21	**0.60**
19	0.86	1.15	2.01	**1.00**
20	1.15	0.76	1.91	**0.95**
21	0.76	0.58	1.34	**0.67**
22	0.58	0.65	1.23	**0.61**
23	0.65	0.80	1.45	**0.72**
24	0.80	0.75	1.55	**0.77**
25	0.75	0.88	1.63	**0.81**
26	0.88	0.86	1.74	**0.87**
27	0.86	1.78	2.64	**1.32**
28	0.90	1.85	2.75	**1.37**
29	1.85	1.30	3.15	**1.57**
30	1.30	0.83	2.13	**1.06**
31	0.83	0.58	1.41	**0.70**
32	0.58	0.35	0.93	**0.46**

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 03 (TRES) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2023	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A7	**PAVIMENTACIÓN**		**BANQUETA DERECHA DE CADENAMIENTO 0+110 A 0+160**							
32-0468	BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE F´C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, T.M.A. 3/4", INCLUYE CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.		33		1.79	2.53		M2	4.52	
			34		1.90	3.04		M2	5.77	
			35		2.00	2.52		M2	5.04	
							SUB TOTAL ESTA HOJA 3 =	M2	15.33	
							SUB TOTAL HOJA 2 =	M2	83.79	
							SUB TOTAL HOJA 1 =	M2	109.77	
							TOTAL M2 DE BANQUETA =	M2	208.89	
							(-) ML COBRADOS EN ESTIMACION 01 =	M2	-179.55	
									29.34	
							TOTAL	M2	29.34	

REFERENCIA	ANCHOS		SUMA	ANCHO PROMEDIO 1/2
33	1.78	1.81	3.59	**1.79**
34	1.81	2.00	3.81	**1.90**
35	2.00	2.00	4.00	**2.00**

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No.: 03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A7 **PAVIMENTACION**

32-0468 BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE F´C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, T.M.A. 3/4", INCLUYE CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.

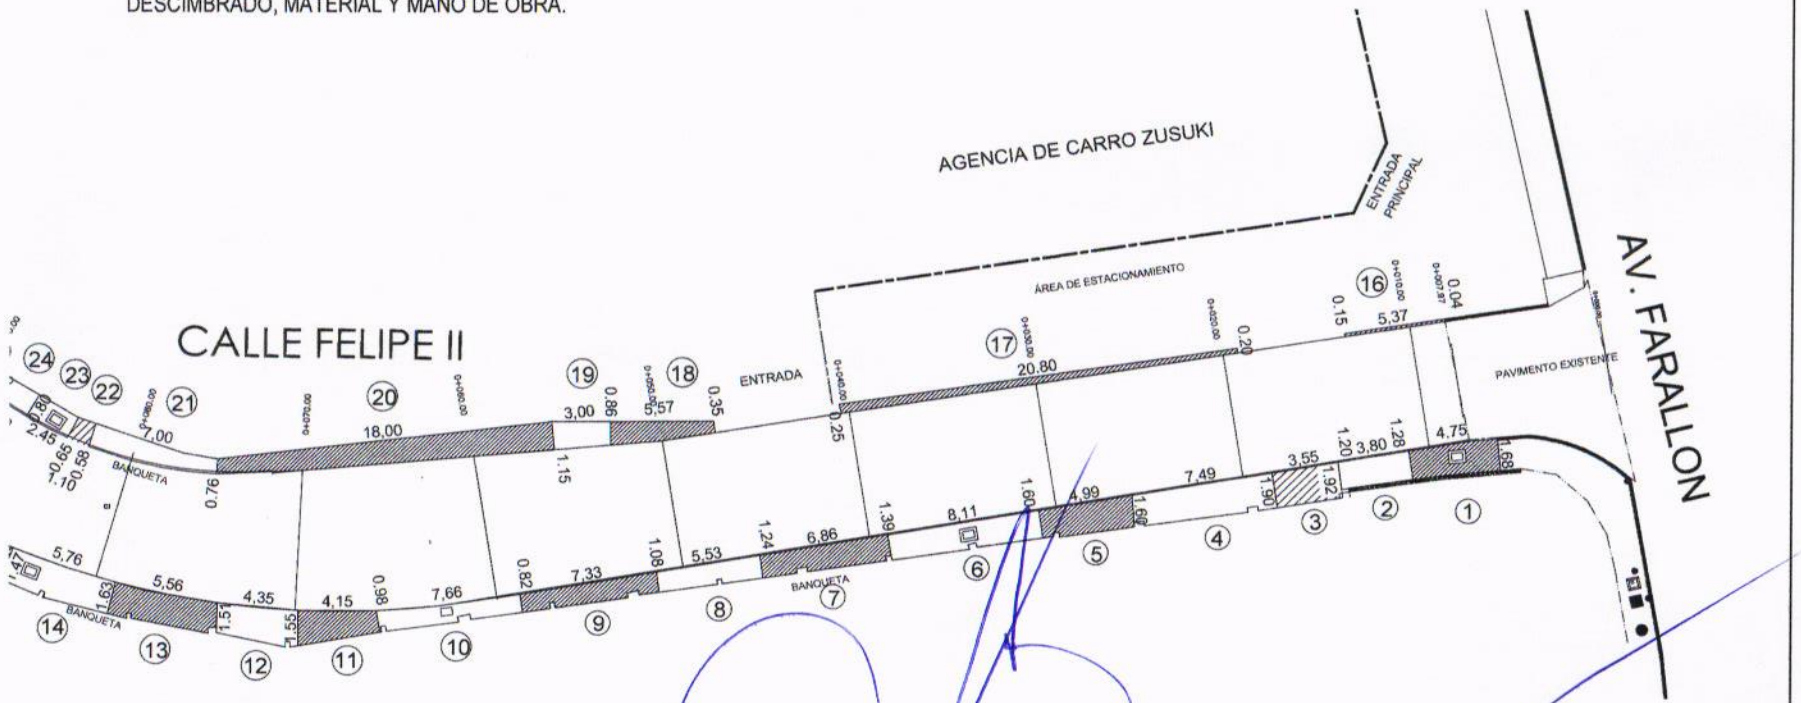

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No.: 03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A7 **PAVIMENTACION**

32-0468 BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE F´C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, T.M.A. 3/4", INCLUYE CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.

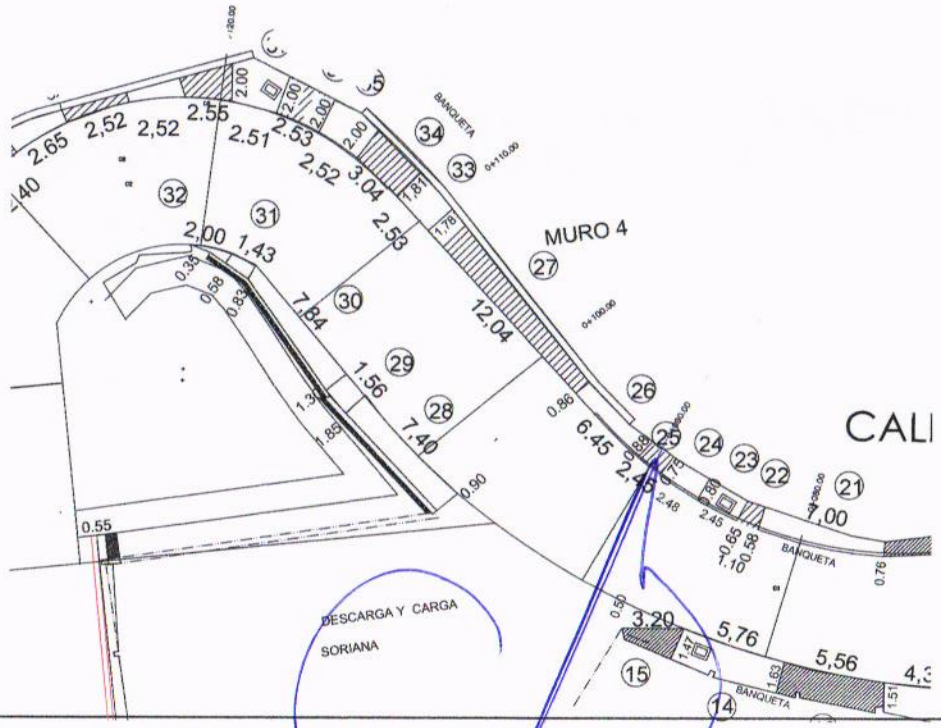

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES)
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023

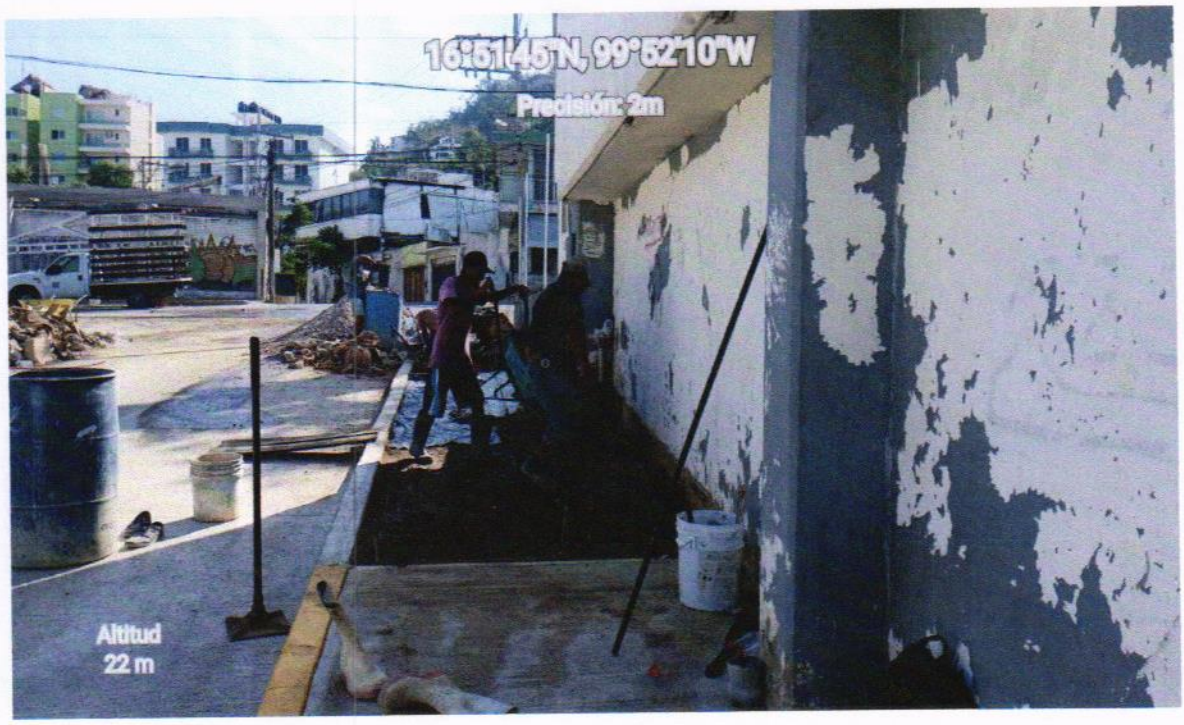

32-0468.- BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, T.M.A 3/4", INCLUYE CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.




32-0468.- BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, T.M.A 3/4", INCLUYE CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.


IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES)
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023

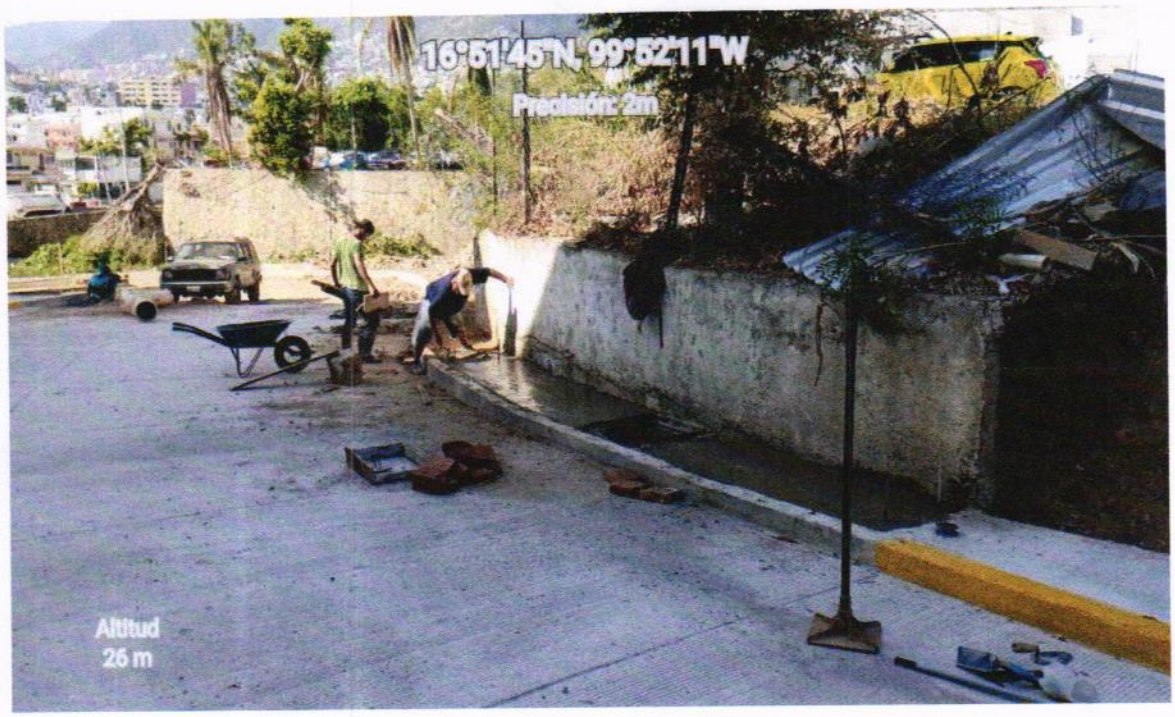

32-0468.- BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, T.M.A 3/4", INCLUYE CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.

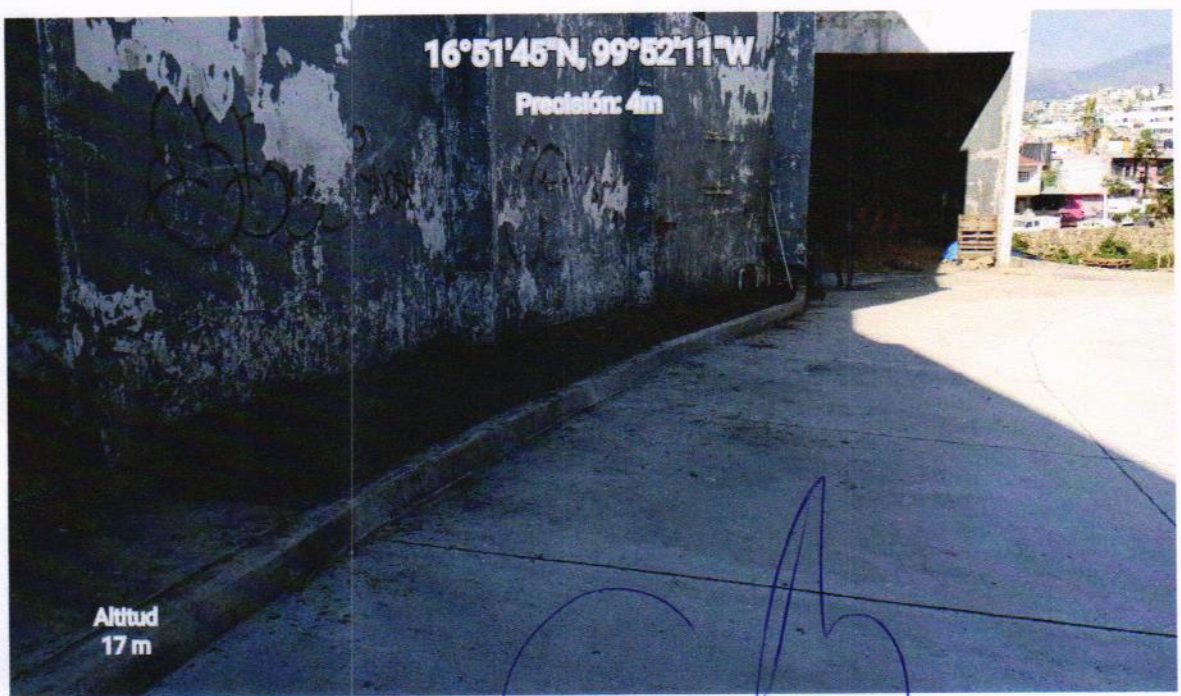

32-0468.- BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, T.M.A 3/4", INCLUYE CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	**RESIDENTE DE OBRA** ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA** ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 03 (TRES) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A8	**ACARREOS Y LIMPIEZAS**									
CARGA	CARGA MECANICA CON USO DE RETROEXCAVADORA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO (6 M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION A TIRO LIBRE.									
		CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE ARRASTRE DEL HURACAN OTIS (ESCOMBRO, LAMINAS, ARBOLES CAIDOS Y OTROS) 9 VIAJES DE 6 M3		9			6	M3	54.00	
							TOTAL	**M3**	**54.00**	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES)
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023



CARGA.- CARGA MECANICA CON USO DE RETROEXCAVADORA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO (6 M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION A TIRO LIBRE.

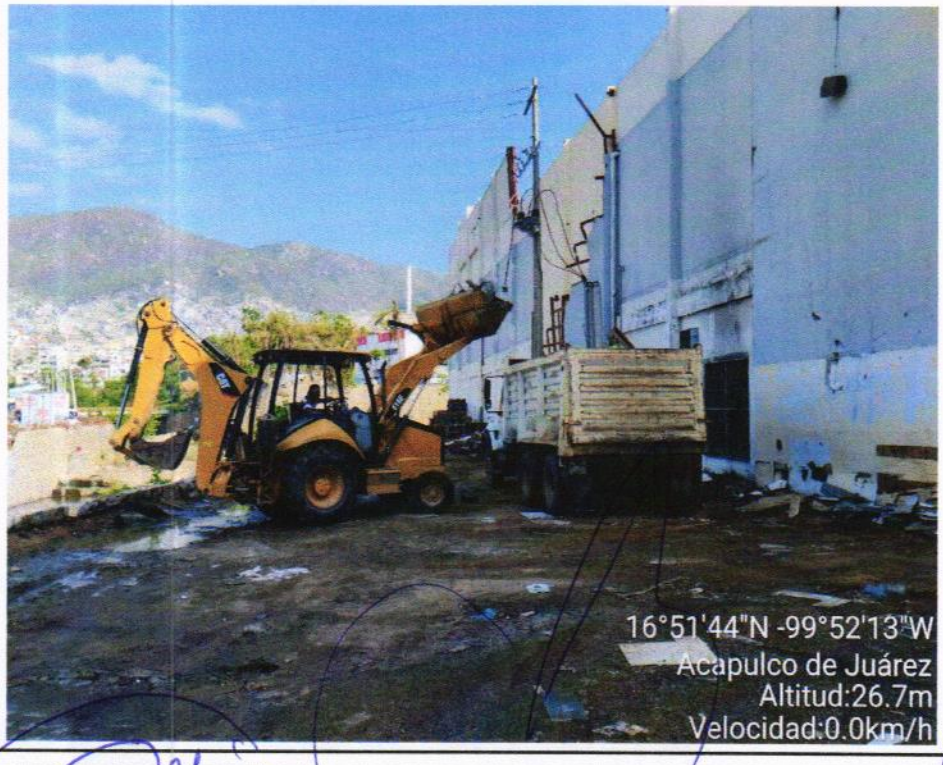

CARGA.- CARGA MECANICA CON USO DE RETROEXCAVADORA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO (6 M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION A TIRO LIBRE.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES)
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023



CARGA.- CARGA MECANICA CON USO DE RETROEXCAVADORA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO (6 M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION A TIRO LIBRE.



CARGA.- CARGA MECANICA CON USO DE RETROEXCAVADORA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO (6 M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION A TIRO LIBRE.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No.: 03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A8 **ACARREOS Y LIMPIEZA**

CARGA CARGA MECANICA CON USO DE RETROEXCAVADORA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO (6 M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION A TIRO LIBRE.

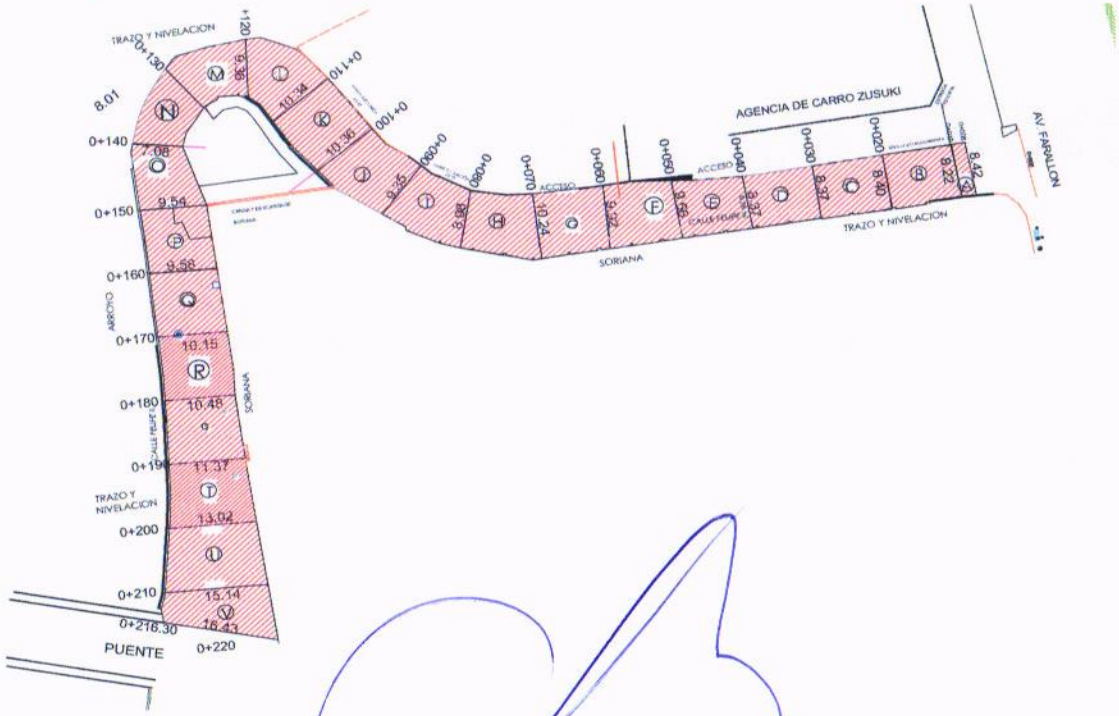

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 03 (TRES) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	ALTO	LARGO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A8	**ACARREOS Y LIMPIEZAS**									
33-0528	LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20 MTS.	0+008.000	0+010.000		8.32		2.00	M2	16.64	A
		0+010.000	0+020.000		8.31		10.00	M2	83.10	B
		0+020.000	0+030.000		8.38		10.00	M2	83.80	C
		0+030.000	0+040.000		8.32		10.00	M2	83.20	D
	ANCHO PROMEDIO	0+040.000	0+050.000		8.97		10.00	M2	89.70	E
	A.-8.42+8.22=16.64/2=8.32	0+050.000	0+060.000		9.79		10.00	M2	97.90	F
	B.- 8.22+8.40=16.62/2=8.31	0+060.000	0+070.000		10.08		10.00	M2	100.80	G
	C.- 8.40+8.37=16.77/2=8.38	0+070.000	0+080.000		9.61		10.00	M2	96.10	H
	D.- 8.37+8.28=16.65/2=8.32	0+080.000	0+090.000		9.16		10.00	M2	91.60	I
	E.- 8.28+9.66=17.94/2=8.97	0+090.000	0+100.000		9.85		10.00	M2	98.50	J
	F.- 9.66+9.92=19.58/2=9.79	0+100.000	0+110.000		10.35		10.00	M2	103.50	K
	G.- 9.92+10.24=20.16/2=10.08	0+110.000	0+120.000		9.84		10.00	M2	98.40	L
	H.- 10.24+8.98=19.22/2=9.61	0+120.000	0+130.000		8.68		10.00	M2	86.80	M
	I.- 8.98+9.35=18.33/2=9.16									
	J.- 9.35+10.36=19.71/2=9.85									
	K.- 10.36+10.34=20.70/2=10.35									
	L.- 10.34+9.36=19.70/2= 9.84									
	M.- 9.36+8.01=17.37/2=8.68									
						SUBTOTAL HOJA 1		**M2**	**1,130.04**	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	N Ú M E R O S G E N E R A D O R E S		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 03 (TRES) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2023	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO	ALTO	LARGO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A8	**ACARREOS Y LIMPIEZAS**									
33-0528	LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20 MTS.	0+130.000	0+140.000		7.54		10.00	M2	75.40	N
		0+140.000	0+150.000		8.31		10.00	M2	83.10	O
		0+150.000	0+160.000		9.56		10.00	M2	95.60	P
		0+160.000	0+170.000		9.86		10.00	M2	98.60	Q
	ANCHO PROMEDIO	0+170.000	0+180.000		10.31		10.00	M2	103.10	R
	N.- 8.01+7.08=15.09/2=7.54	0+180.000	0+190.000		10.92		10.00	M2	109.20	S
	O.-7.08+9.54=16.62/2=8.31	0+190.000	0+200.000		12.19		10.00	M2	121.90	T
	P.- 9.54+9.58=19.12/2=9.56	0+200.000	0+210.000		14.08		10.00	M2	140.80	U
	Q.- 9.58+10.15=19.73/2=9.86	0+210.000	0+216.000		15.78		6.00	M2	94.68	V
	R.- 10.15+10.48=20.63/2=10.31					**SUB TOTAL HOJA 2 =**		**M2**	**922.38**	
	S.- 10.48+11.37=20.85/2=10.92					**SUB TOTAL HOJA 1 =**		**M2**	**1,130.04**	
	T.- 11.37+13.02=24.39/2=12.19									
	U.- 13.02+15.14=28.16/2=14.08									
	V.- 15.14+16.43=31.57/2=15.78									
							TOTAL	**M2**	**2,052.42**	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S				
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	ESTIMACIÓN No.: 03 (TRES) Y FINIQUITO
		FECHA:	12 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.			

C R O Q U I S

A8 **ACARREOS Y LIMPIEZAS**

33-0528 LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20 MTS.

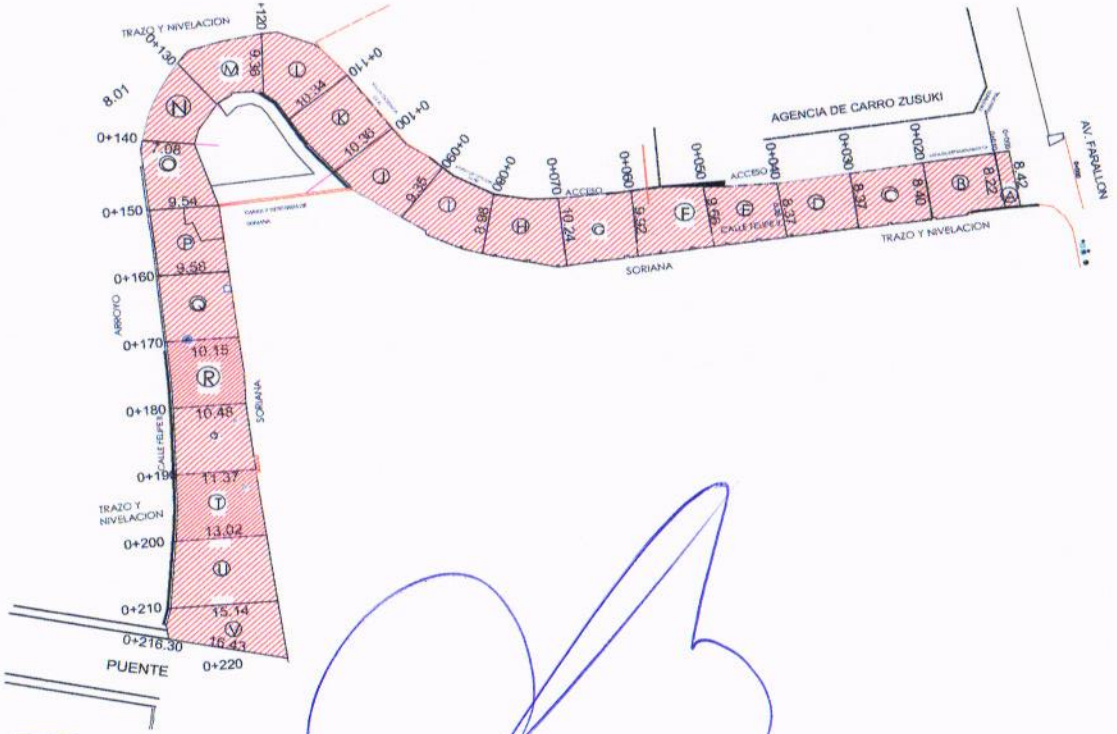

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES)
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023



33-0528.- LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20 MTS.




33-0528.- LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20 MTS.


IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	**RESIDENTE DE OBRA** ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA** ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	03 (TRES)
		FECHA	12 DE DICIEMBRE DEL 2023

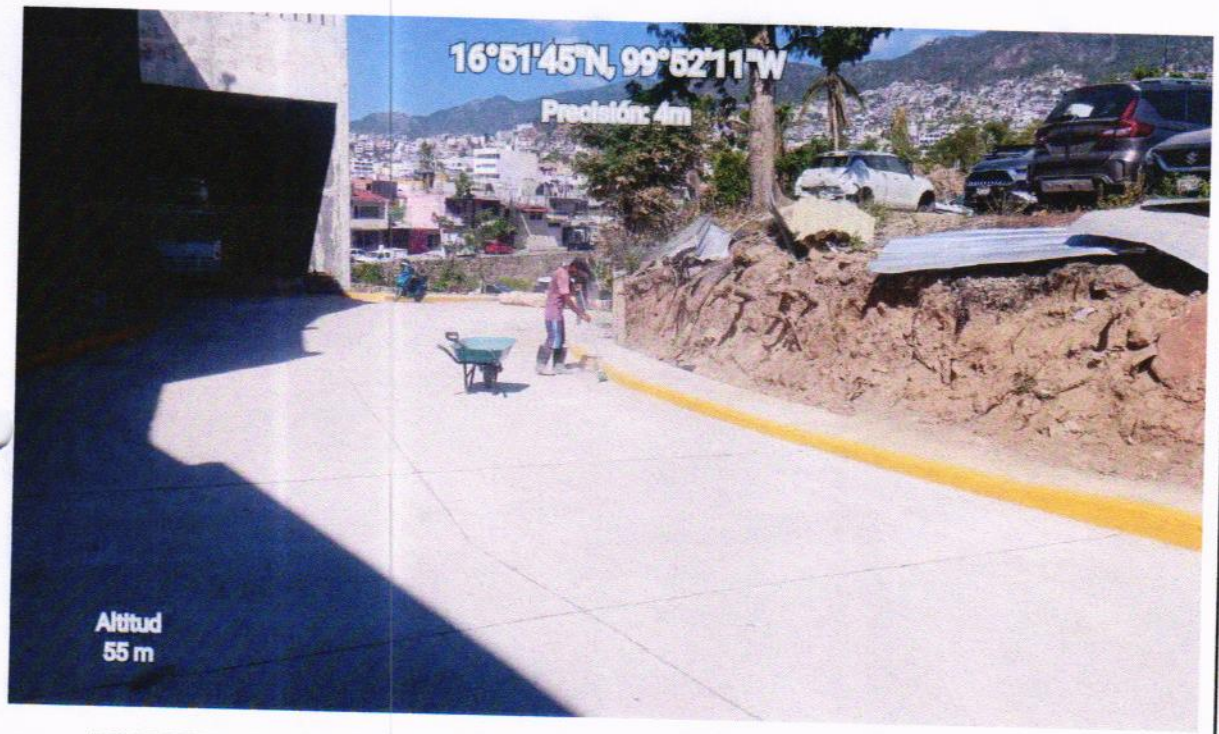

33-0528.- LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20 MTS.

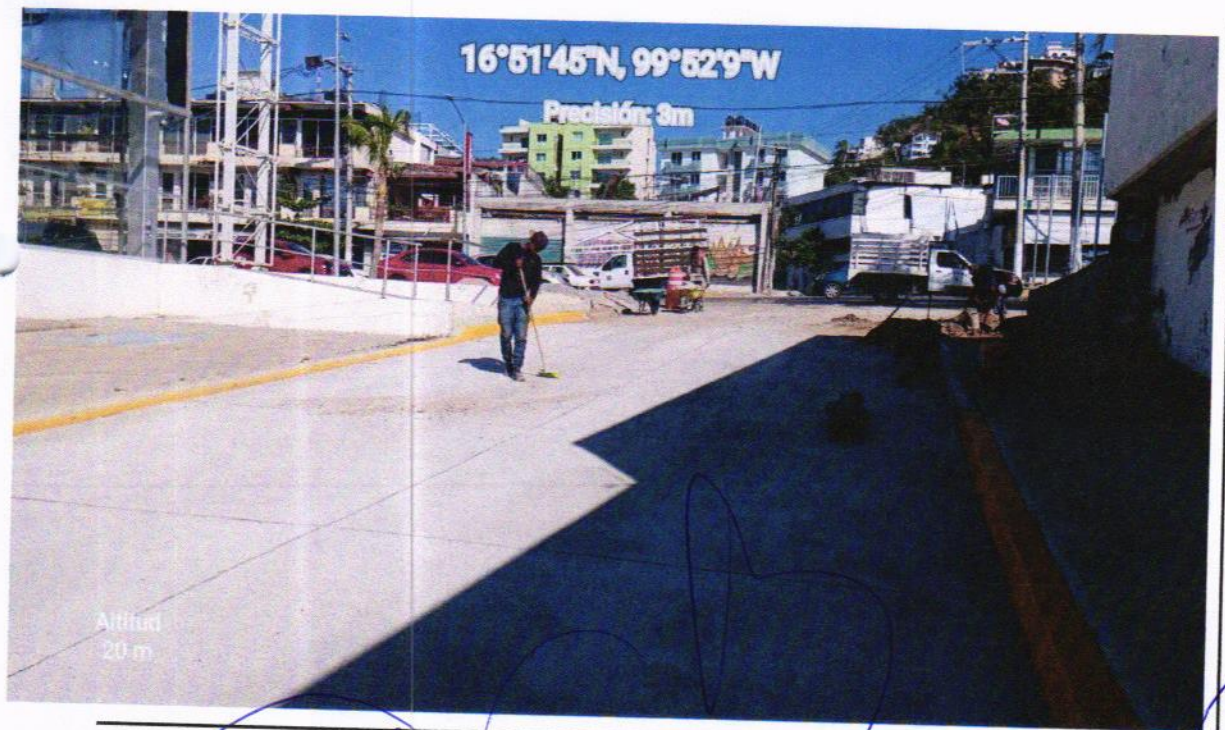

33-0528.- LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20 MTS.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

FOLIO Nº 306919

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO ENTRONQUE AV. UNIVERSIDAD FRACC. MAGALLANES. ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023

NOTA NO 25

CON ESTA FECHA Y NOTA DE BITACORA LA RESIDENCIA DE OBRA Y LA CONTRATISTA VERIFICAN LOS TRABAJOS POR MEDIO DE UN LEVANTAMIENTO CON CINTA PLASMADOS EN LA ESTIMACION 02 (DOS) CON PERIODO DEL 2 DE OCTUBRE DE 2023 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 DE LA OBRA "REHABILITACION DE CALLE FELIPE II TRAMO ENTRONQUE AV. UNIVERSIDAD FRACC. MAGALLANES, UNA VEZ CONCILIADA DE LE AUTORIZA REALICE EL TRAMITE Y COBRO DE DICHA ESTIMACION.

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

ARQ VICENTE AURELIO GUERRERO
SUPERINTENDENTE

NOTA NO 26

3 DE NOVIEMBRE DEL 2023

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA LA CONTRATISTA LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA QUE SE HAN RETOMADO LOS TRABAJOS UNA VEZ DE HACER LIMPIEZA GENERAL DE LA CALLE QUE OCASIONO EL HURACAN OTIS, SE HA HECHO CON LAS EXCAVACIONES PARA CIMENTACION, RELLENO DE BANQUETAS, COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE 2" ASI COMO LA CONSTRUCCION DE REGISTROS ELECTRICOS.

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

SUPERVISOR
ARQ VICENTE AURELIO GUERRERO

SUPERINTENDENTE

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 306920

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO ENTRONQUE AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MACALLUDES, ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

FECHA: 6 DE NOVIEMBRE DEL 2023

NOTA No 27

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA LA RESIDENCIA DE OBRA EN RECORRIDO EN SITIO, OBSERVA QUE SE HA DADO CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS DE FABRICACION DE REGISTROS PLUVIALES, COLOCACION DE TUBERIA, EXCAVACIONES Y SE HA INICIADO CON EL TRAZO DE LA EXCAVACION SANITARIA.

ARQ. URIEL MAURICIO SOLMERON JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO
SUPERINTENDENTE

NOTA No 28

10 DE NOVIEMBRE DEL 2023

POR ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA QUE LOS FOLIOS DE LA BITACORA DE APERTURA DEL FOLIO No 306901 AL 306920 SE HA TERMINADO Y SE INICIARA PARA DAR CONTINUIDAD A ESTA BITACORA DEL NO DE BITACORA No 308644 AL No 308660

ARQ. URIEL MAURICIO SOLMERON JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR

ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO
SUPERINTENDENTE

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 308644

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE I. TEXMO PARALLON AV. UNIVERSIDAD FRACC. MAGDALENAS, ACAPULCO DE

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 JUAREZ, GUERRERO.

NOTA No 29

CON ESTA FECHA Y No DE NOTA LA CONTRATISTA DE OBRA INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA DEL CAMBIO DE No DE FOLIO DEL 306920 A No 308644, TAMBIEN DE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE TUBO PVC COMPUIT DE 2" FABRICACION DE REGISTROS

ING. JUEL MAURICIO CALMERON JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. VICENTE ALARCON DEVERIANO
SUPERINTENDENTE

NOTA No 30

13 DE NOVIEMBRE DEL 2023

CON ESTA FECHA Y No DE NOTA LA CONTRATISTA LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA LA AUTORIZACION DE VOLUMENES (EXCEDENTES) EXCEDENTES QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN.

CONCEPTO.	UNIDAD	P.U.	CANTIDAD ORIGINAL	CANTIDAD DE EXCEDENTE	IMPORTE DE VOLUMEN
(SUMINISTRO Y APLICACION DE SUBBASE AL 90% PROCTOR CON EQUIPO MECANICOS)	M2	40.15	1411.35	1697.51	166.96	6611.32

(CONTINUA NOTA 30...)

RESIDENTE DE OBRA
ING. JUEL MAURICIO CALMERON JIMENEZ

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
ARQ. VICENTE ALARCON DEVERIANO

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 308645

REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FORMACION

OBRA: AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MACALLANES, ACAPULCO DE

FECHA: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 JUAREZ, GUERRERO

CONTINUACION NOTA 30

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD ORIGINAL	CANTIDAD ESTIMADA	EXCEDENTE	IMPORTE DEL VOLUMEN
	REGISTRO AUXILIAR PARA						
REG-AA	ALUMBRADO PUBLICO DE 50X60X65 MTS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28 CMS. CON 14 CMS DE ESPESOR ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 INCLUYE PLANTILLA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR F'c = 100 KG/CM2 HECHO Y CONTRADALEO DE DALAS DE 1/2" X 1/2" CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN TAPA Y FIJACION DE MORCO, DREN DE GRAVA DE 20 CMS DE ESPESOR, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	3554.16	8.0	11.0	3.00	10,663.38
TUBERIA DE PESADO	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PGC PESADO DE 50 MM DE DIAMETRO INCLUYE CONEXION, RELLENO CON ARENA HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M	201.24	200.00	221.20	21.20	4,264.29

CONTINUA NOTA 30 No. 1

RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR	SUPERINTENDENTE
ARQ. URIEL MADRIGAL JIMENEZ		ARQ. VICENTE MORENO SEVERIANO

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 308646

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FRANCISCO
AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MALVALUCHES, MUNICIPIO DE JUAREZ
FECHA: 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023 GUERRERO

CONTINUA NOTA 30

CODIGO	CONCEPTO	(P.U) UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD ORIGINAL	CANTIDAD POR ESTIMAR	EXCEDENTE	IMPORTE DEL VOLUMEN
	PAV. MEZCLA PREMEZCLADO (F'C=300 KG/CM2 TAM. 3/4") DE 20 CMS DE ESPESOR RESISTENCIA NORMAL, INCLUYE JUNTA CONSTRUCTIVA CON CHAFLAN DE 1/2" EN CADA JUNTA FRIA (AL TERMINO DE CADA COLADO) SE PROCEDERA A COLOCAR 8 CONECTORES CON VARILLA DE 1/2" A CADA 60 CMS. 30-30 CMS. FIBRA MICRO SINTETICA CUANDO CONCRETO, VIBRADO, ACABADOS DE INTERVALOS A 1RA ESTACION						
32-04 75A		M2	976.95	1471.35	1637.51	166.16	162,330.00
SUM PAV	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA METALICA CALIBRE 600 PARA EVITAR DESHIDRATACION DEL CONCRETO, INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	57.02	1471.35	(1637.51) 1637.51	166.16	9,474.94
CORTE 01	CORTE DE JUNTAS EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA MOTOR DISCO DIAMANTADO, INCLUYE LIMPIEZA DE JUNTA	ML	30.40	522.00	693.42	171.42	(4,113.93) + 6,239.41

CONTINUA NOTA 30

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. ORIEL MAURICIO
GUTIERREZ JIMENEZ

SUPERVISOR
ARQ. VICENTE ANDRES DELGADILLO

SUPERINTENDENTE

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 308647

REHABILITACION DE CALLE FELIPE II TRAMO FARALLON

OBRA: AV. UNIVERSIDAD, FRAC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

FECHA: 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023

CONTINUA NOTA 30

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	P.U	CANTIDAD ORIGINAL	CANTIDAD POR ESTIMAR	EXCEDENTE	IMPORTE DE VOLUMEN
32-0484	CALAFATEO EN LOSAS Y CUARTELONES A BASE DE ASFALTO OXIDADO INCLUYE MATERIAL DESPERDICIOS ACARREOS A PRIMERA ESTACION Y MANO DE OBRA.	M.L.	28.53	522.0	693.42	171.42	4890.6
CARGA	CARGA MECANICA CON DOS DE RETROEXCAVADORA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO (6 M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION A TIRO LIBRE	M3	229.33	979.16	54.00	54.00	12383.82

ARQ. URIEL MAURICIO
SALMERON JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. VICENTE SUAREZ
SEVERINO
SUPERINTENDENTE

NOTA NO 31

15 DE NOVIEMBRE DEL 2023

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA ESTA RESIDENCIA DE OBRA AUTORIZA A LA CONTRATISTA PRESENTE LOS VOLUMENES EXCEDENTES DE OBRA.

RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR	SUPERINTENDENTE
ARQ URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ VICENTE SUAREZ SEVERINO	

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 308648

OBRA: REHABILITACION DE CALLE PELIPE II TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD FRACC. HACALUCHES ACAPULCO DE

FECHA: 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 JOREC GUERRERO

NOTA No 32

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA LA CONTRATISTA INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA QUE SE TERMINO CON LOS TRABAJOS DE FABRICACION DE GUARNICIONES Y SE HA REALIZADO LAS CONEXIONES DE TOMAS DOMICILIARIAS Y DE ESCUELA TRAM AL 100% Y FUNCIONANDO.

ARQ. URIEL MAURICIO SOLMERON JIMENEZ SUPERVISOR RESIDENTE DE OBRA

ARQ. VICENTE RODRIGUEZ SEVERIANO SUPERINTENDENTE.

NOTA No 33

28 DE NOVIEMBRE DEL 2023

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA LA RESIDENCIA DE OBRA EN RECORRIDO OBSERVO QUE LA CONTRATISTA A CONCLUIDO LA FABRICACION DE REGISTROS AUXILIARES, EL TUBO CONCRETO DE 2" Y HA PROCEDIDO A EL ACARREO DE MATERIAL ACUMULADO POR LA TALA DE ARBOLES Y LODO A CONSECUENCIA DEL HURACAN OTIS PRESENTADO EL DIA 24 DE OCTUBRE Y DESPEJAR EL AREA DE LA VIALIDAD E INICIAR CON LAS TERRACERIAS POR EL TRAMO DE SUBRASANTE, COLOCACION DE BASE, COMPACTACION Y PAVIMENTACION DE LA CALLE

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SOLMERON JIMENEZ

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
ARQ VICENTE RODRIGUEZ SEVERIANO

FOLIO Nº 308649

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FRANCION AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MONTALVANES, ACAPULCO DE

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 JUAREZ, GUERRERO

NOTA NO 34

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA LA CONTRATISTA INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA DEL INICIO DEL AFINE Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENAMIENTO 0+110 EN PRESENCIA DEL LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS.

ARQ. URIEL MAURICIO PALMEROS JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. VICENTE ALARCON OSUNA
SUPERINTENDENTE

NOTA NO 35

1º DE DICIEMBRE

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA LA CONTRATISTA INFORMA A LA RESIDENCIA QUE CONCLUYO EL AFINE Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE DEL CADENAMIENTO 0+110 AL 0+216

ARQ. URIEL MAURICIO PALMEROS JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. VICENTE ALARCON OSUNA
SUPERINTENDENTE

NOTA NO 36

4 DE DICIEMBRE DEL 2023

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA EL RESIDENTE DE OBRA ESTA RESIDENCIA OBSERVA QUE LA CONTRATISTA HA INICIADO CON LA COLOCACION DE BASE Y SU COMPACTACION EN PRESENCIA DEL LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+110

RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR	SUPERINTENDENTE
ARQ URIEL MAURICIO PALMEROS JIMENEZ	ARQ. VICENTE ALARCON OSUNA	

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 308650

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON
FECHA: 5 DE DICIEMBRE DEL 2013 AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO

NOTA NO. 37

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE BITACORA LA CONTRATISTA INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA QUE LOS TRABAJOS DE COMPACTACION DE BASE SE HAN CONCLUIDO EN UN 100% DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENAMIENTO FINAL 0+216

ARQ. ORLEL MANRIQUEZ DOLMEDO JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. VICENTE MARCIAL DELGADILLO
SUPERINTENDENTE

NOTA NO 38 6 DE DICIEMBRE DE 2013

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA LA CONTRATISTA INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA QUE SE HA INICIADO EL COLADO DE PAVIMENTO CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 DE 20 CMS DE ESPESOR T.M.A 3/4" ACABADO A REGLA, JUNTA CONSTRUCTIVA, CONECTORES DE VARILLA DE 1/2" A CADA 60 CMS. FIBRA MICROSINTETICA CURADO CON EXPORETO, VIBRADO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENAMIENTO 0+10, EN PRESENCIA DEL LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS.

ARQ. ORLEL MANRIQUEZ DOLMEDO JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. VICENTE MARCIAL DELGADILLO
SUPERINTENDENTE

SUPERVISOR

ESOR-02
REV.02


FOLIO № 308651


OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FRACCIONAMIENTO AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO

FECHA: 7 DE DICIEMBRE DE 2023

NOTA NU 29

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA SE INFORMA AL RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA QUE HAN CONCLUIDO EL COLADO DE PAVIMENTO DEL CADENAMIENTO 0+110 AL 0+216

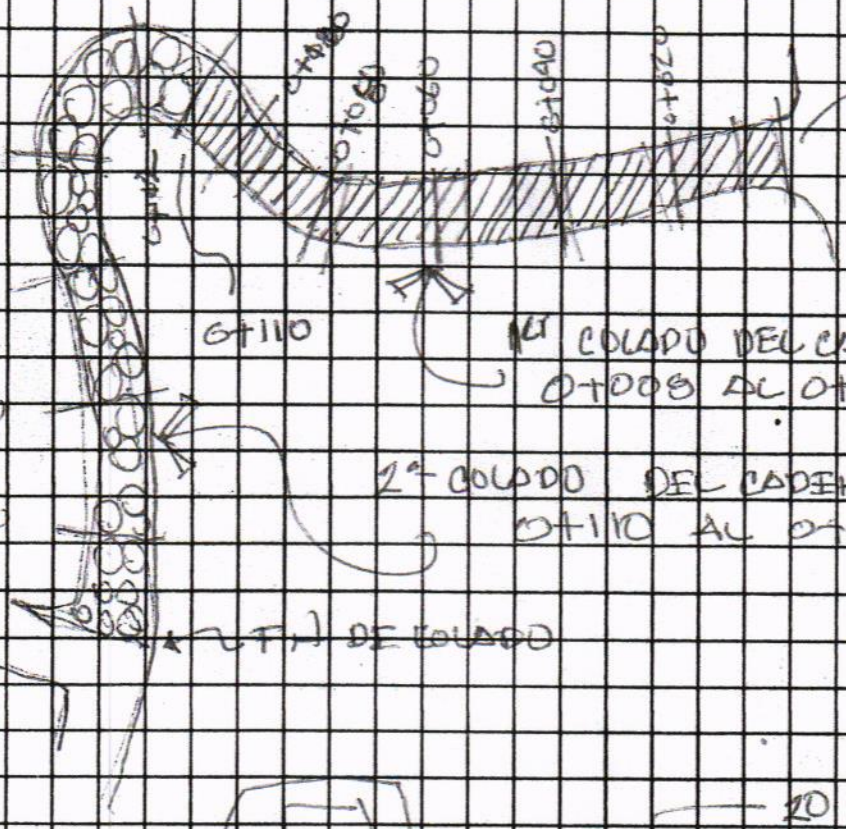

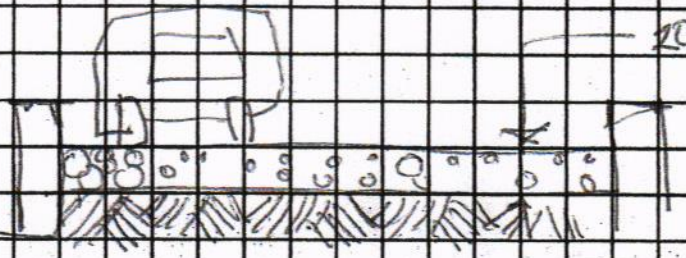

ING. ORIEL MAURICIO CALDERON JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. VICENTE ALBERTO JIMENEZ
SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 308652

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO PARALELA AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO

FECHA: 7 DE DICIEMBRE DEL 2023

NOTA NO. 40

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA LA CONTRATISTA INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA QUE SE HA APLICADO LA PINTURA AMARILLO TRAFICO EN SEÑALIZACION Y DE PROCEDE A REALIZAR LA LIMPIEZA FINA ULTIMA GENERAL

ARQ. URIEL MAURICIO
PALMEROS JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. VICENTE ALARCON
CEVERINO
SUPERINTENDENTE.

NOTA NO 41

11 DE DICIEMBRE DEL 2023

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA LA CONTRATISTA SE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA QUE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA CALLE FELIPE II DEL FRACC. MAGALLANES SE HAN CONCLUIDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA SE CONCILIEN LOS VOLUMENES Y PRESENTAR LA ESTIMACION 03 (TRES) Y FINIQUITO PARA SU REVISION EN SITIO

ARQ. URIEL MAURICIO
PALMEROS JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. VICENTE ALARCON
CEVERINO
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA | SUPERVISOR | SUPERINTENDENTE

FOLIO Nº 308653

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE

FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023 JUAREZ, GUERRERO

NOTA NO 42

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA LA CONTRATISTA HACE ENTREGA A LA RESIDENCIA DE OBRA LA ESTIMACION 03 (TRES) Y FINIQUITO Y VERIFICACION LOS TRABAJOS POR MEDIO DE LEVANTAMIENTO CON CINTA PLASMADOS YA QUE LOS TRABAJOS CONTRATADOS CON NUMERO DE CONTRATO MAS-FAISMUN/1426-2023/LP CON PERIODO DE EJECUCION DEL 15 DE AGOSTO AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023 SE EJECUTARON FISICAMENTE AL 100% DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON, AV. UNIVERSIDAD DEL FRACC MAGALLANES UBICADO EN EL FRACC. MAGALLANES LUEGO DE LA REVISION SE LE PIDE QUE INGRESE SU ESTIMACION PARA SU COBRO

ARQ. ORIEL GUMERCINDO JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO
SUPERINTENDENTE

NOTA NO 43 CIERRE DE BITACORA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023

CON ESTA FECHA Y NO DE NOTA LA RESIDENCIA DE OBRA CON LA CONTRATISTA IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV. REALIZA RECORRIDO Y REVISION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON, AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES EN ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO, CON NUMERO DE CONTRATO MAS-FAISMUN/1426-2023/LP VERIFICANDOSE QUE ENCUENTRAN TERMINADOS AL 100% Y FUNCIONANDO POR LO QUE SE PROCEDE AL CIERRE DE LA PRESENTE BITACORA DE OBRA RECORDANDOLE QUE EL H AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR CUALQUIER RECLAMO POSTERIOR EN CASO DE EXISTIR VICIOS OCULTOS.

RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR	SUPERINTENDENTE
ARQ. ORIEL MAURILIO GUMERCINDO JIMENEZ	ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO	

ESOR-02
REV.02

FOLIO № 308654

OBRA:
FECHA:

RESIDENTE DE OBRA | SUPERVISOR | SUPERINTENDENTE

ESOR-02
REV 02

FOLIO № 308655

OBRA:
FECHA:

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 308656

OBRA:

FECHA:

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 308657

OBRA:

FECHA:

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE

ESOR-02

FOLIO Nº 308658

OBRA:

FECHA:

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 308659

OBRA:
FECHA:

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE

ESOR-02
REV.02

FOLIO № 308660

OBRA:

FECHA:

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE

ESOR-02

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

EJERCICIO 2023

ESTIMACION 02 (DOS)

SUBMODALIDAD: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III) RAMO XXXIII.**

CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**

OBRA/PROYECTO/ACCIÓN: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.**

UBICACIÓN: **ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO**

CONTRATISTA: **IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.**

NUMERO DE ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA: **(ZAP): 2721**

CLAVE DE LA LOCALIDAD: **12001 0001**

NUMERO DE (AGEB) : **12001 0001 2721**

COPIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

COMPARATIVO PRESUPUESTAL

MODALIDAD: **CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2023**
OF. AUTORIZACION:

SUBMODALIDAD: **FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**
OF. APROBACION:

PROGRAMA: **RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS**
PROYECTO SOCIAL:

SUBPROGRAMA:
DEPENDENCIA EJECUTORA: **12M01 H. A. ACAPULCO**

ESTADO: **12 GUERRERO**
No. DE OBRA:

MUNICIPIO: **001 ACAPULCO DE JUAREZ**

AVANCE FISICO: _____ AVANCE FINANCIERO: _____

LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	INVERSION			SALDO
		APROBADA	COMPROBADA	ACUMULADA	
FRACC. MAGALLANES	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD	5,000,427.46	512,356.12	3,224,255.39	1,776,172.07

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

REMISION DE DOCUMENTOS

MODALIDAD: **CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2023**

SUBMODALIDAD: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III) RAMO XXXIII**

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES. ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CONTRATO No.: **MAJ-FAISMUN/426-2023/AD**

DOCUMENTOS REMITIDOS A LA: **AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO**

DEPENDENCIA EJECUTORA: **12M01 H. A. ACAPULCO**

No. PROG.	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
			TOTAL	RETENCIONES	NETO
1	18-dic.-23	IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. FACT. No. 9319	736,472.24	224,116.12	512,356.12
		SUBTOTAL $	736,472.24	224,116.12	512,356.12
		TOTAL $	736,472.24	224,116.12	512,356.12

martes 19 de diciembre de 2023

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

TRANSFERENCIA: 794

26 DE DICIEMBRE DE 2023

Paguese vía transferencia a:
IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

La cantidad de:
512,356.12

(** QUINIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N. **)

PÓLIZA TRANSFERENCIA

Beneficiario IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Banco a transferir

CLABE

Cuenta

Banco pagador
FIII FAISM 2023 STDER 9395
26/12/2023 794

Cuenta
65509609395
512,356.12

Concepto
Pago de solicitudes : 1501-1102, PAGO FACTURA NO. A1C75A5793 19 EST-2 (DOS) REHABILITACION DE CALLE FELIPE II TRAMO FARAL LON AV. UNIVERSIDAD FRACC. MAGALLANES, CON CARGO AL RAMO 33
Facturas: 03A9E730-2AB4-4528-8961-A1C75A579319,

Cuenta	NUP	Descripción	Debe	Haber
21130-00000-10004-00045		Generado por cuenta por pagar	512,356.12	
11120-00000-02005-00005		IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE		512,356.12
			512,356.12	512,356.12

Solicitud de pago
504 - 8880

Póliza
11 12 126

OPERADO
FISM 2023

Elaboró

JCM

Revisó

EMO

Autorizó

CAMR

Santander

794

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ 080122053040

Usuario: 53420142 - MONTSERRAT MONTES MANRRIQUEZ

Referencia: 9Q139

Referencia numérica del Emisor:

Referencias del Movimiento: 1529552

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014260655096093956

Cuenta Cargo: 65509609395 - R33 FIII FAISM 2023

Cuenta Abono: 072261002480081016 - IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Importe: $ 512,356.12 MXN

Concepto: R33FIII F79319 EST2 REHAB CFELIPE

Fecha y hora de Alta: 26/12/2023 16:05:04

Fecha y hora de Liquidación: 26/12/2023 16:05:10

OPERADO
FAISMUN - 2023

Clave de Rastreo: 20231226400140BET0000415295520

RFC Beneficiario:

RFC Ordenante: MAJ010101NA3

Importe IVA:

Email del Beneficiario:

Banco Destino: BANORTE

Operación realizada por internet

Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó **55 5169 4303**

SuperLínea Empresarial SuperLínea PyME

IMEXA CONSTRUCTORES S A DE C V

R.F.C. ICO091216UUA
Corregidora No. 4 Col. Morelos, C.P. 39530

CLIENTE:

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
R.F.C. MAJ010101NA3
AV. CUAUHTÉMOC S/N INTERIOR PARQUE PAPAGAYO COL. HORNOS INSURGENTES. CP. 39350

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES

UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
PERIODO DEL CONTRATO: DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
No. DE OBRA: MAJ/426
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

CONTRATO No.	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE CON I.V.A.	ANTICIPO CON I.V.A.
MAJ-FAISMUN/426-2023/LP	15 DE AGOSTO DEL 2023	$5,000,427.46	$1,500,128.24

TIPO DE OBRA: DOMINIO PUBLICO

METAS PROGRAMADAS: 1,471.35 M2

METAS ALCANZADAS: 50.00%

OPERADO
FAISMUN - 2023

RECIBI DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, A TRAVES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III) QUE TIENE COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO EL RAMO XXXIII., APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, LA CANTIDAD DE: $ 512,356.12 (QUINIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS), DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN EL PERIODO DEL 02 DE OCTUBRE DE 2023 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, UBICADA EN ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO No. MAJ-FAISMUN/426-2023/LP.

DEDUCCIONES:

AMORTIZACION DEL ANTICIPO	$220,941.67
5 AL MILLAR DE SUPERV.	$3,174.45
5 AL MILLAR DE LA CMIC	$0.00
TOTAL DE DEDUCCIONES	**$224,116.12**

CALCULO DE LA ESTIMACION:

IMPORTE DE LA ESTIMACION CON IVA	$736,472.24
MENOS DEDUCCIONES	$224,116.12
SALDO A PAGAR	**$512,356.12**

REPRESENTANTE LEGAL

ING. IRINA SALGADO HERNÁNDEZ

SECRETARIO DE PLANEACION
Y DESARROLLO ECONÓMICO

L.C. ERIC ROMERO MORALES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

M.I. VLADIMIR HERNÁNDEZ ALEMAN
POR ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DR. CARLOS ARMANDO MORILLON RAMIREZ

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL Y CONTRALORÍA

SUBTOTAL	$444,422.91
DESCUENTO	$3,174.45
IMPUESTOS TRASLADOS IVA 16.0000%	$71,107.66
TOTAL	**$512,356.12**

CANTIDAD CON LETRA
(QUINIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N.)

RFC emisor:	ICO091216UUA	**Folio fiscal:**	03A9E730-2AB4-4528-8961-A1C75A579319
Nombre emisor:	IMEXA CONSTRUCTORES	**No. de serie del CSD:**	00001000000702553491
RFC receptor:	MAJ010101NA3	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	39530 2023-12-18 11:05:44
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Código postal del receptor:	39350	**Régimen fiscal:**	General de Ley Personas Morales
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	**Exportación:**	No aplica
Uso CFDI:	Construcciones.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
72141103		1.00	E48	Unidad de servicio	444,422.91	444,422.91	3,174.45	Sí objeto de impuesto.

Descripción: ESTIMACIÓN 02 (DOS) NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD FRACC. MAGALLANES UBICADA EN ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO CON CARGO AL FONDO III RAMO 33 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023 SEGUN CONTRATO No. MAJ-FAISMUN/426-2023/LP DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2023 PERIODO DE CONTRATO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	444,422.90	Tasa	16.00%	71,107.66

Número de pedimento	Número de cuenta predial

Moneda:	Peso Mexicano
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago:	Pago en una sola exhibición

Subtotal			$ 444,422.91
Descuento			$ 3,174.45
Impuestos trasladados	IVA	16.00%	$ 71,107.66
Total			**$ 512,356.12**

Sello digital del CFDI:

EveAwG0g4eonDi4N/bX5B3ENL/NjERn30Lw1zgYgMnY+xfdNE/RbnAyNdhqJ9L1tPSDEZVSaECMU5WiBbPWDCw7rOgG2ZH4mkOnOQZkHMlAundk2i5wZducdhJRv4Eg/MzNVlXeT4qcY
TS10KaKA7pmhhcHfnmKLiBBs7yiNzew1MZvb+FEP8WL6achWPdJoWaxv2orX5wb3xjWihTz7Eh/65WVTpe2OylKq7FzOgPDSezyU4+rrsqd0+aBrZ7myMSbjzqfrhqUfspOlu/XbyGwql7lv77j
sh0wlPtSXEEKpSZNWCCL5EFkU7bUGUYvmkTdeTQwEG8Fl3SCnJhO37w==

Sello digital del SAT:

WNPrnPD55Uu6zyf8Vel1CkGryV5h+03HfzUr/cvYYiZCICUFvLb2JnJ1clAna3cf58ydPSGVfoizENVR3Sk7Jsi0tWVbB/JARszkKL20U6yJ38W1WysW9klavJAEPdjp/NZ16d2mGeMC+s5KAVjr
LFiGTM9LoCxlhf6e9ECCDBbupTZTAPpELdzMlKj76CNozxE3CC8cHFzM++ayymcSbLh4HahVQ4q3vZPdLfCauSsCtOYphCb/zt/HGW4Eh7BVqF4rOX9g7/h40ITAo5w4A9jKzHtVTk3ow/JH
eXATs0Lz82lXiZx37A+l95WZcBUGZuquYHbroJUUd5/piAzGkw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|03A9E730-2AB4-4528-8961-A1C75A579319|2023-12-18T11:07:16|SAT970701NN3|EveAwG0g4eonDi4N/bX5B3ENL/NjERn30Lw1zgYgMnY+xfdNE
/RbnAyNdhqJ9L1tPSDEZVSaECMU5WiBbPWDCw7rOgG2ZH4mkOnOQZkHMlAundk2i5wZducdhJRv4Eg/MzNVlXeT4qcYTS10KaKA7pmhhcHfnmKLiBB
s7yiNzew1MZvb+FEP8WL6achWPdJoWaxv2orX5wb3xjWihTz7Eh/65WVTpe2OylKq7FzOgPDSezyU4+rrsqd0+aBrZ7myMSbjzqfrhqUfspOlu/XbyGwql7lv
77jsh0wlPtSXEEKpSZNWCCL5EFkU7bUGUYvmkTdeTQwEG8Fl3SCnJhO37w==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2023-12-18 11:07:16

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

REVISADO:
C. P. MIGUEL JAIMES RAMOS
SINDICO PROCURADOR ADMINISTRATIVO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2021-2024

REVISADO:
DR. CARLOS ARMANDO MORILLÓN RAMÍREZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

OPERADO
FAISMUN - 2023

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.


```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cartaporte30="http://www.sat.gob.mx/CartaPorte30" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Fecha="2023-12-18T11:05:44"
Sello="EveAwG0g4eonDi4N/bX5B3ENL/NjERn30Lw1zgYgMnY+xfdNE/RbnAyNdhqJ9L1tPSDEZVSaECMU5WiBbPWDCw7rOgG2ZH4mkOnOQZkHMlAundk2i5wZducdhJRv4Eg/MzNVlXeT4qcYTS10Ka
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000702553491"
Certificado="MIIGEDCCA/igAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDI1NTM0OTEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwgU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVU
SubTotal="444422.91" Descuento="3174.45" Moneda="MXN" Total="512356.12" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="39530">
  <cfdi:Emisor Rfc="ICO091216UUA" Nombre="IMEXA CONSTRUCTORES" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="MAJ010101NA3" Nombre="MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ" DomicilioFiscalReceptor="39350" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="72141103" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de servicio" Descripcion="ESTIMACIÓN 02 (DOS) NOMBRE DE LA
    OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD FRACC. MAGALLANES UBICADA EN ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO CON CARGO AL FONDO
    III RAMO 33 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023 SEGUN CONTRATO No. MAJ-FAISMUN/426-2023/LP DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2023 PERIODO DE CONTRATO DEL 15 DE
    AGOSTO DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023." ValorUnitario="444422.91" Importe="444422.91" Descuento="3174.45" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="444422.90" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="71107.66"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="71107.66">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="444422.90" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="71107.66"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="03A9E730-2AB4-4528-8961-A1C75A579319"
    FechaTimbrado="2023-12-18T11:07:16" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
    SelloCFD="EveAwG0g4eonDi4N/bX5B3ENL/NjERn30Lw1zgYgMnY+xfdNE/RbnAyNdhqJ9L1tPSDEZVSaECMU5WiBbPWDCw7rOgG2ZH4mkOnOQZkHMlAundk2i5wZducdhJRv4Eg/MzNVlXeT4qc
    NoCertificadoSAT="00001000000504465028"
    SelloSAT="WNPrnPD55Uu6zyf8Vel1CkGryV5h+03HfzUr/cvYYiZClCUFvLb2JnJ1cIAna3cf58ydPSGVfoizENVR3Sk7Jsi0tWVbB/JARszkKL20U6yJ38W1WysW9klavJAEPdjp/NZ16d2mGeM
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```


OPERADO
FAISMUN - 2023

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

HACIENDA | SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ICO091216UUA	IMEXA CONSTRUCTORES	MAJ010101NA3	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
03A9E730-2AB4-4528-8961-A1C75A579319	2023-12-18T11:05:44	2023-12-18T11:07:16	SAT970701NN3
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$512,356.12	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
FAISMUN - 2023

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISIÓN FISCAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

E S T A D O D E C U E N T A

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	ESTIMACION No.	**02 (DOS)**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLAES**	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023	
CONTRATISTA:	**IMEXA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.**	No. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/426-2023/LP	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023	
		FECHA:	31 DE OCTUBRE DEL 2023		

IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	PERIODO DEL CONTRATO	IMPORTE DEL ANTICIPO (CON IVA)	FECHA DE ANTICIPO
$ 5,000,427.46	DEL 15 DE AGOSTO DE 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	**$ 1,500,128.24**	**07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

ESTIMACION	PERIODO ESTIMACION	IMPORTE ESTIMACION	IVA	2 AL MILLAR C.M.I.C	5 AL MILLAR INSP. DE OBRAS	AMORTIZACION ANTICIPO	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
01 (UNO)	DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023	1,501,204.22	240,192.68	0.00	7,506.02	522,419.07	529,925.09	1,211,471.81
02 (DOS)	DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023	634,889.86	101,582.38	0.00	3,174.45	220,941.67	224,116.12	512,356.12
	TOTAL	2,136,094.08	341,775.06	0.00	10,680.47	743,360.74	754,041.21	1,723,827.93
	SALDO	**$2,522,558.32**		**SALDO POR AMORTIZAR**		**$756,767.50**		

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

R E S U M E N D E L A E S T I M A C I Ó N

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES**	FECHA:	31 DE OCTUBRE DEL 2023	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**IMEXA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/426-2023/LP	ESTIMACION No.: 02 (DOS)
		TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	

No.	P A R T I D A	IMPORTE
A1	PRELIMINARES	30,699.87
A2	TERRACERIAS	45,784.90
A3	INSTALACION HIDRAULICA	20,154.15
A4	INSTALACION SANITARIA	0.00
A5	ALBAÑILERIA	295,217.81
A6	INSTALACIONES ELECTRICAS Y LUMINARIAS	0.00
A7	PAVIMENTACION	77,117.46
A8	ACARREOS Y LIMPIEZAS	165,915.67
	TOTAL DE PARTIDAS $	634,889.86
	SUBTOTAL $	634,889.86
	16 % IVA $	101,582.38
	TOTAL $	736,472.24

LA PRESENTE ESTIMACION IMPORTA LA CANTIDAD DE: $ 736,472.24 (SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N.))

AVANCE FISICO 50.00%

AVANCE FINANCIERO ANTERIOR 34.82%

AVANCE FINANCIERO ACTUAL 14.73%

AVANCE FINANCIERO TOTAL 49.55%

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

	E S T I M A C I Ó N			ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023	
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	FECHA:	31 DE OCTUBRE DEL 2023	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023	
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/426-2023/LP	HOJA: 1	DE: 9
		TIPO DE OBRA:	URBANIZACION		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
A1	PRELIMINARES								
3-0073	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICAS DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIES MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD) INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS.	M2	17.31	2,692.81	2,052.42	0.00	2,052.42	0.00	0.00
D-CAR5A10	DEMOLICION A MAQUINA DE CARPETA ASFALTICA DE 56.00 A 10.00 CMS. DE ESPESOR INCLUYE MANO DE OBRA Y ACARREOS EN 1ra, ESTACION	M2	73.31	1,649.00	1,649.00	70.80	1,719.80	70.80	5,190.35
D-BANQU	DEMOLICION MECANICA DE BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: HERAMIENTA MENOR, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	63.40	146.04	146.04	80.07	226.11	80.07	5,076.44
D-GUARMM	DEMOLICION MECANICA DE GUARNICION DE 15X20X50 CM, INCLUYE: EXTRACCION DE PEDACERIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	69.73	183.67	183.67	52.94	236.61	52.94	3,691.51
1-00056	DESCORANAMIENTO DE MURO DE PIEDRA BRAZA DE 30 CM. DE ANCHO INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA PRODUCTO DE LA DEMOLICION.	M	108.12	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXC-001	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II INCLUYE AFINE DE TALUD Y FONDO, ACARREOS A PRIMERA ESTACION DE 20 MTS.	M3	74.30	699.43	699.43	147.08	846.51	147.08	10,928.04

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

	E S T I M A C I Ó N			ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO**	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023	
	NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES**	FECHA:	**31 DE OCTUBRE DEL 2023**	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023	
	CONTRATISTA: **IMEXA CONSTRUCTORES S.A DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	HOJA: 2	DE: 9
		TIPO DE OBRA: URBANIZACION			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
9-0139	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	83.66	420.29	420.29	69.49	489.78	69.49	5,813.53
9-0138	RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA , MEDIDO COMPACTADO.	M3	498.99	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PRELIMINARES :								**$30,699.87**
A2	**TERRACERIAS**								
31-0448	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO II-A, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO DEL MATERIAL	M3	82.27	558.00	0.00	556.52	556.52	0.00	45,784.90
31-0454	AFINE Y COMPACTACION DE SUB RASANTE AL 90% PROCTOR MINIMO, POR MEDIOS MECANICOS.	M2	40.15	1,471.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0457	FORMACION DE BASE DE 30 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO CON EQUIPO MECANICO INCLUYE VERTIDO, AFINE, COMPACTADO AL 95% PROCTOR Y AGUA.	M3	519.14	442.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0466	AFINE Y COMPACTACION EN BANQUETAS, ANDADORES Y PLAZA A MANO INCLUYE ACARREOS A PRIMERA ESTACION	M2	39.85	556.64	179.55	0.00	179.55	0.00	0.00
	TOTAL TERRACERIAS :								**$45,784.90**

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERÓN JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	E S T I M A C I Ó N			ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO**	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
	NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES**	FECHA:	**31 DE OCTUBRE DEL 2023**	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: **IMEXA CONSTRUCTORES S.A DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	HOJA: 3 DE: 9
		TIPO DE OBRA: URBANIZACION		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
A3	**INSTALACION HIDRAULICA**								
4-0080	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II-A, EN SECO Y BARRETA DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, DEPOSITANDO EL PRODUCTO DE EXCAVACION A ORILLA DE CEPA, CUALQUIER ZONA.	M3	200.62	16.00	16.00	21.92	37.92	21.92	4,397.59
9-0139	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO	M3	83.66	15.80	15.80	17.04	32.84	17.04	1,425.57
5-0102	CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA INCLUYE; ACOSTILLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1ra, ESTACION, METERIAL Y MANO DE OBRA.	M3	475.56	2.00	2.00	2.74	4.74	2.74	1,303.03
27-0412	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 3" CED. RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	449.24	50.00	50.00	29.00	79.00	29.00	13,027.96
TOMDOM*	TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CON TUBO DE CPCV DE 13 MM. DE 6 MTS. DE LONGITUD, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, VALVULA DE INSERCION, ABRAZADERA DE 4", ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1,760.31	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314-IHS-07-087	VALVULA DE ESFERA DE CPVC 13 MM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTO.	PZA	242.93	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BOTA01	CAJA PARA LLAVE DE BANQUETYA (BOTA) INCLUYE: LLAYE DE CUADRO ROSCABLE 1/2", HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO	PZA	1,388.40	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INSTALACION HIDRAULICA :								**$20,154.15**

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

	E S T I M A C I Ó N			ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO**	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023	
	NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES**	FECHA:	**31 DE OCTUBRE DEL 2023**	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023	
	CONTRATISTA: **IMEXA CONSTRUCTORES S.A DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	HOJA: 4	DE: 9
		TIPO DE OBRA:	URBANIZACION		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
A4	**INSTALACION SANITARIA**								
EXC-001	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II INCLUYE AFINE DE TALUD Y FONDO, ACARREOS A PRIMERA ESTACION DE 20 MTS.	M3	74.30	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9-0139	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	83.66	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9-0138	RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	498.99	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-0102	CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA INCLUYE: ACOSTILLLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION Y MANO DE OBRA.	M3	475.56	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28-0417	POZO DE VISITA DE FORMA CONICA DE 0.60 A 1.20 MTS. DE DIAMETRO INTERIOR POR 1.50 MTS. DE ALTURA A BASE DE MAMPOSTERIA, MURO DE TABIQUE DE 25 CMS CON APLANADO DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO, INCLUYE: EXCAVACION, ACARREO Y RELLENO.	PZA	13,271.34	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37-05798P	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO ALTA RESISTENCIA ABIERTO O CERRADO PARA POZO DE VISITA DE 60 CM. DE DIAMETRO, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	4,210.10	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26-0390*	REGISTRO SANITARIO DE 0.40X0.60X0.60 MTS. A BASE DE TABICON 10X14X28, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, PISO DE 10 CM, DE CONCRETO SIMPLE F´C=250 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DEL No 3 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, DE 15 CM DE ESPESOR INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, BARRENADO Y DEMOLICION DE ROCA, ACARREO Y M.O.	PZA	2,482.13	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	E S T I M A C I Ó N			ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO**	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023	
	NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES**	FECHA:	**31 DE OCTUBRE DEL 2023**	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023	
	CONTRATISTA: **IMEXA CONSTRUCTORES S.A DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	HOJA: 5	DE: 9
		TIPO DE OBRA:	URBANIZACION		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
TUBO 8"	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES SECUNDARIOS, CONEXIONES Y MANO DE OBRA.	M	773.19	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUM-COD2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SANITARIO DE 6"X45°, INCLUYE CARGA Y DESCARGA EN ALMACEN DE OBRA.	PZA	356.10	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PU-6255	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNION DE SERVICIO DE P.V.C. DE 150 MM. (6") DE DIAMETRO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO INCLUYE CARGA Y DESCARGA EN ALMACEN DE OBRA	PZA	624.14	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PU-6239	SUMINISTRO DE TUBO DE PVC SANITARIO DE NORMA LISO DE 150 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: FLETE , CARGA Y DESCARGA EN ALMACEN DE OBRA.	ML	483.03	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INSTALACION SANITARIA:								**$0.00**
A5	**ALBAÑILERIA**								
18-0296	MURO DE PIEDRA BRAZA DE LA REGION, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO COMUN INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION DE 20 MTS.	M3	2,755.36	276.52	276.52	106.06	382.58	106.06	292,233.48
18-0313	DREN PARA MURO DE MAMPOSTERIA A BASE DE P.V.C. 4" TIPO RIGIDO INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	130.32	26.00	26.00	22.90	48.90	22.90	2,984.33

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	E S T I M A C I Ó N			ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO**	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023	
	NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES**	FECHA:	**31 DE OCTUBRE DEL 2023**	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023	
	CONTRATISTA: **IMEXA CONSTRUCTORES S.A DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	HOJA: 6	DE: 9
		TIPO DE OBRA:	URBANIZACION		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
18-0318	FILTRO DE GRAVA Y/O RAJUELA DE PIEDRA DE 30 CMS DE ESPESOR INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M3	1,019.51	53.70	35.01	0.00	35.01	0.00	0.00
11-0151*	ANCLAJE DE CASTILLO DE 20 X 15 CMS 4 VAR # 4 Y ESTRIBOS DEL # 2 A,C, 20CMS HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 50 CMS. CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	441.46	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-0160*	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F´C=250 KG/CM2, DE 15X20 CM, ARMADO CON 6 VARILLAS No. 4 Y ESTRIBOS No, 2 A CADA 25 CM. INCLUYE CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1RA. ESTACION.	M	882.93	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-0221	LOSAS DE CONCRETO F´C= 250 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ARMADA CON VAR. No. 4 A CADA 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, PARA PASO PEATONAL, SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO COLADO Y DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	2,869.37	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F-BARANDAL1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE TUBO DE ACERO NEGRO DE 1 1/2 CON DIVISION DE TUBO DE 1" CON POSTES DE 1 1/2" A CADA METRO SOLDADO A PLACA DE 1/2" DE 15X15 CMS. EMBUTIDA EN LOSA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, PINTURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	2,373.49	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ALBAÑILERIA:								**$295,217.81**

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	E S T I M A C I Ó N			ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO**	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023	
	NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES**	FECHA:	**31 DE OCTUBRE DEL 2023**	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023	
	CONTRATISTA: **IMEXA CONSTRUCTORES S.A DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/426-2023/AD**	HOJA: 7	DE: 9
		TIPO DE OBRA:	URBANIZACION		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
A6	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y LUMINARIAS**								
REG-AUX	REGISTRO AUXILIAR PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 50X60X65 MTS, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28 CMS. CON 14 CMS. DE ESPESOR ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 INCUYE: PLANTILLA DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR F´C=100 KG/CM2, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X 16" CONCRETO F´C=200 KG/CM2 EN TAPA Y FIJACION DE MARCO, DREN DE GRAVA DE 20 CMS DE ESPESOR, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	3,554.46	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TUB-PESA50	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO 50 MM DE DIAMETRO INCLUYE: CONEXIÓN, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, CAMA DE ARENA, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M	201.24	200.00	70.72	0.00	70.72	0.00	0.00
	TOTAL INSTALACIONES ELEC TRICAS Y LUMINARIAS								**$0.00**
A7	**PAVIMENTACION.**								
4-0080	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II-A, EN SECO Y BARRETA DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, DEPOSITANDO EL PRODUCTO DE EXCAVACION A ORILLA DE CEPA, CUALQUIER ZONA.	M3	200.62	64.35	12.04	13.97	26.01	0.00	2,802.66
9-0138	RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO, DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	498.99	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	E S T I M A C I Ó N			ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO**	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023	
	NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES**	FECHA:	**31 DE OCTUBRE DEL 2023**	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023	
	CONTRATISTA: **IMEXA CONSTRUCTORES S.A DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	HOJA: 8	DE: 9
		TIPO DE OBRA:	URBANIZACION		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
321-0471	GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE DE F´C=200 KH/CM2 DE 20X15X40 CM. DE SECCION T.M.A. 3/4" INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	530.82	424.35	200.70	140.00	340.70	0.00	74,314.80
32-0475A	PAVIMENTO PREMEZCLADO F´C= 300 KG/CM2, T.A.M. 3/4" DE 20 CM. DE ESPESOR RESISTENCIA NORMAL, ACABADO A REGLA INCLUYE: JUNTA CONSTRUCTIVA CON CHAFLAN DE 1/2", EN CADA JUNTA FRIA (AL TERMINO DEL COLADO) SE PROCEDERA A COLOCAR 8 CONECTORES CON VARILLA DE 1/2" A CADA 60 CMS 30-30 CMS. FIBRA MICROSINTETICA, CURADO CON CURACRETO, VIBRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 1RA. ESTACION.	M2	976.95	1,471.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMPOL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO CALIBRE 600 PARA EVITAR DESHIDRATACION DEL CONCRETO, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	57.02	1,471.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CORTE01	CORTE DE JUNTAS EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA MANUAL DE DISCO DIAMANTADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA.	ML	36.40	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0484	CALAFATEO EN LOSAS Y GUARNICIONES A BASE DE ASFALTO OXIDADO INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, ACARREOS A PRIMERA ESTACION Y MANO DE OBRA	ML	28.53	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

	E S T I M A C I Ó N			ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO**	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023	
	NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES**	FECHA:	**31 DE OCTUBRE DEL 2023**	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023	
	CONTRATISTA: **IMEXA CONSTRUCTORES S.A DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	HOJA: 9	DE: 9
		TIPO DE OBRA:	URBANIZACION		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
22-0333*	PINTURA ESMALTE AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES CON DESARROLLO DE 30.00 CM. INCL. MATERIAL MANO DE OBRA Y ACARREOS A PRIMERA ESTACION.	ML	91.64	424.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0468	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, T.M.A 3/4", INCLUYE CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	538.78	556.64	179.55	0.00	179.55	0.00	0.00
	TOTAL PAVIMENTACION:								**$77,117.46**
A8	**ACARREOS Y LIMPIEZAS**								
CARGA	CARGA MECANICA CON USO DE RETROEXCAVADORA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO (6 M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION A TIRO LIBRE.	M3	229.33	979.64	783.06	723.48	1,506.54	526.90	165,915.67
33-0528	LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20 MTS.	M2	15.99	2,692.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DE ACARREOS Y LIMPIEZAS								**$165,915.67**
								TOTAL DE ESTA ESTIMACION:	**$634,889.86**

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

ACAPULCO, DE JUAREZ, GRO. A 02 DE OCTUBRE DEL 2023

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA H. HAYUNTAMIENTO
P R E S E N T E :

POR MEDIO DE LA PRESENTE, SOLICITO A UD. DE LA MANERA MAS ATENTA LA REVISION Y AUTORIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS EXCEDENTES DE OBRA DENOMINADA "**REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES"**, UBICADO EN **ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO,** CON NUMERO DE CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP.**

Código	Concepto	Unidad	P.U.	Cantidad Original	Cantidad por Estimar	Excedente	Importe del Volumen
D- CAR5A10	Demolicion a maquina de carpeta asfaltica de 5.00 a 10.00 cms. De espesor, incluye mano de obra y acarreos en 1a, estacion.	M2	$ 73.31	1,649.00	1719.8	70.8	$ 5,190.35
D-BANQU	Demolicion mecanica de banqueta de 10.00 cms. De espesor, incluye: herramienta menor, equipo y mano de obra	M2	$ 63.40	146.04	226.11	80.07	$ 5,076.44
D-GUARM	Demolicion mecanica de guarnicón de 15x20x50 cm, . , incluye: extracion de pedaceria, mano de obra, equipo y herramienta.	M	$ 69.73	183.67	236.61	52.94	$ 3,691.51
EXC-001	Excavacion por medios mecánicos en cepas de 0.00 A 2.00 mts de profundidad en material tipo II incluye afine de talud y fondo, acarreos a primera estación de 20 mts	M3	$ 74.30	699.43	846.51	147.08	$ 10,928.04
9-0139	Relleno de material producto de excavacion compactado con pison de mano y agua en capas de 20 cms, de espesor, incluye acarreo de la obra, medido compactado.	M3	$ 83.66	420.29	489.78	69.49	$ 5,813.53
4-0080	Excavacion a mano en material tipo II-A, en seco y barreta de 0.00 a 2.00 mts, de profundidad, depositando el producto de excavacion a orilla de cepa, cualquier zona.	M3	$ 200.62	16.00	37.92	21.92	$ 4,397.59
9-0139	Relleno de material producto de excavacion compactado con pison de mano y agua en capas de 20 cms, de espesor, incluye acarreo de la obra, medido compactado.	M3	$ 83.66	15.80	32.84	17.04	$ 1,425.57
5-0102	Cama de arena para instalacion de tuberia incluye; acostillado, acarreo de material en 1ra, estacion, material, y mano de obra.	M3	$ 475.56	2.00	4.74	2.74	$ 1,303.03

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01
CEL. 744 4490912/744 2354717 E-MAIL: imexa@telmexmail.com, gno_0301@hotmail.com

Código	Concepto	Unidad	P.U.	Cantidad Original	Cantidad por Estimar	Excedente	Importe del Volumen
27-0412	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 3" CED. RD. 26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE; SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRASNECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	$ 449.24	50.00	79.00	29.00	$ 13,027.96
18-0296	Muro de piedra brasa de la region asentada con mortero cemento arena 1:5 acabado comun incluye: acarreo de materiales a 1ra, estación de 20 mts.	M3	$ 2,755.36	276.52	382.58	106.06	$ 292,233.48
18-0313	Dren para muro de mamposteria a base de P.V.C. 4" tipo rigido incluye material y mano de obra.	ML	$ 130.32	26.00	48.90	22.90	$ 2,984.33
CARGA	CARGA MECÁNICA CON USO DE RETROEXCAVADORA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A TIRO LIBRE.	M3	$ 229.33	979.64	1506.54	526.90	$ 120,833.98

SIN MÁS POR EL MOMENTO, NOS PONEMOS A SUS ORDENES, PARA CUALQUIER DUDA Y/O ACLARACION, ASI MISMO LE ENVIAMOS UN CORDIAL SALUDO

ATENTAMENTE

ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

IMEXA
Constructores, S.A. de C.V.

Calle Corregidora # 4, Col. Morelos
C.P. 39530 Acapulco, Gro.
R.F.C.: ICO-091216-UUA
imexa@telmexmail.com

OFICIO: DOP/1945-1-2023/AD
ASUNTO: Autorización de Excedentes
Acapulco, gro. 04 de Octubre del 2023

ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
IMEXA CONSTRUCTORES S.A DE C.V.

En relación a su similar de fecha 02 de octubre del 2023 mediante el cual solicita la autorización de cantidades adicional a 12 (doce) conceptos de obra,referentes al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado: No. MAJ-FAISMUN/426-2023/LP. Formalizada a favor de su representada con fecha de 15 de agosto de 2023. Por medio del presente en total apego a lo establecido en los Art. 50, párrafo onceavo de la ley de Obras Públicas y sus Servicios Relacionados con las mismas. Art. 105 y 106 del reglamento de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, los cuales señalan:

Artículo 105.- Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la dependencia o entidad de que se trate, para que ésta resuelva lo conducente. El contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Artículo 106.- Cuando la dependencia o entidad requiera de la ejecución de cantidades adicionales no previstas en el catálogo original del contrato, se haya formalizado o no el convenio respectivo, una vez ejecutados los trabajos, el contratista elaborará sus estimaciones y las presentará a la residencia en la fecha de corte más cercana.

En cumplimiento a mis funciones estipuladas en el Articulo 113, 114 y 115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y sus Servicios Relacionados con las Mismas, en mi carácter de Residente de Obra, una vez realizado el dictamen Técnico que fundamenta y sustenta la solicitud presentada.

Se considera Procedente autorizar la ejecución de cantidades adicionales a los 12 (doce) conceptos de obra, así mismo se especifica que son totalmente necesarios durante el proceso constructivo del contrato de obra pública en cuestión y que no existe la necesidad de modificar el importe contratado y el tiempo de ejecución originalmente pactados.

ATENTAMENTE
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

C.c.p. .- Ing. Alberto Márquez León – Jefe del departamento de supervisión de obra zona urbana
C.c.p. Archivo.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE CANTIDADES ADICIONALES NO PREVISTAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS ORIGINAL

1.- ANTECEDENTES

De acuerdo al oficio de autorización de recursos por parte de la **Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico,** No. SEPLADE/321/2023 de fecha 08 de Mayo de 2023, correspondiente al **Ramo 33, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), ejercicio 2023,** mediante el cual fue autorizada la obra denominada, **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES UBICADA EN : ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, EN ACAPULCO DE JUÁREZ**, por un importe de Contrato de **$ 5,000,427.46 (cinco millones cuatrocientos veintisiete pesos 46/100 M.N.).**

Con fecha 15 de Agosto del 2023, fue formalizado el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado de No. **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**, entre la **Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas** y la empresa contratista **"IMEXA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V."** para la ejecución de la obra , **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES UBICADA EN : ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO EN ACAPULCO DE JUÁREZ.** con un plazo de ejecución del 15 de Agosto al 12 de diciembre de 2023.

Con fecha 02 de octubre del 2023, fue realizada la solicitud por parte de la empresa contratista **"IMEXA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V."**, para la ejecución de cantidades adicionales en 12 (DOCE) conceptos de obra incluidos en el catálogo de conceptos del contrato de obra pública de No. MAJ-FAISMUN/426-2023/LP, solicitud que se anexa al presente como anexo 1.

2.- JUSTIFICACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE CANTIDADES ADICIONALES

2.1.- CONSIDERACIONES TECNICAS

A. Fundamento No. 1

Estos trabajos son derivados por las decisión de iniciar la obra **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES UBICADA EN : ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO EN ACAPULCO DE JUÁREZ.**, los trabajos realizados para mejora del proyecto desde su inicio, ha presentado un aumento en sus volúmenes relacionados con intangibles no proporcionados en expediente; por lo que se dio a la tarea de ejecutarlos y así dejar en el caso de las instalaciones preparado para futuras rehabilitaciones, en cuanto a los muros ; se presento la necesidad de realizar los trabajos para encontrar terreno firme por la naturaleza del terreno anclado sobre una ladera de un escurrimiento natural, por lo que habrá diferencias de volúmenes de proyecto con los volúmenes del catálogo autorizado, de acuerdo a catálogo de conceptos y cantidades de obra autorizado de contrato durante

2022 Año de Ricardo Flores Magón

el desarrollo constructivo de la obra se han generado conceptos con volúmenes excedentes en virtud de que se han realizado los cuales técnicamente se requieren su ejecución para alcanzar las metas del el proyecto a cargo de esta dirección de obras públicas , que corresponden principalmente a los siguientes aspectos:

1. La necesidad de alcanzar terreno natural o firme para el desplante de los muros de piedra braza de protección, originando que los volúmenes se desfasaran por la ampliación de las excavaciones las cuales originaron movimiento de volúmenes excedentes en acarreos, tanto en materiales como en agregados,

2. En las áreas que por consiguiente se desarrollaron trabajos de excavación y demolición de drenaje existente, los cuales fueron demolidos o desmantelados (red de agua potable y alcantarillado sanitario) previo a esta decisión, los volúmenes que resulte sin afectar a la buena ejecución del proyecto y para cumplir con lo dispuesto en el proyecto autorizado y en las áreas de cada tramo incrementándose los conceptos de excavación, cama de arena, relleno, tubería hidráulica, registros sanitarios, tomas domiciliaria y muros de piedra

- Con fecha 02 de octubre del 2023 a través de la nota de bitácora No. 18, la contratista informó a la Residencia de obras que presenta volúmenes excedentes de los programados en el presupuesto, por lo que se le solicita la autorización de la ejecución de estos volúmenes ya que son necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, para poder realizar el cierre al monto de contrato.

- A través de la nota de bitácora No. 19 con fecha 04 de octubre del 2023, la Residencia y Supervisión de obras, le informa que los conceptos con volúmenes excedentes son autorizados, para la conclusión de obra, mismo que fue revisado directamente en el sitio de los trabajos durante la conciliación.

2.2.- CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Fundamento. - Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

Artículo 59, Párrafo 11.- Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, las dependencias y entidades podrán autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Fundamento. - Artículo 105 y 106 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Artículo 105.- Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la dependencia o entidad de que se trate, para que ésta resuelva lo conducente. El contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Artículo 106.- Cuando la dependencia o entidad requiera de la ejecución de cantidades adicionales no previstas en el catálogo original del contrato, se haya formalizado o no el convenio respectivo, una vez ejecutados los trabajos, el contratista elaborará sus estimaciones y las presentará a la residencia en la fecha de corte más cercana.

Una vez realizada la revisión y procedencia de las cantidades adicionales en los 12 (doce) conceptos de obra, se determina que se cuenta con la suficiencia presupuestal total para su ejecución, por lo que no será necesario realizar una modificación al contrato de obra pública de No. MAJ-FAISMUN/426-2023/LP.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

3.- DESCRIPCIÓN DEL OBJETO

Derivado del proceso constructivo de la obra en cuestión y una vez analizada la necesidad de la ejecución de las cantidades adicionales (excedentes) en los 12 (doce) conceptos de obra. Se determina que son totalmente necesarios para la terminación y continuación del proceso de ejecución de los trabajos al amparo del contrato de obra pública de No. **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**

Las cantidades adicionales necesarias por ejecutarse, dentro de los 12 (doce) conceptos de obra, se anexan al presente como anexo 2.

4.- DICTAMEN

Una vez expuestas las motivaciones anteriores y en total apego a lo dispuesto en el **artículo 59, párrafo onceavo** de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas**, y los **artículos 105 y 106** de su Reglamento, se dictamina procedente la ejecución de cantidades adicionales para los 12 (doce) conceptos de obra mencionados en el **anexo 2**.

Así lo dictaminó el Residente de la Obra, con base a sus funciones, establecidas en los **Artículos 112 y 113** del **Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas**. Se anexa Bitácora fotográfica de cada concepto con cantidades excedentes como **anexo 3.**

ATENTAMENTE
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

C.c.p. Archivo.

2022 Año de Ricardo Flores Magón

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CANTIDADES ADICIONALES ANEXO No. 2

CONTRATO: MAJ-FAISMUN/426-2023/LP

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES

UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.

EXCEDENTES

Código	Concepto	Unidad	P.U.	Cantidad Original	Cantidad por Estimar	Excedente	Importe del Volumen
D- CAR5A10	Demolicion a maquina de carpeta asfaltica de 5.00 a 10.00 cms. De espesor, incluye mano de obra y acarreos en 1a, estacion.	M2	$ 73.31	1649.00	1719.8	70.8	$ 5,190.35
D-BANQU	Demolicion mecanica de banqueta de 10.00 cms. De espesor, incluye: herramienta menor, equipo y mano de obra	M2	$ 63.40	146.04	226.11	80.07	$ 5,076.44
D-GUARM	Demolicion mecanica de guarnicón de 15x20x50 cm, incluye: extracion de pedaceria, mano de obra, equipo y herramienta.	M	$ 69.73	183.67	236.61	52.94	$ 3,691.51
EXC-001	Excavacion por medios mecánicos en cepas de 0.00 A 2.00 mts de profundidad en material tipo II incluye afine de talud y fondo, acarreos a primera estación de 20 mts	M3	$ 74.30	699.43	846.51	147.08	$ 10,928.04
9-0139	Relleno de material producto de excavacion compactado con pison de mano y agua en capas de 20 cms, de espesor, incluye acarreo de la obra, medido compactado.	M3	$ 83.66	420.29	489.78	69.49	$ 5,813.53
4-0080	Excavacion a mano en material tipo II-A, en seco y barreta de 0.00 a 2.00 mts, de profundidad, depositando el producto de excavacion a orilla de cepa, cualquier zona.	M3	$ 200.62	16.00	37.92	21.92	$ 4,397.59
9-0139	Relleno de material producto de excavacion compactado con pison de mano y agua en capas de 20 cms, de espesor, incluye acarreo de la obra, medido compactado.	M3	$ 83.66	15.80	32.84	17.04	$ 1,425.57
5-0102	Cama de arena para instalacion de tuberia incluye; acostillado, acarreo de material en 1ra, estacion, material, y mano de obra.	M3	$ 475.56	2.00	4.74	2.74	$ 1,303.03
27-0412	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 3" CED. RD. 26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE; SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	$ 449.24	50.00	79.00	29.00	$ 13,027.96
18-0296	Muro de piedra brasa de la region asentada con mortero cemento arena 1:5 acabado comun incluye: acarreo de materiales a 1ra, estación de 20 mts.	M3	$ 2,755.36	276.52	382.58	106.06	$ 292,233.48
18-0313	Dren para muro de mamposteria a base de P.V.C. 4" tipo rigido incluye material y mano de obra.	ML	$ 130.32	26.00	48.90	22.90	$ 2,984.33
CARGA	CARGA MECÁNICA CON USO DE RETROEXCAVADORA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A TIRO LIBRE.	M3	$ 229.33	979.64	1506.54	526.90	$ 120,833.98

REVISÓ Y APROBÓ

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

EJERCICIO FISCAL 2023

BITACORA FOTOGRAFICA DE EXCEDENTES DE OBRA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES		
CONTRATISTA	IMEXA CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	PERIODO CONTRACTUAL: 15 DE AGOSTO AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	
CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/426-2023/LP	IMPORTE DE CONTRATO :	$5,000,427.46
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	PERIODO: DEL 02 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023	



D- CAR5A10.- Demolicion a maquina de carpeta asfaltica de 5.00 a 10.00 cms. De espesor, incluye mano de obra y acarreos en 1a, estacion. **70.80 M2**



D-BANQU.- Demolicion mecanica de banqueta de 10.00 cms. De espesor, incluye: herramienta menor, equipo y mano de obra **80.07 M2**



D-GUARM.- Demolicion mecanica de guarnicón de 15x20x50 cm, incluye: extracion de pedaceria, mano de obra, equipo y herramienta **52.94 ML**



EXC-001.- Excavacion por medios mecánicos en cepas de 0.00 A 2.00 mts de profundidad en material tipo II incluye afine de talud y fondo, acarreos a primera estación de 20 mts **147.08 m2**



9-0139.- Relleno de material producto de excavacion compactado con pison de mano y agua en capas de 20 cms, de espesor, incluye acarreo de la obra, medido compactado. **69.49 M3**



4-0080.- Excavacion a mano en material tipo II-A, en seco y barreta de 0.00 a 2.00 mts, de profundidad, depositando el producto de excavacion a orilla de cepa, cualquier zona.
21.92 M2

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS


DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

EJERCICIO FISCAL 2023

BITACORA FOTOGRAFICA DE EXCEDENTES DE OBRA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES		
CONTRATISTA	IMEXA CONSTRUCTORES S A DE C.V.	PERIODO CONTRACTUAL: 15 DE AGOSTO AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	
CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/426-2023/LP	IMPORTE DE CONTRATO :	$5,000,427.46
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	PERIODO: DEL 02 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023	

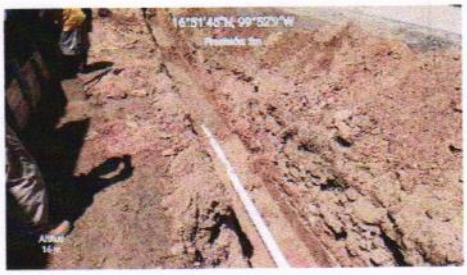

9-0139.- Relleno de material producto de excavacion compactado con pison de mano y agua en capas de 20 cms, de espesor, incluye acarreo de la obra, medido compactado. **17.04 M3**



5-0102.- Cama de arena para instalacion de tuberia incluye; acostillado, acarreo de material en 1ra, estacion, material, y mano de obra. **2.74 M3**



27-0412.- SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 3" CED. RD. 26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE; SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
29.00 ML



18-0296.- MURO DE PIEDRA BRAZA DE LA REGION, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO COMUN, INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION DE 20.00 MTS..
106.06 M3



18-0313.- Dren para muro de mamposteria a base de P.V.C. 4" tipo rigido incluye material y mano de obra.
22.90 ML



CARGA.- CARGA MECÁNICA CON USO DE RETROEXCAVADORA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A TIRO LIBRE.
526.90 M3

REVISÓ Y APROBÓ

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

ACAPULCO, GRO. A 31 DE OCTUBRE DEL 2023.

CARTA DE ENTREGA DE ESTIMACION

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E:

POR ESTE CONDUCTO HAGO ENTREGA DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS), DE LA OBRA : **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES,** UBICADA EN: **ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO**, CON NUMERO DE CONTRATO **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP QUE COMPRENDE EL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO NO SIN ANTES MANIFESTARLE QUEDAR A SUS ORDENES PARA CUALQUIER ACLARACION.

ATENTAMENTE

ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01
CEL. 744 4490912 / 744 2354717 E-MAIL: imexa@telmexmail.com, gno_0301@hotmail.com


MÉXICO
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
SALGADO
HERNANDEZ
IRINA
SEXO M
DOMICILIO
C NUEVO LEON 23
COL PROGRESO 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
CLAVE DE ELECTOR SLHRIR67082312M900
CURP
SAHI670823MGRLRR09
AÑO DE REGISTRO
1993 06
FECHA DE NACIMIENTO
23/08/1967
SECCIÓN
0057
VIGENCIA
2023 - 2033


INE
IDMEX2412998667<<0057054805632
6708238M3312315MEX<06<<00253<9
SALGADO<HERNANDEZ<<IRINA<<<<<<

ACAPULCO, GRO. A 31 DE OCTUBRE DEL 2023.

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E:


POR ESTE CONDUCTO HAGO ENTREGA DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS), CORRESPONDIENTE A LA OBRA : : **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES,** UBICADA EN: **ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO**, CON NUMERO DE CONTRATO **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP,** LA CUAL HA SIDO REVISADA POR EL SUSCRITO COMO REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA ANTE EL MUNICIPIO Y CON LA CUAL ESTOY DE ACUERDO, ASI MISMO CERTIFICO QUE HE REVISADO FISICAMENTE LOS TRABAJOS TERMINADOS COMPRENDIDOS EN ESTA ESTIMACION Y ESTOY DE ACUERDO EN QUE CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES Y CALIDAD REQUERIDOS POR EL MUNICIPIO.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO NO SIN ANTES MANIFESTARLE QUEDAR A SUS ORDENES PARA CUALQUIER ACLARACION.

ATENTAMENTE

ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO
No. DE CEDULA PROFESIONAL: 2220846

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01
CEL. 744 4490912 / 744 2354717 E-MAIL: imexa@telmexmail.com, gno_0301@hotmail.com

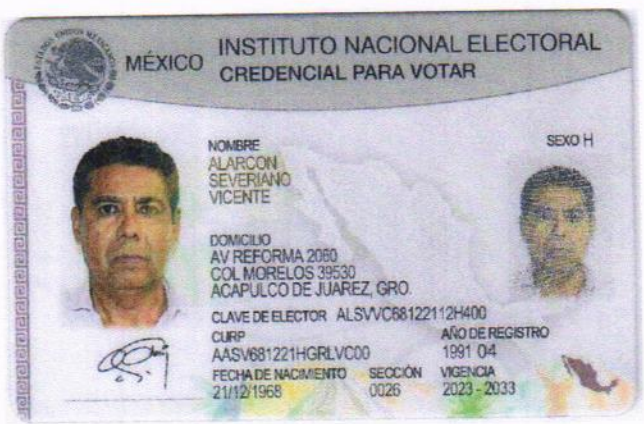
MÉXICO
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
ALARCON
SEVERIANO
VICENTE
SEXO H
DOMICILIO
AV REFORMA 2060
COL MORELOS 39530
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
CLAVE DE ELECTOR ALSVVC68122112H400
CURP
AASV681221HGRLVC00
AÑO DE REGISTRO
1991 04
FECHA DE NACIMIENTO
21/12/1968
SECCIÓN
0026
VIGENCIA
2023 - 2033


INE
IDMEX2414903999<<0026047494258
6812218H3312315MEX<04<<00374<3
ALARCON<SEVERIANO<<VICENTE<<<<

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

RAMO XXXIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)
EJERCICIO FISCAL 2023

REPORTE DE SUPERVISIÓN CON SOPORTE FOTOGRÁFICO.

NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES				
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	PERIODO DE CONTRATO:	DEL 15-ago-23	AL	12-dic-23
CONTRATO No. :	MAJ-FAISMUN/426-2023/LP	IMPORTE DE CONTRATO:		$	5,000,427.46
UBICACIÓN:	ACAPULCODE JUAREZ, GUERRERO	PERIODO:	DEL 02-oct-23	AL	15-oct-23

AVANCES POR PARTIDAS:

A1	PRELIMINARES		90%
A2	TERRACERIAS		10%
A3	INSTALACION HIDRAULICA		75%
A5	ALBAÑILERIA		40%
A6	INSTALACIONES ELECTRICAS Y LUMINARIAS		20%
A7	PAVIMENTACION		10%
A8	ACARREOS Y LIMPIEZAS		60%

AVANCE TOTAL
44%



DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA



DEMOLICION DE BANQUETAS



GUARNICIONES



APERTURA DE CAJA

RESIDENTE

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE RESIDENTE

ING. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

RAMO XXXIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)
EJERCICIO FISCAL 2023

REPORTE DE SUPERVISIÓN CON SOPORTE FOTOGRÁFICO.


NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES					
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	PERIODO DE CONTRATO:	DEL	15-ago-23	AL	12-dic-23
CONTRATO No. :	MAJ-FAISMUN/426-2023/LP	IMPORTE DE CONTRATO:			$	5,000,427.46
UBICACIÓN:	ACAPULCODE JUAREZ, GUERRERO	PERIODO:	DEL	16-oct-23	AL	31-oct-23

AVANCES POR PARTIDAS:

A1	PRELIMINARES		90%
A2	TERRACERIAS		15%
A3	INSTALACION HIDRAULICA		75%
A5	ALBAÑILERIA		60%
A6	INSTALACIONES ELECTRICAS Y LUMINARIAS		20%
A7	PAVIMENTACION		10%
A8	ACARREOS Y LIMPIEZAS		80%


AVANCE TOTAL
50%



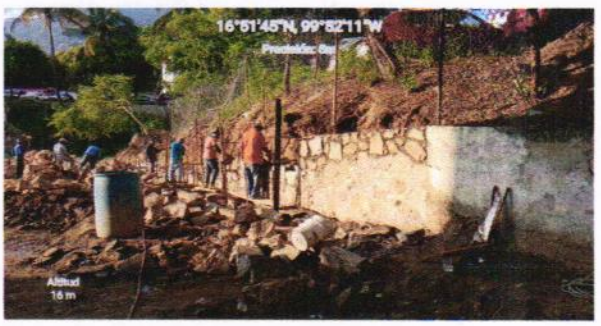

RELLENO	-	MURO DE PIEDRA



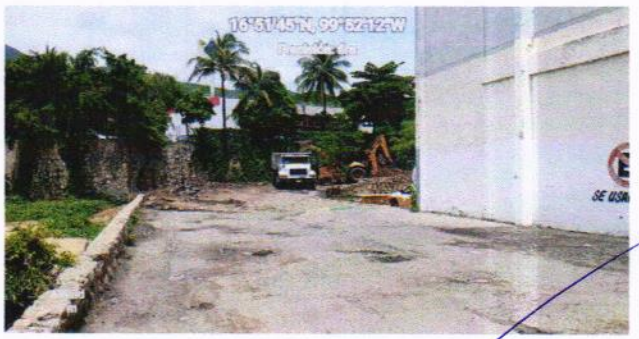

TUBERIA DE PVC HIDRAULICA 3" RD-26	-	ACARREOS

RESIDENTE

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE RESIDENTE

ING. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A1	**PRELIMINARES**									
D- CAR5A10	Demolicion a maquina de carpeta asfaltica de 5.00 a 10.00 cms. De espesor, incluye mano de obra y acarreos en 1a, estacion.									
	ANCHO PROMEDIO									
	A.- 6.54+6.55=13.09/2=6.54	0+008.000	0+010.000		6.54	2.00		M2	13.08	A
	B.-6.55+6.60=13.15/2=6.57	0+010.000	0+020.000		6.57	10.00		M2	65.70	B
	C.-6.60+6.48=13.08/2=6.54	0+020.000	0+030.000		6.54	10.00		M2	65.40	C
	D.-6.48+6.42=12.90/2=6.45	0+030.000	0+040.000		6.45	10.00		M2	64.50	D
	E.- 6.42+6.69=13.11/2=6.55	0+040.000	0+050.000		6.55	10.00		M2	65.50	E
	F.-6.69+6.94=13.63/2=6.81	0+050.000	0+060.000		6.81	10.00		M2	68.10	F
	G.-6.94+7.34=14.28/2=7.14	0+060.000	0+070.000		7.14	10.00		M2	71.40	G
	H.-7.34+5.56=12.90/2=6.45	0+070.000	0+080.000		6.45	10.00		M2	64.50	H
	I.-5.56+8.31=13.87/2=6.93	0+080.000	0+090.000		6.93	10.00		M2	69.30	I
	J.-8.31+8.14=16.45/2=8.22	0+090.000	0+100.000		8.22	10.00		M2	82.20	J
	K.- 8.14+8.03=16.17/2=8.08	0+100.000	0+110.000		8.08	10.00		M2	80.80	K
	L.- 8.03+8.30=16.33/2=8.16	0+110.000	0+120.000		8.16	10.00		M2	81.60	L
	M.-8.30+8.28=16.58/2=8.29	0+120.000	0+130.000		8.29	10.00		M2	82.90	M
						SUBTOTAL HOJA 1		**M2**	**874.98**	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A1	**PRELIMINARES**									
D- CAR5A10	Demolicion a maquina de carpeta asfaltica de 5.00 a 10.00 cms. De espesor, incluye mano de obra y acarreos en 1a, estacion.									
	ANCHO PROMEDIO									
	N.- 8.28+7.08=15.36/2=7.68	0+130.000	0+140.000		7.68	10.00		M2	76.80	N
	O.- 7.08+6.56=13.64/2=6.82	0+140.000	0+147.100		6.82	7.10		M2	48.42	O
	O'- 4.88+4.72=9.60/2=4.80	0+147.100	0+150.000		4.80	2.90		M2	13.92	O´
	P..-4.72+6.35=11.35/2=5.53	0+150.000	0+155.570		5.53	5.57		M2	30.80	P
	P´.- 9.17+9.58=18.75/2=9.37	0+155.570	0+160.000		9.37	4.43		M2	41.50	P´
		DESCUENTO REGISTROS		-6.00	1.00	1.00		M2	-6.00	
	Q.-9.58+10.15=19.73/2=9.86	0+160.000	0+170.000		9.86	10.00		M2	98.60	Q
	R.-10.15+10.26=20.41/2=10.20	0+170.000	0+180.000		10.20	10.00		M2	102.00	R
	S.-10.26+11.40=21.66/2=10.83	0+180.000	0+190.000		10.83	10.00		M2	108.30	S
	T.-11.40+11.86=23.26/2=11.63	0+190.000	0+200.000		11.63	10.00		M2	116.30	T
	U.-11.86+13.37=25.23/2=12.61	0+200.000	0+210.000		12.61	10.00		M2	126.10	U
	V.-13.37+16=29.37/2=14.68	0+210.000	0+216.000		14.68	6.00		M2	88.08	V
					SUBTOTAL HOJA 2				**844.82**	
					SUBTOTAL HOJA 1			**M2**	**874.98**	
					SUBTOTAL HOJA 2			**M2**	**844.82**	
					TOTAL M2 DE DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA =			**M2**	**1719.80**	
					(-) MENOS M2 COBRADOS EN ESTIMACION 01 (UNO) DE DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA = -			**M2**	**-1649.00**	
					TOTAL M2 ESTA ESTIMACIÓN =			**M2**	**70.80**	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
		FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES, S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A1 **PRELIMINARES**

D- CAR5A10 DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5.00 A 10.00 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA Y ACARREOS EN 1A, ESTACIÓN.



IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
		FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A1 **PRELIMINARES**

D- CAR5A10 DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5.00 A 10.00 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA Y ACARREOS EN 1A, ESTACIÓN.

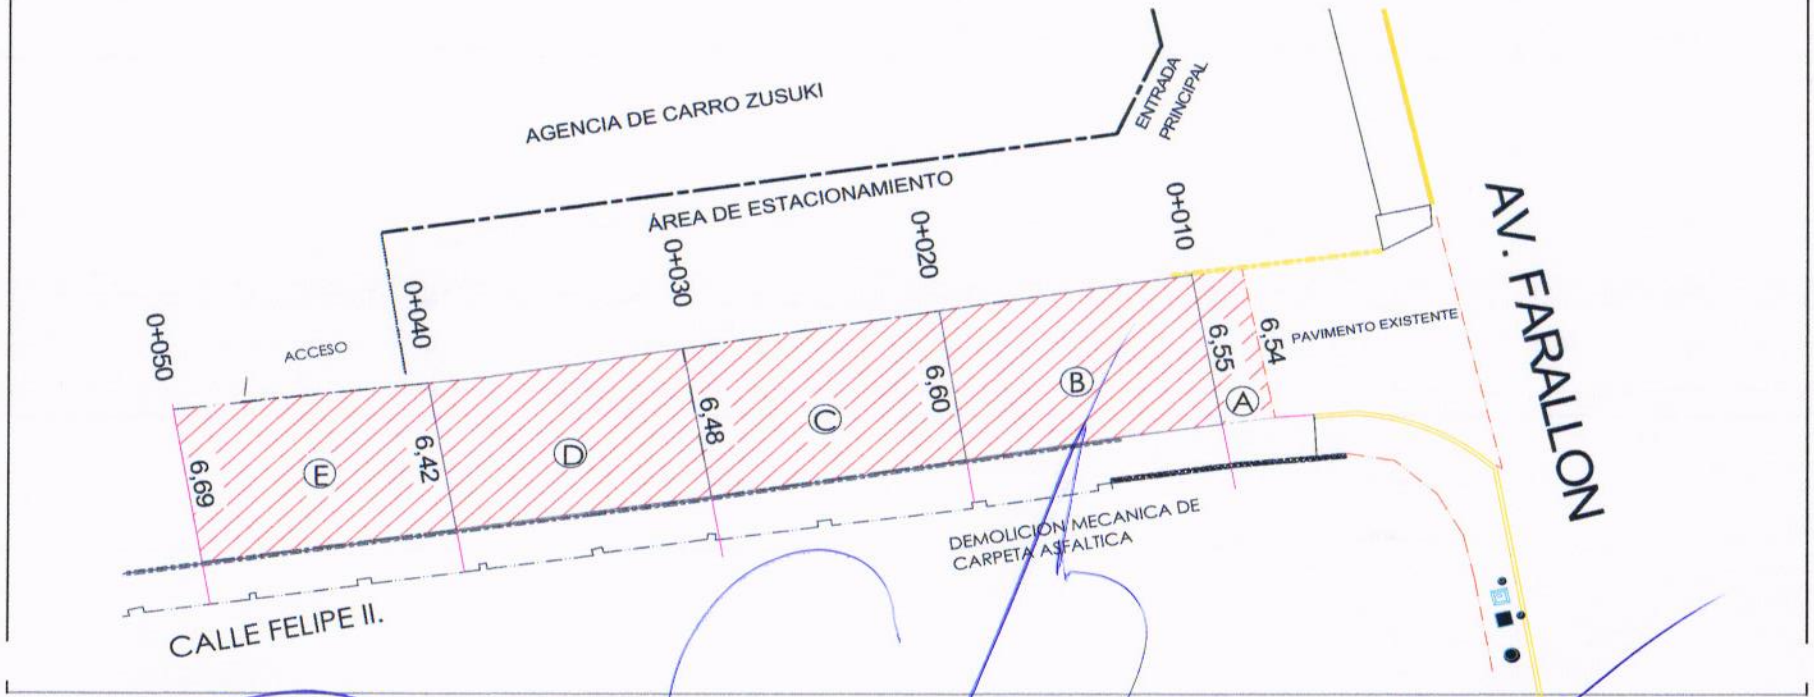

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
		FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A1 **PRELIMINARES**

D- CAR5A10 DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5.00 A 10.00 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA Y ACARREOS EN 1A, ESTACIÓN.

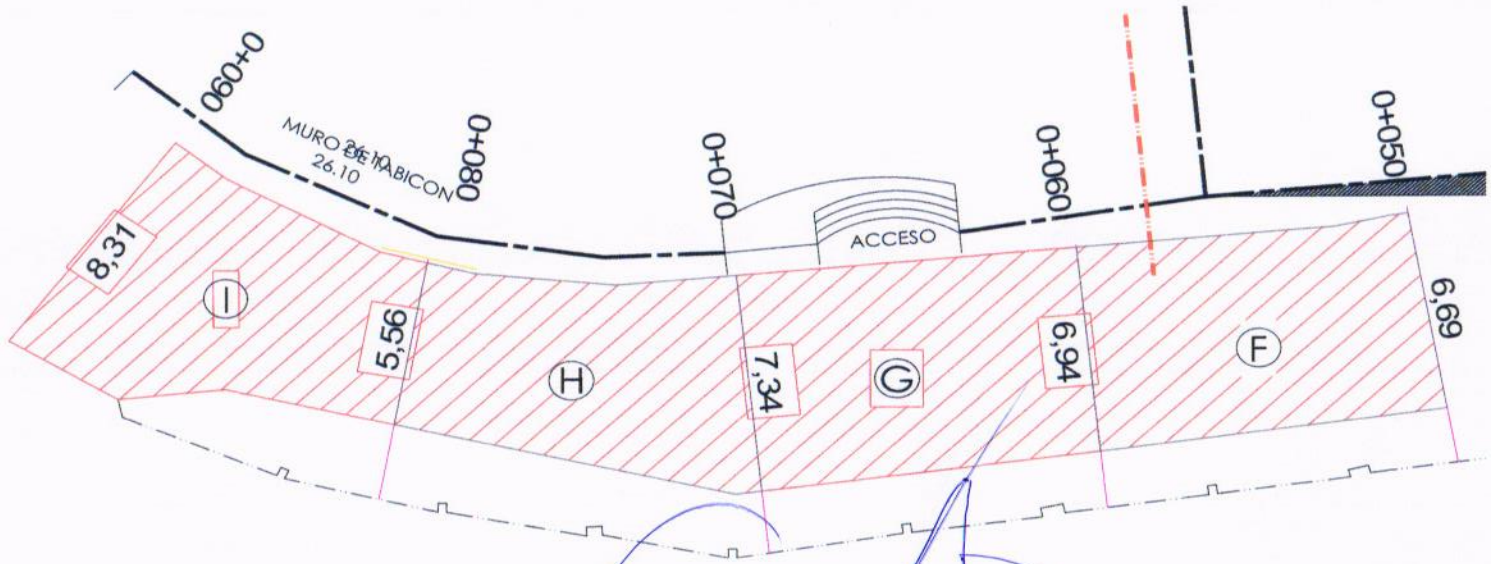

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/426	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
		FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/426-2023/LP	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A1 **PRELIMINARES**

D- CAR5A10 DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5.00 A 10.00 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA Y ACARREOS EN 1A, ESTACIÓN.

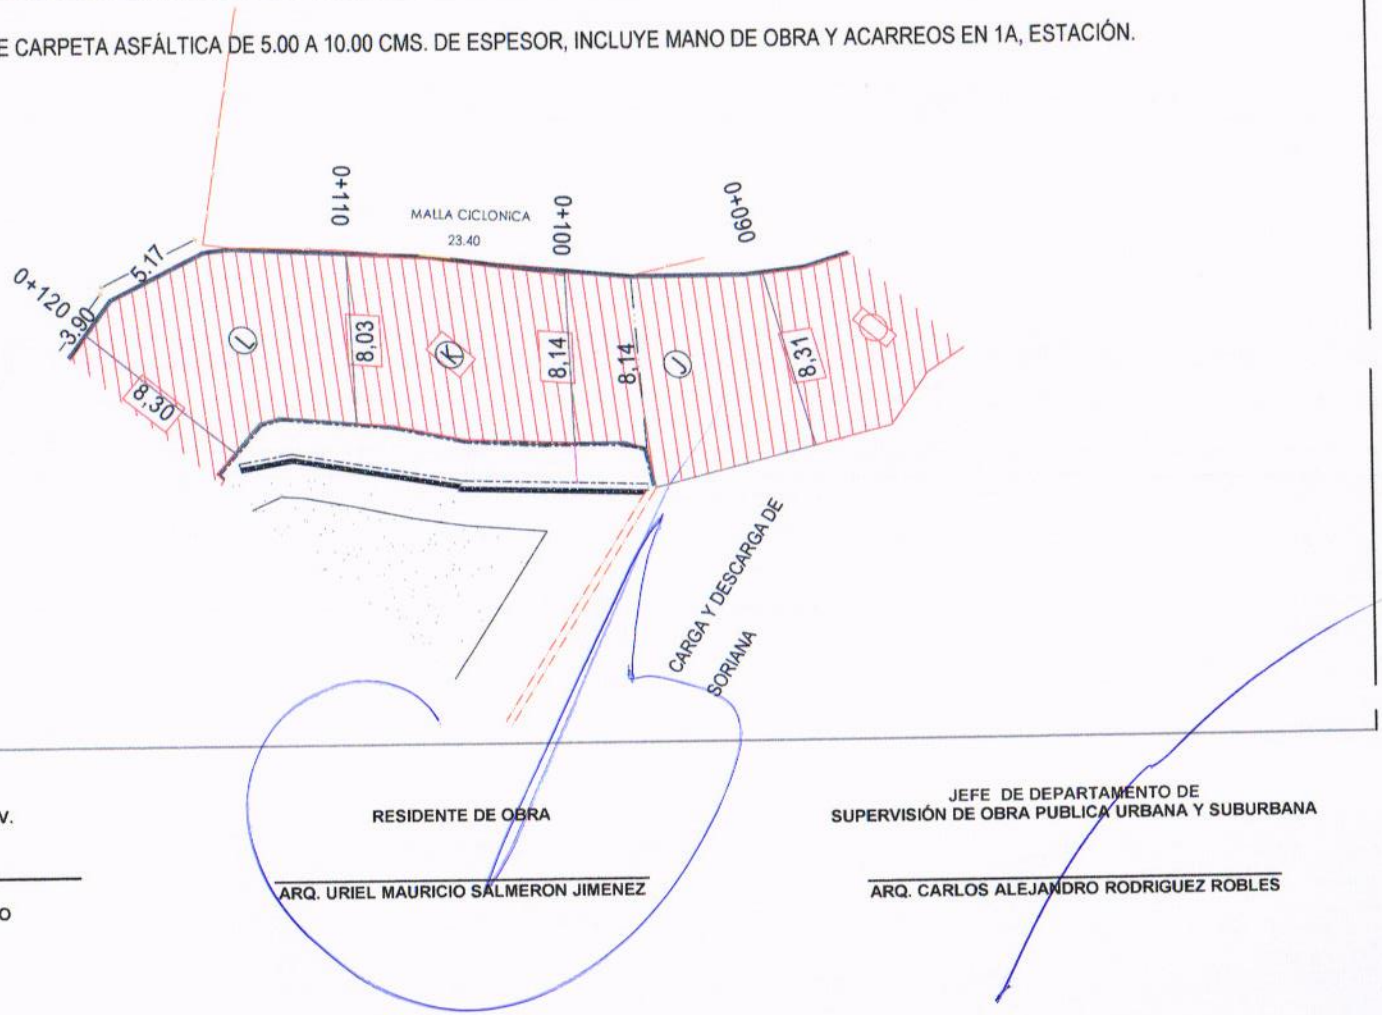

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
		FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A1 **PRELIMINARES**

D- CAR5A10 DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5.00 A 10.00 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA Y ACARREOS EN 1A, ESTACIÓN.

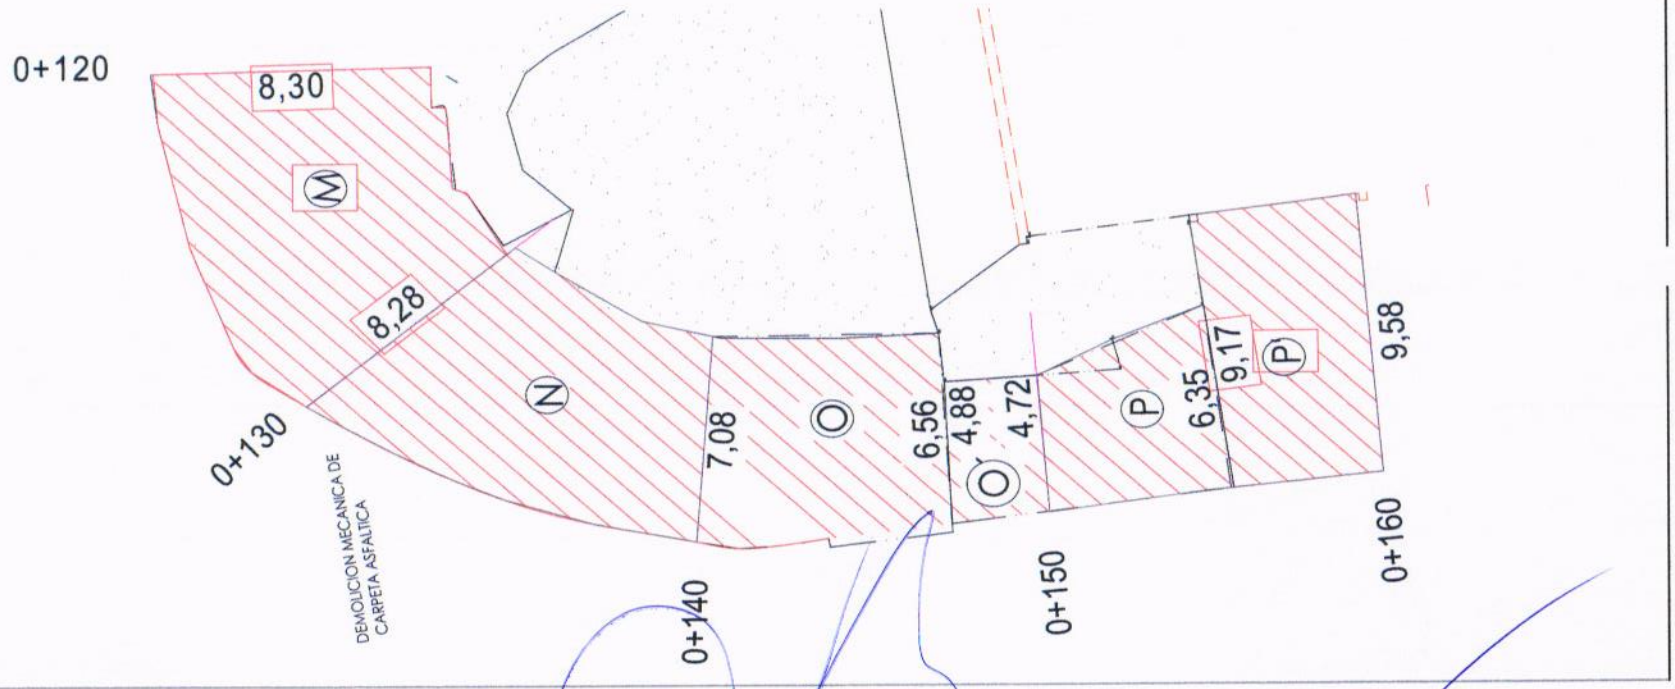

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
		FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A1 **PRELIMINARES**

D- CAR5A10 DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5.00 A 10.00 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA Y ACARREOS EN 1A, ESTACIÓN.

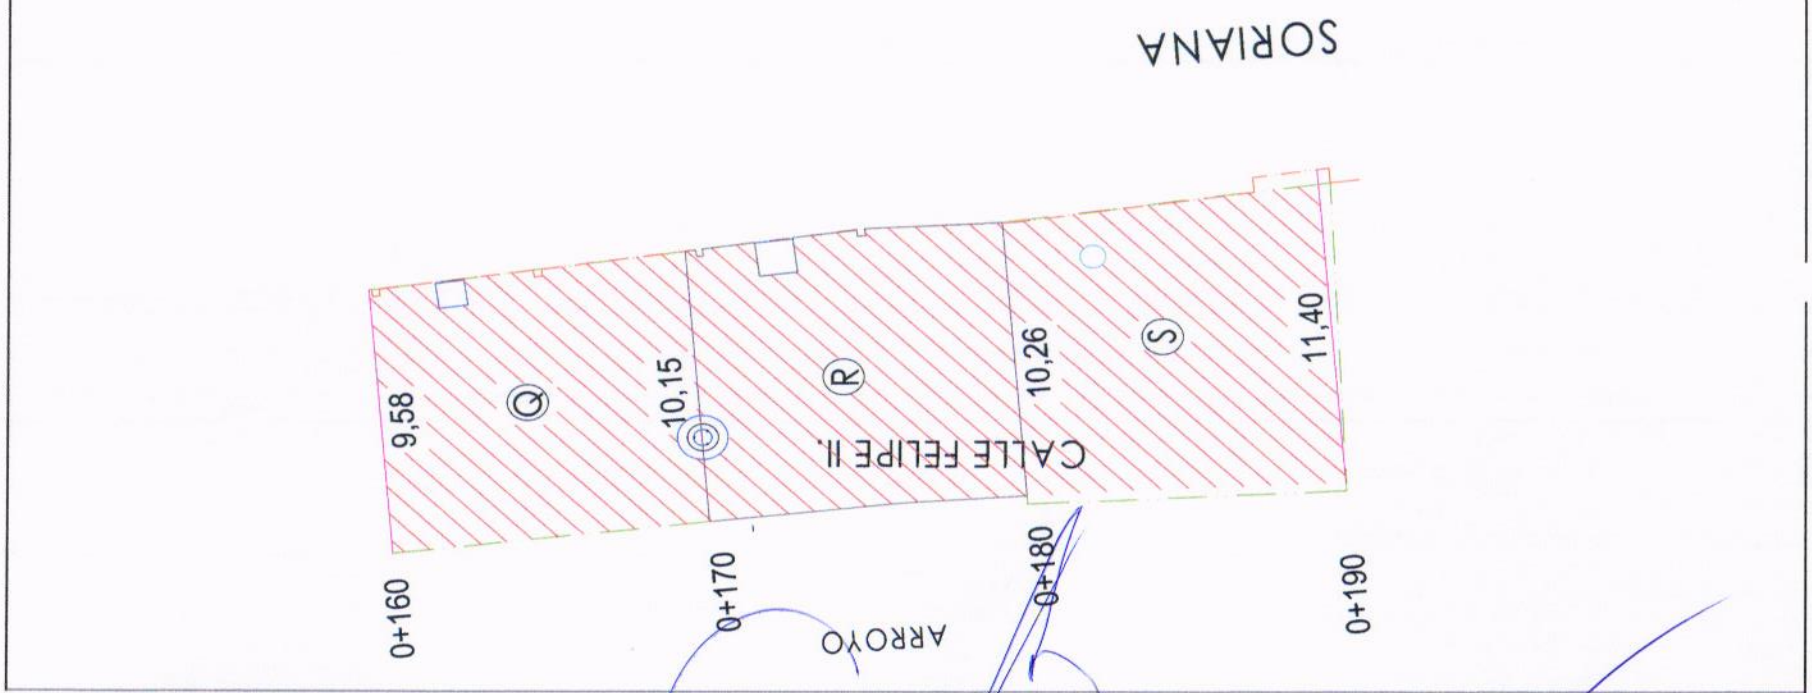

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
		FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A1 **PRELIMINARES**

D- CAR5A10 DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5.00 A 10.00 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA Y ACARREOS EN 1A, ESTACIÓN.

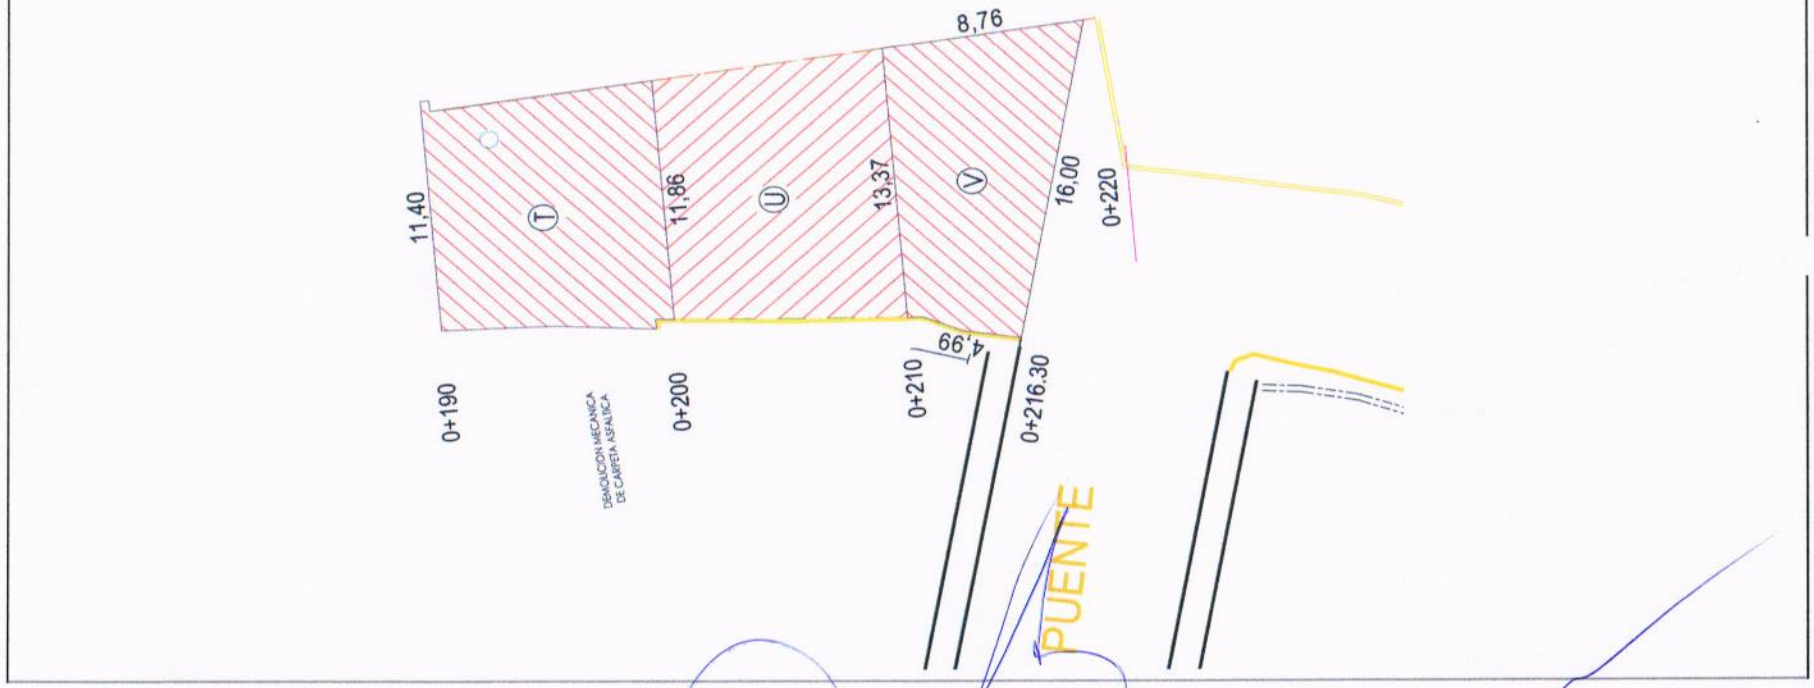

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	02 (DOS)
		FECHA	31 DE OCTUBRE DEL 2023



D-CAR5A10.- Demolición a maquina de carpeta asfaltica de 5.00 a 10.00 cms. De espesor. Incluye mano de obra y acarreos en 1a. estación.



D-CAR5A10.- Demolición a maquina de carpeta asfaltica de 5.00 a 10.00 cms. De espesor. Incluye mano de obra y acarreos en 1a. estación.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	02 (DOS)
		FECHA	31 DE OCTUBRE DEL 2023



D-CAR5A10.- Demolición a maquina de carpeta asfaltica de 5.00 a 10.00 cms. De espesor. Incluye mano de obra y acarreos en 1a. estación.




D-CAR5A10.- Demolición a maquina de carpeta asfaltica de 5.00 a 10.00 cms. De espesor. Incluye mano de obra y acarreos en 1a. estación.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	**RESIDENTE DE OBRA** ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA** ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	02 (DOS)
		FECHA	31 DE OCTUBRE DEL 2023

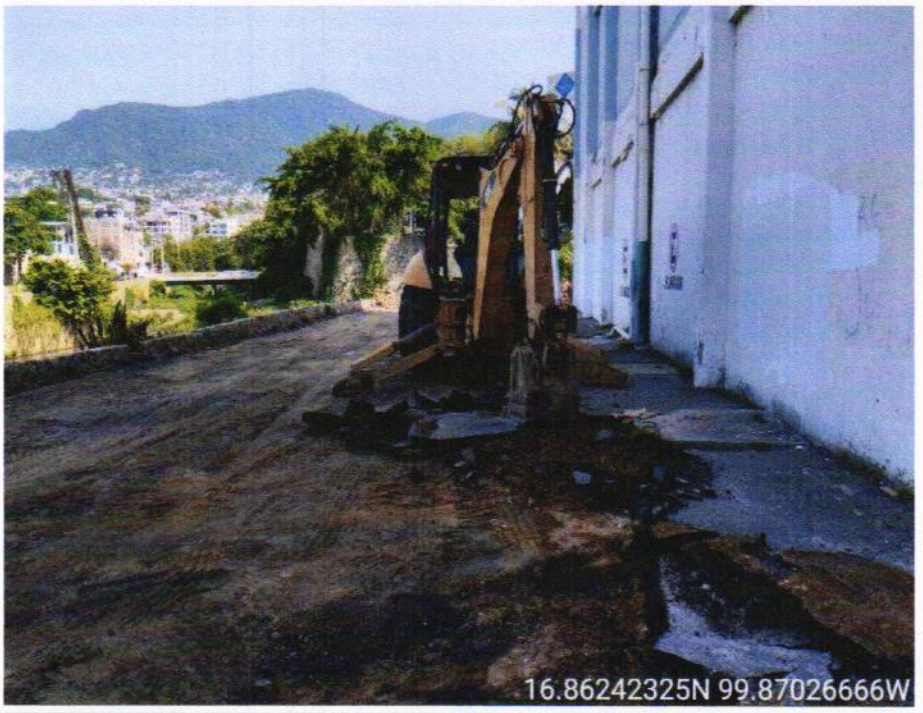

D-CAR5A10.- Demolición a maquina de carpeta asfaltica de 5.00 a 10.00 cms. De espesor. Incluye mano de obra y acarreos en 1a. estación.



D-CAR5A10.- Demolición a maquina de carpeta asfaltica de 5.00 a 10.00 cms. De espesor. Incluye mano de obra y acarreos en 1a. estación.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	N Ú M E R O S G E N E R A D O R E S		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	ANCHO	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A1	**PRELIMINARES**									
D-BANQU	Demolicion mecanica de banqueta de 10.00 cms. De espesor, incluye: herramienta menor, equipo y mano de obra									
	ANCHO PROMEDIO DEMOLICION BANQUETA									**LAD-IZQ.**
	LADO IZQ.									
	A.- 1.63+1.52 =3.15 /2 =**1.57**	0+006.550	0+010.000		1.57	3.45		M2	5.41	A
	B.- 1.52+1.96=3.48/2=**1.74**	0+010.000	0+020.000		1.74	10.00		M2	17.40	B
	C.- 1.96+1.74=3.70/2=**1.85**	0+020.000	0+030.000		1.85	10.00		M2	18.50	C
	D.- 1.74+1.71=3.45/2=**1.72**	0+030.000	0+040.000		1.72	10.00		M2	17.20	D
	E.-1.71+1.71=3.42/2=**1.71**	0+040.000	0+050.000		1.71	10.00		M2	17.10	E
	F.-1.71+1.76=3.47/2=**1.73**	0+050.000	0+060.000		1.73	10.00		M2	17.30	F
	G.-1.76+1.95=3.71/2=**1.85**	0+060.000	0+070.000		1.85	10.00		M2	18.50	G
	H.-1.95+2.41=4.36/2=**2.18**	0+070.000	0+080.000		2.18	10.00		M2	21.80	H
	I.-2.41+1.92=4.33/2=**2.16**	0+080.000	0+084.970		2.16	4.97		M2	10.73	I
	I'.-1.92+0.53=2.45/2=**1.22**	0+084.970	0+087.790		1.22	2.82		M2	3.44	I'
	J.-1. 90+2.03=3.93/2=**1.96**	0+096.350	0+100.000		1.96	3.65		M2	7.15	J
	K.- 2.03+2.00=4.03/2=**2.01**	0+100.000	0+110.000		2.01	10.00		M2	20.10	K
	L.- 2.00+1.84=3.84/2=**1.92**	0+110.000	0+113.200		1.92	3.20		M2	6.14	L
	L'.- 1.84+0.20=2.04/2=**1.02**	0+113.200	0+120.000		1.02	6.80		M2	6.93	L'
						SUBTOTAL HOJA 1		**M2**	**187.70**	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	N Ú M E R O S G E N E R A D O R E S		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	ANCHO	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A1	**PRELIMINARES**									
D-BANQU	Demolicion mecanica de banqueta de 10.00 cms. De espesor,									
	incluye: herramienta menor, equipo y mano de obra									
	ANCHO PROMEDIO DEMOLICION BANQUETA									**LAD. DER.**
	LADO DER.									
	G.-0.68+0.65=1.33/2=**0.66**	0+063.380	0+070.000		0.66	6.62		M2	4.36	G
	H.-0.81+0.82=1.63/2=**0.81**	0+073.490	0+080.000		0.81	6.51		M2	5.27	H
	I.-0.82+0.89=1.71/2=**0.85**	0+080.000	0+090.000		0.85	10.00		M2	8.50	I
	T.-0.65+0.69=1.29/2=**0.67**	0+199.340	0+200.000		0.67	0.66		M2	0.44	T
	U.-0.65+1.41=2.06/2=**1.03**	0+200.000	0+210.000		1.03	10.00		M2	10.30	U
	V.-1.41+1.78=3.19/2=**1.59**	0+210.000	0+216.000		1.59	6.00		M2	9.54	V
						SUBTOTAL HOJA 2		**M2**	**38.41**	
						SUBTOTAL HOJA 1		**M2**	**187.70**	
						SUBTOTAL HOJA 2		**M2**	**38.41**	
						TOTAL M2 DE DEMOLICION MECANICA DE BANQUETA =		**M2**	**226.11**	
						(-) MENOS M2 COBRADOS EN ESTIMACION 01 (UNO) DE DEMOLICION DE BANQUETA =		**M2**	**-146.04**	
						TOTAL M2 ESTA ESTIMACIÓN =		**M2**	**80.07**	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA:	**MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
	FECHA:	31 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.			

C R O Q U I S

A1 **PRELIMINARES**

D-BANQU DEMOLICION MECANICA DE BANQUETA DE 10.00 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y MANO DE OBRA



IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA:	**MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
	FECHA:	31 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.			

C R O Q U I S

A1 **PRELIMINARES**

D-BANQU DEMOLICION MECANICA DE BANQUETA DE 10.00 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y MANO DE OBRA



IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
		FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A1 **PRELIMINARES**

D-BANQU DEMOLICION MECANICA DE BANQUETA DE 10.00 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y MANO DE OBRA

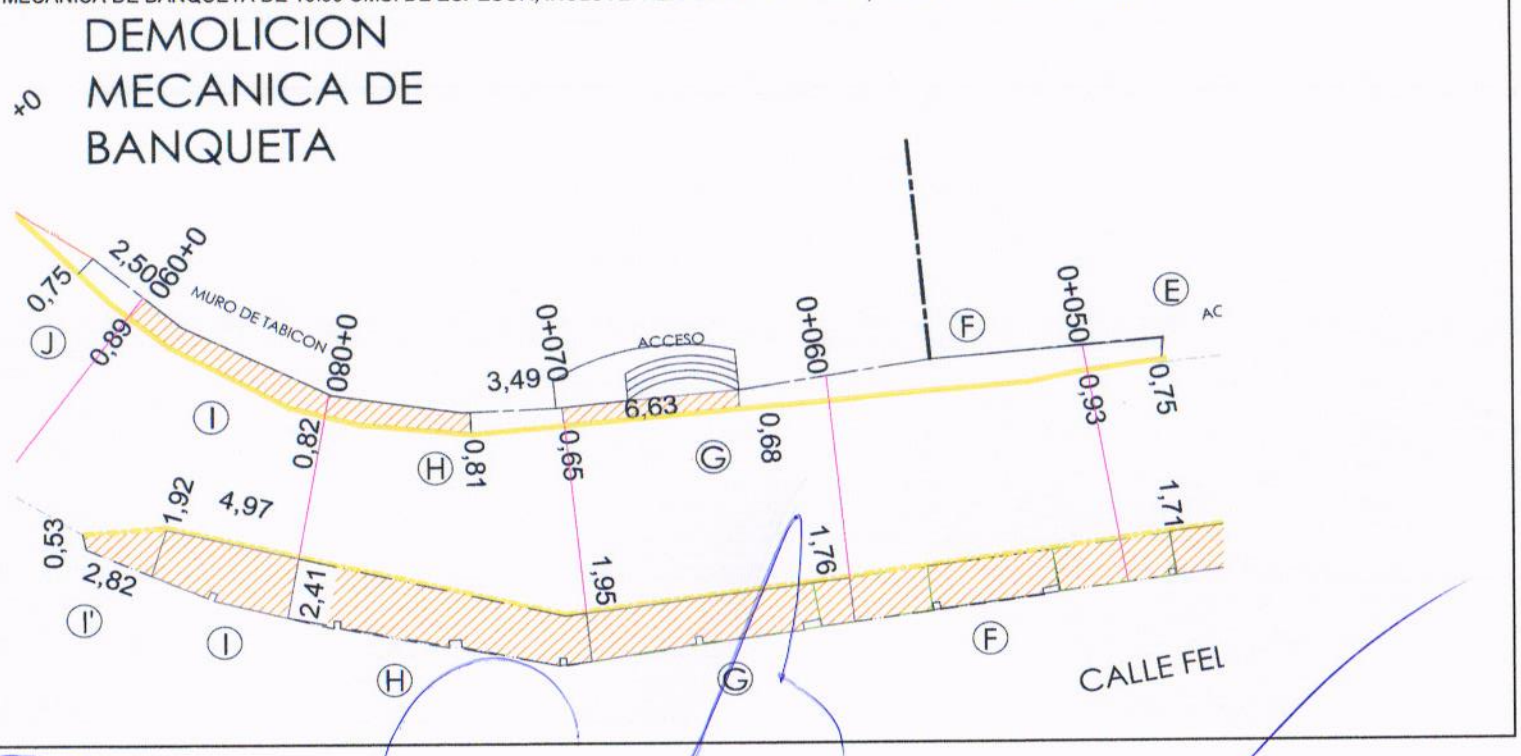

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
		FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A1 **PRELIMINARES**

D-BANQU DEMOLICION MECANICA DE BANQUETA DE 10.00 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y MANO DE OBRA

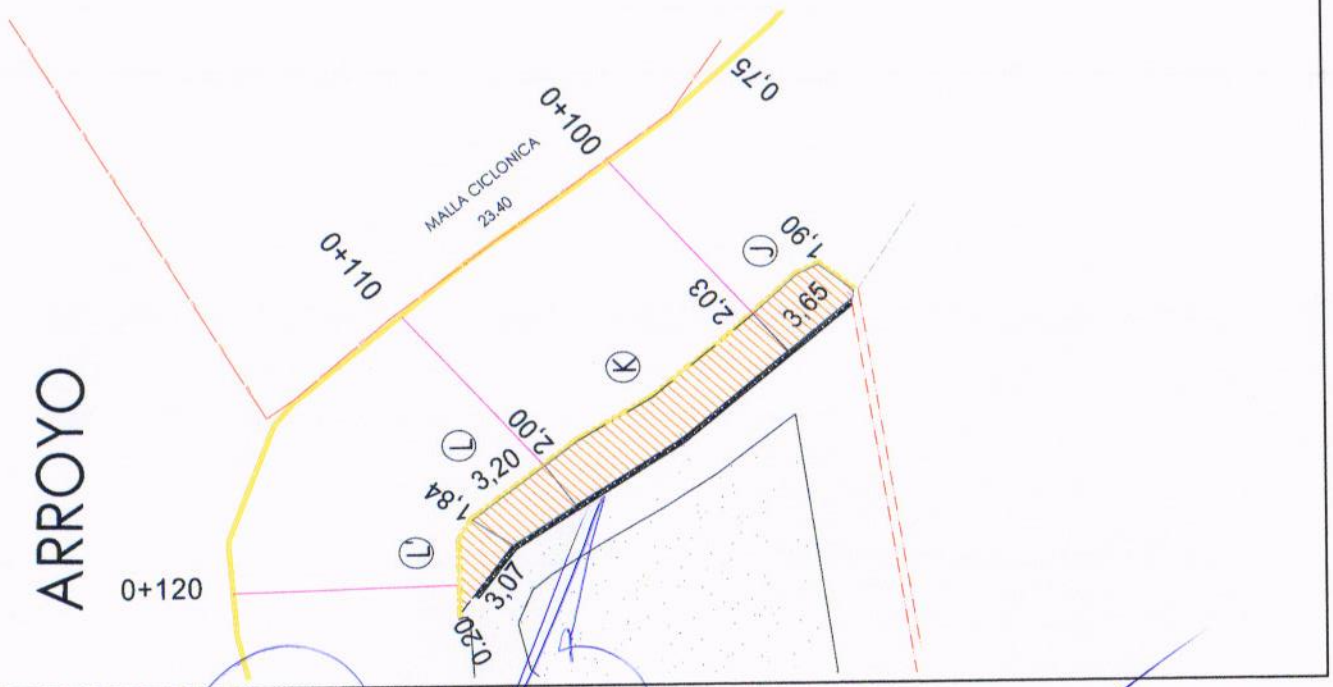

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
		FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A1 **PRELIMINARES**

D-BANQU DEMOLICION MECANICA DE BANQUETA DE 10.00 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y MANO DE OBRA



IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	02 (DOS)
		FECHA	31 DE OCTUBRE DEL 2023



D-BANQU -. Demolición mecánica de banqueta de 10 cms. de espesor incluye: herramienta menor, equipo y mano de obra.




D-BANQU -. Demolición mecánica de banqueta de 10 cms. de espesor incluye: herramienta menor, equipo y mano de obra.


IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	02 (DOS)
		FECHA	31 DE OCTUBRE DEL 2023

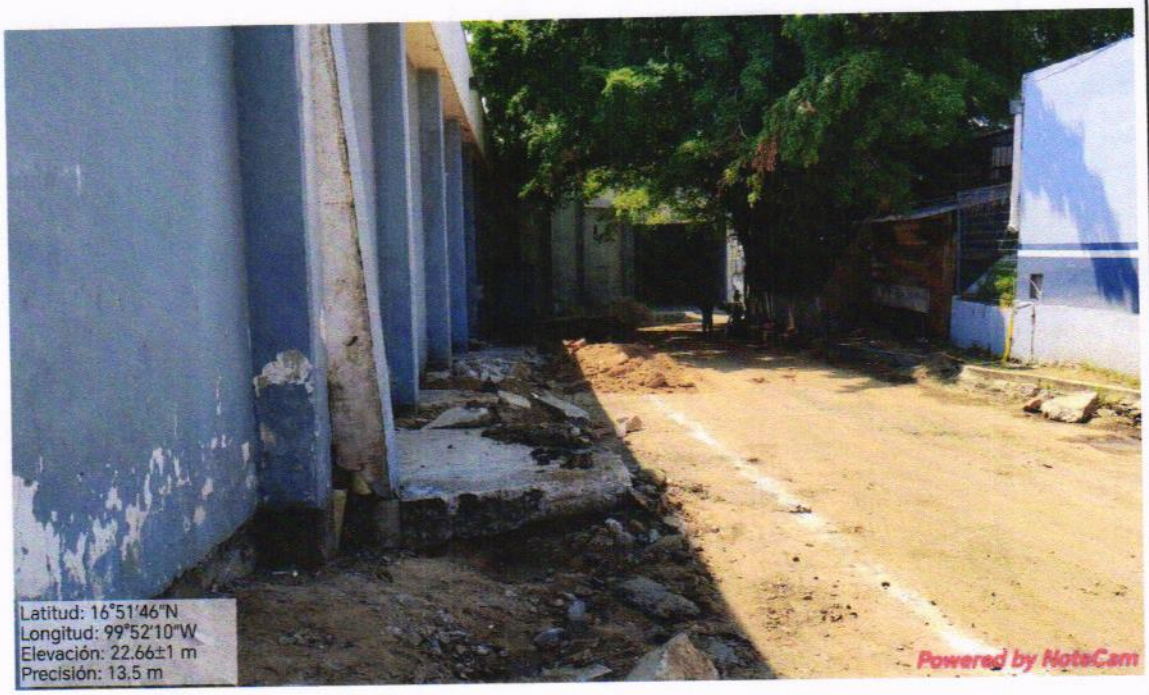

D-BANQU -. Demolición mecánica de banqueta de 10 cms. de espesor incluye: herramienta menor, equipo y mano de obra.

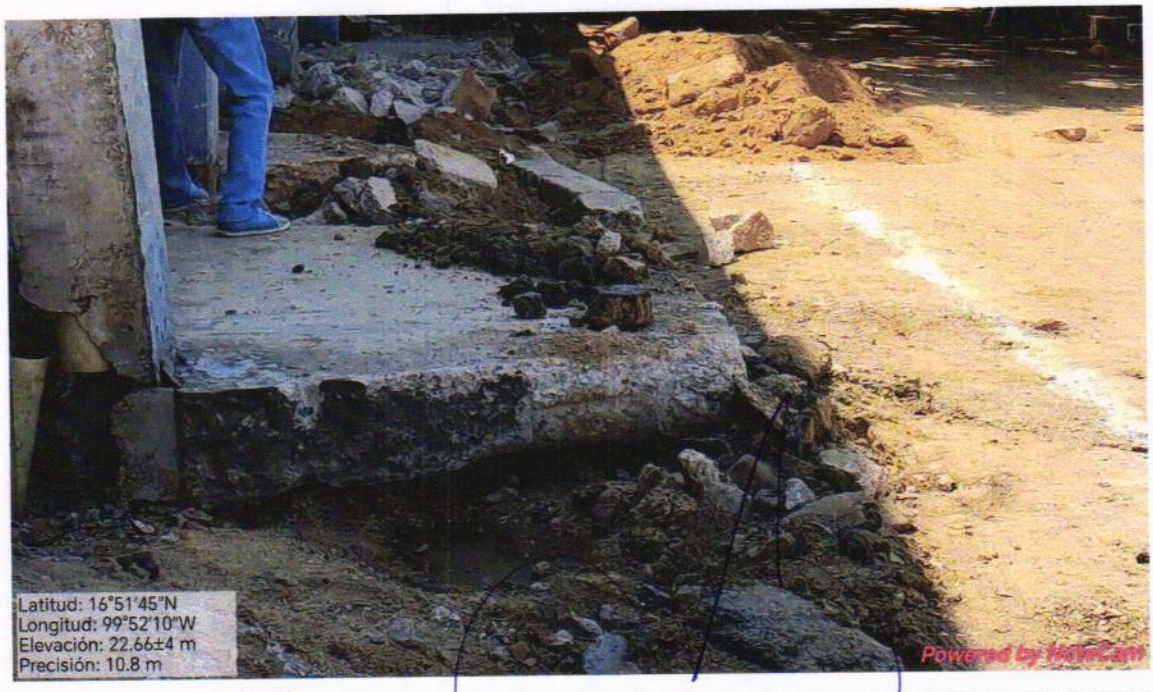

D-BANQU -. Demolición mecánica de banqueta de 10 cms. de espesor incluye: herramienta menor, equipo y mano de obra.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	02 (DOS)
		FECHA	31 DE OCTUBRE DEL 2023



D-BANQU -. Demolición mecánica de banqueta de 10 cms. de espesor incluye: herramienta menor, equipo y mano de obra.



D-BANQU -. Demolición mecánica de banqueta de 10 cms. de espesor incluye: herramienta menor, equipo y mano de obra.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A1	**PRELIMINARES**									
D-GUARM	Demolicion mecanica de guarnicón de 15x20x50 cm, . , incluye: extracion de pedaceria, mano de obra, equipo y herramienta.									
		0+010.000	0+020.000			10.00		M	10.00	Lado Der.
		0+020.000	0+030.000			10.00		M	10.00	Lado Der.
		0+030.000	0+040.000			10.00		M	10.00	Lado Der.
		0+040.000	0+050.000			10.00		M	10.00	Lado Der.
		0+050.000	0+060.000			10.00		M	10.00	Lado Der.
		0+060.000	0+070.000			10.00		M	10.00	Lado Der.
		0+070.000	0+080.000			10.00		M	10.00	Lado Der.
		0+080.000	0+090.000			10.00		M	10.00	Lado Der.
		0+090.000	0+100.000			10.00		M	10.00	Lado Der.
		0+100.000	0+110.000			10.00		M	10.00	Lado Der.
		0+110.000	0+115.460			5.46		M	5.46	Lado Der.
		0+115.460	0+120.760			5.30		M	5.30	Lado Der.
		0+120.760	0+124.690			3.93		M	3.93	Lado Der.
		0+124.690	0+128.920			4.23		M	4.23	Lado Der.
		0+128.920	0+132.700			3.78		M	3.78	Lado Der.
		0+200.000	0+210.000			10.00		M	10.00	Lado Der.
		0+210.000	0+216.000			6.00		M	6.00	Lado Der.
		0+013.000	0+020.000			7.00		M	7.00	Lado Izq.
						SUBTOTAL HOJA 1		**M**	**145.70**	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A1	**PRELIMINARES**									
D-GUARM	Demolicion mecanica de guarnicón de 15x20x50 cm, . , incluye: extracion de pedaceria, mano de obra, equipo y herramienta.									
		0+020.000	0+030.000			10.00		M	10.00	Lado Izq.
		0+030.000	0+040.000			10.00		M	10.00	Lado Izq.
		0+040.000	0+050.000			10.00		M	10.00	Lado Izq.
		0+050.000	0+060.000			10.00		M	10.00	Lado Izq.
		0+060.000	0+070.000			10.00		M	10.00	Lado Izq.
		0+070.000	0+080.000			10.00		M	10.00	Lado Izq.
		0+080.000	0+085.100			5.10		M	5.10	Lado Izq.
		0+085.100	0+088.090			2.99		M	2.99	Lado Izq.
		0+095.000	0+100.000			5.00		M	5.00	Lado Izq.
		0+100.000	0+110.000			10.00		M	10.00	Lado Izq.
		0+110.000	0+117.820			7.82		M	7.82	Lado Izq.
						SUBTOTAL HOJA 2		**M**	**90.91**	
					SUBTOTAL HOJA 1			**M**	**145.70**	
					SUBTOTAL HOJA 2			**M**	**90.91**	
					TOTAL M DE DEMOLICION MECANICA DE GUARNICION =			**M**	**236.61**	
					(-) MENOS M COBRADOS EN ESTIMACION 01 (UNO) DE DEMOLICION DE GUARNICION =			**M**	**-183.67**	
					TOTAL M ESTA ESTIMACIÓN =			**M**	**52.94**	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
		FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		


C R O Q U I S

A1 **PRELIMINARES**

D-GUARM DEMOLICION MECANICA DE GUARNICIÓN DE 15X20X50 CM, INCLUYE: EXTRACION DE PEDACERIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



SECCIÓN
GUARNICIÓN

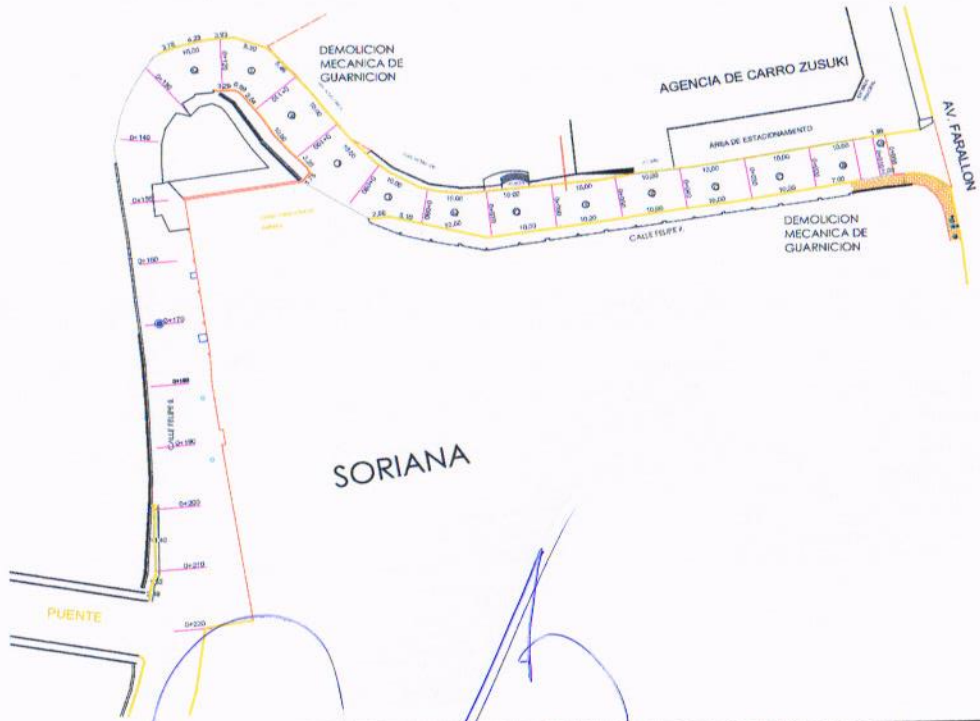

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
		FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A1 **PRELIMINARES**

D-GUARM DEMOLICION MECANICA DE GUARNICIÓN DE 15X20X50 CM, INCLUYE: EXTRACION DE PEDACERIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



SECCIÓN GUARNICIÓN



IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
		FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A1 **PRELIMINARES**

D-GUARM DEMOLICION MECANICA DE GUARNICIÓN DE 15X20X50 CM, INCLUYE: EXTRACION DE PEDACERIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

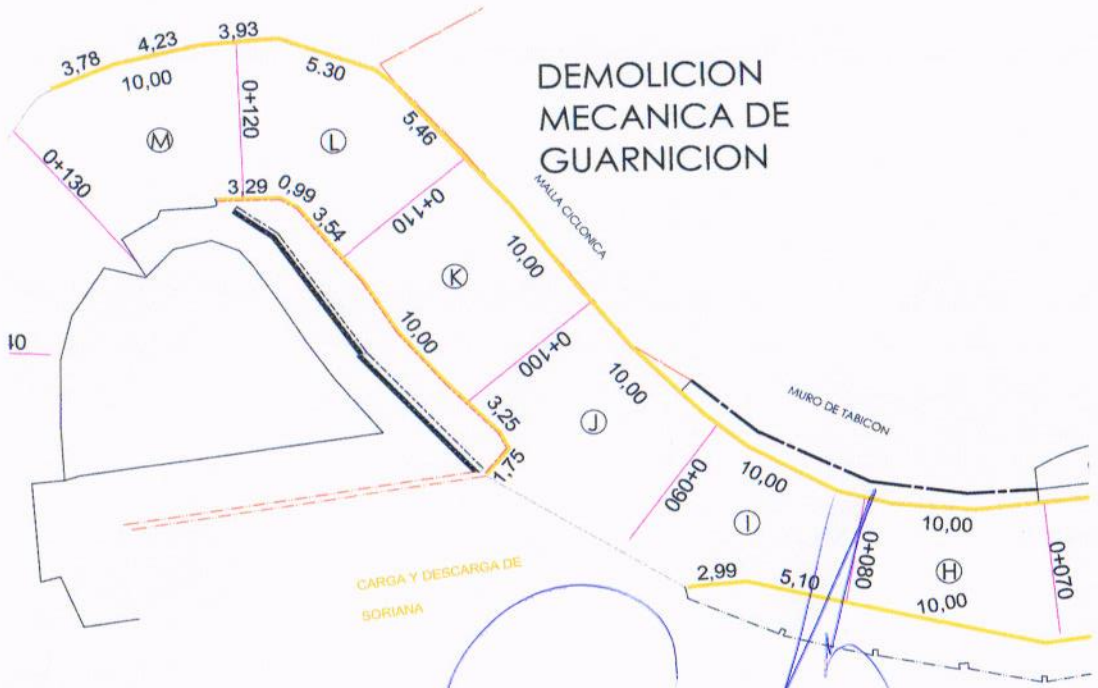



SECCIÓN GUARNICIÓN

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
		FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A1 **PRELIMINARES**

D-GUARM DEMOLICION MECANICA DE GUARNICIÓN DE 15X20X50 CM, INCLUYE: EXTRACION DE PEDACERIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

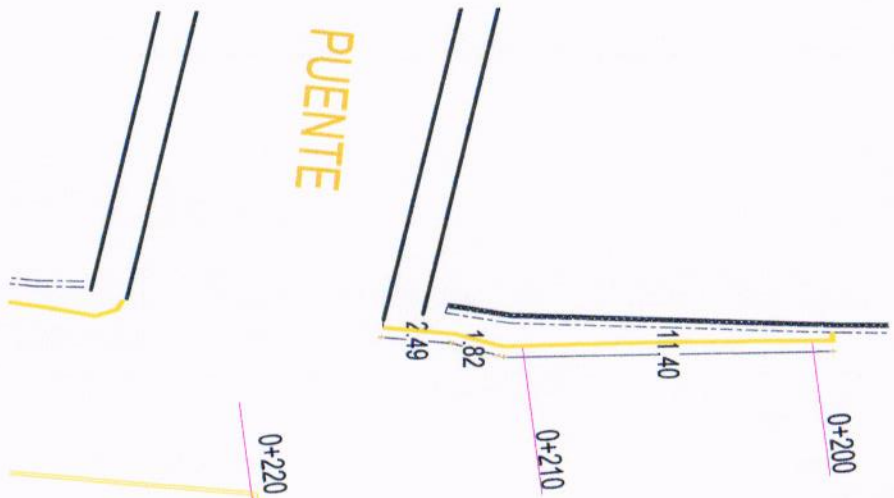



SECCIÓN GUARNICIÓN

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	02 (DOS)
		FECHA	31 DE OCTUBRE DEL 2023

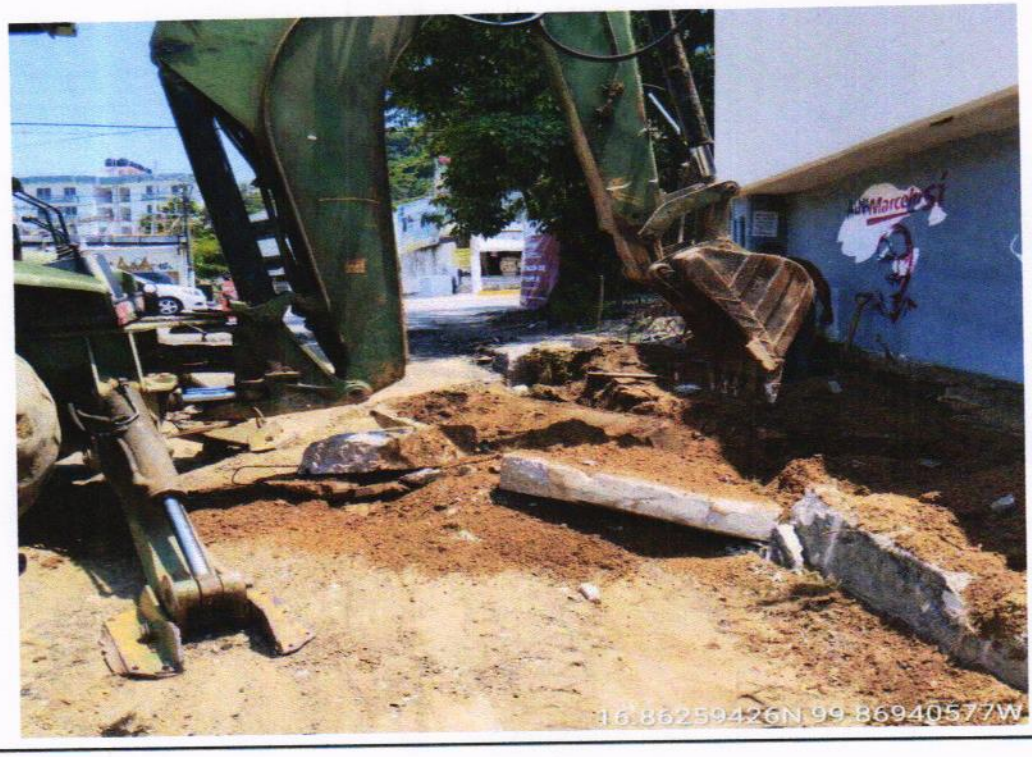

D-GUARM.- Demolición mecánica de guarnición de 15x20x50 cm., incluye extracción de pedacería, mano de obra, equipo y herramienta.



D-GUARM.- Demolición mecánica de guarnición de 15x20x50 cm., incluye extracción de pedacería, mano de obra, equipo y herramienta.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	02 (DOS)
		FECHA	31 DE OCTUBRE DEL 2023



D-GUARM .- Demolición mecánica de guarnición de 15x20x50 cm., incluye extracción de pedacería, mano de obra, equipo y herramienta.




D-GUARM .- Demolición mecánica de guarnición de 15x20x50 cm., incluye extracción de pedacería, mano de obra, equipo y herramienta.


IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	02 (DOS)
		FECHA	31 DE OCTUBRE DEL 2023

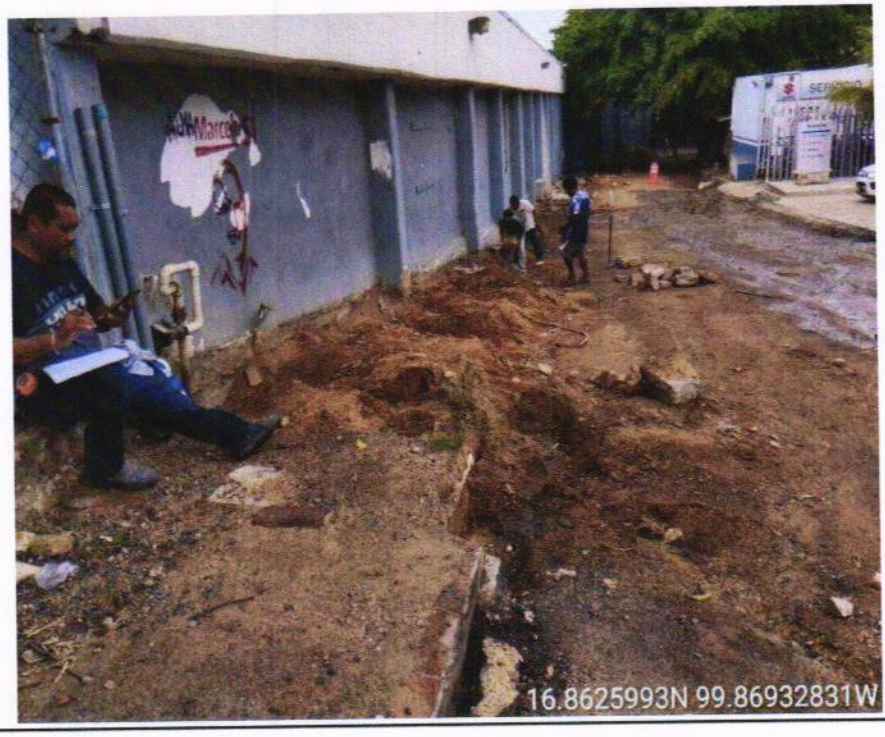

D-GUARM.- Demolición mecánica de guarnición de 15x20x50 cm., incluye extracción de pedacería, mano de obra, equipo y herramienta.

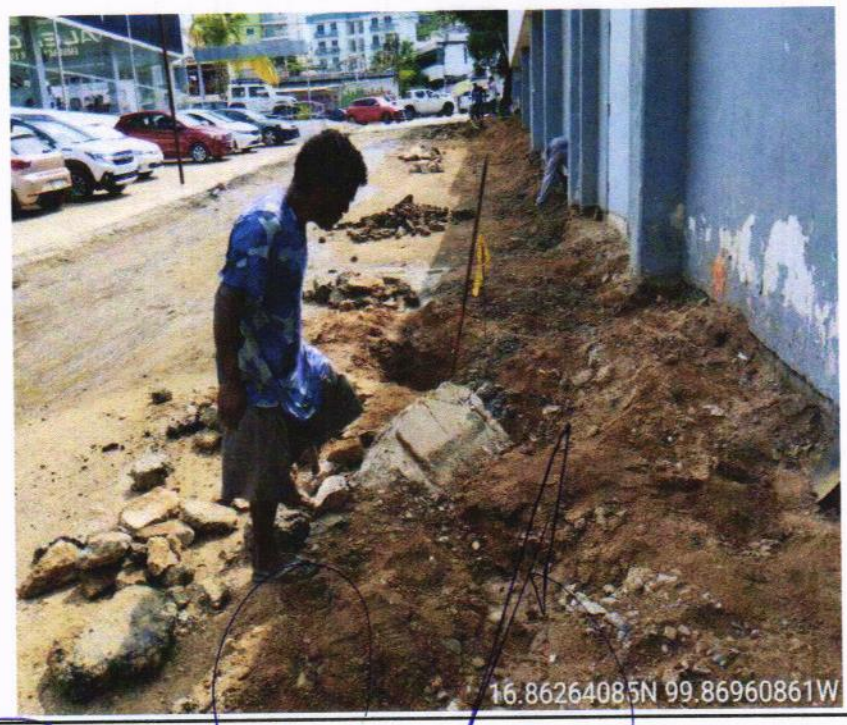

D-GUARM.- Demolición mecánica de guarnición de 15x20x50 cm., incluye extracción de pedacería, mano de obra, equipo y herramienta.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

ACAPULCO

BIENESTAR

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A1	**PRELIMINARES**									
EXC-001	Excavacion por medios mecánicos en cepas de 0.00 A 2.00 mts de profundidad en material tipo II incluye afine de talud y fondo, acarreos a primera estación de 20 mts									
	ANCHO PROMEDIO DE MURO				**AREA**					
	MURO 1 A1.- 3.50 + 4.20=7.70 /2 = **3.85**		**MURO 1**	A1	3.85	10.87	1.48	M3	61.93	
	A2.- 2.90+4.37=7.27/2=**3.63**			A2	3.63	10.87	2.96	M3	116.79	
	A3.- 0.56X2.96=1.65/2= **0.83**				**AREA**					
				A3	0.83	10.87		M3	9.02	TRIANGULO
	MURO 2 A1.- 4.75+6.44=11.19/2=**5.59**		**MURO 2**	A1	5.59	11.13	3.35	M3	208.42	
	A2.- 3.95+5.05=9.00/2=**4.50**			A2	4.50	11.13	2.30	M3	115.19	
	A3.- 1.86X2.30=4.27 / 2 = **2.14**				**AREA**					
				A3	2.14	11.13		M3	23.81	
	MURO 3 A1.- 3.70+4.70=8.40/2=**4.20**		**MURO 3**	A1	4.20	10.00	2.00	M3	84.00	
	A2.- 3.68+5.61=9.29/2=**4.64**			A2	4.64	10.00	3.80	M3	176.32	
	A3.- 0.73 X 3.80 = 2.69 / 2 = **1.39**				**AREA**					
				A3	1.39	10.00		M3	13.90	
	MURO 4 A1.- 1.00X0.70=**0.70**		**MURO 4**		**AREA**					
	A2.- 0.70X0.81/2=**0.28**			A1	0.70	22.00		M3	15.40	
	A3.- 0.50X0.70=0.35/2=**0.17**			A2	0.56	22.00		M3	12.32	
	A4.- 0.13X0.81=0.10/2=**0.05**			A3	0.17	22.00		M3	3.74	
	A5.-041X0.81=0.33/2=**0.17**			A4	0.05	22.00		M3	1.10	
	A6.-0.11X0.70=0.077/2=**0.038**			A5	0.17	22.00		M3	3.74	
				A6	0.04	22.00		M3	0.83	
	TOTAL M3 DE EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MUROS DE MAMP. DE PIEDRA =							**M3**	**846.51**	
	(-) MENOS M3 COBRADOS EN ESTIMACION 01 (UNO) DE EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS =							**M3**	**-699.43**	
	TOTAL M3 ESTA ESTIMACIÓN =							**M3**	**147.08**	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
		FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A1 **PRELIMINARES**

EXC-001 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II INCLUYE AFINE DE TALUD Y FONDO, ACARREOS A PRIMERA ESTACIÓN DE 20 MTS.

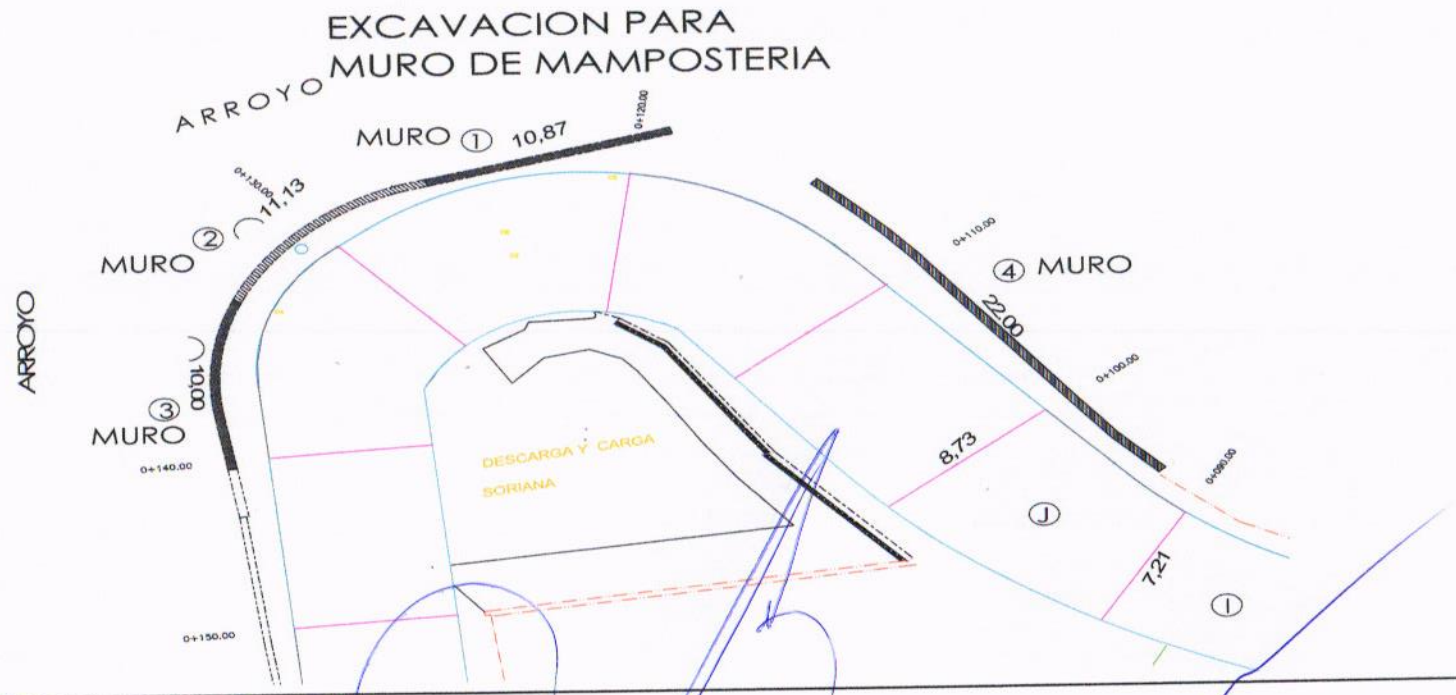

IMEXA CONSTRUCTORES, S/A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
		FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A1 **PRELIMINARES**

EXC-001 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II INCLUYE AFINE DE TALUD Y FONDO, ACARREOS A PRIMERA ESTACIÓN DE 20 MTS.

MURO 1

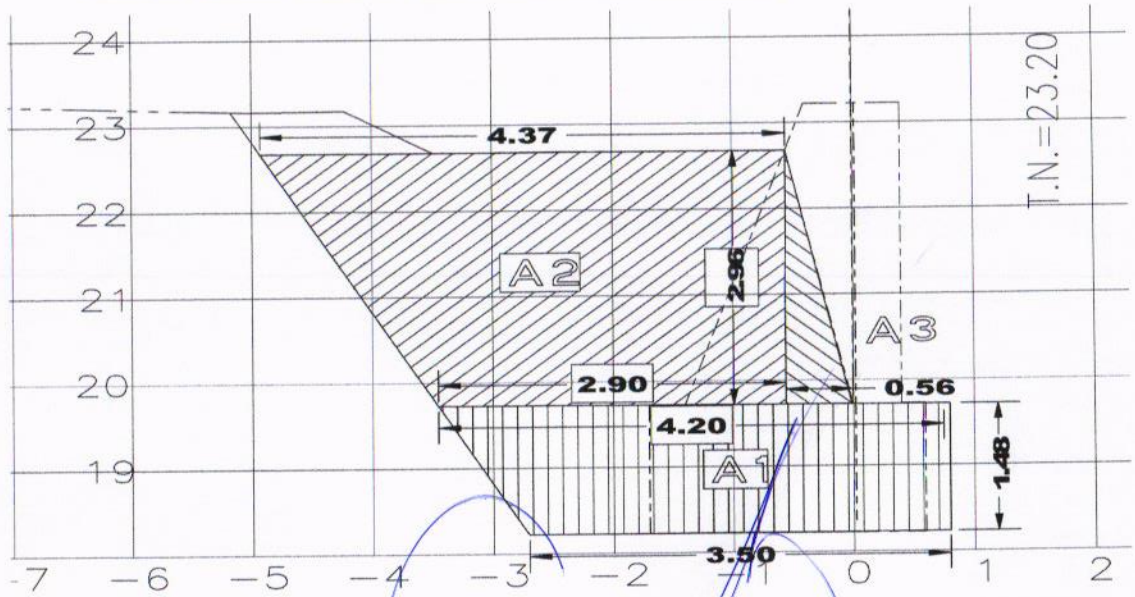

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
		FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A1 **PRELIMINARES**

EXC-001 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II INCLUYE AFINE DE TALUD Y FONDO, ACARREOS A PRIMERA ESTACIÓN DE 20 MTS.

MURO 2

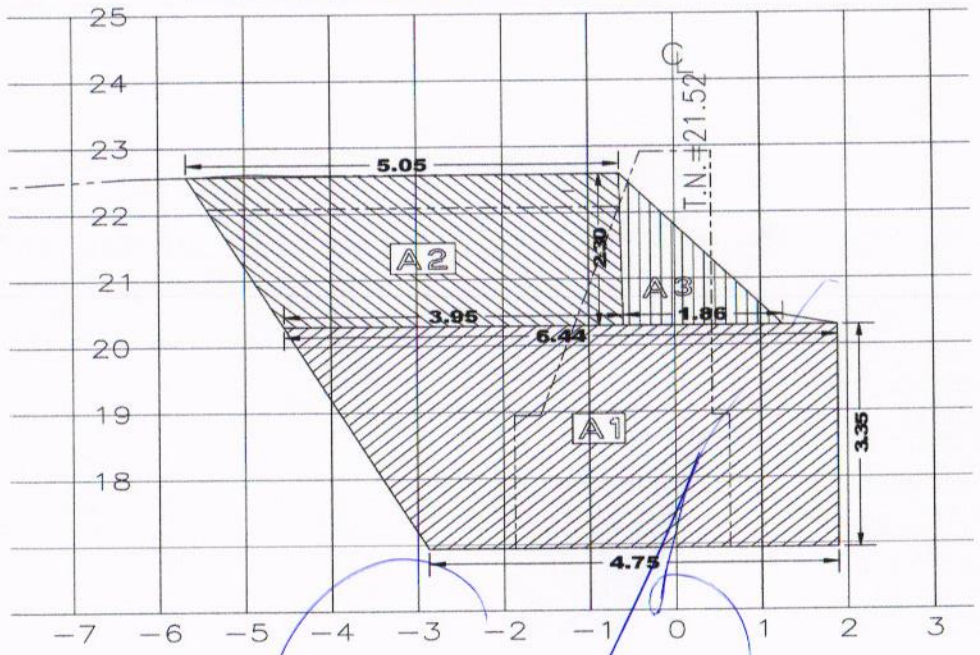

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
		FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A1 **PRELIMINARES**

EXC-001 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II INCLUYE AFINE DE TALUD Y FONDO, ACARREOS A PRIMERA ESTACIÓN DE 20 MTS.

MURO 3

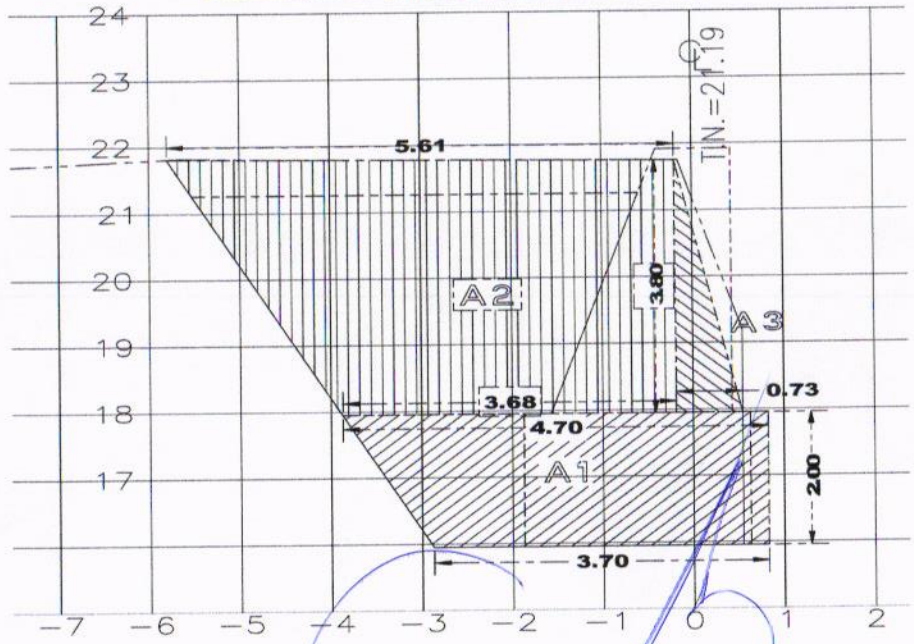

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S				
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	MAJ/426	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
		FECHA:	31 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/426-2023/LP	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.			

C R O Q U I S

A1 **PRELIMINARES**

EXC-001 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II INCLUYE AFINE DE TALUD Y FONDO, ACARREOS A PRIMERA ESTACIÓN DE 20 MTS.

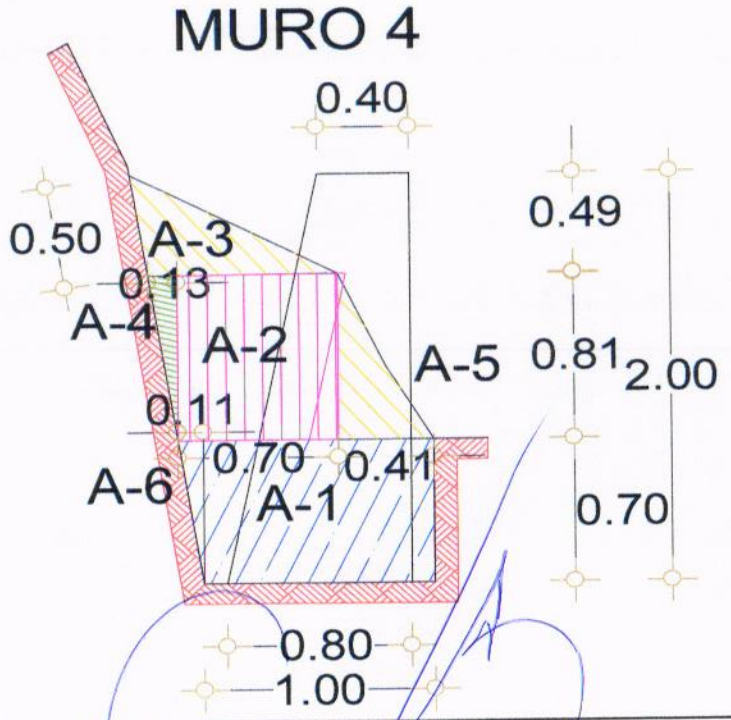

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	02 (DOS)
		FECHA	31 DE OCTUBRE DEL 2023



EXC-001 - Excavación por medios mecánicos en cepas de 0.00 A 2.00 mts de profundidad en material tipo II incluye afine de talud y fondo, acarreos a primera estación de 20 mts.



EXC-001 - Excavación por medios mecánicos en cepas de 0.00 A 2.00 mts de profundidad en material tipo II incluye afine de talud y fondo, acarreos a primera estación de 20 mts.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	02 (DOS)
		FECHA	31 DE OCTUBRE DEL 2023



EXC-001 - Excavación por medios mecánicos en cepas de 0.00 A 2.00 mts de profundidad en material tipo II incluye afine de talud y fondo, acarreos a primera estación de 20 mts.



EXC-001 - Excavación por medios mecánicos en cepas de 0.00 A 2.00 mts de profundidad en material tipo II incluye afine de talud y fondo, acarreos a primera estación de 20 mts.


IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	02 (DOS)
		FECHA	31 DE OCTUBRE DEL 2023



EXC-001 - Excavación por medios mecánicos en cepas de 0.00 A 2.00 mts de profundidad en material tipo II incluye afine de talud y fondo, acarreos a primera estación de 20 mts.

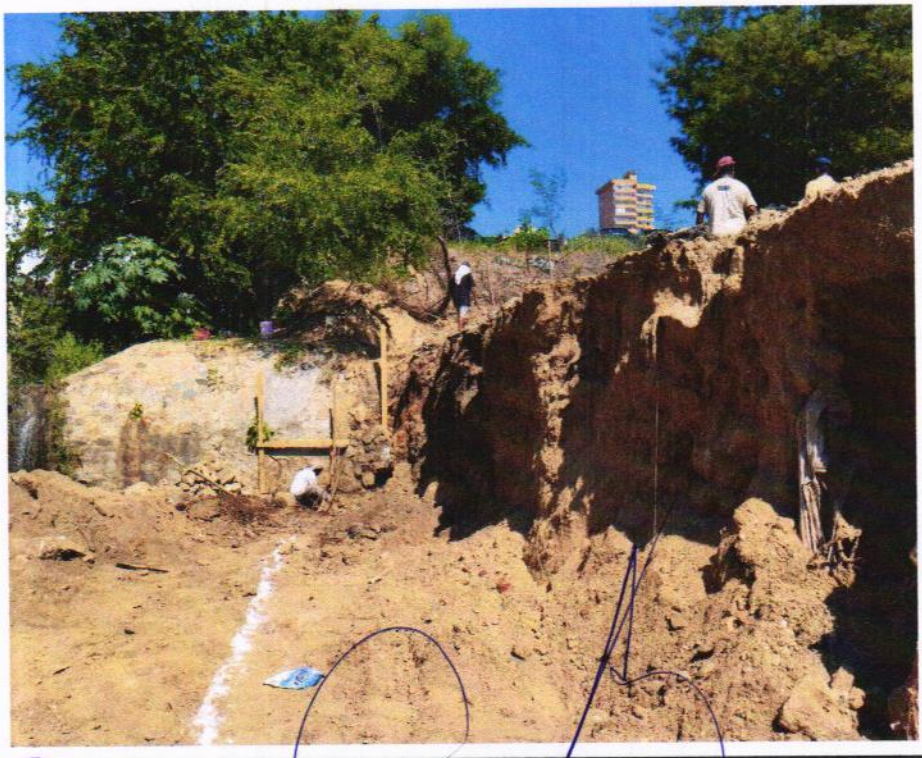

EXC-001 - Excavación por medios mecánicos en cepas de 0.00 A 2.00 mts de profundidad en material tipo II incluye afine de talud y fondo, acarreos a primera estación de 20 mts.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	02 (DOS)
		FECHA	31 DE OCTUBRE DEL 2023



EXC-001 - Excavación por medios mecánicos en cepas de 0.00 A 2.00 mts de profundidad en material tipo II incluye afine de talud y fondo, acarreos a primera estación de 20 mts.



EXC-001 - Excavación por medios mecánicos en cepas de 0.00 A 2.00 mts de profundidad en material tipo II incluye afine de talud y fondo, acarreos a primera estación de 20 mts.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A1	**PRELIMINARES**									
9-0139	Relleno de material producto de excavacion compactado con pison de mano y agua en capas de 20 cms, de espesor incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.									
					AREA					
	ANCHO PROMEDIO DE RELLENO			A1	2.32	10.87	5.31	M3	133.90	
	MURO 1 A1.- 1.00 + 3.65=4.65 /2 = **2.32**		**RELLENO MURO 1**	A2	0.79	10.87	3.31	M3	28.42	
	A2.- 0.30+1.28=1.58/2=**0.79**									
				A3	0.20	10.87	2.00	M3	4.34	
	MURO 2 A1.- 1.00 + 3.57=4.57 /2 = **2.28**			A1	2.28	11.13	5.14	M3	130.43	
	A2.- 0.30+1.23=1.53/2=**0.76**		**RELLENO MURO 2**	A2	0.76	11.13	3.14	M3	26.56	
				A3	0.20	11.13	2.00	M3	4.45	
					SUBTOTAL HOJA 1			**M3**	**328.10**	
						SUBTOTAL HOJA 1		**M3**	**328.10**	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	N Ú M E R O S G E N E R A D O R E S		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A1	**PRELIMINARES**									
9-0139	Relleno de material producto de excavacion compactado con pison de mano y agua en capas de 20 cms, de espesor incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.									
	ANCHO PROMEDIO DE RELLENO									
	MURO 3 A1.- 1.00+3.57=4.57/2=**2.28**		**RELLENO MURO 3**	A1	2.28	10.00	5.14	M3	117.19	
	A2.- 0.30+1.20=1.50/2=0.75			A2	0.75	10.00	3.14	M3	23.55	
				A3	0.20	10.00	2.00	M3	4.00	
	MURO 4 A1.- 0.10+0.60=0.70/2=**0.35**		**RELLENO MURO 4**	A1	0.35	22.00	2.00	M3	15.40	
				A2	0.10	22.00	0.70	M3	1.54	
					SUBTOTAL HOJA 2			**M3**	**161.68**	
					SUBTOTAL HOJA 1			**M3**	**328.10**	
					SUBTOTAL HOJA 2			**M3**	**161.68**	
	TOTAL M3 DE RELLENO POR MEDIOS MECANICOS EN MUROS DE MAMP. DE PIEDRA =							**M3**	**489.78**	
	(-) MENOS M3 COBRADOS EN ESTIMACION 01 (UNO) DE RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION =							**M3**	**-420.29**	
	TOTAL M3 ESTA ESTIMACIÓN =							**M3**	**69.49**	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S				
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
		FECHA:	31 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.			

C R O Q U I S

A1 **PRELIMINARES**

9-0139 RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.

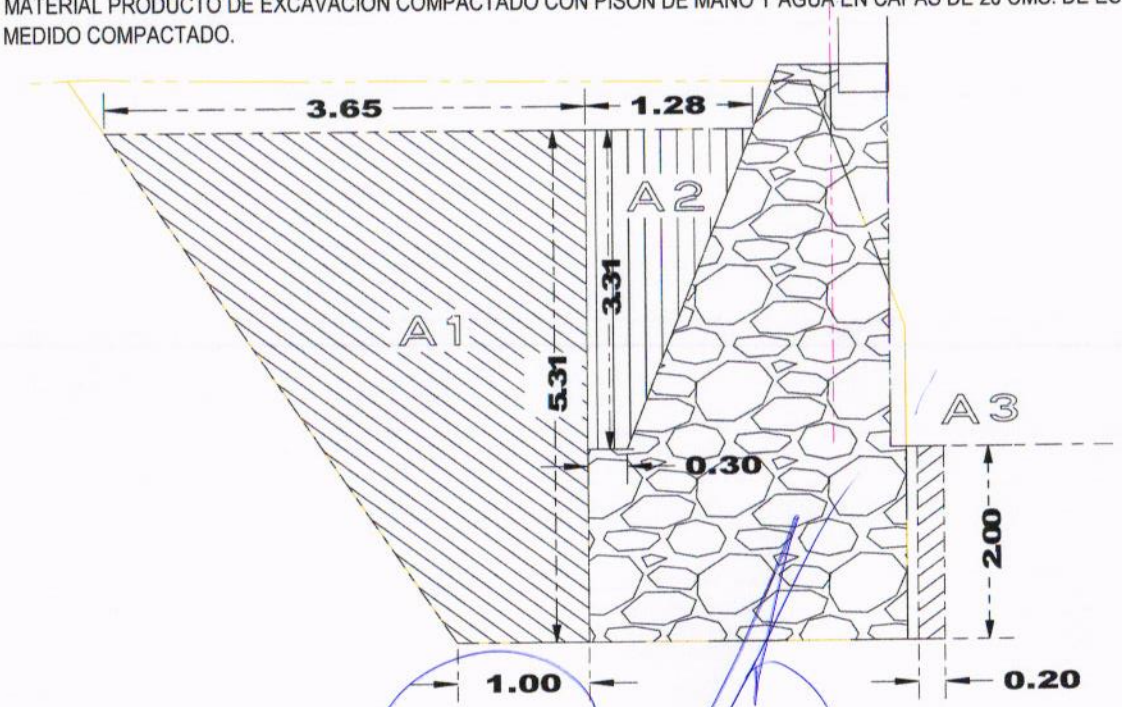

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
		FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A1 **PRELIMINARES**

9-0139 RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.

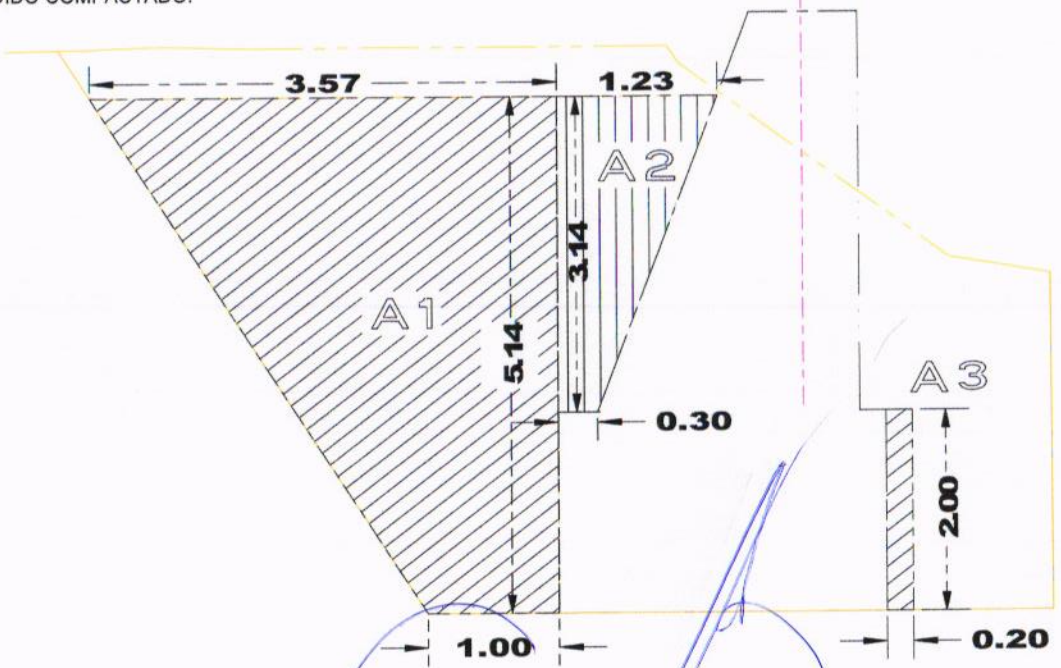

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
		FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A1 **PRELIMINARES**

9-0139 RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.

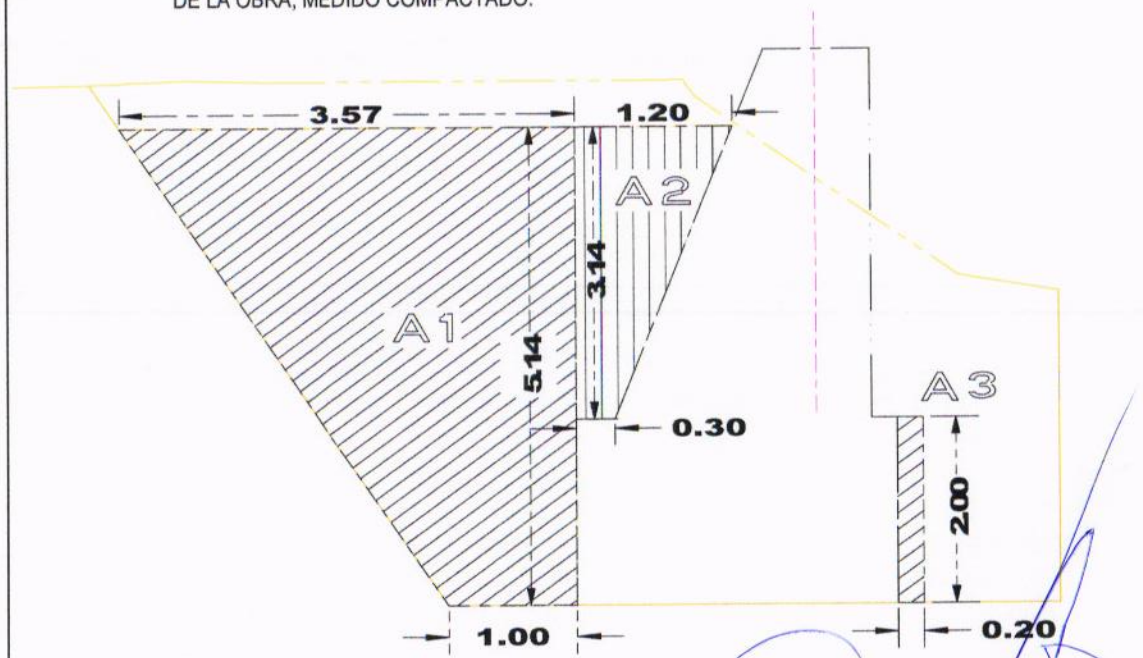

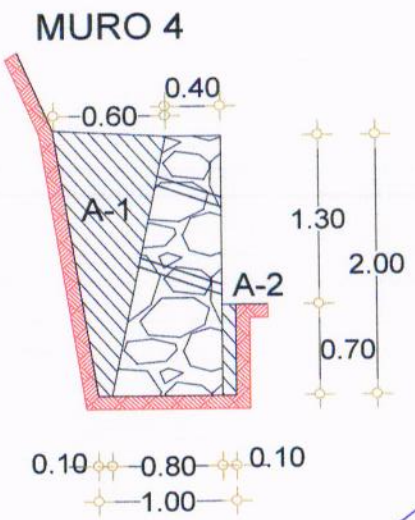

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA:	**MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
	FECHA:	31 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.			

C R O Q U I S

A1 **PRELIMINARES**

9-0139 RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.

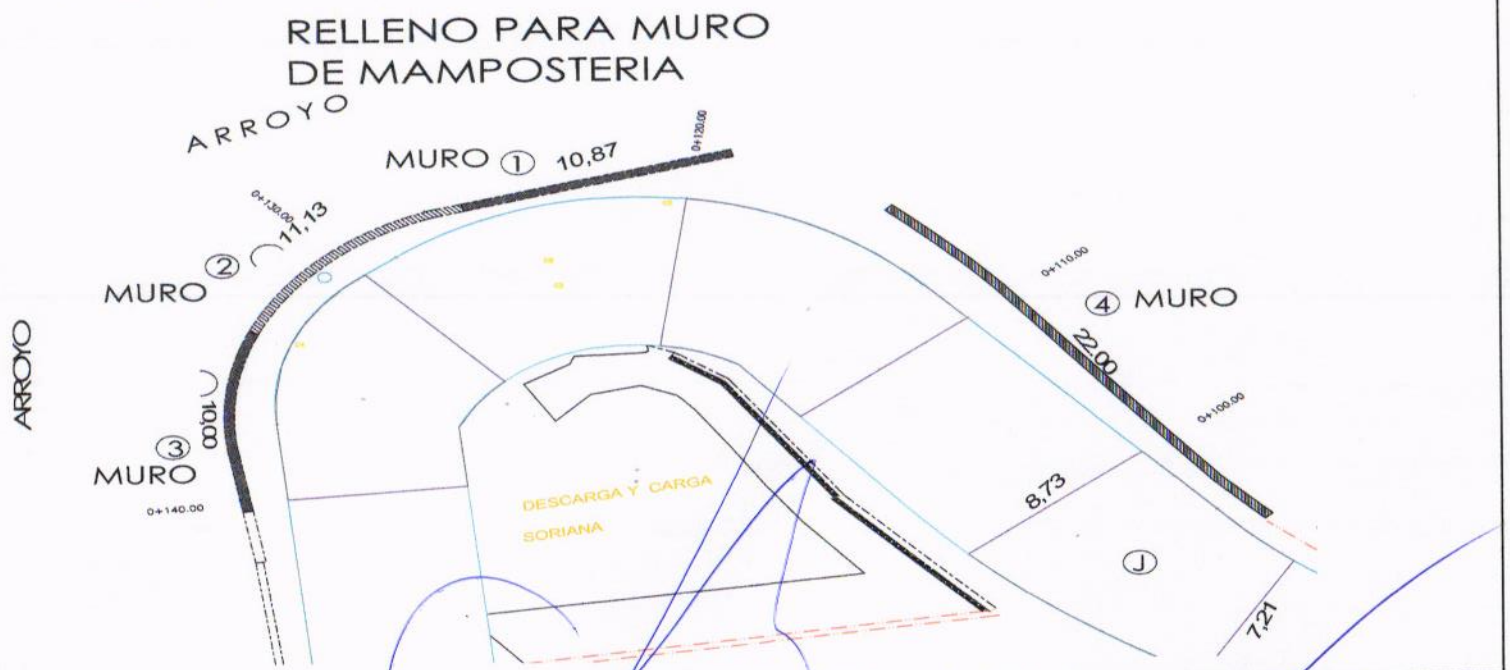

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	02 (DOS)
		FECHA	31 DE OCTUBRE DEL 2023



9-0139 - Relleno de material producto de excavación compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor, incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.



9-0139 - Relleno de material producto de excavación compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor, incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	02 (DOS)
		FECHA	31 DE OCTUBRE DEL 2023



9-0139 - Relleno de material producto de excavación compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor, incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.



9-0139 - Relleno de material producto de excavación compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor, incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.


IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	02 (DOS)
		FECHA	31 DE OCTUBRE DEL 2023



9-0139 - Relleno de material producto de excavación compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor, incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.

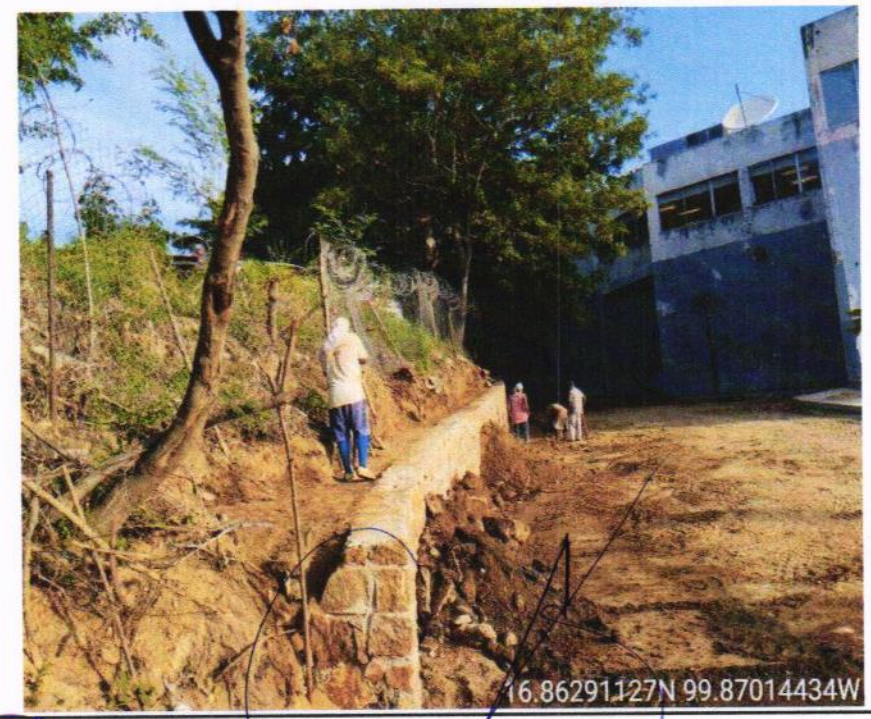

9-0139 - Relleno de material producto de excavación compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor, incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A2	TERRACERIAS									
31-0448	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO II-A, INCLUYE ACAMELLONAMIENTO DE MATERIAL		1		2.00	6.55	0.30	M3	3.93	
			2		10.00	6.55	0.30	M3	19.65	
			3		10.00	6.60	0.30	M3	19.80	
			4		10.00	6.70	0.30	M3	20.10	
			5		10.00	6.93	0.30	M3	20.79	
	ANCHO PROMEDIO		6		10.00	7.41	0.30	M3	22.23	
	3.- 6.55+6.65=13.20/2= 6.60		7		10.00	7.56	0.30	M3	22.68	
	4.- 6.65+6.75=13.40/2= 6.70		8		10.00	6.96	0.30	M3	20.88	
	5.- 6.75+7.12=13.87/2= 6.93		9		10.00	7.32	0.30	M3	21.96	
	6.- 7.12+7.70=14.82/2= 7.41		10		10.00	8.40	0.30	M3	25.20	
	7.- 7.70+7.42=15.12/2= 7.56		11		10.00	8.32	0.30	M3	24.96	
	8.- 7.42+6.50=13.92/2= 6.96		12		10.00	8.00	0.30	M3	24.00	
	9.- 6.50+8.15=14.65/2= 7.32		13		10.00	8.00	0.40	M3	32.00	
	10.- 8.15+8.65=16.80/2= 8.40		14		10.00	7.50	0.40	M3	30.00	
	11.- 8.65+8.00=16.65/2= 8.32		15		10.00	7.00	0.40	M3	28.00	
	14.- 8.00+7.00=15.00/2= 7.50		16		10.00	7.33	0.40	M3	29.32	
	16.- 7.00+7.67=14.67/2= 7.33		17		10.00	7.70	0.40	M3	30.80	
	17.- 7.67+7.78=15.45/2= 7.70		18		10.00	7.90	0.40	M3	31.60	
	18.- 7.78+8.02=15.80/2= 7.90									
						SUB- TOTAL HOJA 1 =		M3	427.90	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A2	**TERRACERIAS**									
31-0448	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO II-A, INCLUYE ACAMELLONAMIENTO DE MATERIAL									
			19		10.00	8.12	0.40	M3	32.48	
	ANCHO PROMEDIO		20		10.00	8.62	0.40	M3	34.48	
	19.- 8.02+8.22=16.24/2= **8.12**		21		10.00	8.78	0.40	M3	35.12	
	20.- 8.22+9.02=17.24/2= **8.62**		22		7.88	8.55	0.40	M3	26.94	
	21.- 9.02+8.55=17.57/2= **8.78**					**SUB- TOTAL HOJA 2 =**			**129.02**	
	22.- 8.55+8.95=17.3/2= **8.75**					**SUB- TOTAL HOJA 1 =**			**427.90**	
						SUB- TOTAL HOJA 2 =			**129.02**	
	AREA DE POZO DE VISITA									
	0.40+0.40 0.16									
	0.16X3.1416= **0.50 M2**	**(-) DESCUENTO POZO DE VISITA**		**-2.00**		0.50	0.40	M3	**-0.40**	
							TOTAL	**M3**	**556.52**	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
		FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A2 **TERRACERIAS**

31-0448 APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO II-A, INCLUYE ACAMELLONAMIENTO DE MATERIAL.

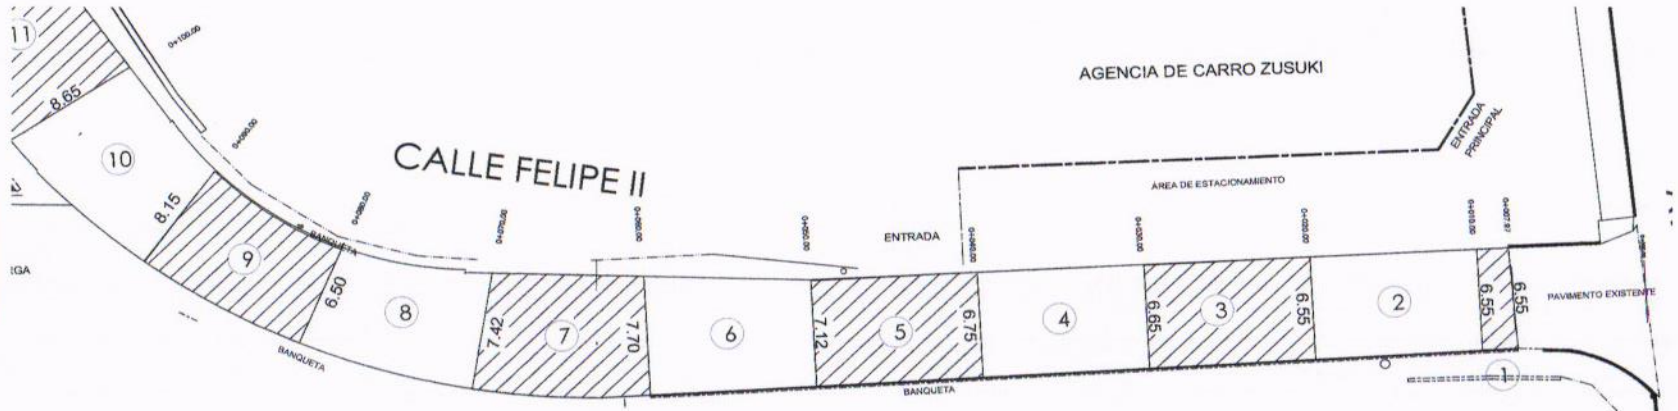

SORIANA. APERTURA DE CAJA

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
		FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A2 **TERRACERIAS**

31-0448 APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO II-A, INCLUYE ACAMELLONAMIENTO DE MATERIAL.



IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	02 (DOS)
		FECHA	31 DE OCTUBRE DEL 2023



31-0448.- APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO II-A, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO DEL MATERIAL.



31-0448.- APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO II-A, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO DEL MATERIAL.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	**RESIDENTE DE OBRA** ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA** ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	02 (DOS)
		FECHA	31 DE OCTUBRE DEL 2023



31-0448.- APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO II-A, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO DEL MATERIAL.



31-0448.- APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO II-A, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO DEL MATERIAL.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	N Ú M E R O S G E N E R A D O R E S		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A3	**INSTALACION HIDRAULICA**									
4-0080	Excavacion a mano en material tipo II-A, en seco y barreta de 0.00 a 2.00 mts, de profundidad, depositando el producto de excavacion a orilla de cepa, cualquier zona.									
		RED AGUA POTABLE								
		0+007.000	0+086.000		0.60	79.00	0.80	M3	37.92	tuberia 3" PVC
	TOTAL M3 DE EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II PARA COLOC. DE TUBERIA PVC DE 3" =							**M3**	**37.92**	
	(-) MENOS M3 COBRADOS EN ESTIMACION 01 (UNO) DE EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II-A =							**M3**	**-16.00**	
	TOTAL M3 ESTA ESTIMACIÓN =							**M3**	**21.92**	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
		FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A3 **INSTALACION HIDRAULICA**

4-0080 EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO LL-A, EN SECO Y BARRETA DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, DEPOSITANDO EL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A ORILLA DE CEPA, CUALQUIER ZONA..

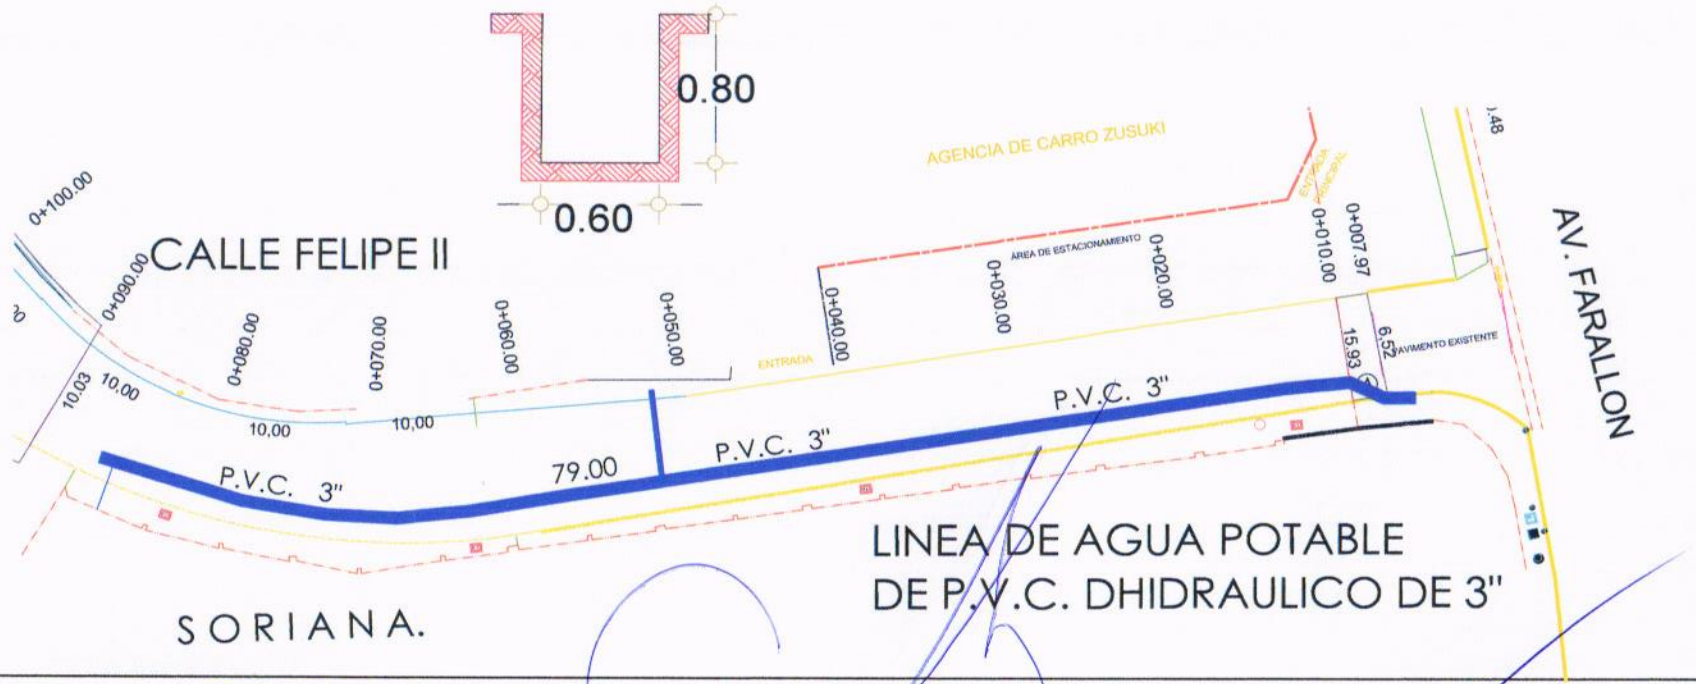

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	02 (DOS)
		FECHA	31 DE OCTUBRE DEL 2023

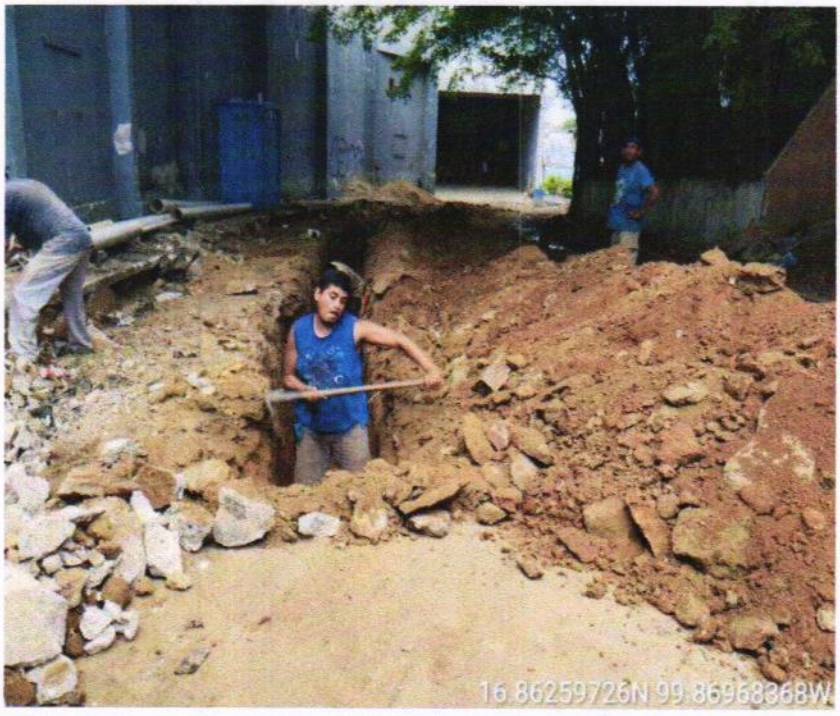

4-0080.- Excavación a mano en material tipo II-A, en seco y barreta de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad, depositando el producto de excavación a orilla de cepa, cualquier zona.



4-0080.- Excavación a mano en material tipo II-A, en seco y barreta de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad, depositando el producto de excavación a orilla de cepa, cualquier zona.


IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	02 (DOS)
		FECHA	31 DE OCTUBRE DEL 2023



4-0080.- Excavación a mano en material tipo II-A, en seco y barreta de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad, depositando el producto de excavación a orilla de cepa, cualquier zona.

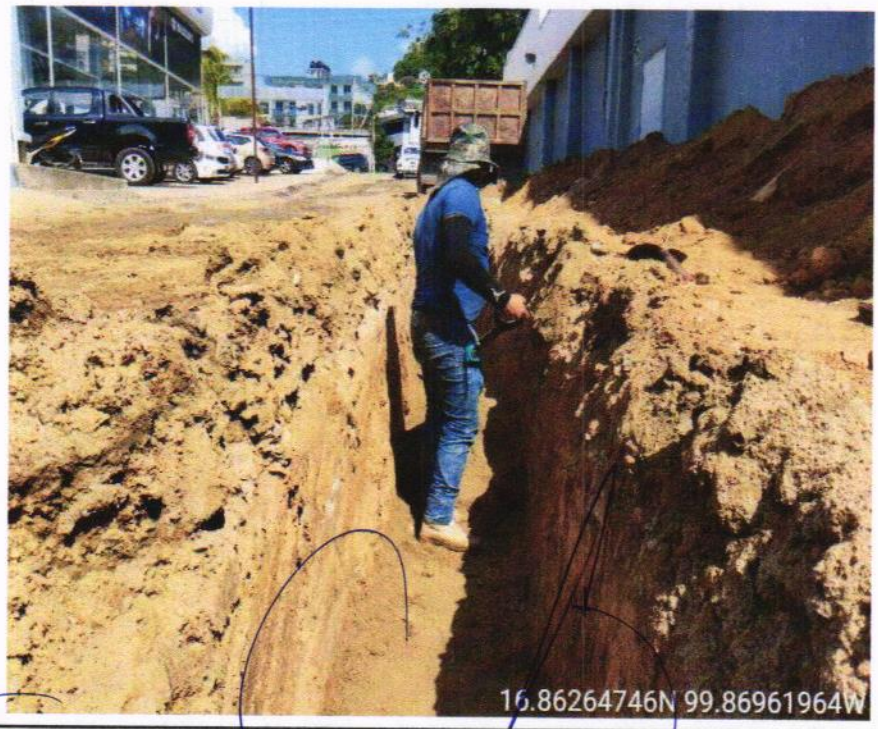

4-0080.- Excavación a mano en material tipo II-A, en seco y barreta de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad, depositando el producto de excavación a orilla de cepa, cualquier zona.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	N Ú M E R O S G E N E R A D O R E S		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A3	**INSTALACION HIDRAULICA**									
9-0139	Relleno de material producto de excavacion compactado con pison de mano y agua en capas de 20 cms, de espesor, incluye acarreo de la obra, medido compactado.									
		RED AGUA POTABLE								
		0+007.000	0+086.000		0.60	79.00	0.70	M3	33.18	tuberia principal
					AREA					
		DESCUENTO DE TUBO DE 3"			-0.0043	79.00		M3	-0.3397	
		0.0375X 0.0375=0.0014								
		0.0014X3.1416=**0.0043**								
	TOTAL M3 DE RELLENO DE MATERIAL PROD. DE EXC. EN CEPA DE TUBERIA DE 3" =							**M3**	**32.84**	
	(-) MENOS M3 COBRADOS EN ESTIMACION 01 (UNO) DE RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION =							**M3**	**-15.80**	
	TOTAL M3 ESTA ESTIMACIÓN =							**M3**	**17.04**	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
		FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A3 **INSTALACION HIDRAULICA**

9-0139 RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS, DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.

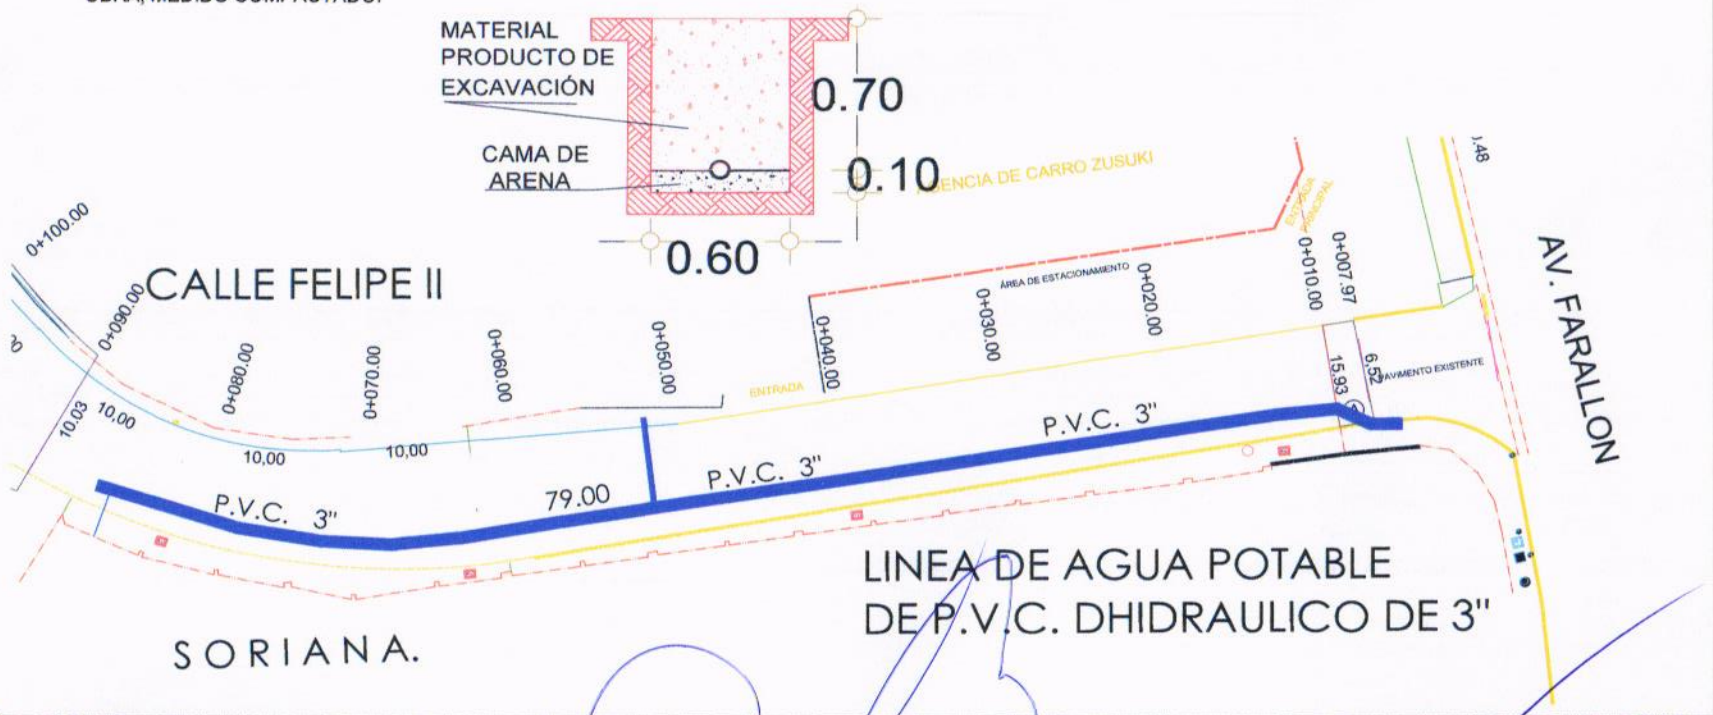

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	02 (DOS)
		FECHA	31 DE OCTUBRE DEL 2023



9-0139 - Relleno de material producto de excavación compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor, incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.

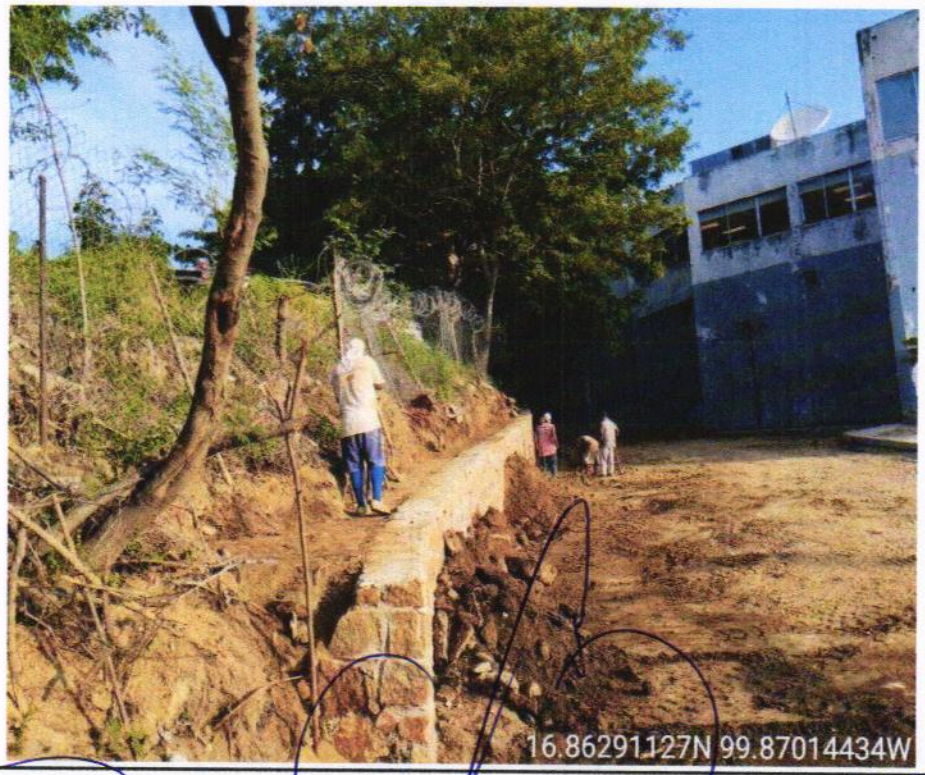

9-0139 - Relleno de material producto de excavación compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor, incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	02 (DOS)
		FECHA	31 DE OCTUBRE DEL 2023



9-0139.- Relleno de material producto de excavación compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor, incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.



9-0139.- Relleno de material producto de excavación compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor, incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.


IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	02 (DOS)
		FECHA	31 DE OCTUBRE DEL 2023



9-0139.- Relleno de material producto de excavación compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor, incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.

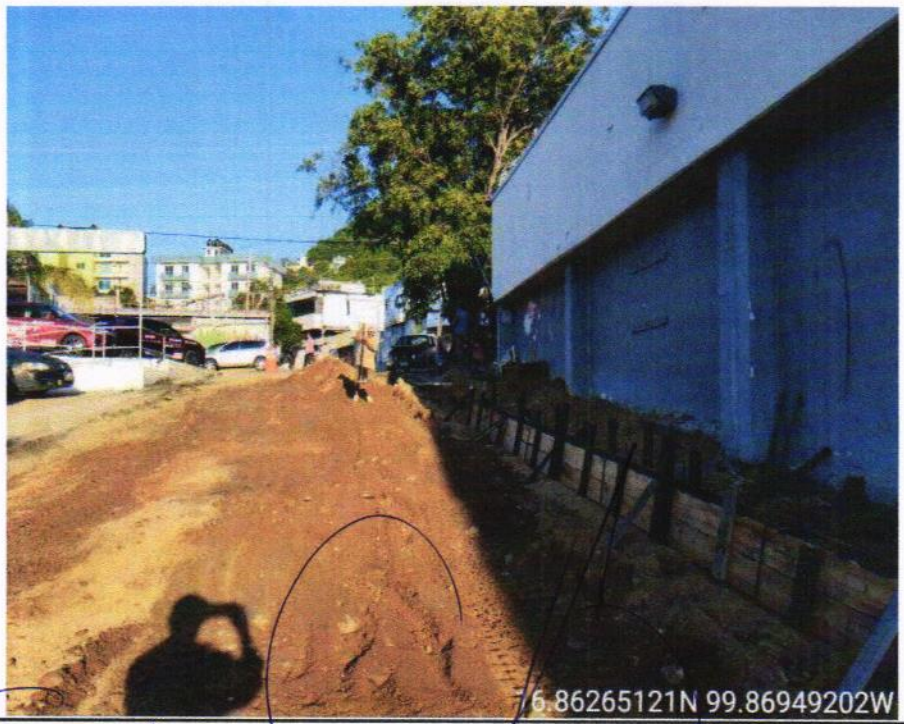

9-0139.- Relleno de material producto de excavación compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor, incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	N Ú M E R O S G E N E R A D O R E S		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A3	**INSTALACION HIDRAULICA**									
5-0102	Cama de arena para instalacion de tuberia incluye; acostillado, acarreo de material en 1ra, estacion, material, y mano de obra.									
	RED AGUA POTABLE									
		0+007.000	0+086.000		0.60	79.00	0.10	M3	4.74	tuberia principal
	TOTAL M3 DE CAMA DE ARENA EN CEPA PARA COLOC. DE TUBERIA DE 3" =							**M3**	**4.74**	
	(-) MENOS M3 COBRADOS EN ESTIMACION 01 (UNO) DE CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA =							**M3**	**-2.00**	
	TOTAL M3 ESTA ESTIMACIÓN =							**M3**	**2.74**	-

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA:	**MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
	FECHA:	31 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.			

C R O Q U I S

A3 **INSTALACION HIDRAULICA**

5-0102 CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA INCLUYE; ACOSTILLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1RA, ESTACION, MATERIAL, Y MANO DE OBRA.

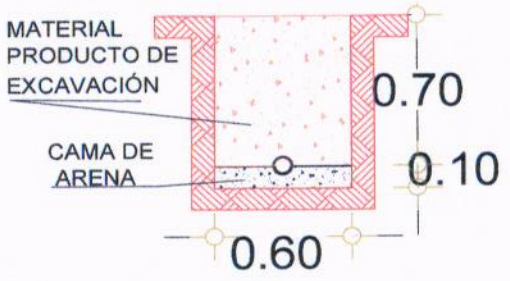

cama de arena




IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ


JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	02 (DOS)
		FECHA	31 DE OCTUBRE DEL 2023

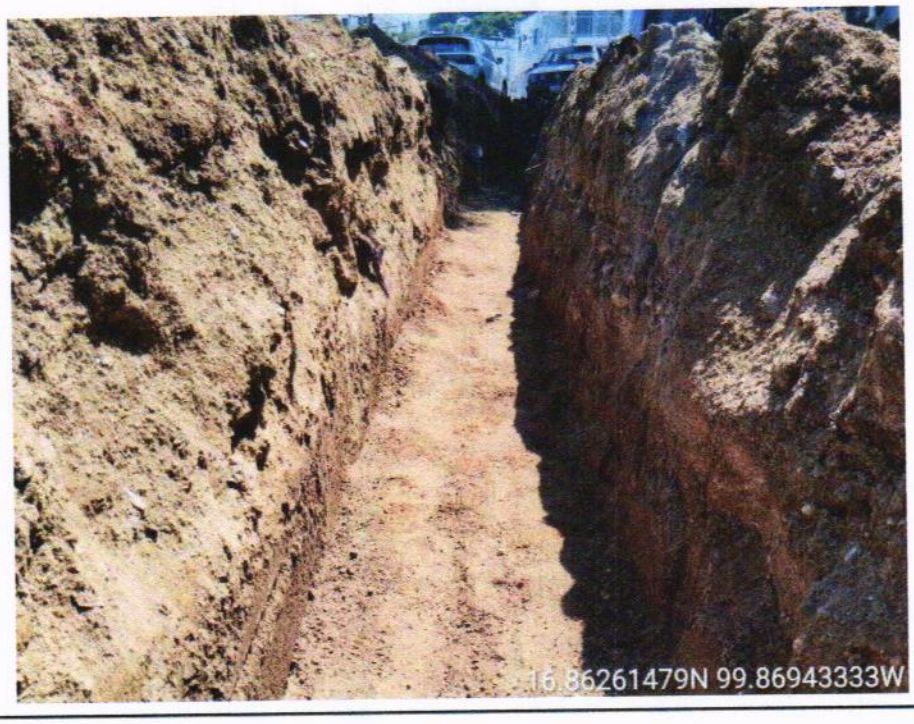

5-0102.- Cama de arena para instalación de tubería incluye: acostillado, acarreo de material en 1ra. estación, material y mano de obra.

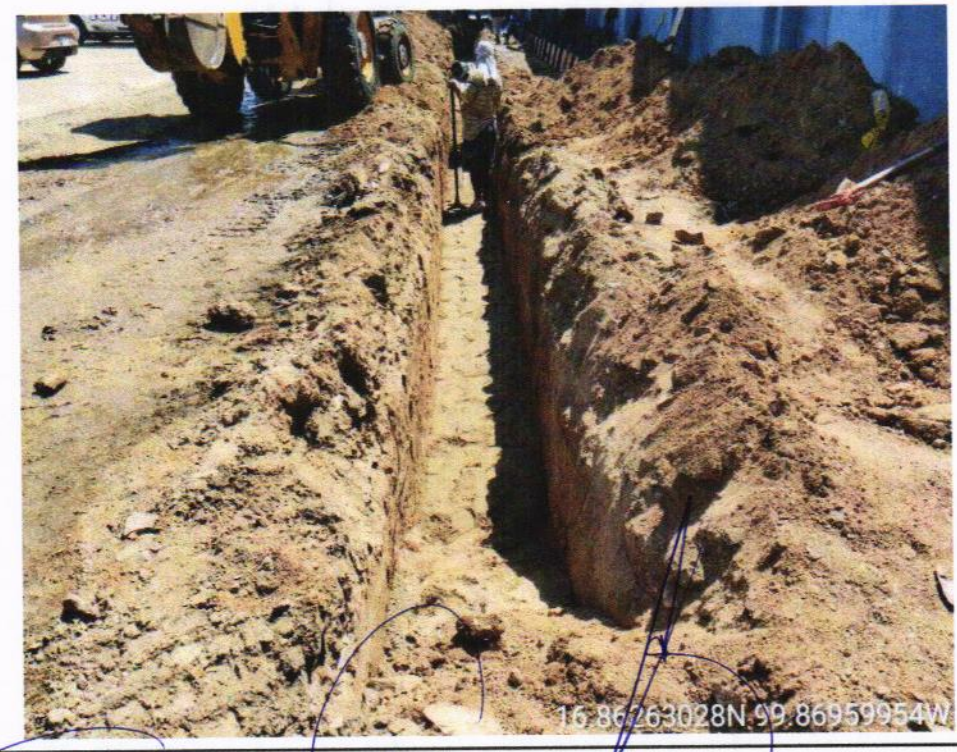


5-0102.- Cama de arena para instalación de tubería incluye: acostillado, acarreo de material en 1ra. estación, material y mano de obra.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	02 (DOS)
		FECHA	31 DE OCTUBRE DEL 2023

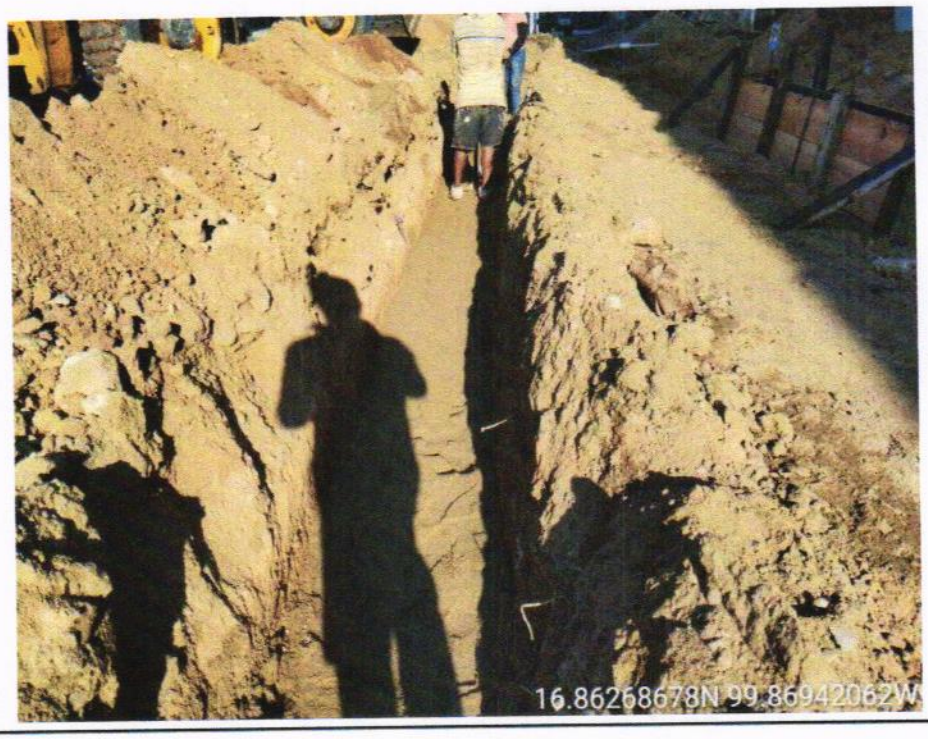

5-0102.- Cama de arena para instalación de tubería incluye: acostillado, acarreo de material en 1ra. estación, material y mano de obra.



5-0102.- Cama de arena para instalación de tubería incluye: acostillado, acarreo de material en 1ra. estación, material y mano de obra.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A3	**INSTALACIÓN HIDRAULICA**									
27-0412	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 3" CED. RD. 26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE; SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRASNECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.									
		0+007.000	0+086.000			79.00		ML	79.00	tuberia principal
	TOTAL ML DE TUBERIA DE 3" =							**ML**	**79.00**	
	(-) MENOS ML COBRADOS EN ESTIMACION 01 (UNO) DE TUBERIA DE P.V.C. 3" CED. RD. 26 =							**ML**	**-50.00**	
	TOTAL ML ESTA ESTIMACIÓN =							**ML**	**29.00**	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
		FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A3
27-0412

INSTALACION HIDRAULICA

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 3" CED. RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.



IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	02 (DOS)
		FECHA	31 DE OCTUBRE DEL 2023



27-0412 -SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 3" CED. RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

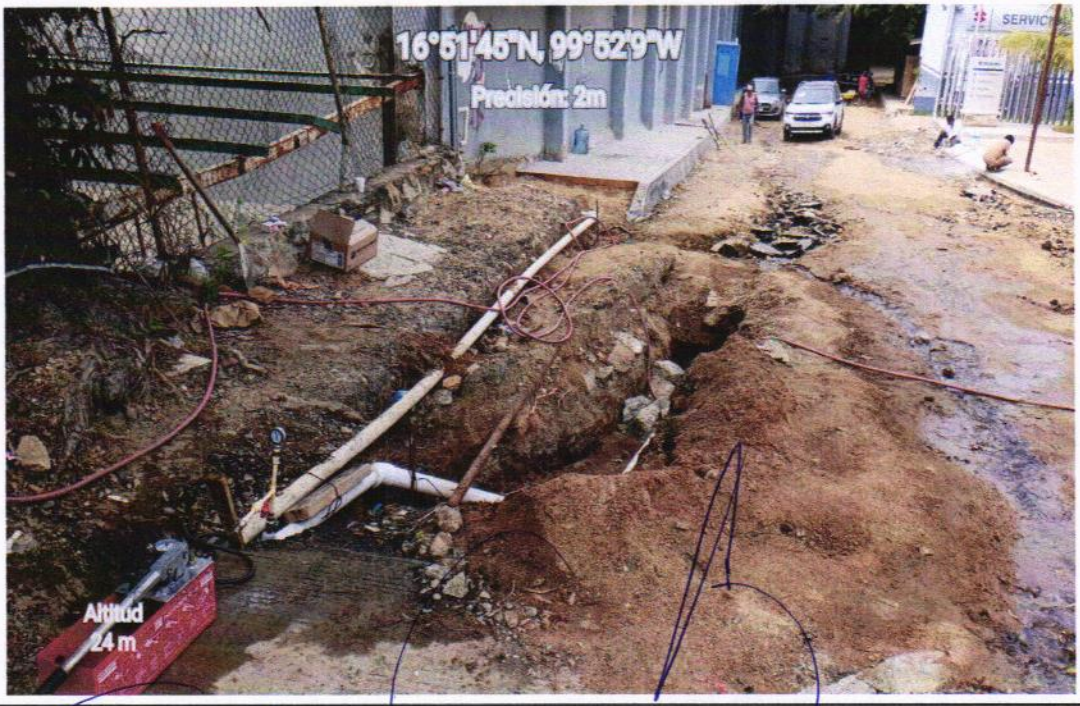


27-0412 -SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 3" CED. RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	02 (DOS)
		FECHA	31 DE OCTUBRE DEL 2023

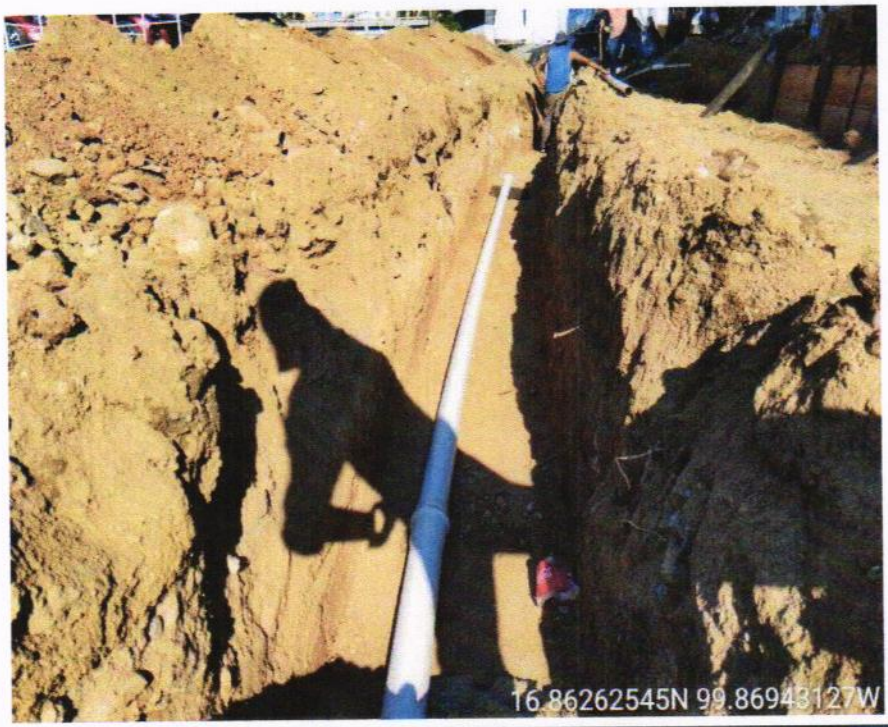

27-0412.- SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 3" CED. RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.




27-0412 -SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 3" CED. RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	02 (DOS)
		FECHA	31 DE OCTUBRE DEL 2023

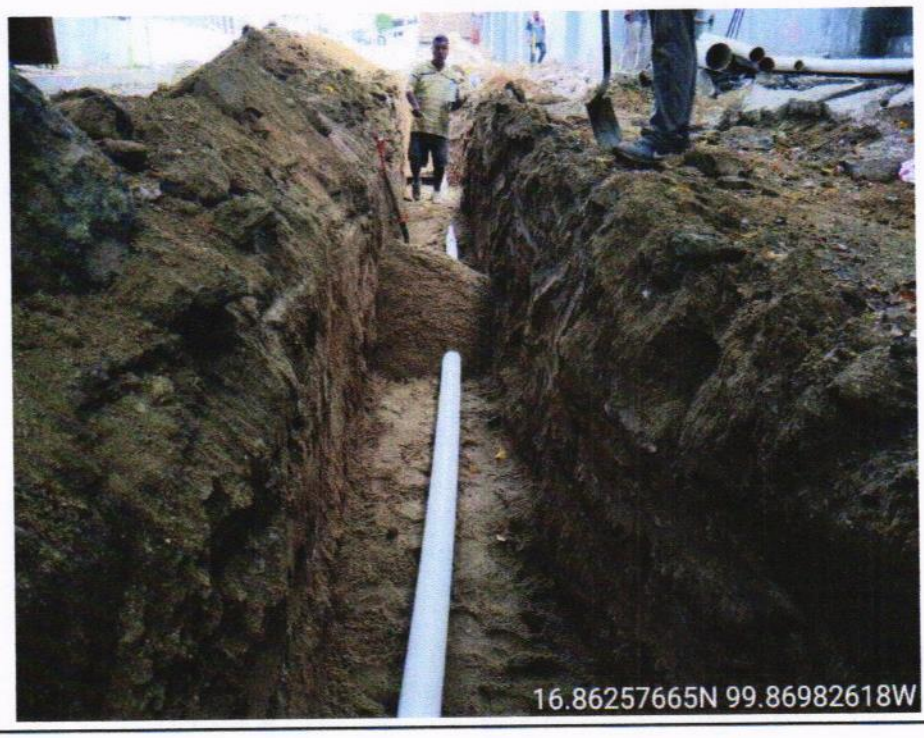

27-0412 -SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 3" CED. RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.



27-0412 -SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 3" CED. RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A5	**ALBAÑILERIA**									
18-0296	Muro de piedra brasa de la region asentada con mortero cemento arena 1:5 acabado comun incluye: acarreo de materiales a 1ra, estación de 20 mts.									
	ANCHO PROMEDIO (BM+CORONA/2)									
	MURO 1 2.50+0.40=2.90/2=**1.45**		**MURO 1**	BASE	2.50	10.87	2.00	M3	54.35	
	ALT. PROM.=3.50+3.19/2=**3.34**				1.45	10.87	3.34	M3	52.64	
	MURO 2 2.50+0.40=2.90/2=**1.45**		**MURO 2**	BASE	2.50	11.13	2.00	M3	55.65	
	ALT. PROM.=3.98+3.48/2=**3.73**				1.45	11.13	3.73	M3	60.19	
	MURO 3 2.50+0.40=2.90/2=**1.45**		**MURO 3**	BASE	2.50	10.00	2.00	M3	50.00	
	ALT. PROM.=3.48+2.98/2=**3.23**				1.45	10.00	3.23	M3	46.83	
	MURO 4 0.80+0.40=1.20/2=**0.60**		**MURO 4**	BASE	0.60	22.00	2.00	M3	26.40	
			MURO 5	BASE	2.50	8.80	1.66	M3	36.52	
	TOTAL M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA =							**M3**	**382.58**	
	(-) MENOS M3 COBRADOS EN ESTIMACION 01 (UNO) DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA =							**M3**	**-276.52**	
	TOTAL M3 ESTA ESTIMACIÓN =							**M3**	**106.06**	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
		FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A5 **ALBAÑILERIA**

18-0296 MURO DE PIEDRA BRASA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 ACABADO COMUN INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES A 1RA, ESTACIÓN DE 20 MTS.



IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/426	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
		FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/426-2023/LP	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		


C R O Q U I S


A5 **ALBAÑILERIA**

18-0296 MURO DE PIEDRA BRASA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 ACABADO COMUN INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES A 1RA, ESTACIÓN DE 20 MTS.

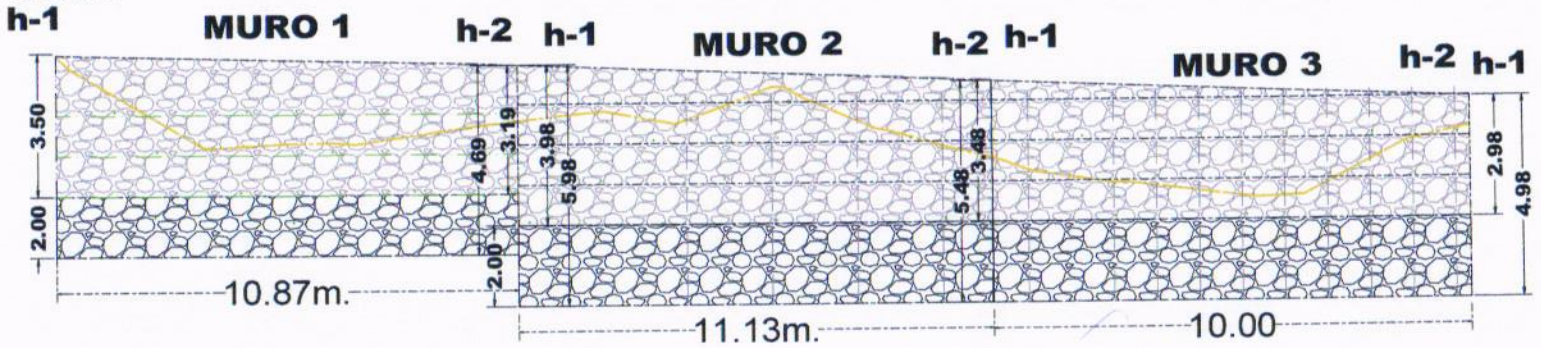

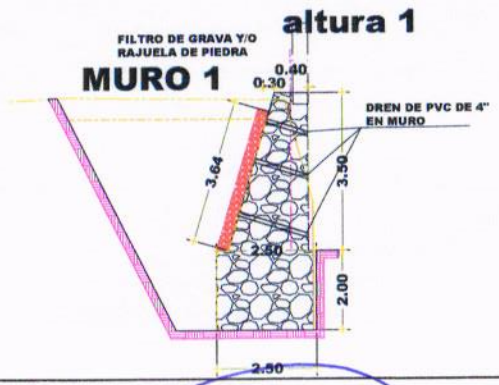

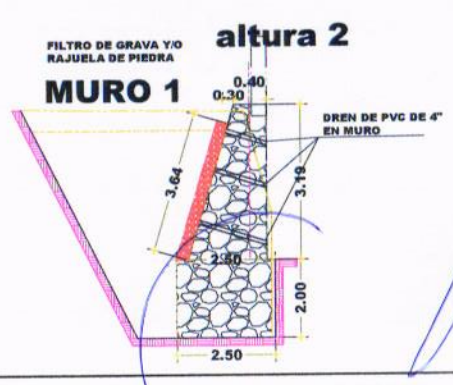

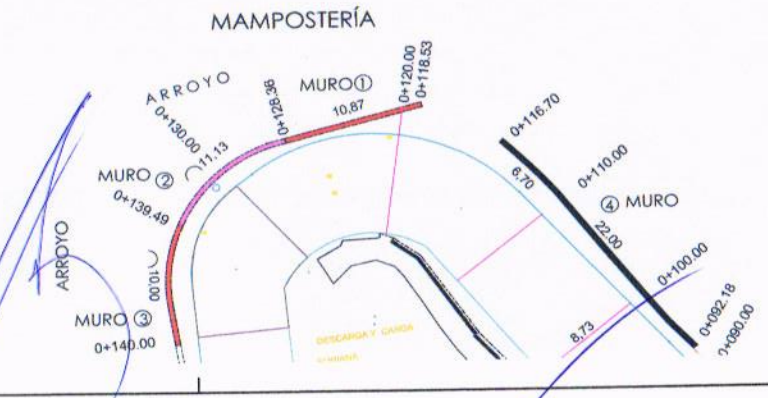

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/426	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
		FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/426-2023/LP	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		


C R O Q U I S


A5 **ALBAÑILERIA**

18-0296 MURO DE PIEDRA BRASA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 ACABADO COMUN INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES A 1RA, ESTACIÓN DE 20 MTS.

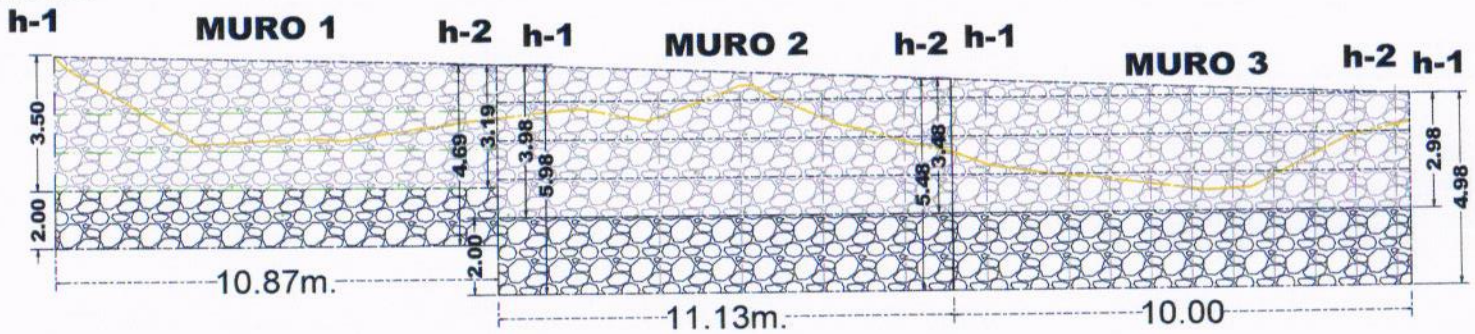

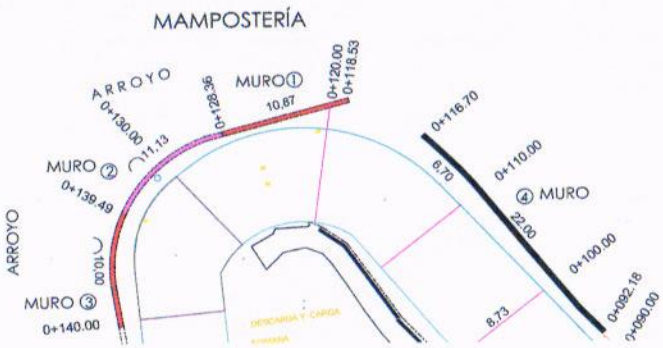

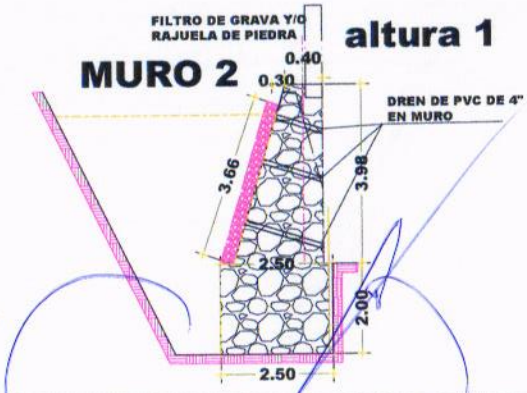

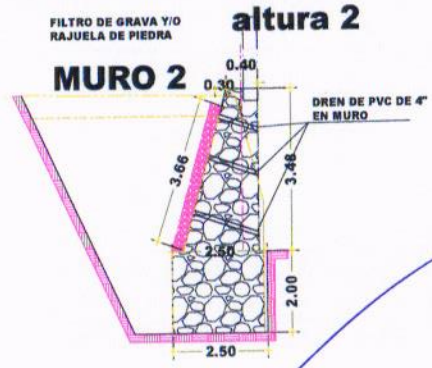

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
		FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		


C R O Q U I S


A5 **ALBAÑILERIA**

18-0296 MURO DE PIEDRA BRASA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 ACABADO COMUN INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES A 1RA, ESTACIÓN DE 20 MTS.

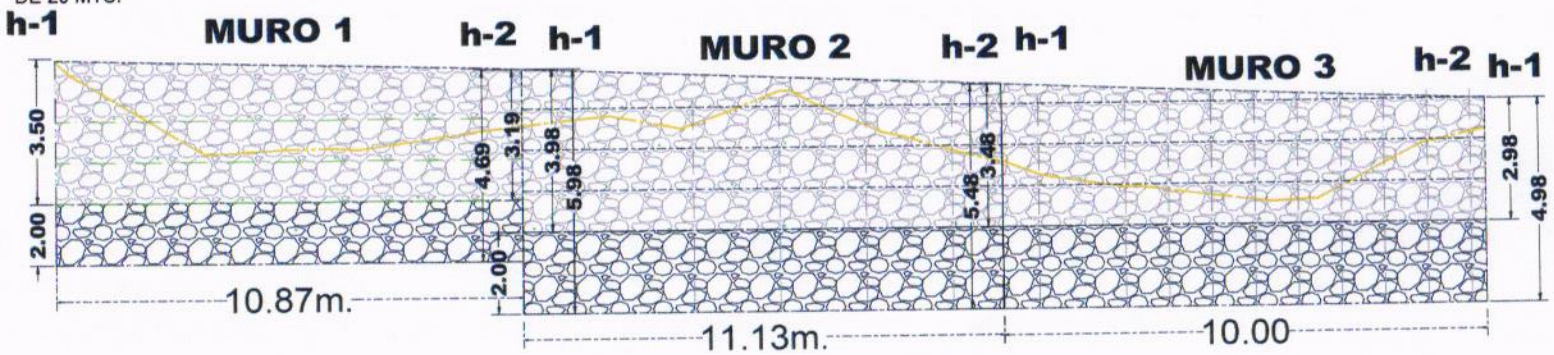

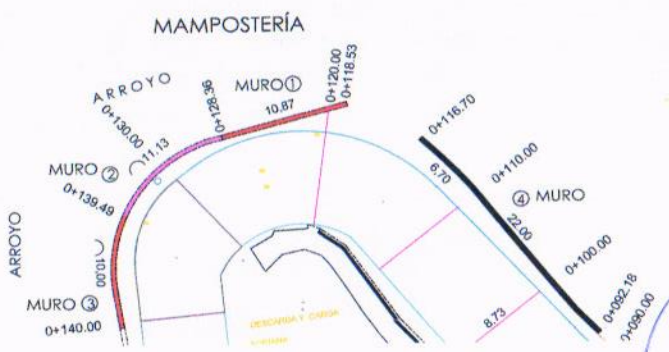

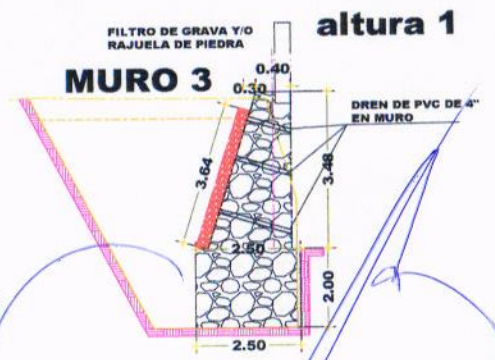

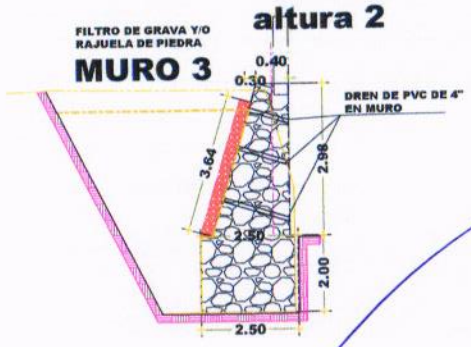

IMEXA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
		FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		


C R O Q U I S

A5 **ALBAÑILERIA**


18-0296 MURO DE PIEDRA BRASA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 ACABADO COMUN INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES A 1RA, ESTACIÓN DE 20 MTS.

MAMPOSTERÍA



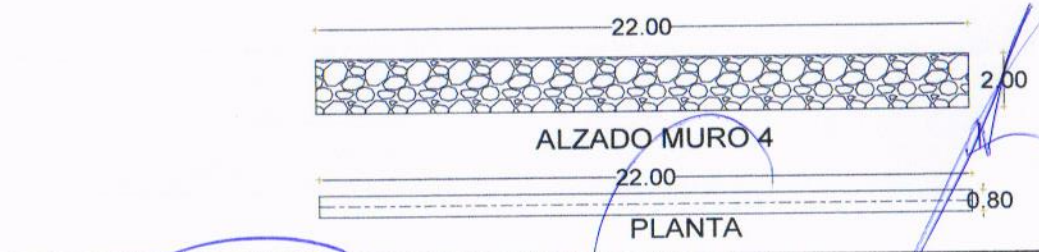

MURO 4

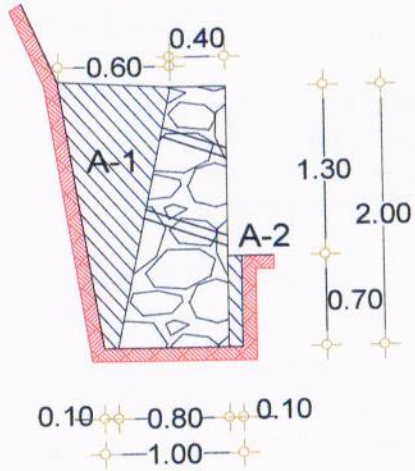

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
		FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A5 **ALBAÑILERIA**

18-0296 MURO DE PIEDRA BRASA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 ACABADO COMUN INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES A 1RA, ESTACIÓN DE 20 MTS.



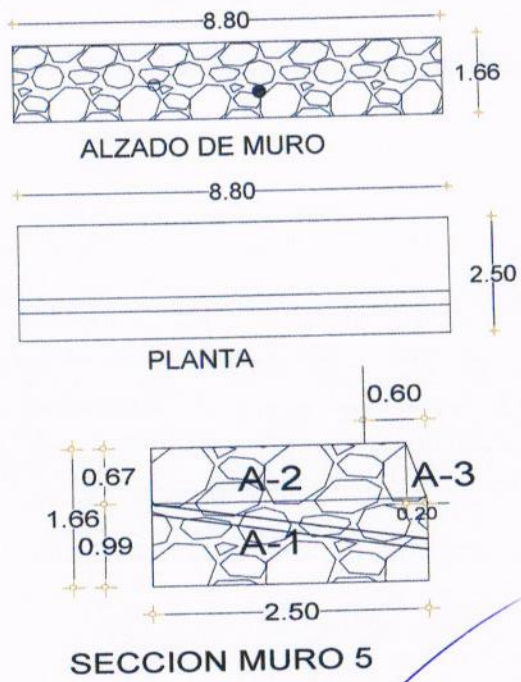

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
		FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		


C R O Q U I S

A5 **ALBAÑILERIA**

18-0296 MURO DE PIEDRA BRASA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 ACABADO COMUN INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES A 1RA, ESTACIÓN DE 20 MTS.

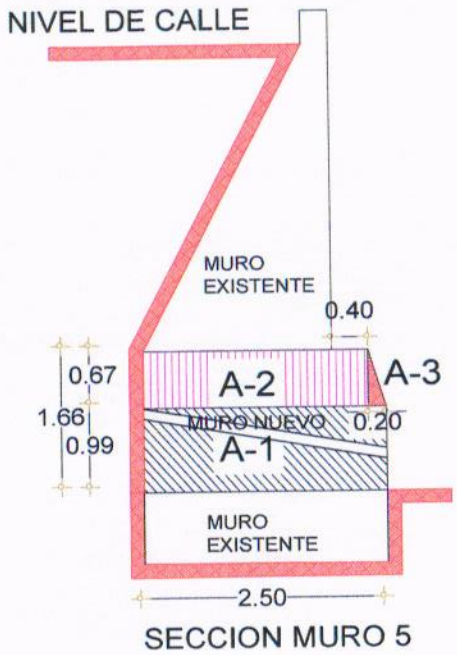

SECCION MURO 5

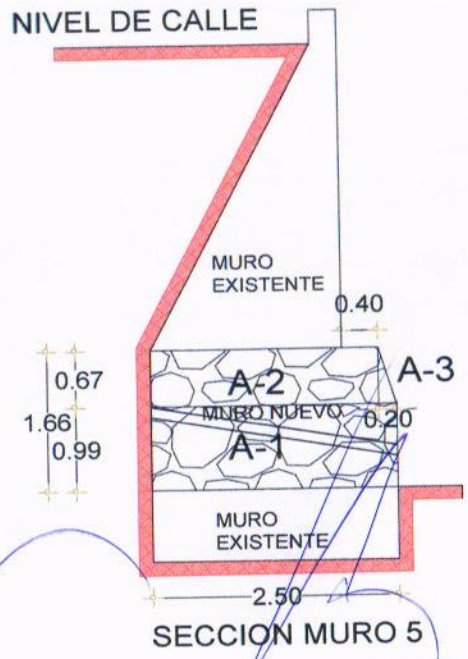

SECCION MURO 5



IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	02 (DOS)
		FECHA	31 DE OCTUBRE DEL 2023



18-0296.- Muro de piedra braza de la región, asentada con mortero cemento arena 1:5, acabado común incluye: acarreo de materiales en 1ra. erstación de 20 mts.

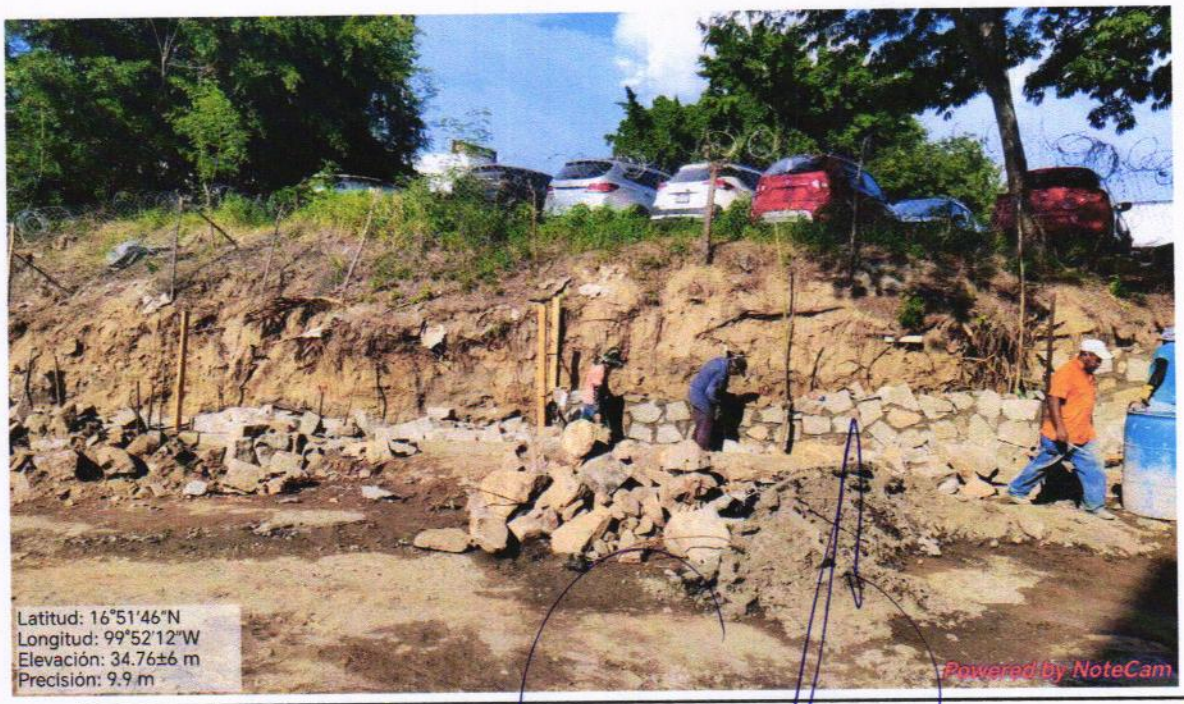

18-0296.- Muro de piedra braza de la región, asentada con mortero cemento arena 1:5, acabado común incluye: acarreo de materiales en 1ra. erstación de 20 mts.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	02 (DOS)
		FECHA	31 DE OCTUBRE DEL 2023



18-0296.- Muro de piedra braza de la región, asentada con mortero cemento arena 1:5, acabado común incluye: acarreo de materiales en 1ra. erstación de 20 mts.



18-0296.- Muro de piedra braza de la región, asentada con mortero cemento arena 1:5, acabado común incluye: acarreo de materiales en 1ra. erstación de 20 mts.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	02 (DOS)
		FECHA	31 DE OCTUBRE DEL 2023



18-0296.- Muro de piedra braza de la región, asentada con mortero cemento arena 1:5, acabado común incluye: acarreo de materiales en 1ra. erstación de 20 mts.




18-0296.- Muro de piedra braza de la región, asentada con mortero cemento arena 1:5, acabado común incluye: acarreo de materiales en 1ra. erstación de 20 mts.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	02 (DOS)
		FECHA	31 DE OCTUBRE DEL 2023

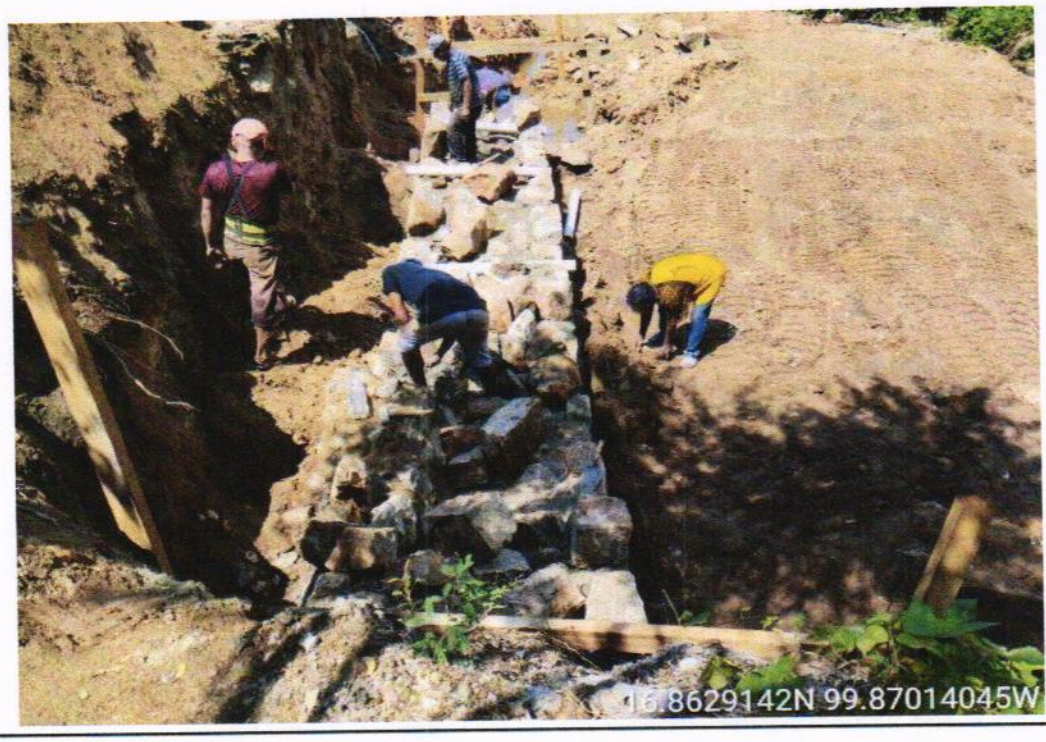

18-0296 .- Muro de piedra braza de la región, asentada con mortero cemento arena 1:5, acabado común incluye: acarreo de materiales en 1ra. erstación de 20 mts.




18-0296 .- Muro de piedra braza de la región, asentada con mortero cemento arena 1:5, acabado común incluye: acarreo de materiales en 1ra. erstación de 20 mts.


IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	02 (DOS)
		FECHA	31 DE OCTUBRE DEL 2023

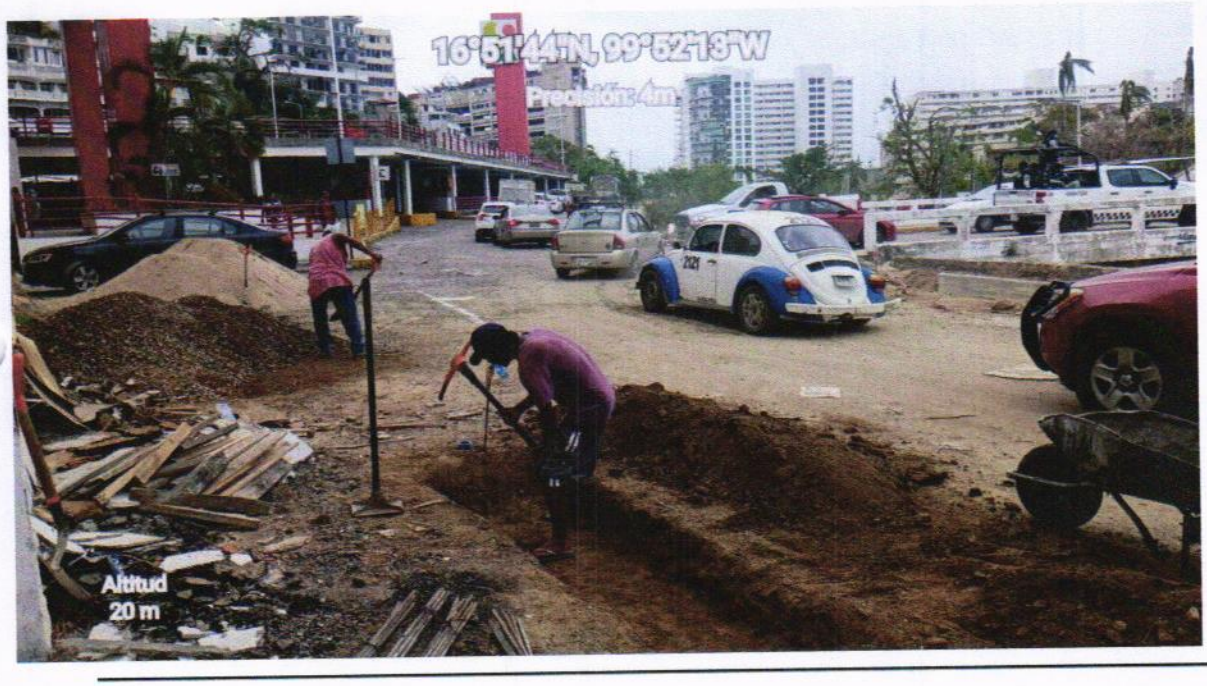

4-0080.- EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II-A, EN SECO Y BARRETA DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, DEPOSITANDO EL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A ORILLA DE CEPA, CUALQUIER ZONA.

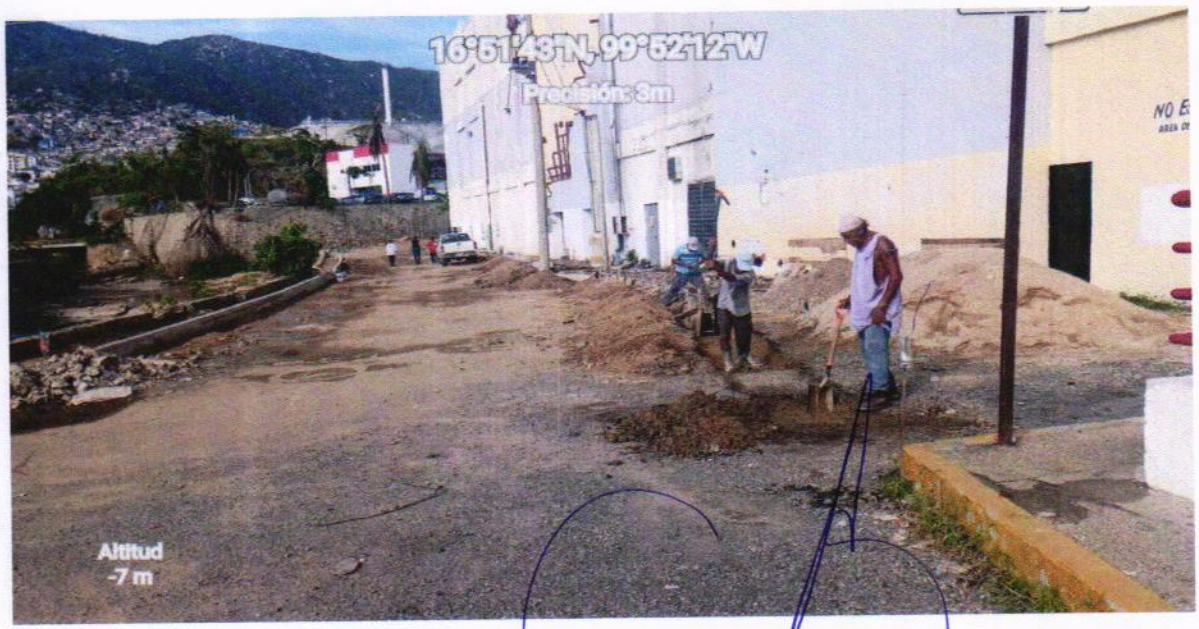


4-0080.- EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II-A, EN SECO Y BARRETA DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, DEPOSITANDO EL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A ORILLA DE CEPA, CUALQUIER ZONA.


IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	**RESIDENTE DE OBRA**	**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA**
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	02 (DOS)
		FECHA	31 DE OCTUBRE DEL 2023

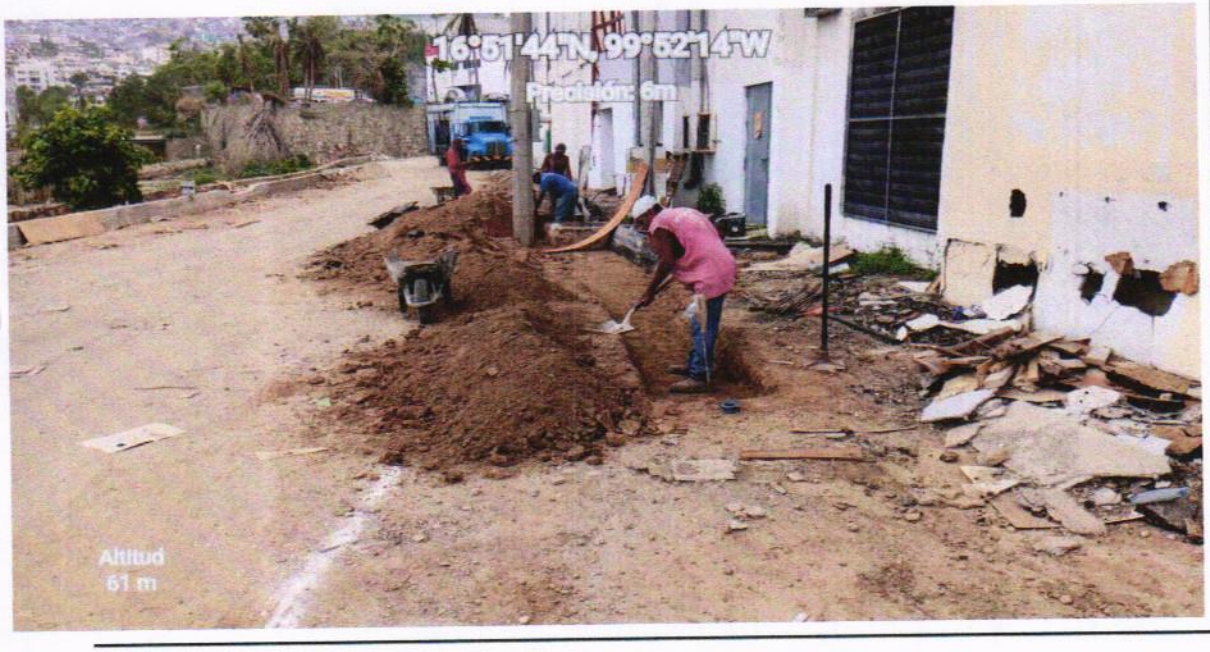

4-0080 .- EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II-A, EN SECO Y BARRETA DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, DEPOSITANDO EL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A ORILLA DE CEPA, CUALQUIER ZONA.

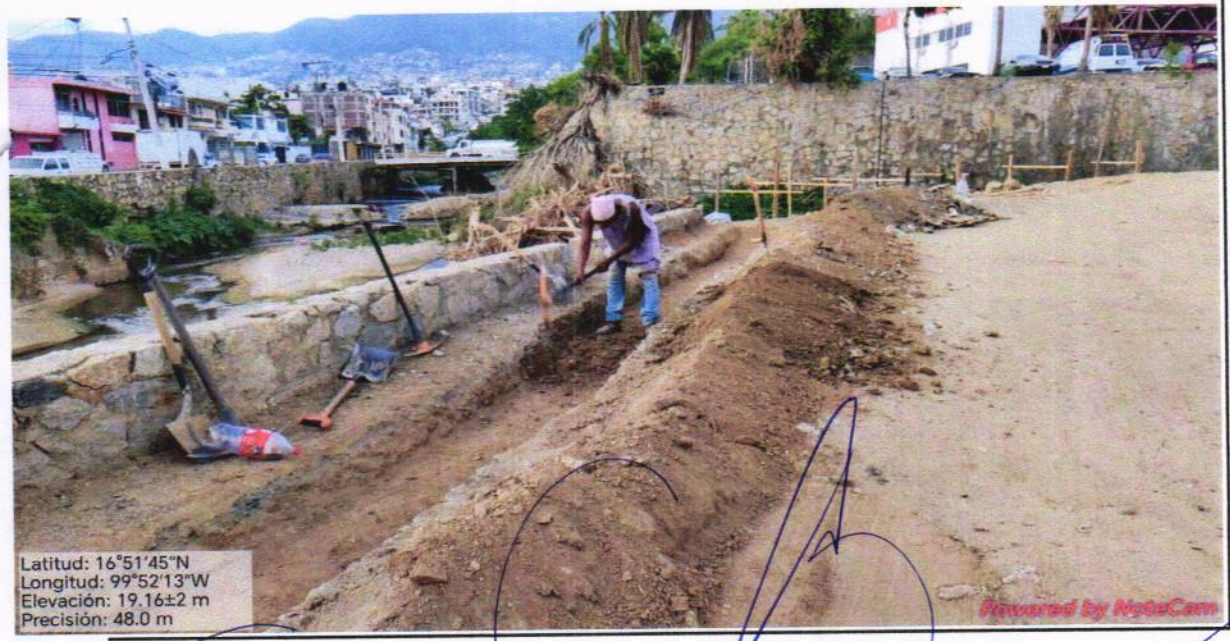


4-0080 .- EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II-A, EN SECO Y BARRETA DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, DEPOSITANDO EL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A ORILLA DE CEPA, CUALQUIER ZONA.


IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	02 (DOS)
		FECHA	31 DE OCTUBRE DEL 2023

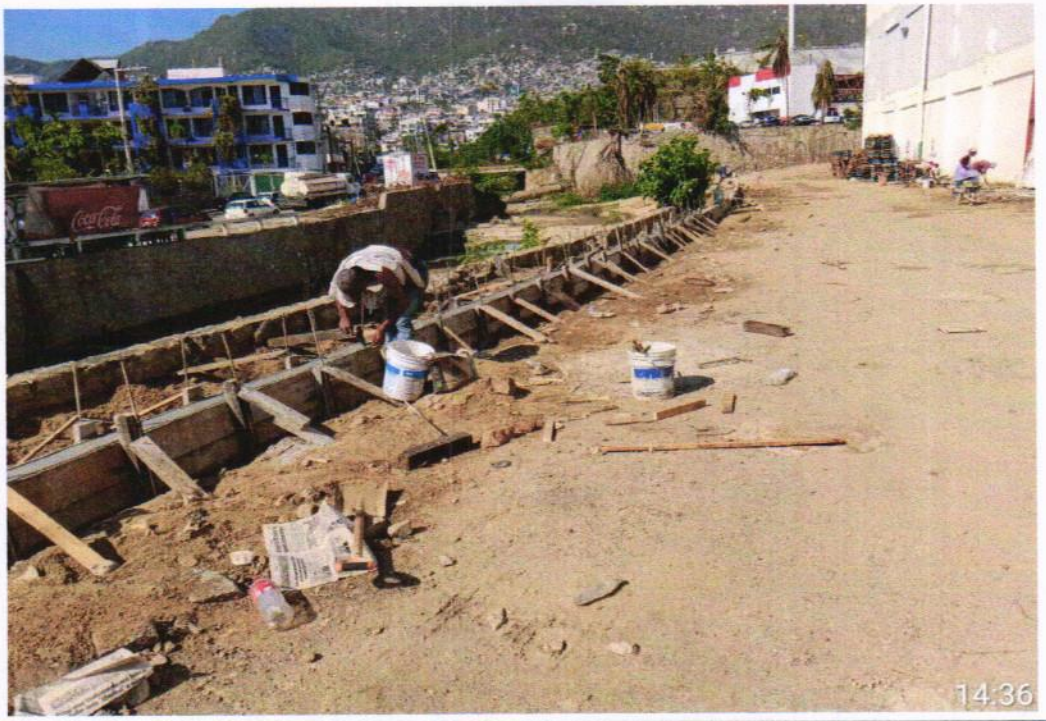

32-0471 .- Guarnición de concreto simple de f´c= 200 kg/cm2 de 20x15x40 cm. de sección T.M.A. 3/4" Incluye cimbrado, descimbrado, materiales y mano de obra.

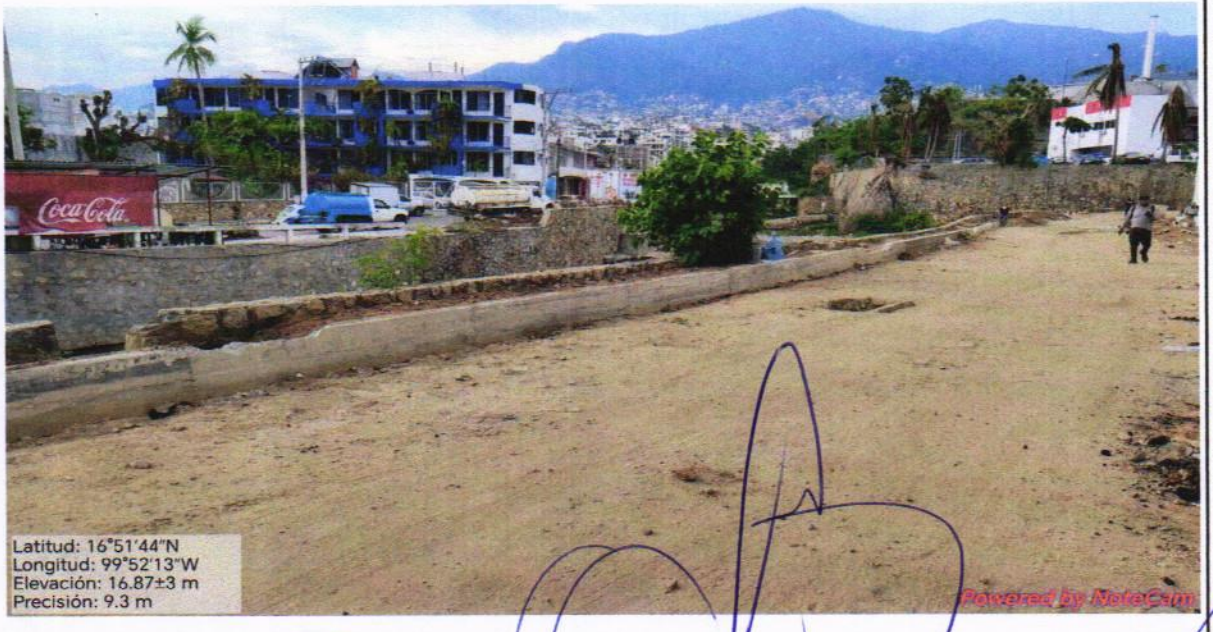


32-0471 .- Guarnición de concreto simple de f´c= 200 kg/cm2 de 20x15x40 cm. de sección T.M.A. 3/4" Incluye cimbrado, descimbrado, materiales y mano de obra.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	02 (DOS)
		FECHA	31 DE OCTUBRE DEL 2023

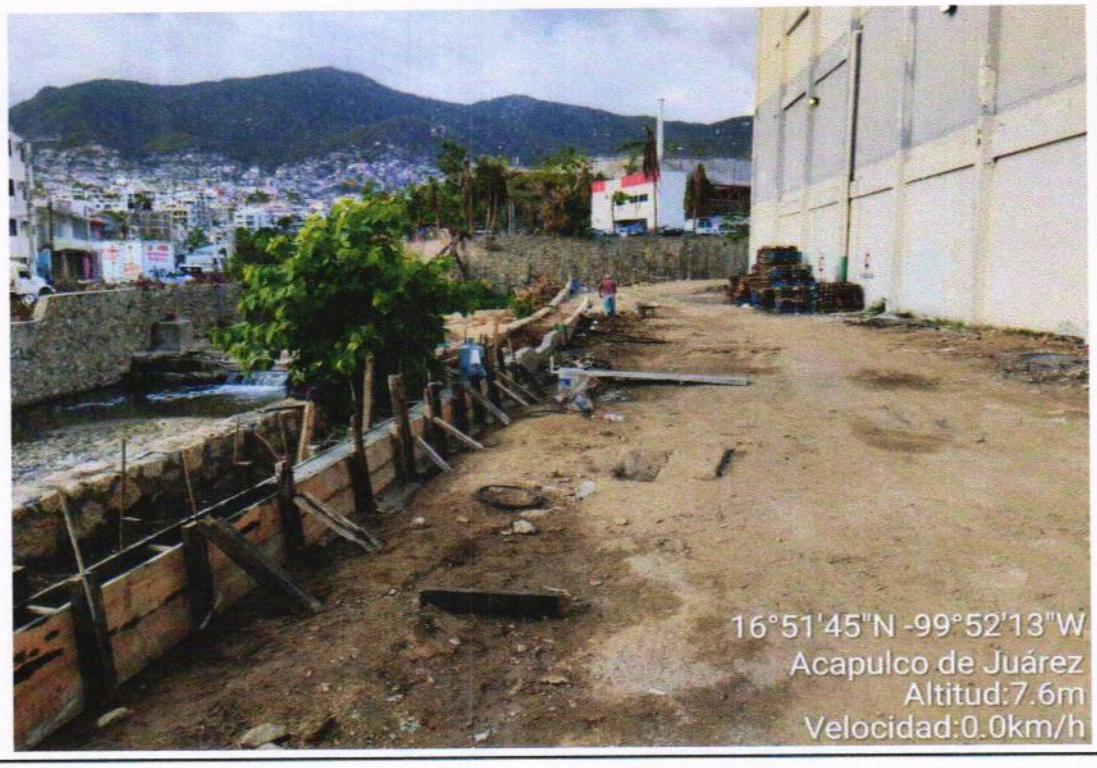

32-0471 .- Guarnición de concreto simple de f´c= 200 kg/cm2 de 20x15x40 cm. de sección T.M.A. 3/4" Incluye cimbrado, descimbrado, materiales y mano de obra.




32-0471 .- Guarnición de concreto simple de f´c= 200 kg/cm2 de 20x15x40 cm. de sección T.M.A. 3/4" Incluye cimbrado, descimbrado, materiales y mano de obra.


IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	02 (DOS)
		FECHA	31 DE OCTUBRE DEL 2023

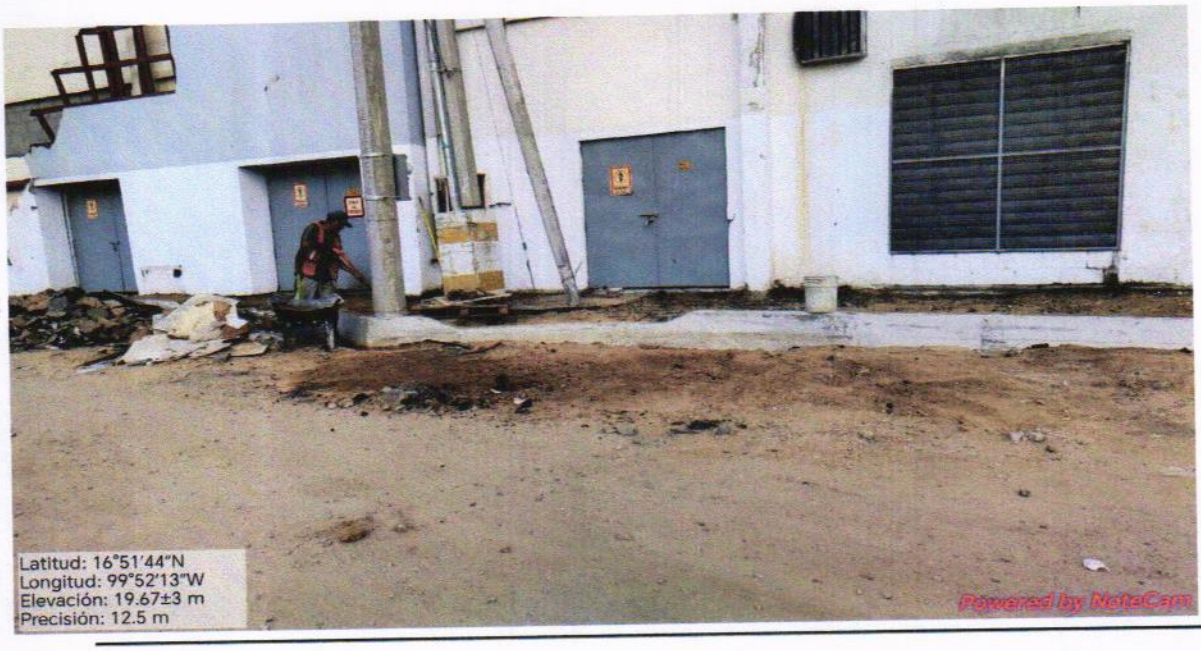

32-0471 .- Guarnición de concreto simple de f´c= 200 kg/cm2 de 20x15x40 cm. de sección T.M.A. 3/4" Incluye cimbrado, descimbrado, materiales y mano de obra.

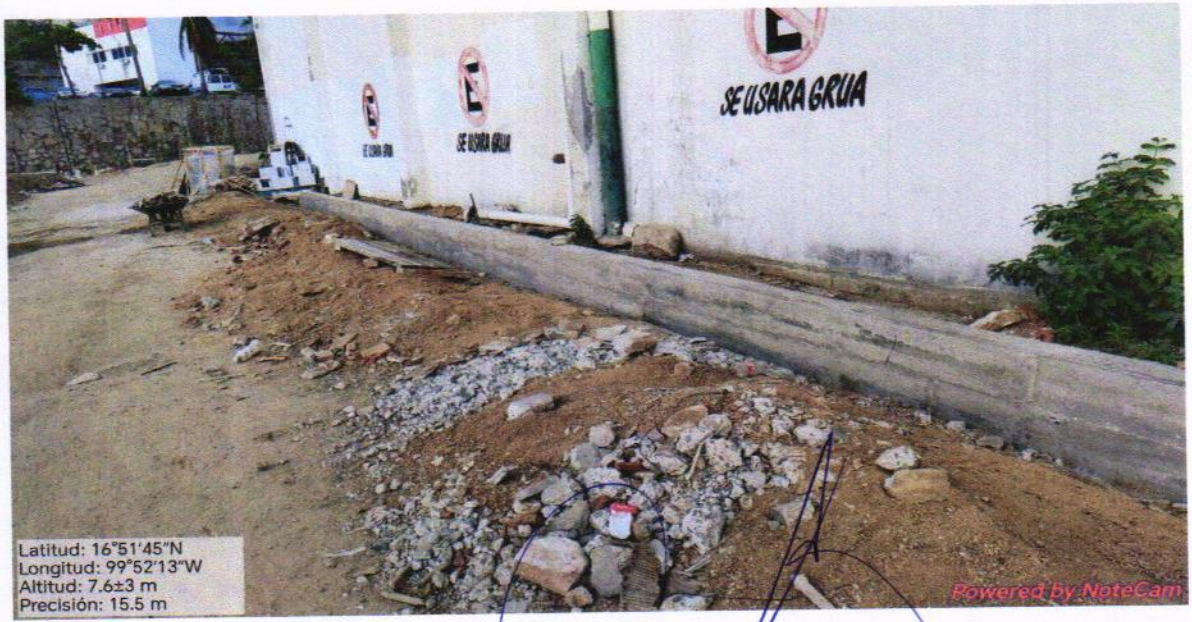

32-0471 .- Guarnición de concreto simple de f´c= 200 kg/cm2 de 20x15x40 cm. de sección T.M.A. 3/4" Incluye cimbrado, descimbrado, materiales y mano de obra.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A5	**ALBAÑILERIA**									
18-0313	Dren para muro de mamposteria a base de P.V.C. 4" tipo rigido incluye material y mano de obra.									
										MURO
		0+116.000	0+140.000	11.00		2.50		ML	27.50	1,2,3
		0+116.000	0+140.000	10.00		1.30		ML	13.00	1,2,3
		0+092.000	0+140.000	14.00		0.60		ML	8.40	4
	TOTAL ML DE DREN PARA MURO DE MAMPOSTERIA A BASE DE P.V.C. DE 4" =							**ML**	**48.90**	
	(-) MENOS ML COBRADOS EN ESTIMACION 01 (UNO) DE DREN PARA MURO DE MAMPOSTERIA A BASE DE P.V.C. DE 4" =							**M3**	**-26.00**	
	TOTAL ML ESTA ESTIMACIÓN =							**ML**	**22.90**	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA:	**MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
	FECHA:	31 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.			

C R O Q U I S

A5 **ALBAÑILERIA**

18-0313 DREN PARA MURO DE MAMPOSTERIA A BASE DE P.V.C. 4" TIPO RIGIDO INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.



IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	02 (DOS)
		FECHA	31 DE OCTUBRE DEL 2023



18-0313 -Dren para muro de mampostería a base de P.V.C. 4" tipo rígido incluye material y mano de obra.



18-0313 -Dren para muro de mampostería a base de P.V.C. 4" tipo rígido incluye material y mano de obra.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	02 (DOS)
		FECHA	31 DE OCTUBRE DEL 2023



18-0313 -Dren para muro de mampostería a base de P.V.C. 4" tipo rígido incluye material y mano de obra.



18-0313 -Dren para muro de mampostería a base de P.V.C. 4" tipo rígido incluye material y mano de obra.


IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	02 (DOS)
		FECHA	31 DE OCTUBRE DEL 2023



18-0313 -Dren para muro de mampostería a base de P.V.C. 4" tipo rígido incluye material y mano de obra.

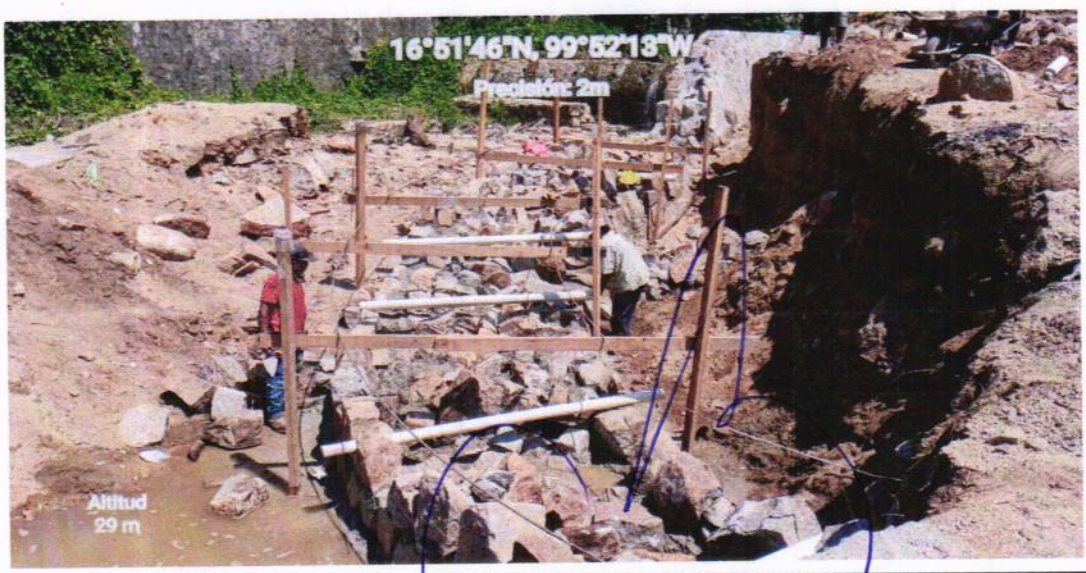

18-0313 -Dren para muro de mampostería a base de P.V.C. 4" tipo rígido incluye material y mano de obra.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A7	**PAVIMENTACION**									
4-0080	Excavacion a mano en material tipo II-A, en seco y barreta de 0.00 a 2.00 mts, de profundidad depositando el producto de excavacion a orilla de cepa, cualquier zona.									
			PARA GUARNICION							
			1		0.40	21.00	0.25	M3	2.10	Lado Der.
			2		0.40	20.00	0.25	M3	2.00	Lado Der.
			3		0.40	9.00	0.25	M3	0.90	Lado Der.
			4		0.40	8.00	0.25	M3	0.80	Lado Der.
			5		0.40	17.20	0.25	M3	1.72	Lado Der.
			6		0.40	0.35	0.25	M3	0.03	Lado Izq.
			7		0.40	27.05	0.25	M3	2.70	Lado Izq.
			8		0.40	7.35	0.25	M3	0.73	Lado Izq.
			9		0.40	2.65	0.25	M3	0.26	Lado Izq.
			10		0.40	2.55	0.25	M3	0.25	Lado Izq.
			11		0.40	8.30	0.25	M3	0.83	Lado Izq.
			12		0.40	16.55	0.25	M3	1.65	Lado Izq.
							TOTAL	**M3**	**13.97**	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
		FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A7 **PAVIMENTACIÓN**

4-0080 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO LL-A, EN SECO Y BARRETA DE 0.00 A 2.00 MTS, DE PROFUNDIDAD DEPOSITANDO EL PRODUCTO DE EXCAVACION A ORILLA DE CEPA, CUALQUIER ZONA.



IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A7	**PAVIMENTACIÓN**									
32-0471	Guarnición de concreto simple de f´c=200 kg/cm2 de 15x20x40cm, de seccion T.M.A. 3/4" incluye cimbrado, decimbrado, materiales y mano de obra.									
			guarnición							
			1			21.00		ML	21.00	Lado Der.
			2			20.00		ML	20.00	Lado Der.
			3			9.00		ML	9.00	Lado Der.
			4			8.00		ML	8.00	Lado Der.
			5			17.20		ML	17.20	Lado Der.
			6			0.35		ML	0.35	Lado Izq.
			7			27.05		ML	27.05	Lado Izq.
			8			7.35		ML	7.35	Lado Izq.
			9			2.65		ML	2.65	Lado Izq.
			10			2.55		ML	2.55	Lado Izq.
			11			8.30		ML	8.30	Lado Izq.
			12			16.55		ML	16.55	Lado Izq.
							TOTAL	**ML**	**140.00**	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
		FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A7 **PAVIMENTOS**

32-0471 GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE F´C= 200 KG/CM2 DE 20X15X40 CM. DE SECCIÓN T.M.A. 3/4" INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.



IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	N Ú M E R O S G E N E R A D O R E S		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A8	**ACARREOS Y LIMPIEZA**									
CARGA	CARGA MECÁNICA CON USO DE RETROEXCAVADORA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A TIRO LIBRE.		**CARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE APERTURA DE CAJA (HOJA 1)**							
			1		2.00	6.55	0.30	M3	3.93	
			2		10.00	6.55	0.30	M3	19.65	
			3		10.00	6.60	0.30	M3	19.80	
			4		10.00	6.70	0.30	M3	20.10	
	ANCHO PROMEDIO		5		10.00	6.93	0.30	M3	20.79	
	3.- 6.55+6.65=13.20/2= **6.60**		6		10.00	7.41	0.30	M3	22.23	
	4.- 6.65+6.75=13.40/2= **6.70**		7		10.00	7.56	0.30	M3	22.68	
	5.- 6.75+7.12=13.87/2= **6.93**		8		10.00	6.96	0.30	M3	20.88	
	6.- 7.12+7.70=14.82/2= **7.41**		9		10.00	7.32	0.30	M3	21.96	
	7.- 7.70+7.42=15.12/2= **7.56**		10		10.00	8.40	0.30	M3	25.20	
	8.- 7.42+6.50=13.92/2= **6.96**		11		10.00	8.32	0.30	M3	24.96	
	9.- 6.50+8.15=14.65/2= **7.32**		12		10.00	8.00	0.30	M3	24.00	
	10.- 8.15+8.65=16.80/2= **8.40**		13		10.00	8.00	0.40	M3	32.00	
	11.- 8.65+8.00=16.65/2= **8.32**		14		10.00	7.50	0.40	M3	30.00	
	14.- 8.00+7.00=15.00/2= **7.50**		15		10.00	7.00	0.40	M3	28.00	
	16.- 7.00+7.67=14.67/2= **7.33**		16		10.00	7.33	0.40	M3	29.32	
	17.- 7.67+7.78=15.45/2= **7.70**		17		10.00	7.70	0.40	M3	30.80	
	18.- 7.78+8.02=15.80/2= **7.90**		18		10.00	7.90	0.40	M3	31.60	
	SUB - TOTAL (HOJA 1) M3 DE ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE APERTURA =							**M3**	**427.90**	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	N Ú M E R O S G E N E R A D O R E S		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A8	**ACARREOS Y LIMPIEZA**									
CARGA	CARGA MECÁNICA CON USO DE RETROEXCAVADORA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A TIRO LIBRE.	**CARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE APERTURA DE CAJA (HOJA 2)**								
			19		10.00	8.12	0.40	M3	32.48	
	ANCHO PROMEDIO		20		10.00	8.62	0.40	M3	34.48	
	19.- 8.02+8.22=16.24/2= **8.12**		21		10.00	8.78	0.40	M3	35.12	
	20.- 8.22+9.02=17.24/2= **8.62**		22		7.88	8.55	0.40	M3	26.94	
	21.- 9.02+8.55=17.57/2= **8.78**	(-) DESCUENTO POZO DE VISITA		-2.00		0.50	0.40	M3	-0.40	
	22.- 8.55+8.95=17.3/2= **8.75**					**SUB- TOTAL HOJA 2 =**			**128.62**	
						SUB- TOTAL HOJA 1 =			**427.90**	
		SUB-TOTAL M3 DE CARGA Y ACARREO DE MAT. PROD. DE DEMOLICION Y EXCAVACION =						**M3**	**556.52**	
	AREA DE POZO DE VISITA									
	0.40+0.40 0.16					(+) ABUNDAMIENTO 30% =		M3	**166.96**	
	0.16X3.1416= **0.50 M2**	**TOTAL M3 DE CARGA Y ACARREO DE MAT. PROD. DE DEMOLICION Y/O EXCAVACION =**						**M3**	**723.48**	
		TOTAL M3 DE CARGA Y ACARREO DE MAT. PROD. DE APERTURA =						**M3**	**723.48**	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
		FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A8 **ACARREOS Y LIMPIEZA**

CARGA CARGA MECÁNICA CON USO DE RETROEXCAVADORA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A TIRO LIBRE.

ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE APERTURA DE CAJA

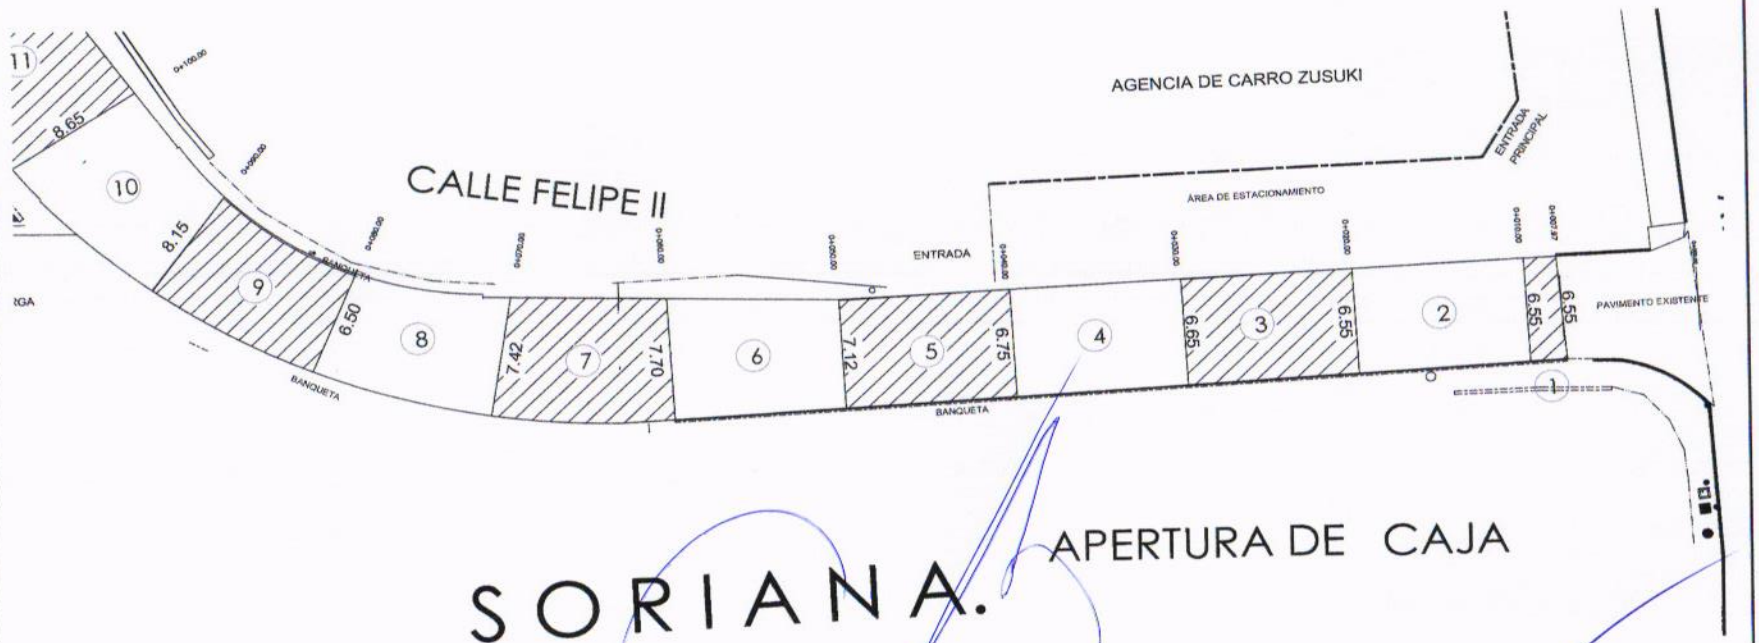

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)
		FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A8 **ACARREOS Y LIMPIEZA**

CARGA CARGA MECÁNICA CON USO DE RETROEXCAVADORA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A TIRO LIBRE.

ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE APERTURA DE CAJA



IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	02 (DOS)
		FECHA	31 DE OCTUBRE DEL 2023



CARGA .- Carga mecánica con uso de retroexcavadora y acarreo en camión de volteo (6M3) de material producto de excavación y/o demolición a tiro libre.



CARGA -Carga mecánica con uso de retroexcavadora y acarreo en camión de volteo (6M3) de material producto de excavación y/o demolición a tiro libre.


IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	02 (DOS)
		FECHA	31 DE OCTUBRE DEL 2023



CARGA .- Carga mecánica con uso de retroexcavadora y acarreo en camión de volteo (6M3) de material producto de excavación y/o demolición a tiro libre.

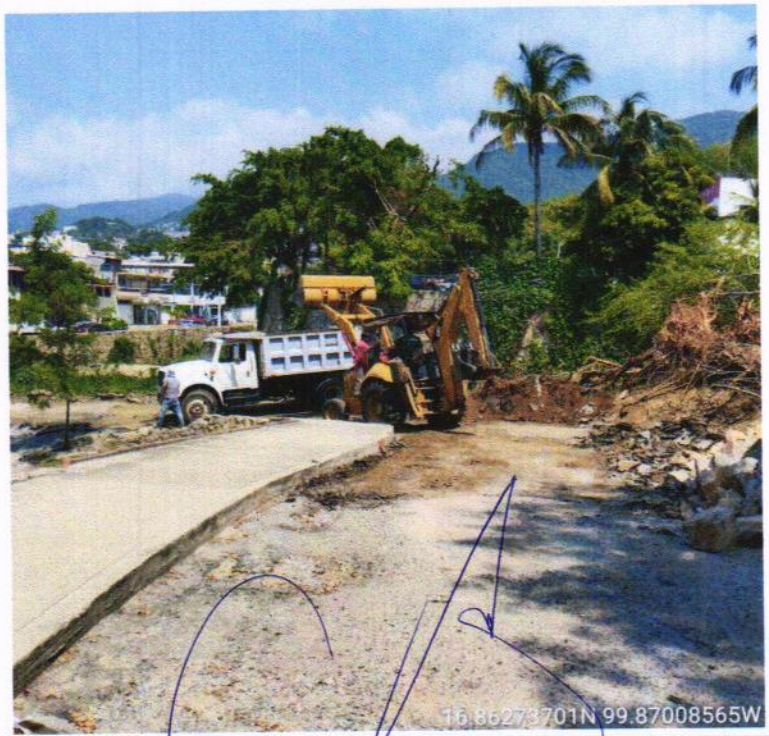

CARGA .- Carga mecánica con uso de retroexcavadora y acarreo en camión de volteo (6M3) de material producto de excavación y/o demolición a tiro libre.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

FOLIO Nº 306913

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FRACCIONAMIENTO
FECHA: AV. UNIVERSIDAD TRAC. MACRO (ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO)
2 DE OCTUBRE/13

HOJA NO 18

CON FECHA Y NOTA DE BITACORA LA CONTRATISTA LE SOLICITA A LA RESIDENCIA DE OBRA, LA AUTORIZACION DE LOS VOLUMENES DE OBRA QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN.

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CANTIDAD ORIGINAL	CANTIDAD ESTIMADA	IMPORTE	IMPORTE DE VOLUMENES
D-CARPETA	DEMOLICION A MAQUINA DE CARPETA ASFALTICA DE 5.00 A 10.00 CMS. DE ESPESOR INCLUYE MANO DE OBRA Y ACARREOS EN 1ª ESTACION	M2	$73.31	1,649.00	179.80	7080	5,190.35
D-BAN QU	DEMOLICION MECANICA DE BANQUETA DE 10.00 CMS DE ESPESOR, INCLUYE HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	63.40	146.04	226.11	80.07	5,076.44
D-GUA RM	DEMOLICION MECANICA DE GUARNICION DE 15X20X30CM INCLUYE EXTRACCION DE PEDACERIA MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	69.73	180.67	236.61	52.04	3,691.31
4-001	(EXTRACCION) EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II INCLUYE AFINE DE TALUD Y FONDO ACARREOS A PRIMERA ESTACION DE 20 MTS.	M3	74.30	699.43	846.51	147.00	10928.04

CONTINUA NOTA 18

RESIDENTE DE OBRA
MAQ. URIEL MADRIGAL JAIMERON JIMENEZ

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
ARQ. VICENTE ALARCON (JIMENEZ) SEVERINO

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 306914

REHABILITACION DE CALLE FELIPE II TRAMO PARALELA

OBRA: AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MACROLOTES, ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

FECHA: 2 DE OCTUBRE DE 2020

CONTINUA NOTA 18

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	P.U	CANTIDAD ESTIMADA	CANTIDAD POR ESTIMAR	IMPORTE ANTERIOR	IMPORTE DEL ESTIMADO
9-6139	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA MEDIDO COMPACTADO	M3	83.66	420.29	189.78	69.49	5,813.50
4-0080	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO I-A, EN SECO Y BAJO AGUA DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD DEPOSITANDO EL PRODUCTO DE EXCAVACION A ORILLAS DE CEPA CUALQUIER ZONA	M3	200.62	16.00	37.92	2.92	4,397.51
9-0134	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA MEDIDO COMPACTADO.	M3	83.66	(420.29) 15.30	32.84	17.04	1,425.57
5-0102	CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA INCLUYE, ACOSTILLADO, ACARREO DE MATERIAL EXCAVACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA	M3	475.96	2.0	4.74	2.74	1,303.03
27-0112	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE PVC 3" RD 26 PARA LINEA DE AGUA	ML	449.24	90.0	79.00	29.00	13,021.96

CONTINUA NOTA 18

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO
OLMEDO JIMENEZ

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
ARQ. VICENTE ALARCON
CERVANTES

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 306915

REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON

OBRA: AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MACROLLANEROS. ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.

FECHA: 2 DE OCTUBRE DE 2023

CONTINUA NOTA 18

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	P.U	CANTIDAD ORIGINAL	CANTIDAD POR ESTIMAR	CANTIDAD EXCEDENTE	IMPORTE DEL VOLUMEN A.
27-0412	POTABLE INCLUYE SUMINISTRO, PROBADO Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA FUNCIONAMIENTO.						
18-0296	MURO DE PIEDRA BRUTA DE LA REGION, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 ACABADO COMUN INCLUYE ACARREO DE MATERIALES EN 1ER ESTACION DE 20. MTS.	M3	2755.36	276.52	382.58	106.06	292,133.98
18-0513	DREN PARA MURO DE MAMPOSTERIA A BASE DE PVC 4" TIPO RIGIDO INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA	ML	130.32	26.00	18.90	12.90	2984.33
CARGA	CARGA MECANICA CON USO DE RETROEXCAVADORA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO (6 M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION A TIRO LIBRE	M3	279.33	779.69	1,506.54	526.90	(70,906.60) 120,833.98

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. ORLEC MAURICIO CALMEROM JIMENEZ

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
ARQ VICENTE ALARCON DEVERANO.

ESCR-02
REV.02

FOLIO Nº 306916

OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE FELIPE II, TRAMO BOULEVARD AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGISTRADOS ACAPULCO DE

FECHA: 4 DE OCTUBRE DE 2023 JUÁREZ, GUERRERO

NOTA NO 19

CON ESTA FECHA Y NOTA DE BITACORA LA RESIDENCIA DE OBRA LE AUTORIZA A LA CONTRATISTA QUE PRESENTE LOS VOLUMENES EXCEDENTES DE OBRA PARA SER AUTORIZADOS


ARQ. URIEL MAURICIO
CALMERON JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. VICENTE ALBERTO
DELGADILLO
SUPERINTENDENTE

NOTA NO 20

10 OCTUBRE DE 2023

CON ESTA FECHA Y NOTA DE BITACORA LA CONTRATISTA TOMA A LA RESIDENCIA DE OBRA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE EXCAVACION A MANO PARA ALOJAR LA CIMENTACION EN LA PARTE BAJA DEL CADENAMIENTO 0+140 AL 0+180 EN AMBOS LADOS, ASI COMO EL RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA MUROS

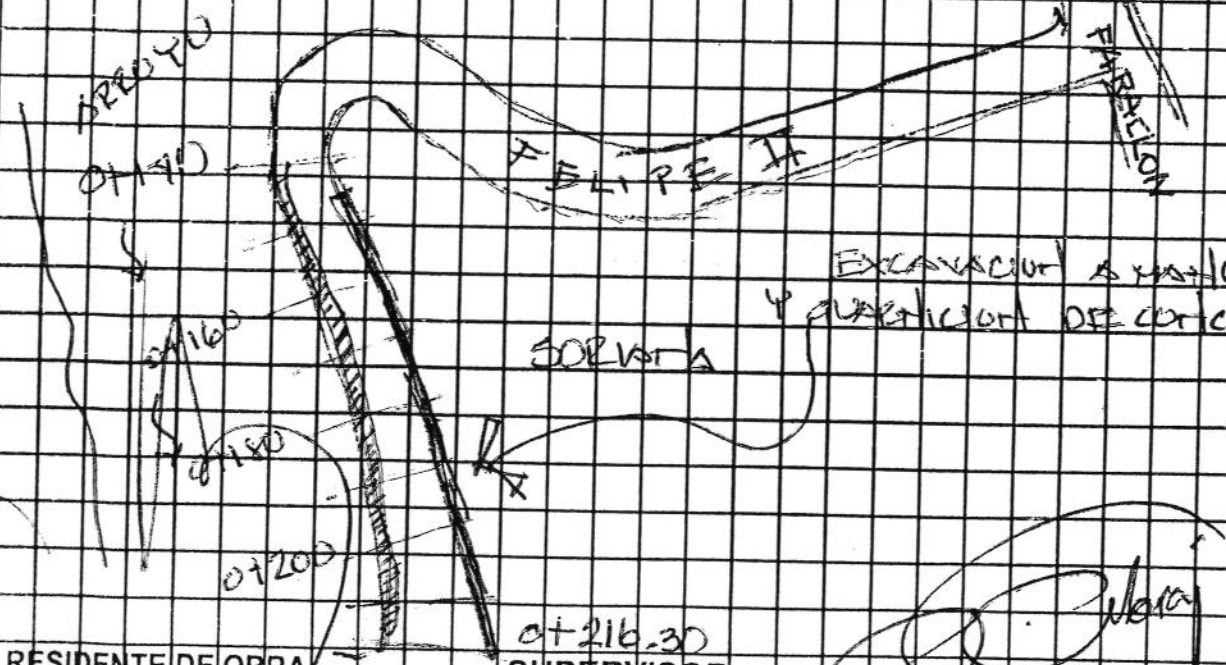

RESIDENTE DE OBRA
ARQ URIEL MAURICIO
CALMERON JIMENEZ

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
ARQ. VICENTE ALBERTO
DELGADILLO

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 306917

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO TAMALCAH AV. UNIVERSIDAD. TRACC. MAGALLANES ACAPULCO DE

FECHA: 19 DE OCTUBRE DE 2023 JUAREZ, GUERRERO

NOTA NO 21

CON ESTA FECHA Y NOTA DE BITACORA LA CONTRATISTA LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA QUE SE HA INICIADO CON LA APERTURA DE ZANJA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+216.48 Y DE RETIRA EL MATERIAL DE LA OBRA SIMULTANEAMENTE; DE LE INFORMA QUE SE INICIARA LOS CONCRETOS DE CIMENTACION. Y SE CONTINUA CON LA EXCAVACION DEL CADENAMIENTO 0+180 AL (2) 0+216.48; SE LE INFORMA TAMBIEN QUE SE HA VERTIDO MATERIAL DE BANCO PARA LA BASE EN LOS CADENAMIENTOS 0+020 AL 0+060

ARQ. URIEL MAURICIO OLMEDO JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. VICENTE ALARCON DEVERDIANO
SUPERINTENDENTE

NOTA NO 22

23 DE OCTUBRE DE 2023

CON ESTA FECHA Y NOTA DE BITACORA LA RESIDENCIA DE OBRA LE INFORMA A LA CONTRATISTA DE QUE DE FORMA COORDINADA CON LA SUPERVISORA DE LA TIENDA SOBRINA; SE CALENDARIZE EL TENDIDO DE MATERIAL DE BANCO PARA NO OBTRUIR EL ACCESO DE DESCARGA DE LOS TRAILERS DE PRODUCTOS.

ARQ. URIEL MAURICIO OLMEDO JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. VICENTE ALARCON DEVERDIANO
SUPERINTENDENTE

SUPERVISOR

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 306918

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO PERALVILLO AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES ACAPULCO DE

FECHA: 26 DE OCTUBRE DE 2023. JUAREZ, GUERRERO

NOTA NO 23

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA, LA CONTRATISTA SE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA; QUE EL DIA MARTES 24 DE OCTUBRE DE 2023, A MEDIANOCHE SE PRESENTO DE FORMA INESPERADA EL HURACAN "OTIS" QUE HA DEJADO LA CONSTRUCCION DE LA OBRA DE LA CALLE FELIPE II, INTRANSITABLE, YA QUE A PROVOCADO CON EL MOVIMIENTO DE BANCO VERTIDO EN LOS CONTAMIENTOS SUPERIORES DEL CROQUIS AL OTRO; ASI COMO EL DERRIBO DE ARBOLES HACIA EL INTERIOR DE LA CALLE Y LA DESTRUCCION PARCIAL DE NUESTRA BODEGA DE MATERIALES Y HERRAMIENTA, POR TAL ACONTECIMIENTO SE LE PIDE PODER HACER UN CORTE PARA PRESENTAR A LA BREVEDAD LA ESTIMACION 02 (DOS); YA QUE LOS SUMINISTROS DE MATERIALES NO SE RESTABLECERAN PRONTO Y EL PERSONAL LABORAL HA SUFRIDO DAÑOS EN SUS VIVIENDAS Y NOS DIDICAREMOS A HACER LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA; EN ESPERA DE SU MEJOR RECOMENDACION.

ARQ. URIEL MAURICIO CAMACHO JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. VICENTE ALARCON OCAMPO
SUPERINTENDENTE.

NOTA NO 24

30 DE OCTUBRE DE 2023

CON ESTA FECHA Y NOTA ESTA RESIDENCIA DE OBRA OBSERVA LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL HURACAN SON CONSIDERABLES Y SE LE PIDE QUE REALICE UNA LIMPIEZA CON CORTE DE ARBOLES CAIDOS Y LOS APILE PARA SU RETIRO Y COBRO POSTERIOR Y PRESENTE LA ESTIMACION 02 (DOS) PARA SER CONTENIDO A LA BREVEDAD.

RESIDENTE DE OBRA
ARQ URIEL MAURICIO CAMACHO JIMENEZ

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
ARQ. VICENTE ALARCON OCAMPO

FOLIO Nº 306919

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO PERIFERICO AV. UNIVERSIDAD FRACC. MACADAMES. ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023

NOTA NO 25

CON ESTA FECHA Y NOTA DE BITACORA LA RESIDENCIA DE OBRA Y LA CONTRATISTA VERIFICAN LOS TRABAJOS POR MEDIO DE UN LEVANTAMIENTO CON CINTA PLASMADOS EN LA ESTIMACION 02 (DOS) CON PERIODO DEL 2 DE OCTUBRE DE 2023 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 DE LA OBRA "REHABILITACION DE CALLE FELIPE II TRAMO PERIFERICO AV. UNIVERSIDAD FRACC. MACADAMES, UNA VEZ CONCILIADA SE LE AUTORIZA REALICE EL TRAMITE Y COBRO DE DICHA ESTIMACION.

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. VICENTE AURELIA GUERRERO
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA | SUPERVISOR | SUPERINTENDENTE

ESOR-02
REV.02

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021 2024

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

EJERCICIO 2023

ESTIMACION 01 (UNO)

SUBMODALIDAD: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III) RAMO XXXIII.**

CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**

OBRA/PROYECTO/ACCIÓN: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.**

UBICACIÓN: **ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO**

CONTRATISTA: **IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.**

NUMERO DE ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA: **(ZAP): 2721**

CLAVE DE LA LOCALIDAD: **12001 0001**

NUMERO DE (AGEB) : **12001 0001 2721**

ORIGINAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

COMPARATIVO PRESUPUESTAL

MODALIDAD: **CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2023**
OF. AUTORIZACION:

SUBMODALIDAD: **FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**
OF. APROBACION:

PROGRAMA: **RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS**
PROYECTO SOCIAL:

SUBPROGRAMA:
DEPENDENCIA EJECUTORA: **12M01 H. A. ACAPULCO**

ESTADO: **12 GUERRERO**
No. DE OBRA:

MUNICIPIO: **001 ACAPULCO DE JUAREZ**

AVANCE FISICO: _____ AVANCE FINANCIERO: _____

LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	INVERSION			SALDO
		APROBADA	COMPROBADA	ACUMULADA	
FRACC. MAGALLANES	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD	5,000,427.46	1,211,471.81	2,711,600.05	2,288,827.41

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

REMISION DE DOCUMENTOS

MODALIDAD: **CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2023**
SUBMODALIDAD: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023** **(FONDO III) RAMO XXXIII**
OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES. ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
CONTRATO No.: **MAJ-FAISMUN/426-2023/AD**
DOCUMENTOS REMITIDOS A LA: **AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO**
DEPENDENCIA EJECUTORA: **12M01 H. A. ACAPULCO**

No. PROG.	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
			TOTAL	RETENCIONES	NETO
1	7-dic.-23	IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. FACT. No. BECA	1,741,396.90	529,925.09	1,211,471.81
		SUBTOTAL $	**1,741,396.90**	**529,925.09**	**1,211,471.81**
		TOTAL $	**1,741,396.90**	**529,925.09**	**1,211,471.81**

viernes 8 de diciembre de 2023

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

TRANSFERENCIA: 736

Paguese vía transferencia a: 15 DE DICIEMBRE DE 2023

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. La cantidad de:

(** UN MILLON DOSCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 81/100 M.N. **) 1,211,471.81

PÓLIZA TRANSFERENCIA

Beneficiario IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Banco a transferir | CLABE | Banco pagador: FIII FAISM 2023 STDER 9395 15/12/2023 736 | Cuenta: 65509609395 1,211,471.81

Concepto | Cuenta

Pago de solicitudes : 1501-1041, PAGO FACTURA NO. 3D120F85BE CA EST-1 (UNO) REHABILITACION DE CALLE FELIPE II TRAMO FARAL LON - AV. UNIVERSIDAD FRACC. MAGALLANES, CON CARGO AL RAMO 3

Facturas: 4884CF38-67DE-49A5-9842-3D120F85BECA,

Cuenta	NUP	Descripción	Debe	Haber
21130-00000-10004-00045		Generado por cuenta por pagar IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE	1,211,471.81	
11120-00000-02005-00005				1,211,471.81
Solicitud de pago 504 - 8547	Póliza 11 12 71		1,211,471.81	1,211,471.81

OPERADO
FISM 2023

Elaboró JCM

Revisó EMO

Autorizó CAMR

Santander

736

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Contrato: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ 080122053040
Usuario: 53420142 - MONTSERRAT MONTES MANRRIQUEZ
Referencia: 38235
Referencia numérica del Emisor:
Referencias del Movimiento: 6191827
Estado: EJECUTADO
Divisa: MXN
Cuenta CLABE: 014260655096093956
Cuenta Cargo: 65509609395 - R33 FIII FAISM 2023
Cuenta Abono: 072261002480081016 - IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV
Importe: $ 1,211,471.81 MXN
Concepto: R33FIII FBECA EST1 REHAB CFELIPE II
Fecha y hora de Alta: 15/12/2023 17:31:45
Fecha y hora de Liquidación: 15/12/2023 17:32:46
Clave de Rastreo: 20231215400140BET0000461918270
RFC Beneficiario:
RFC Ordenante: MAJ010101NA3
Importe IVA:
Email del Beneficiario:
Banco Destino: BANORTE

OPERADO
FAISMUN - 2023

Operación realizada por internet

Para dudas o aclaraciones por favor llame a:
SuperLínea
55 5169 4301 SuperLínea Empresarial ó **55 5169 4303** SuperLínea PyME

IMEXA CONSTRUCTORES S A DE C V

R.F.C. ICO091216UUA

Corregidora No. 4 Col. Morelos, C.P. 39530

CLIENTE:

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
R.F.C. MAJ010101NA3
AV. CUAUHTÉMOC S/N INTERIOR PARQUE PAPAGAYO COL. HORNOS INSURGENTES. CP. 39350

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES

UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
PERIODO DEL CONTRATO: DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
No. DE OBRA: MAJ/426
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023

CONTRATO No.	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE CON I.V.A.	ANTICIPO CON I.V.A.
MAJ-FAISMUN/426-2023/LP	15 DE AGOSTO DEL 2023	$5,000,427.46	$1,500,128.24

TIPO DE OBRA: DOMINIO PUBLICO

METAS PROGRAMADAS: 1,471.35 M2

METAS ALCANZADAS: 35.00%

OPERADO
FAISMUN - 2023

RECIBI DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, A TRAVES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III) QUE TIENE COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO EL RAMO XXXIII, APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, LA CANTIDAD DE: $ 1,211,471.81 (UN MILLON DOSCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 81/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION 01(UNO), DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN EL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO DE 2023 AL 01 DE OCTUBRE DE 2023 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES. UBICADA EN ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO No. MAJ-FAISMUN/426-2023/LP.

DEDUCCIONES:

AMORTIZACION DEL ANTICIPO	$522,419.07
5 AL MILLAR DE SUPERV.	$7,506.02
5 AL MILLAR DE LA CMIC	$0.00
TOTAL DE DEDUCCIONES	**$529,925.09**

CALCULO DE LA ESTIMACION:

IMPORTE DE LA ESTIMACION CON IVA	$1,741,396.90
MENOS DEDUCCIONES	$529,925.09
SALDO A PAGAR	**$1,211,471.81**

REPRESENTANTE LEGAL

ING. IRINA SALGADO HERNÁNDEZ

SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONÓMICO

L.C. ERIC ROMERO MORALES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2021-2024

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
POR ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
ESTADO DE GUERRERO
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
2021 2024

DR. CARLOS ARMANDO MORILLON RAMIREZ

SUBTOTAL	$1,050,842.96
DESCUENTO	$7,506.02
IMPUESTOS TRASLADOS IVA 16.0000%	$168,134.87
TOTAL	**$1,211,471.81**

ITIDAD CON LETRA

MILLON DOSCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 81/100 M.N.)

RFC emisor:	ICO091216UUA	**Folio fiscal:**	4884CF38-67DE-49A5-9842-3D120F85BECA
Nombre emisor:	IMEXA CONSTRUCTORES	**No. de serie del CSD:**	00001000000702553491
RFC receptor:	MAJ010101NA3	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	39530 2023-12-07 12:13:16
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Código postal del receptor:	39350	**Régimen fiscal:**	General de Ley Personas Morales
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	**Exportación:**	No aplica
Uso CFDI:	Construcciones.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
72141103		1.00	E48	Unidad de servicio	1,050,842.96	1,050,842.96	7,506.02	Sí objeto de impuesto.
Descripción	ESTIMACIÓN 01 (UNO) NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD FRACC. MAGALLANES UBICADA EN ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO CON CARGO AL FONDO III RAMO 33 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023 SEGUN CONTRATO No. MAJ-FAISMUN/426-2023/LP DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2023 PERIODO DE CONTRATO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.							
Número de pedimento		**Número de cuenta predial**						

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	1,050,842.96	Tasa	16.00%	168,134.87

Moneda:	Peso Mexicano
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago:	Pago en una sola exhibición

Subtotal			$ 1,050,842.96
Descuento			$ 7,506.02
Impuestos trasladados	IVA	16.00%	$ 168,134.87
Total			**$ 1,211,471.81**

Sello digital del CFDI:

X2l3tF5M/erpIm4LqOrWTxsEIKaxzJROXsZaFdzrjiFfcO5HtBtDW27BPH2wI19hKAjxpHIO7NTGGp6PBWMe59yBhzTyXUEaNcr6aEsbuzphD+pWw/esk9KARl2ZR8iG5GKHCRZaqiHFsroHo
SxIB9pncDrxqy0yuDjvpQCUBAnRWNUyQjl/stjoXB7WdjlgPiL1tJ7bROdy8O8qaEhKZMfS0YmzYKrmhhEPjRDdDzzspB9/dS+vrylif95YkWJ5qP/IfQFxdD82yW1wBzv2PoE/tCzn5zmwb8fljCrX
SYSLQwA115M3bwdiB6uatfurruM8Sqrh3sYidJPPJ9+Gyg==

Sello digital del SAT:

e5etYLFSTHIqwurGSb5LFEenOTH6Pz+fwvRnDLNVwJr9Jz2ZJlt2QH5mM69yrj7bAJfn+aQfNR5hdSxbTWbo7NaFnBwygngsWjB8s7tC0Ei5SV07PCtfWaYkqMGDGgu71bhP2NWBxGczutE
wbn6WLjPfEzXBN7vDq+OSwmn4Q7Cmk7mVi1waxr/yBtaTrfIB5GhHxw5OFPuTYq6OjtidYALrMP/3nvyXM9VuLilmxEwH+IkhXIlzdHBezGxB/SPobi0NfsOoajod+DbfXOTAF8LnO5XPTovfP6
mM8Zvwc8yHP/VBSmWwHhj4mq6znecmnJaaexyiHJyd8c2jtNyIEA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4884CF38-67DE-49A5-9842-3D120F85BECA|2023-12-07T12:13:35|SAT970701NN3|X2l3tF5M/erpIm4LqOrWTxsEIKaxzJROXsZaFdzrjiFfcO5HtBtD
W27BPH2wI19hKAjxpHIO7NTGGp6PBWMe59yBhzTyXUEaNcr6aEsbuzphD+pWw/esk9KARl2ZR8iG5GKHCRZaqiHFsroHoSxIB9pncDrxqy0yuDjvpQCU
BAnRWNUyQjl/stjoXB7WdjlgPiL1tJ7bROdy8O8qaEhKZMfS0YmzYKrmhhEPjRDdDzzspB9/dS+vrylif95YkWJ5qP/IfQFxdD82yW1wBzv2PoE/tCzn5zmwb8
fljCrXSYSLQwA115M3bwdiB6uatfurruM8Sqrh3sYidJPPJ9+Gyg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación:	SAT970701NN3	**Fecha y hora de certificación:**	2023-12-07 12:13:35
No. de serie del certificado SAT	00001000000504465028		

REVISADO:
C. P. MIGUEL JAIMES RAMOS
INDICO PROCURADOR ADMINISTRATIVO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2021-2024

OPERADO
FAISMUN - 2023

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

REVISADO:
DR. CARLOS ARMANDO MORILLÓN RAMÍREZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.


```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cartaporte30="http://www.sat.gob.mx/CartaPorte30" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Fecha="2023-12-07T12:13:16"
Sello="X2l3tF5M/erpIm4LqOrWTxsEIKaxzJROXsZaFdzrjiFfcO5HtBtDW27BPH2wI19hKAjxpHIO7NTGGp6PBWMe59yBhzTyXUEaNcr6aEsbuzphD+pWw/esk9KAR12ZR8iG5GKHCRZaqiHFsroHoS
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000702553491"
Certificado="MIIGEDCCA/igAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDI1NTM0OTEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwgU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVU
SubTotal="1050842.96" Descuento="7506.02" Moneda="MXN" Total="1211471.81" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="39530">
  <cfdi:Emisor Rfc="ICO091216UUA" Nombre="IMEXA CONSTRUCTORES" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="MAJ010101NA3" Nombre="MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ" DomicilioFiscalReceptor="39350" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="72141103" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de servicio" Descripcion="ESTIMACIÓN 01 (UNO) NOMBRE DE LA
    OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD FRACC. MAGALLANES UBICADA EN ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO CON CARGO AL FONDO
    III RAMO 33 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023 SEGUN CONTRATO No. MAJ-FAISMUN/426-2023/LP DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2023 PERIODO DE CONTRATO DEL 15 DE
    AGOSTO DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023." ValorUnitario="1050842.96" Importe="1050842.96" Descuento="7506.02" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="1050842.96" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="168134.87"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="168134.87">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="1050842.96" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="168134.87"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="4884CF38-67DE-49A5-9842-3D120F85BECA"
    FechaTimbrado="2023-12-07T12:13:35" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
    SelloCFD="X2l3tF5M/erpIm4LqOrWTxsEIKaxzJROXsZaFdzrjiFfcO5HtBtDW27BPH2wI19hKAjxpHIO7NTGGp6PBWMe59yBhzTyXUEaNcr6aEsbuzphD+pWw/esk9KAR12ZR8iG5GKHCRZaqiH
    NoCertificadoSAT="00001000000504465028"
    SelloSAT="e5etYLFSTHIqwurGSb5LFEenOTH6Pz+fwvRnDLNVwJr9Jz2ZJlt2QH5mM69yrj7bAJfn+aQfNR5hdSxbTWbo7NaFnBwygngsWjB8s7tC0Ei5SV07PCtfWaYkqMGDGgu71bhP2NWBxGc
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

OPERADO
FAISMUN - 2023

HACIENDA | SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ICO091216UUA	IMEXA CONSTRUCTORES	MAJ010101NA3	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
4884CF38-67DE-49A5-9842-3D120F85BECA	2023-12-07T12:13:16	2023-12-07T12:13:35	SAT970701NN3
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$1,211,471.81	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

OPERADO
FAISMUN - 2023

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

E S T A D O D E C U E N T A

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	ESTIMACION No.	**01 (UNO)**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLAES**	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL:	15 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	**IMEXA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.**	No. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/426-2023/LP	AL:	01 DE OCTUBRE DEL 2023
		FECHA:	01 DE OCTUBRE DEL 2023		

IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	PERIODO DEL CONTRATO	IMPORTE DEL ANTICIPO (CON IVA)	FECHA DE ANTICIPO
$ 5,000,427.46	DEL 15 DE AGOSTO DE 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	**$ 1,500,128.24**	**07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

ESTIMACION	PERIODO ESTIMACION	IMPORTE ESTIMACION	IVA	2 AL MILLAR C.M.I.C	5 AL MILLAR INSP. DE OBRAS	AMORTIZACION ANTICIPO	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
01 (UNO)	DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023	1,501,204.22	240,192.68	0.00	7,506.02	522,419.07	529,925.09	1,211,471.81
	TOTAL	1,501,204.22	240,192.68	0.00	7,506.02	522,419.07	529,925.09	1,211,471.81
	SALDO	**$3,259,030.56**		**SALDO POR AMORTIZAR**		**$977,709.17**		

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

R E S U M E N D E L A E S T I M A C I Ó N

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES**	FECHA:	01 DE OCTUBRE DEL 2023	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**IMEXA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/426-2023/LP	ESTIMACION No.: 01 (UNO)
		TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	

No.	P A R T I D A	IMPORTE
A1	PRELIMINARES	265,610.94
A2	TERRACERIAS	7,155.07
A3	INSTALACION HIDRAULICA	27,944.87
A4	INSTALACION SANITARIA	0.00
A5	ALBAÑILERIA	800,993.52
A6	INSTALACIONES ELECTRICAS Y LUMINARIAS	14,231.69
A7	PAVIMENTACION	205,688.98
A8	ACARREOS Y LIMPIEZAS	179,579.15
	TOTAL DE PARTIDAS $	1,501,204.22
	SUBTOTAL $	1,501,204.22
	16 % IVA $	240,192.68
	TOTAL $	1,741,396.90

LA PRESENTE ESTIMACION IMPORTA LA CANTIDAD DE: $ 1,741,396.90 (UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.))

AVANCE FISICO 35.00%

AVANCE FINANCIERO ANTERIOR 0.00%

AVANCE FINANCIERO ACTUAL 34.82%

AVANCE FINANCIERO TOTAL 34.82%

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

ACAPULCO SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

E S T I M A C I Ó N

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	FECHA:	01 DE OCTUBRE DEL 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/426-2023/LP	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
		TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	HOJA: 1 DE: 9

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
A1	PRELIMINARES								
3-0073	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICAS DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIES MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD) INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS.	M2	17.31	2,692.81		2,052.42	2,052.42	0.00	35,527.39
D-CARSA10	DEMOLICION A MAQUINA DE CARPETA ASFALTICA DE 56.00 A 10.00 CMS. DE ESPESOR INCLUYE MANO DE OBRA Y ACARREOS EN 1ra, ESTACION	M2	73.31	1,649.00		1,649.00	1,649.00	0.00	120,888.19
D-BANQU	DEMOLICION MECANICA DE BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: HERAMIENTA MENOR, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	63.40	146.04		146.04	146.04	0.00	9,258.94
D-GUARMM	DEMOLICION MECANICA DE GUARNICION DE 15X20X50 CM, INCLUYE: EXTRACCION DE PEDACERIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	69.73	183.67		183.67	183.67	0.00	12,807.31
1-00056	DESCORANAMIENTO DE MURO DE PIEDRA BRAZA DE 30 CM. DE ANCHO INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA PRODUCTO DE LA DEMOLICION.	M	108.12	120.00		0.00	0.00	0.00	0.00
EXC-001	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II INCLUYE AFINE DE TALUD Y FONDO, ACARREOS A PRIMERA ESTACION DE 20 MTS.	M3	74.30	699.43		699.43	699.43	0.00	51,967.65

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	E S T I M A C I Ó N			ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO**	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
	NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES**	FECHA:	**01 DE OCTUBRE DEL 2023**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: **IMEXA CONSTRUCTORES S.A DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	HOJA: 2 DE: 9
		TIPO DE OBRA: URBANIZACION		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
9-0139	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	83.66	420.29		420.29	420.29	0.00	35,161.46
9-0138	RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA , MEDIDO COMPACTADO.	M3	498.99	30.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PRELIMINARES :								**$265,610.94**
A2	**TERRACERIAS**								
31-0448	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO II-A, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO DEL MATERIAL	M3	82.27	558.00		0.00	0.00	0.00	0.00
31-0454	AFINE Y COMPACTACION DE SUB RASANTE AL 90% PROCTOR MINIMO, POR MEDIOS MECANICOS.	M2	40.15	1,471.35		0.00	0.00	0.00	0.00
31-0457	FORMACION DE BASE DE 30 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO CON EQUIPO MECANICO INCLUYE VERTIDO, AFINE, COMPACTADO AL 95% PROCTOR Y AGUA.	M3	519.14	442.62		0.00	0.00	0.00	0.00
32-0466	AFINE Y COMPACTACION EN BANQUETAS, ANDADORES Y PLAZA A MANO INCLUYE ACARREOS A PRIMERA ESTACION	M2	39.85	556.64		179.55	179.55	0.00	7,155.07
	TOTAL TERRACERIAS :								**$7,155.07**

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

E S T I M A C I Ó N				ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	FECHA:	01 DE OCTUBRE DEL 2023	AL: 09 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/426-2023/LP	HOJA: 3 DE: 9
		TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
A3	INSTALACION HIDRAULICA								
4-0080	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II-A, EN SECO Y BARRETA DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, DEPOSITANDO EL PRODUCTO DE EXCAVACION A ORILLA DE CEPA, CUALQUIER ZONA.	M3	200.62	16.00		16.00	16.00	0.00	3,209.92
9-0139	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO	M3	83.66	15.80		15.80	15.80	0.00	1,321.83
5-0102	CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA INCLUYE; ACOSTILLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1ra, ESTACION, METERIAL Y MANO DE OBRA.	M3	475.56	2.00		2.00	2.00	0.00	951.12
27-0412	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 3" CED. RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	449.24	50.00		50.00	50.00	0.00	22,462.00
TOMDOM*	TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CON TUBO DE CPCV DE 13 MM. DE 6 MTS. DE LONGITUD, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, VALVULA DE INSERCION, ABRAZADERA DE 4", ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1,760.31	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00
314-IHS-07-087	VALVULA DE ESFERA DE CPVC 13 MM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTO.	PZA	242.93	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00
BOTA01	CAJA PARA LLAVE DE BANQUETYA (BOTA) INCLUYE: LLAYE DE CUADRO ROSCABLE 1/2" , HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO	PZA	1,388.40	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INSTALACION HIDRAULICA :								$27,944.87

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

	E S T I M A C I Ó N			ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO**	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023	
	NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES**	FECHA:	**01 DE OCTUBRE DEL 2023**	AL: 09 DE OCTUBRE DEL 2023	
	CONTRATISTA: **IMEXA CONSTRUCTORES S.A DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	HOJA: 4	DE: 9
		TIPO DE OBRA: URBANIZACION			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
A4	**INSTALACION SANITARIA**								
EXC-001	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II INCLUYE AFINE DE TALUD Y FONDO, ACARREOS A PRIMERA ESTACION DE 20 MTS.	M3	74.30	47.26		0.00	0.00	0.00	0.00
9-0139	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	83.66	31.79		0.00	0.00	0.00	0.00
9-0138	RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	498.99	13.62		0.00	0.00	0.00	0.00
5-0102	CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA INCLUYE: ACOSTILLLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION Y MANO DE OBRA.	M3	475.56	3.37		0.00	0.00	0.00	0.00
28-0417	POZO DE VISITA DE FORMA CONICA DE 0.60 A 1.20 MTS. DE DIAMETRO INTERIOR POR 1.50 MTS. DE ALTURA A BASE DE MAMPOSTERIA, MURO DE TABIQUE DE 25 CMS CON APLANADO DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO, INCLUYE: EXCAVACION, ACARREO Y RELLENO.	PZA	13,271.34	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00
37-05798P	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO ALTA RESISTENCIA ABIERTO O CERRADO PARA POZO DE VISITA DE 60 CM. DE DIAMETRO, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	4,210.10	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00
26-0390*	REGISTRO SANITARIO DE 0.40X0.60X0.60 MTS. A BASE DE TABICON 10X14X28, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, PISO DE 10 CM, DE CONCRETO SIMPLE F´C=250 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DEL No 3 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, DE 15 CM DE ESPESOR INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, BARRENADO Y DEMOLICION DE ROCA, ACARREO Y M.O.	PZA	2,482.13	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

	E S T I M A C I Ó N			ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO**	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
	NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES**	FECHA:	**01 DE OCTUBRE DEL 2023**	AL: 09 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: **IMEXA CONSTRUCTORES S.A DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	HOJA: 5 DE: 9
		TIPO DE OBRA: URBANIZACION		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
TUBO 8"	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES SECUNDARIOS, CONEXIONES Y MANO DE OBRA.	M	773.19	42.80		0.00	0.00	0.00	0.00
SUM-COD2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SANITARIO DE 6"X45°, INCLUYE CARGA Y DESCARGA EN ALMACEN DE OBRA.	PZA	356.10	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00
PU-6255	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNION DE SERVICIO DE P.V.C. DE 150 MM. (6") DE DIAMETRO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO INCLUYE CARGA Y DESCARGA EN ALMACEN DE OBRA	PZA	624.14	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00
PU-6239	SUMINISTRO DE TUBO DE PVC SANITARIO DE NORMA LISO DE 150 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: FLETE , CARGA Y DESCARGA EN ALMACEN DE OBRA.	ML	483.03	18.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INSTALACION SANITARIA:								**$0.00**
A5	**ALBAÑILERIA**								
18-0296	MURO DE PIEDRA BRAZA DE LA REGION, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO COMUN INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES EN 1ra ESTACION DE 20 MTS.	M3	2,755.36	276.52		276.52	276.52	0.00	761,912.15
18-0313	DREN PARA MURO DE MAMPOSTERIA A BASE DE P.V.C. 4" TIPO RIGIDO INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	130.32	26.00		26.00	26.00	0.00	3,388.32

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	E S T I M A C I Ó N			ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO**	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023	
	NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES**	FECHA:	**01 DE OCTUBRE DEL 2023**	AL: 09 DE OCTUBRE DEL 2023	
	CONTRATISTA: **IMEXA CONSTRUCTORES S.A DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	HOJA: 6	DE: 9
		TIPO DE OBRA: URBANIZACION			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
18-0318	FILTRO DE GRAVA Y/O RAJUELA DE PIEDRA DE 30 CMS DE ESPESOR INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M3	1,019.51	53.70		35.01	35.01	0.00	35,693.05
11-0151*	ANCLAJE DE CASTILLO DE 20 X 15 CMS 4 VAR # 4 Y ESTRIBOS DEL # 2 A,C, 20CMS HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 50 CMS. CONCRETO F¨C= 200 KG/CM2 INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	441.46	13.00		0.00	0.00	0.00	0.00
11-0160*	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F¨C=250 KG/CM2, DE 15X20 CM, ARMADO CON 6 VARILLAS No. 4 Y ESTRIBOS No, 2 A CADA 25 CM. INCLUYE CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1RA. ESTACION.	M	882.93	31.53		0.00	0.00	0.00	0.00
11-0221	LOSAS DE CONCRETO F¨C= 250 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ARMADA CON VAR. No. 4 A CADA 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, PARA PASO PEATONAL, SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO COLADO Y DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	2,869.37	26.80		0.00	0.00	0.00	0.00
F-BARANDAL1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE TUBO DE ACERO NEGRO DE 1 1/2 CON DIVISION DE TUBO DE 1" CON POSTES DE 1 1/2" A CADA METRO SOLDADO A PLACA DE 1/2" DE 15X15 CMS. EMBUTIDA EN LOSA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, PINTURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	2,373.49	39.78		0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ALBAÑILERIA:								**$800,993.52**

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	E S T I M A C I Ó N			ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO**	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023	
	NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES**	FECHA:	**01 DE OCTUBRE DEL 2023**	AL: 09 DE OCTUBRE DEL 2023	
	CONTRATISTA: **IMEXA CONSTRUCTORES S.A DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/426-2023/AD**	HOJA: 7	DE: 9
		TIPO DE OBRA: URBANIZACION			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
A6	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y LUMINARIAS**								
REG-AUX	REGISTRO AUXILIAR PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 50X60X65 MTS, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28 CMS. CON 14 CMS. DE ESPESOR ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 INCUYE: PLANTILLA DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR F¨C=100 KG/CM2, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X 16" CONCRETO F¨C=200 KG/CM2 EN TAPA Y FIJACION DE MARCO, DREN DE GRAVA DE 20 CMS DE ESPESOR, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	3,554.46	8.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TUB-PESA50	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO 50 MM DE DIAMETRO INCLUYE: CONEXIÓN, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, CAMA DE ARENA, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M	201.24	200.00		70.72	70.72	0.00	14,231.69
	TOTAL INSTALACIONES ELEC TRICAS Y LUMINARIAS								**$14,231.69**
A7	**PAVIMENTACION.**								
4-0080	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II-A, EN SECO Y BARRETA DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, DEPOSITANDO EL PRODUCTO DE EXCAVACION A ORILLA DE CEPA, CUALQUIER ZONA.	M3	200.62	64.35		12.04	12.04	0.00	2,415.46
9-0138	RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO, DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	498.99	38.55		0.00	0.00	0.00	0.00

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	E S T I M A C I Ó N			ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO**	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023	
	NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES**	FECHA:	**01 DE OCTUBRE DEL 2023**	AL: 09 DE OCTUBRE DEL 2023	
	CONTRATISTA: **IMEXA CONSTRUCTORES S.A DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	HOJA: 8	DE: 9
		TIPO DE OBRA: URBANIZACION			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
321-0471	GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE DE F¨C=200 KH/CM2 DE 20X15X40 CM. DE SECCION T.M.A. 3/4" INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	530.82	424.35		200.70	200.70	0.00	106,535.57
32-0475A	PAVIMENTO PREMEZCLADO F¨C= 300 KG/CM2, T.A.M. 3/4" DE 20 CM. DE ESPESOR RESISTENCIA NORMAL, ACABADO A REGLA INCLUYE: JUNTA CONSTRUCTIVA CON CHAFLAN DE 1/2", EN CADA JUNTA FRIA (AL TERMINO DEL COLADO) SE PROCEDERA A COLOCAR 8 CONECTORES CON VARILLA DE 1/2" A CADA 60 CMS 30-30 CMS. FIBRA MICROSINTETICA, CURADO CON CURACRETO, VIBRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 1RA. ESTACION.	M2	976.95	1,471.35		0.00	0.00	0.00	0.00
SUMPOL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO CALIBRE 600 PARA EVITAR DESHIDRATACION DEL CONCRETO, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	57.02	1,471.35		0.00	0.00	0.00	0.00
CORTE01	CORTE DE JUNTAS EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA MANUAL DE DISCO DIAMANTADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA.	ML	36.40	522.00		0.00	0.00	0.00	0.00
32-0484	CALAFATEO EN LOSAS Y GUARNICIONES A BASE DE ASFALTO OXIDADO INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, ACARREOS A PRIMERA ESTACION Y MANO DE OBRA.	ML	28.53	522.00		0.00	0.00	0.00	0.00

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
M.I. VLADIMIR HERNÁNDEZ ALEMAN

ESTIMACIÓN

ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ

UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2023

AL: 09 DE OCTUBRE DEL 2023

CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A DE C.V.

No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/426-2023/LP

HOJA: 9 DE: 9

TIPO DE OBRA: URBANIZACION

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
22-0333*	PINTURA ESMALTE AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES CON DESARROLLO DE 30.00 CM. INCL. MATERIAL MANO DE OBRA Y ACARREOS A PRIMERA ESTACION.	ML	91.64	424.35		0.00	0.00	0.00	0.00
32-0468	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, T.M.A 3/4", INCLUYE CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	538.78	556.64		179.55	179.55	0.00	96,737.95
	TOTAL PAVIMENTACION:								**$205,688.98**
A8	**ACARREOS Y LIMPIEZAS**								
CARGA	CARGA MECANICA CON USO DE RETROEXCAVADORA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO (6 M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION A TIRO LIBRE.	M3	229.33	979.64		783.06	783.06	0.00	179,579.15
33-0528	LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20 MTS.	M2	15.99	2,692.81		0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DE ACARREOS Y LIMPIEZAS								**$179,579.15**
								TOTAL DE ESTA ESTIMACION:	**$1,501,204.22**

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

ACAPULCO, GRO. A 01 DE OCTUBRE DEL 2023.

CARTA DE ENTREGA DE ESTIMACION

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E:

POR ESTE CONDUCTO HAGO ENTREGA DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO), DE LA OBRA : **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES,** UBICADA EN: **ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO**, CON NUMERO DE CONTRATO **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP QUE COMPRENDE EL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO NO SIN ANTES MANIFESTARLE QUEDAR A SUS ORDENES PARA CUALQUIER ACLARACION.

ATENTAMENTE

ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01
CEL. 744 4490912/744 2354717 E-MAIL: imexa@telmexmail.com, gno_0301@hotmail.com



MÉXICO
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
SALGADO
HERNANDEZ
IRINA

SEXO M

DOMICILIO
C NUEVO LEON 23
COL PROGRESO 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE DE ELECTOR SLHRIR67082312M900
CURP
SAHI670823MGRLRR09
AÑO DE REGISTRO
1993 06
FECHA DE NACIMIENTO
23/08/1967
SECCIÓN
0057
VIGENCIA
2023 - 2033



INE

IDMEX2412998667<<0057054805632
6708238M3312315MEX<06<<00253<9
SALGADO<HERNANDEZ<<IRINA<<<<<<

ACAPULCO, GRO. A 01 DE OCTUBRE DEL 2023.

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E:


POR ESTE CONDUCTO HAGO ENTREGA DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO), CORRESPONDIENTE A LA OBRA : : **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES,** UBICADA EN: **ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO**, CON NUMERO DE CONTRATO **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP,** LA CUAL HA SIDO REVISADA POR EL SUSCRITO COMO REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA ANTE EL MUNICIPIO Y CON LA CUAL ESTOY DE ACUERDO, ASI MISMO CERTIFICO QUE HE REVISADO FISICAMENTE LOS TRABAJOS TERMINADOS COMPRENDIDOS EN ESTA ESTIMACION Y ESTOY DE ACUERDO EN QUE CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES Y CALIDAD REQUERIDOS POR EL MUNICIPIO.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO NO SIN ANTES MANIFESTARLE QUEDAR A SUS ORDENES PARA CUALQUIER ACLARACION.

ATENTAMENTE

ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO
No. DE CEDULA PROFESIONAL: 2220846

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01
CEL. 744 4490912/744 2354717 E-MAIL: imexa@telmexmail.com, gno_0301@hotmail.com

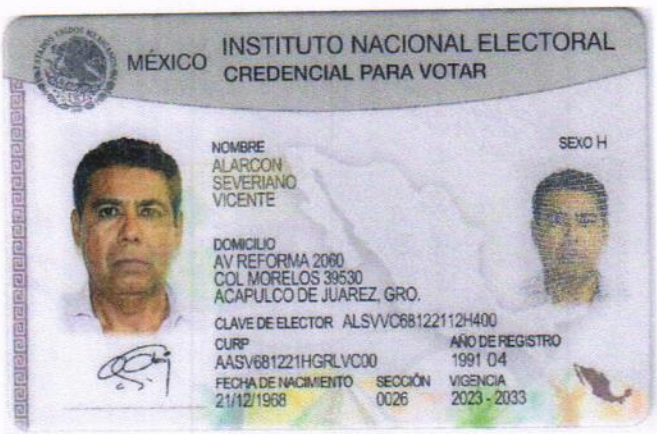
MÉXICO
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
ALARCON
SEVERIANO
VICENTE
SEXO H
DOMICILIO
AV REFORMA 2060
COL MORELOS 39530
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
CLAVE DE ELECTOR ALSVVC68122112H400
CURP
AASV681221HGRLVC00
AÑO DE REGISTRO
1991 04
FECHA DE NACIMIENTO
21/12/1968
SECCIÓN
0026
VIGENCIA
2023 - 2033


INE
IDMEX2414903999<<0026047494258
6812218H3312315MEX<04<<00374<3
ALARCON<SEVERIANO<<VICENTE<<<<

CEDULA PROFESIONAL - SUPERINTENDENTE





ACAPULCO, GRO. A 15 DE AGOSTO DEL 2023.

CARTA DE RECEPCION DEL SITIO DE LA OBRA

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E:

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO CONSTAR QUE LA OBRA DENOMINADA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES,** UBICADA EN: **ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO**, SE INICIA CON FECHA **15 DE AGOSTO DE 2023**, POR LO QUE HACEMOS LA RECEPCION DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO No.: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCION QUE SE SIRVA BRINDAR A LA PRESENTE, APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

CONTRATISTA

ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ
IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01
CEL. 744 4490912/744 2354717 E-MAIL: imexa@telmexmail.com, gno_0301@hotmail.com

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO)
		FECHA	01 DE OCTUBRE DEL 2023



BITACORA SOCIAL.


IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	**RESIDENTE DE OBRA** ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA** ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO)
		FECHA	01 DE OCTUBRE DEL 2023



BITACORA SOCIAL.

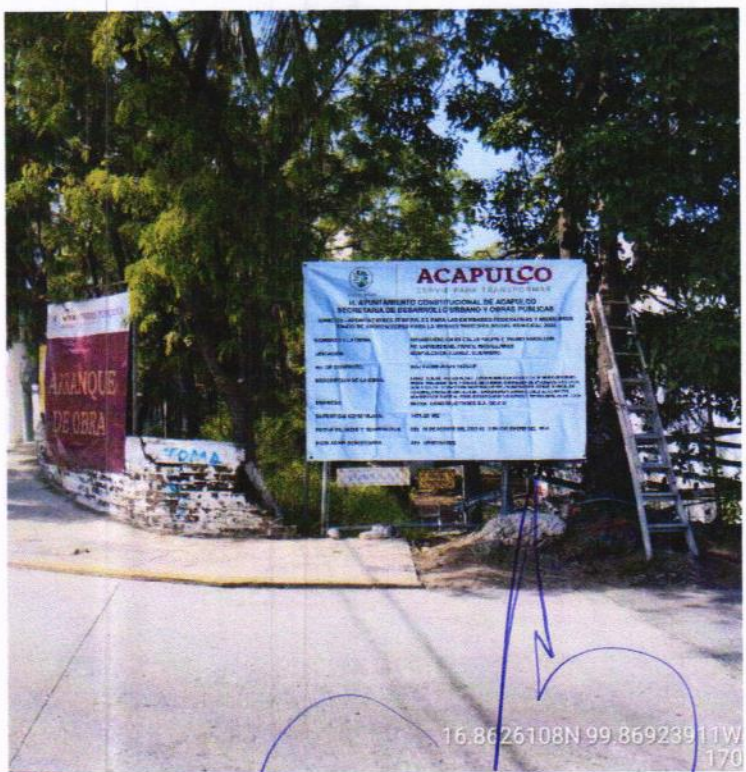

BITACORA SOCIAL.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

RAMO XXXIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)
EJERCICIO FISCAL 2023

REPORTE DE SUPERVISIÓN CON SOPORTE FOTOGRÁFICO.

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.**

CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

PERIODO DE CONTRATO: DEL 15-ago-23 AL 12-dic-23

CONTRATO No. : MAJ-FAISMUN/426-2023/LP

IMPORTE DE CONTRATO: $ 5,000,427.46

UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

PERIODO: DEL 15-ago-23 AL 31-ago-23

AVANCES POR PARTIDAS:

A1	PRELIMINARES		40%
A2	TERRACERIAS		
A3	INSTALACION HIDRAULICA		30%
A4	INSTALACION SANITARIA		
A5	ALBAÑILERIA		20%

A7	INSTALACIONES ELECTRICAS Y LUMINARIAS		
A7	PAVIMENTACION		5%
A8	ACARREOS Y LIMPIEZAS		40%

AVANCE TOTAL
16.88%



TRAZO Y NIVELACION




DEMOLICION A MAQUINA DE CARPETA ASFALTICA



DEMOLICION DE GUARNICION



EXCAVACIONES

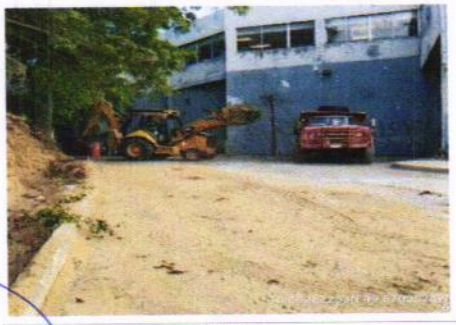

ACARREOS

RESIDENTE

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE RESIDENTE

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

RAMO XXXIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)
EJERCICIO FISCAL 2023

REPORTE DE SUPERVISIÓN CON SOPORTE FOTOGRÁFICO.

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES**

CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

PERIODO DE CONTRATO: DEL 15-ago-23 AL 12-dic-23

CONTRATO No. : MAJ-FAISMUN/426-2023/LP

IMPORTE DE CONTRATO: $ 5,000,427.46

UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

PERIODO: DEL 01-sep-23 AL 15-sep-23

AVANCES POR PARTIDAS:

A1	PRELIMINARES	70%
A2	TERRACERIAS	1%
A3	INSTALACION HIDRAULICA	50%
A4	INSTALACION SANITARIA	
A5	ALBAÑILERIA	50%

A7	INSTALACIONES ELECTRICAS Y LUMINARIAS	10%
A7	PAVIMENTACION	8%
A8	ACARREOS Y LIMPIEZAS	50%

AVANCE TOTAL
29.88%



DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA



MURO DE PIEDRA



MURO DE PIEDRA




DREN PARA MURO DE MAMPOSTERIA



RELLENO



GUARNICION DE CONCRETO

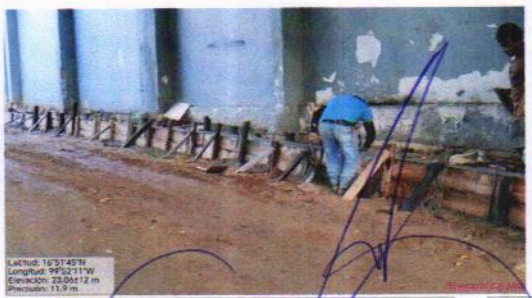

GUARNICION DE CONCRETO



TUBO PVC CONDUIT PESADO



ACARREOS

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE RESIDENTE

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

RAMO XXXIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)
EJERCICIO FISCAL 2023

REPORTE DE SUPERVISIÓN CON SOPORTE FOTOGRÁFICO.

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES**

CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

PERIODO DE CONTRATO: DEL 15-ago-23 AL 12-dic-23

CONTRATO No.: MAJ-FAISMUN/426-2023/LP

IMPORTE DE CONTRATO: $ 5,000,427.46

UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

PERIODO: DEL 16-sep-23 AL 01-oct-23

AVANCES POR PARTIDAS:


A1	PRELIMINARES	75%
A2	TERRACERIAS	2%
A3	INSTALACION HIDRAULICA	60%
A4	INSTALACION SANITARIA	
A5	ALBAÑILERIA	70%

A7	INSTALACIONES ELECTRICAS Y LUMINARIAS	15%
A7	PAVIMENTACION	8%
A8	ACARREOS Y LIMPIEZAS	50%

AVANCE TOTAL
35.00%



EXCAVACION A MANO

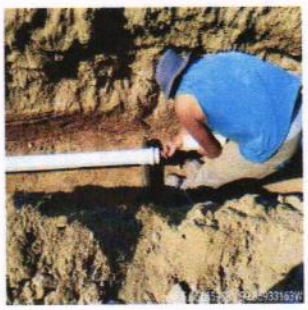

TUBO PVC HIDRAULICO 3" RD-26



PRUEBA HIDROSTATICA A TUBERIA HIDRAULICA 3"



BANQUETA



MURO DE PIEDRA



MURO DE PIEDRA



BANQUETA



ACARREO



ACARREO

RESIDENTE

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE RESIDENTE

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	ALTO	LARGO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A1	**PRELIMINARES**									
3-0073	Trazo y nivelación topográficas del terreno para estructuras estableciendo ejes y referencias, para superficie mayores a 300.00 m2 (vialidad) incluye: elaboración de planos topográficos.									
	ANCHO PROMEDIO									
	A.-8.42+8.22=16.64/2=8.32	0+008.000	0+010.000		8.32		2.00	M2	16.64	A
	B.- 8.22+8.40=16.62/2=8.31	0+010.000	0+020.000		8.31		10.00	M2	83.10	B
	C.- 8.40+8.37=16.77/2=8.38	0+020.000	0+030.000		8.38		10.00	M2	83.80	C
	D.- 8.37+8.28=16.65/2=8.32	0+030.000	0+040.000		8.32		10.00	M2	83.20	D
	E.- 8.28+9.66=17.94/2=8.97	0+040.000	0+050.000		8.97		10.00	M2	89.70	E
	F.- 9.66+9.92=19.58/2=9.79	0+050.000	0+060.000		9.79		10.00	M2	97.90	F
	G.- 9.92+10.24=20.16/2=10.08	0+060.000	0+070.000		10.08		10.00	M2	100.80	G
	H.- 10.24+8.98=19.22/2=9.61	0+070.000	0+080.000		9.61		10.00	M2	96.10	H
	I.- 8.98+9.35=18.33/2=9.16	0+080.000	0+090.000		9.16		10.00	M2	91.60	I
	J.- 9.35+10.36=19.71/2=9.85	0+090.000	0+100.000		9.85		10.00	M2	98.50	J
	K.- 10.36+10.34=20.70/2=10.35	0+100.000	0+110.000		10.35		10.00	M2	103.50	K
	L.- 10.34+9.36=19.70/2= 9.84	0+110.000	0+120.000		9.84		10.00	M2	98.40	L
	M.- 9.36+8.01=17.37/2=8.68	0+120.000	0+130.000		8.68		10.00	M2	86.80	M
					SUBTOTAL HOJA 1			**M2**	**1,130.04**	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO	ALTO	LARGO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A1	**PRELIMINARES**									
3-0073	Trazo y nivelación topográficas del terreno para estructuras estableciendo ejes y referencias, para superficie mayores a 300.00 m2 (vialidad) incluye: elaboración de planos topográficos.									
	ANCHO PROMEDIO									
	N.- 8.01+7.08=15.09/2=7.54	0+130.000	0+140.000		7.54		10.00	M2	75.40	N
	O.-7.08+9.54=16.62/2=8.31	0+140.000	0+150.000		8.31		10.00	M2	83.10	O
	P.- 9.54+9.58=19.12/2=9.56	0+150.000	0+160.000		9.56		10.00	M2	95.60	P
	Q.- 9.58+10.15=19.73/2=9.86	0+160.000	0+170.000		9.86		10.00	M2	98.60	Q
	R.- 10.15+10.48=20.63/2=10.31	0+170.000	0+180.000		10.31		10.00	M2	103.10	R
	S.- 10.48+11.37=20.85/2=10.92	0+180.000	0+190.000		10.92		10.00	M2	109.20	S
	T.- 11.37+13.02=24.39/2=12.19	0+190.000	0+200.000		12.19		10.00	M2	121.90	T
	U.- 13.02+15.14=28.16/2=14.08	0+200.000	0+210.000		14.08		10.00	M2	140.80	U
	V.- 15.14+16.43=31.57/2=15.78	0+210.000	0+216.000		15.78		6.00	M2	94.68	V
			SUBTOTAL HOJA 2						**922.38**	
			SUBTOTAL HOJA 1						**1,130.04**	
			SUBTOTAL HOJA 2						**922.38**	
							TOTAL	**M2**	**2,052.42**	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
		FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A1 **PRELIMINARES**

3-0073 Trazo y nivelación topográficas del terreno para estructuras estableciendo ejes y referencias, para superficie mayores a 300.00 m2 (vialidad) incluye: elaboración de planos topográficos.

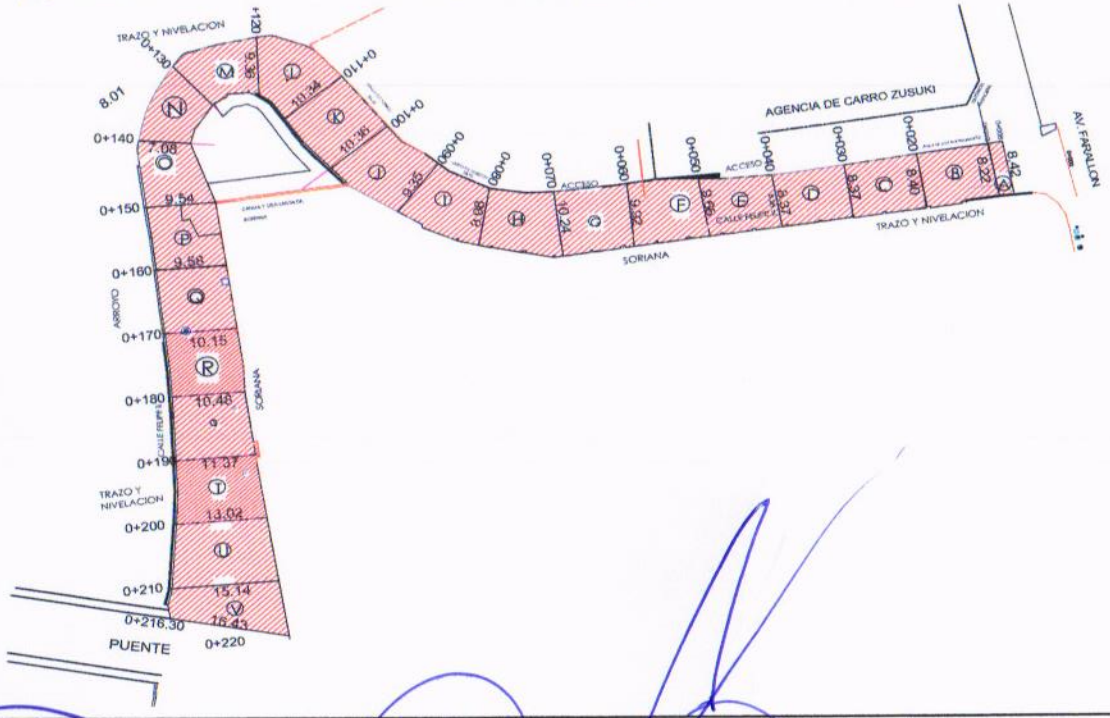

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
		FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A1 **PRELIMINARES**

3-0073 Trazo y nivelación topográficas del terreno para estructuras estableciendo ejes y referencias, para superficie mayores a 300.00 m2 (vialidad) incluye: elaboración de planos topográficos.



IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
		FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A1 **PRELIMINARES**

3-0073 Trazo y nivelación topográficas del terreno para estructuras estableciendo ejes y referencias, para superficie mayores a 300.00 m2 (vialidad) incluye: elaboración de planos topográficos.

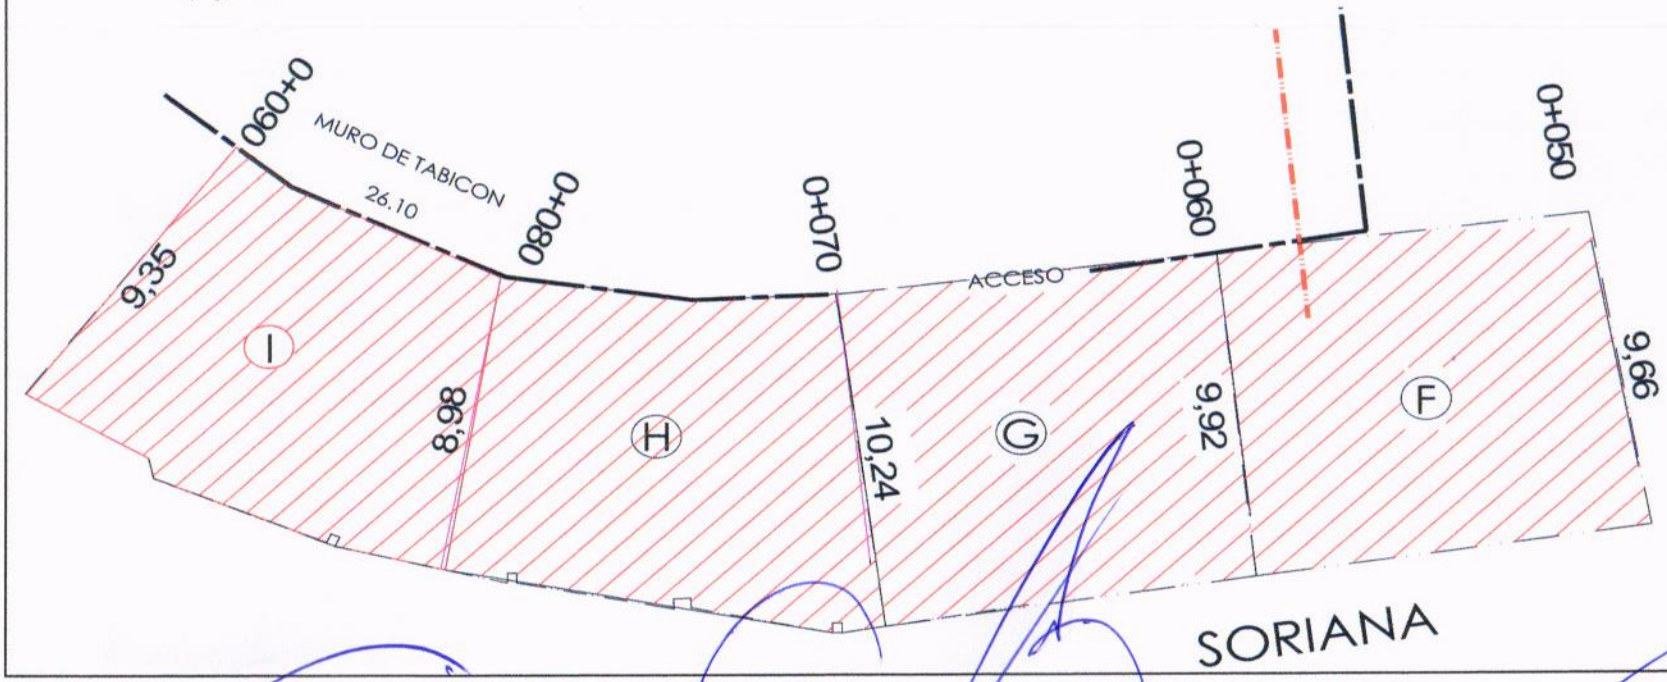

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
		FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A1 **PRELIMINARES**

3-0073 Trazo y nivelación topográficas del terreno para estructuras estableciendo ejes y referencias, para superficie mayores a 300.00 m2 (vialidad) incluye: elaboración de planos topográficos.

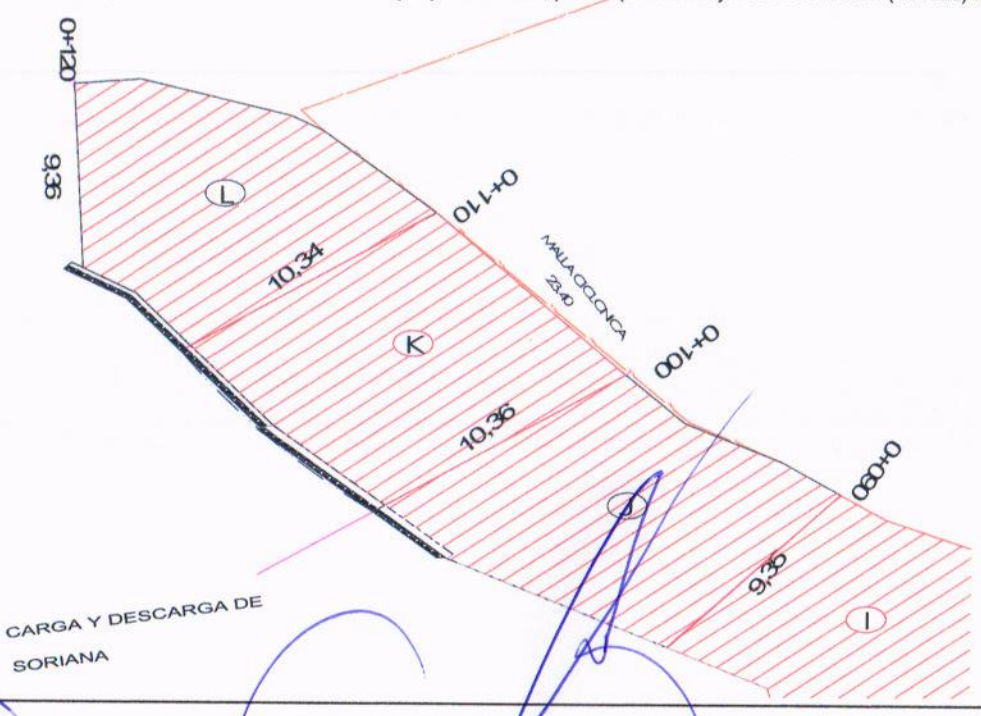

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
		FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A1 **PRELIMINARES**

3-0073 Trazo y nivelación topográficas del terreno para estructuras estableciendo ejes y referencias, para superficie mayores a 300.00 m2 (vialidad) incluye: elaboración de planos topográficos.

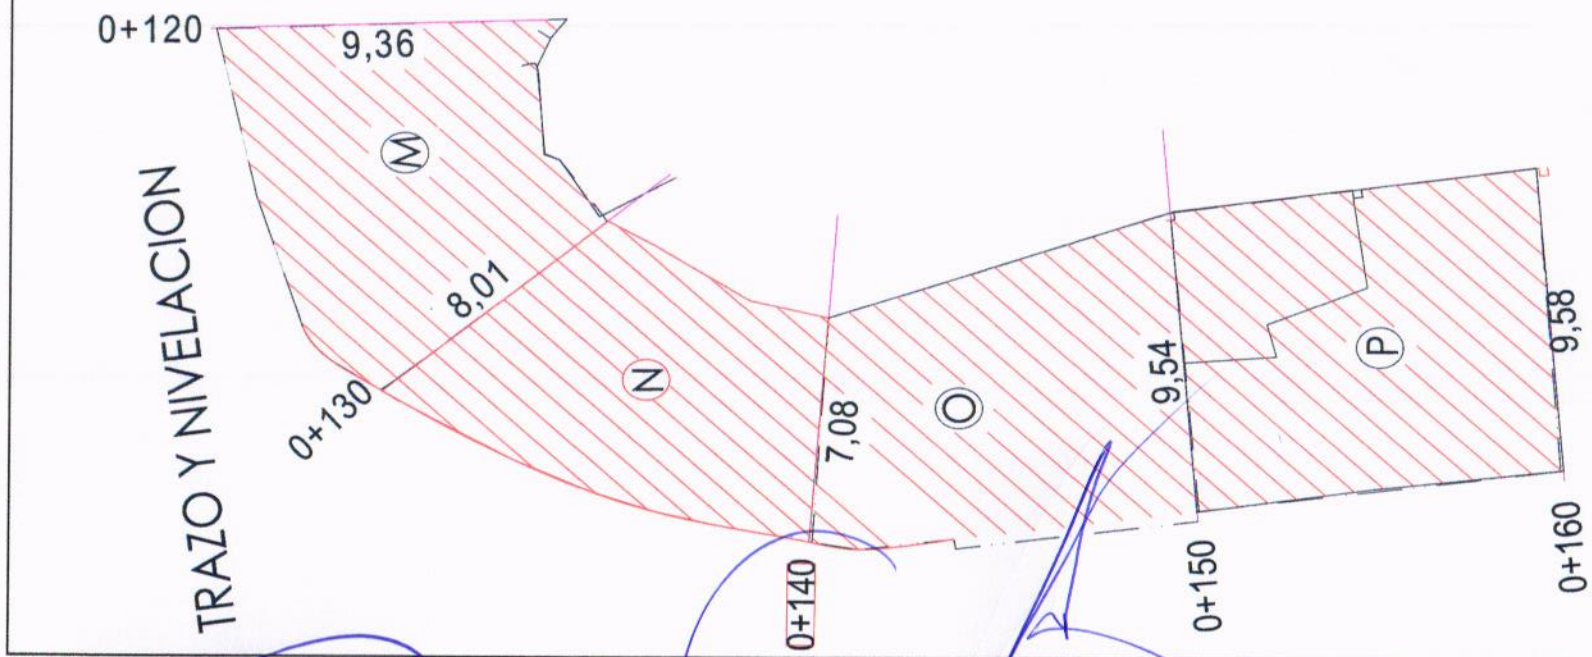

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
		FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A1 **PRELIMINARES**

3-0073 Trazo y nivelación topográficas del terreno para estructuras estableciendo ejes y referencias, para superficie mayores a 300.00 m2 (vialidad) incluye: elaboración de planos topográficos.



IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
		FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A1 **PRELIMINARES**

3-0073 Trazo y nivelación topográficas del terreno para estructuras estableciendo ejes y referencias, para superficie mayores a 300.00 m2 (vialidad) incluye: elaboración de planos topográficos.



IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO)
		FECHA	01 DE OCTUBRE DEL 2023

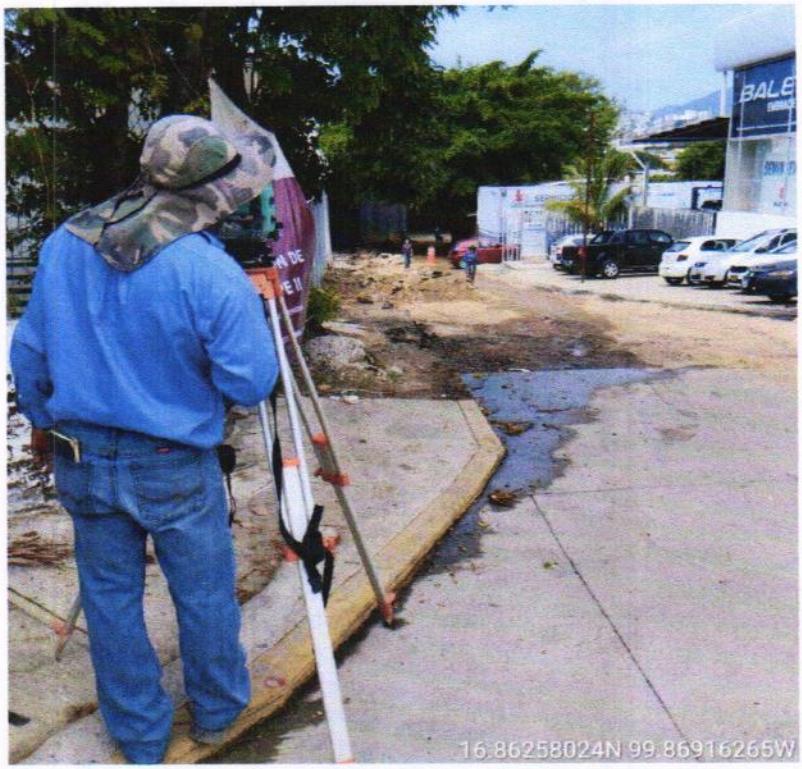

3-0073.- TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICAS DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD) INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS

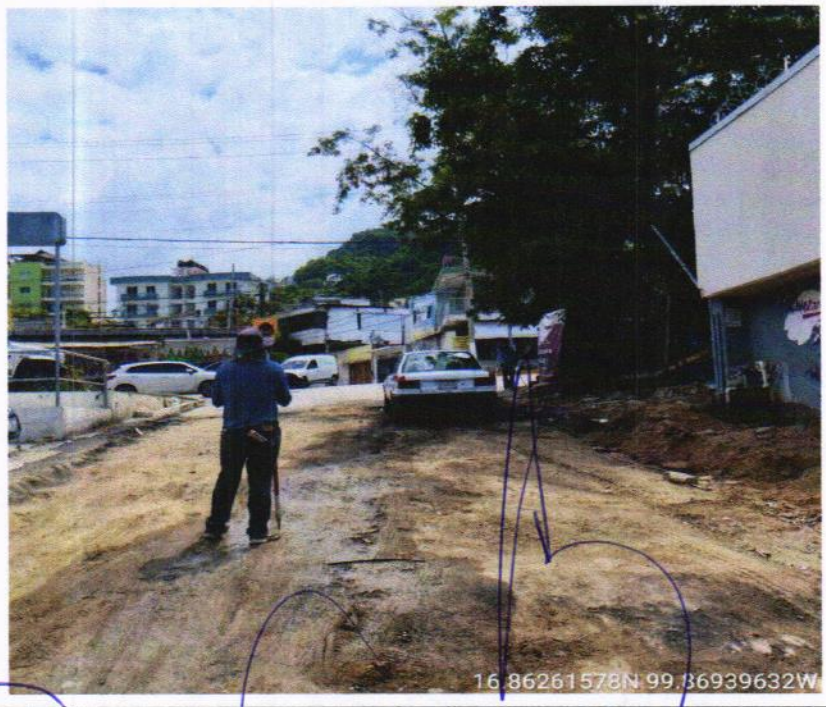


3-0073.- TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICAS DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD) INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS.


IMEMA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO)
		FECHA	01 DE OCTUBRE DEL 2023

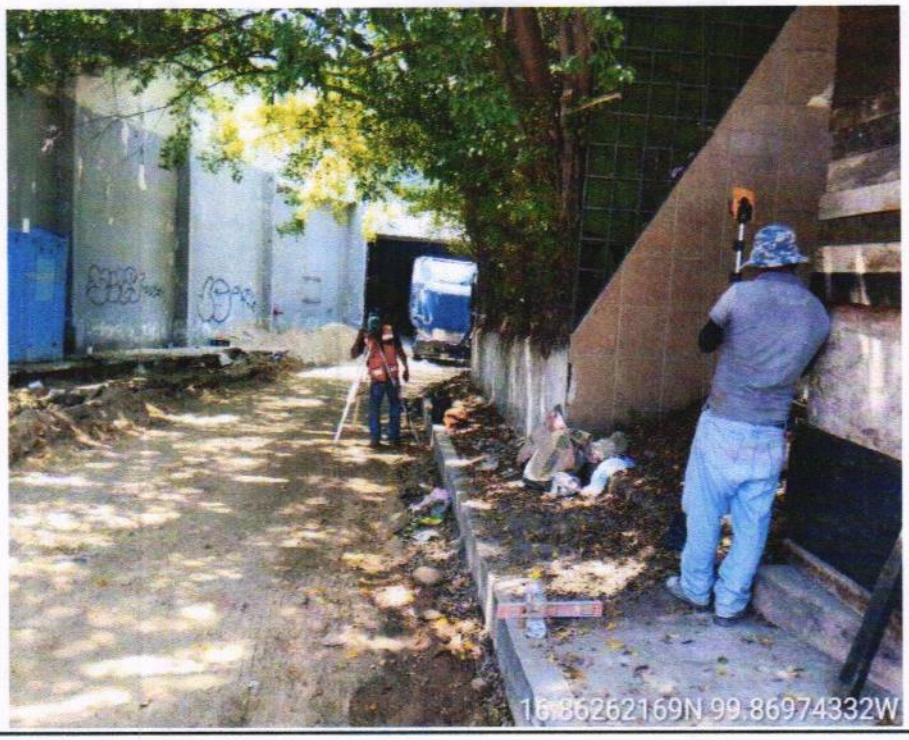

3-0073.- TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICAS DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD) INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS

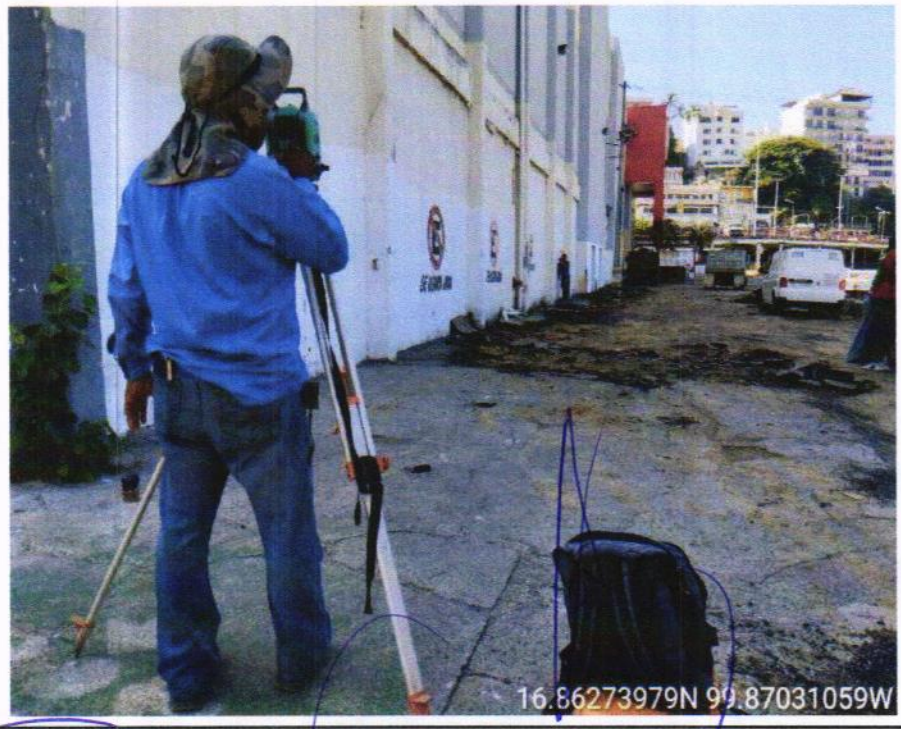

3-0073.- TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICAS DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD) INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	**RESIDENTE DE OBRA** ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA** ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO)
		FECHA	01 DE OCTUBRE DEL 2023



3-0073.- TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICAS DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD) INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS



3-0073.- TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICAS DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD) INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A1	**PRELIMINARES**									
D- CAR5A10	Demolicion a maquina de carpeta asfaltica de 5.00 a 10.00 cms. De espesor, incluye mano de obra y acarreos en 1a, estacion.									
	ANCHO PROMEDIO									
	A.- 6.54+6.55=13.09/2=6.54	0+008.000	0+010.000		6.54	2.00		M2	13.08	A
	B.-6.55+6.60=13.15/2=6.57	0+010.000	0+020.000		6.57	10.00		M2	65.70	B
	C.-6.60+6.48=13.08/2=6.54	0+020.000	0+030.000		6.54	10.00		M2	65.40	C
	D.-6.48+6.42=12.90/2=6.45	0+030.000	0+040.000		6.45	10.00		M2	64.50	D
	E.- 6.42+6.69=13.11/2=6.55	0+040.000	0+050.000		6.55	10.00		M2	65.50	E
	F.-6.69+6.94=13.63/2=6.81	0+050.000	0+060.000		6.81	10.00		M2	68.10	F
	G.-6.94+7.34=14.28/2=7.14	0+060.000	0+070.000		7.14	10.00		M2	71.40	G
	H.-7.34+5.56=12.90/2=6.45	0+070.000	0+080.000		6.45	10.00		M2	64.50	H
	I.-5.56+8.31=13.87/2=6.93	0+080.000	0+090.000		6.93	10.00		M2	69.30	I
	J.-8.31+8.14=16.45/2=8.22	0+090.000	0+100.000		8.22	10.00		M2	82.20	J
	K.- 8.14+8.03=16.17/2=8.08	0+100.000	0+110.000		8.08	10.00		M2	80.80	K
	L.- 8.03+8.30=16.33/2=8.16	0+110.000	0+120.000		8.16	10.00		M2	81.60	L
	M.-8.30+8.28=16.58/2=8.29	0+120.000	0+130.000		8.29	10.00		M2	82.90	M
						SUBTOTAL HOJA 1		**M2**	**874.98**	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A1	**PRELIMINARES**									
D- CAR5A10	Demolicion a maquina de carpeta asfaltica de 5.00 a 10.00 cms. De espesor, incluye mano de obra y acarreos en 1a, estacion.									
	ANCHO PROMEDIO									
	N.- 8.28+7.08=15.36/2=7.68	0+130.000	0+140.000		7.68	10.00		M2	76.80	N
	O.- 7.08+6.56=13.64/2=6.82	0+140.000	0+147.100		6.82	7.10		M2	48.42	O
	O'- 4.88+4.72=9.60/2=4.80	0+147.100	0+150.000		4.80	2.90		M2	13.92	O´
	P..-4.72+6.35=11.35/2=5.53	0+150.000	0+155.570		5.53	5.57		M2	30.80	P
	P´.- 9.17+9.58=18.75/2=9.37	0+155.570	0+160.000		9.37	4.43		M2	41.50	P´
		DESCUENTO REGISTROS		-6.00	1.00	1.00		M2	-6.00	
	Q.-9.58+10.15=19.73/2=9.86	0+160.000	0+170.000		9.86	10.00		M2	98.60	Q
	R.-10.15+10.26=20.41/2=10.20	0+170.000	0+180.000		10.20	10.00		M2	102.00	R
	S.-10.26+11.40=21.66/2=10.83	0+180.000	0+190.000		10.83	10.00		M2	108.30	S
	T.-11.40+11.86=23.26/2=11.63	0+190.000	0+200.000		11.63	10.00		M2	116.30	T
	U.-11.86+13.37=25.23/2=12.61	0+200.000	0+210.000		12.61	10.00		M2	126.10	U
	V.-13.37+16=29.37/2=14.68	0+210.000	0+216.000		14.68	6.00		M2	88.08	V
				SUBTOTAL HOJA 2					**844.82**	
				SUBTOTAL HOJA 1				**M2**	**874.98**	
				SUBTOTAL HOJA 2				**M2**	**844.82**	
				TOTAL M2 DE DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA =				**M2**	**1719.80**	
				EN ESTA ESTIMACIÓN SÓLO SE COBRA LA CANTIDAD DE PRESUPUESTO =				**M2**	**1649.00**	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
		FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A1 **PRELIMINARES**

D- CAR5A10 DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5.00 A 10.00 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA Y ACARREOS EN 1A, ESTACIÓN.



IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
		FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A1 **PRELIMINARES**

D- CAR5A10 DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5.00 A 10.00 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA Y ACARREOS EN 1A, ESTACIÓN.



IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
		FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A1 **PRELIMINARES**

D- CAR5A10 DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5.00 A 10.00 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA Y ACARREOS EN 1A, ESTACIÓN.

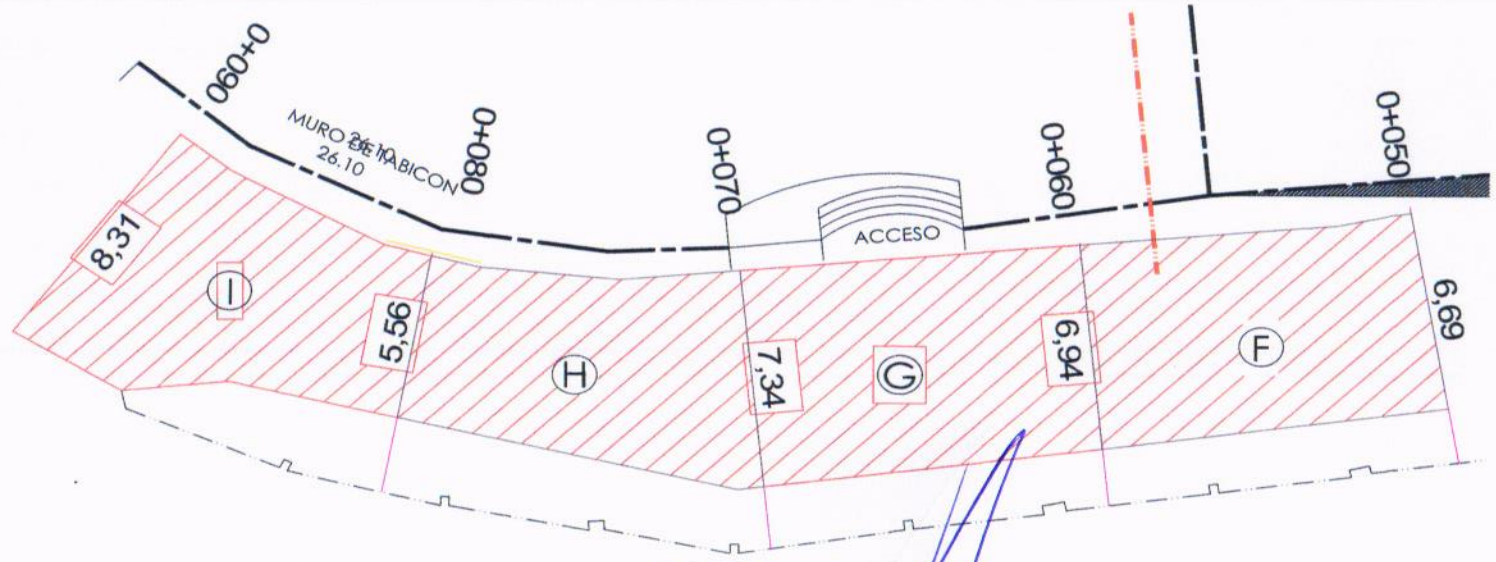

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
		FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A1 **PRELIMINARES**

D- CAR5A10 DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5.00 A 10.00 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA Y ACARREOS EN 1A, ESTACIÓN.



IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
		FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A1 **PRELIMINARES**

D- CAR5A10 DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5.00 A 10.00 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA Y ACARREOS EN 1A, ESTACIÓN.

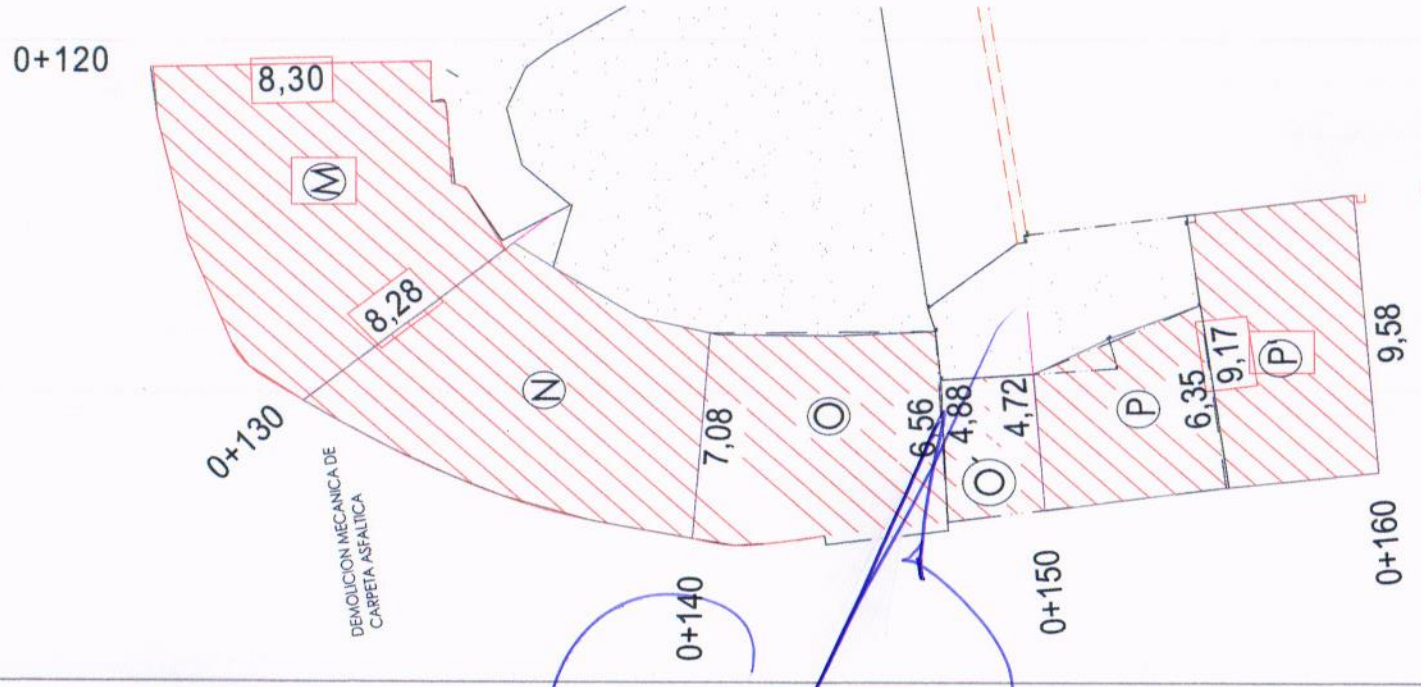

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
		FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A1 **PRELIMINARES**

D- CAR5A10 DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5.00 A 10.00 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA Y ACARREOS EN 1A, ESTACIÓN.

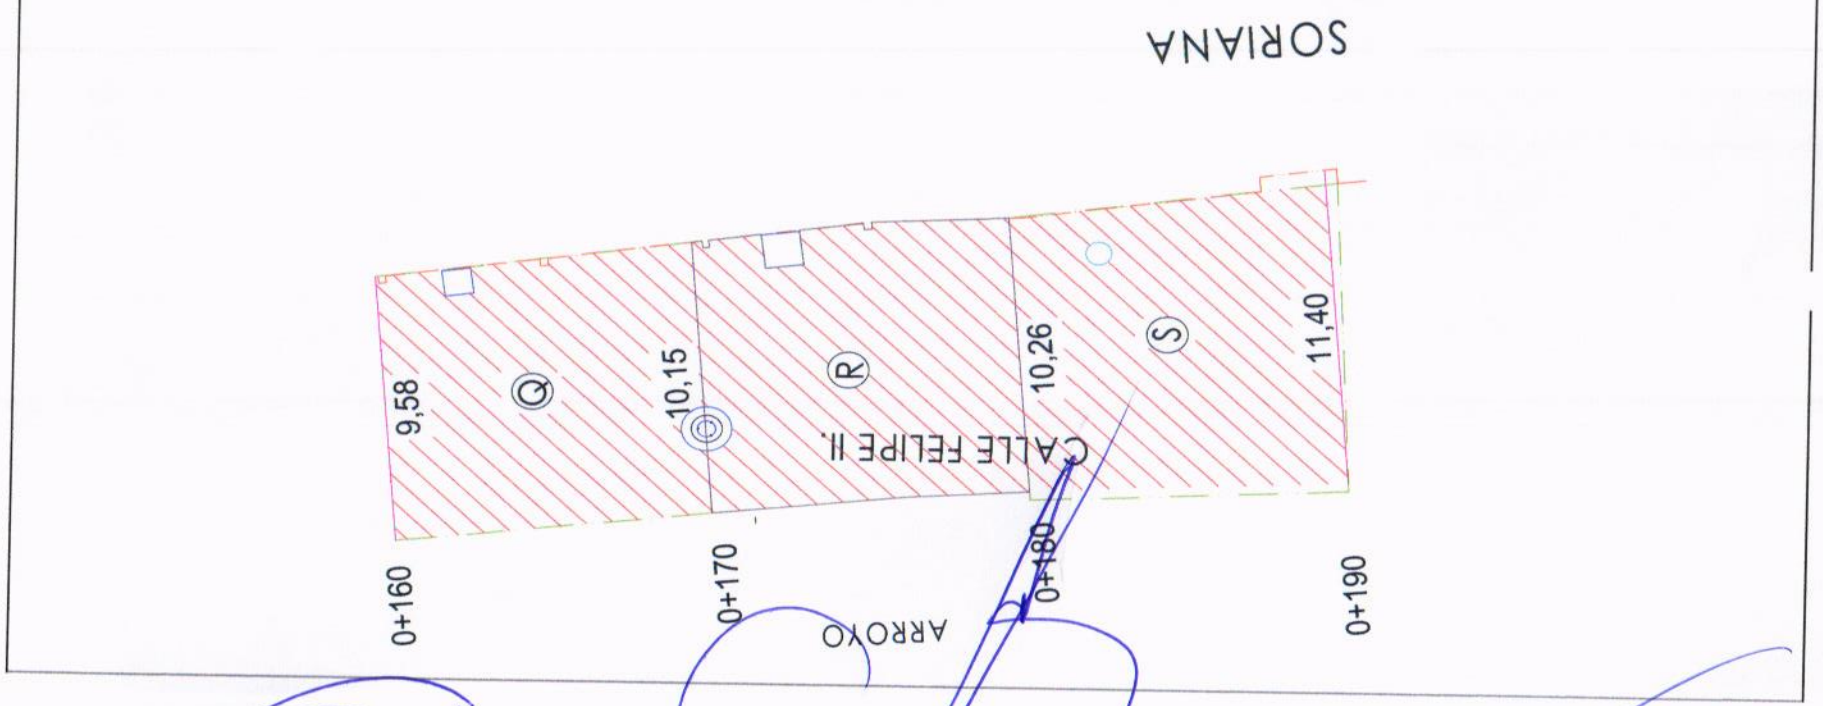

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
		FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A1 **PRELIMINARES**

D- CAR5A10 DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5.00 A 10.00 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA Y ACARREOS EN 1A, ESTACIÓN.



IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO)
		FECHA	01 DE OCTUBRE DEL 2023



D-CAR5A10.- Demolición a maquina de carpeta asfaltica de 5.00 a 10.00 cms. De espesor. Incluye mano de obra y acarreos en 1a. estación.




D-CAR5A10.- Demolición a maquina de carpeta asfaltica de 5.00 a 10.00 cms. De espesor. Incluye mano de obra y acarreos en 1a. estación.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO)
		FECHA	01 DE OCTUBRE DEL 2023

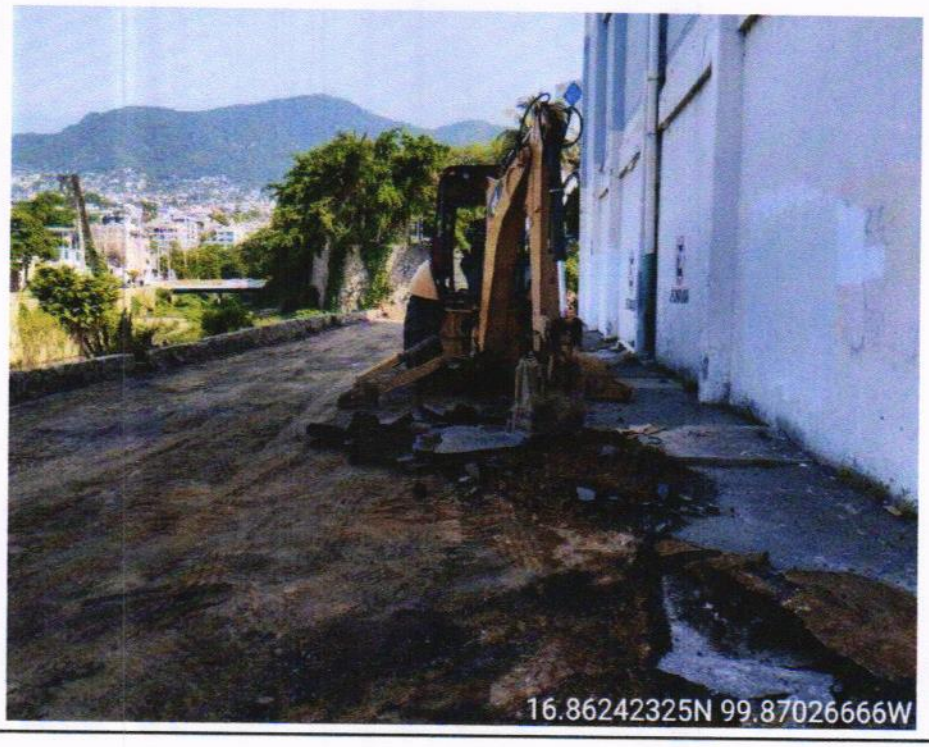

D-CAR5A10.- Demolición a maquina de carpeta asfaltica de 5.00 a 10.00 cms. De espesor. Incluye mano de obra y acarreos en 1a. estación.



D-CAR5A10.- Demolición a maquina de carpeta asfaltica de 5.00 a 10.00 cms. De espesor. Incluye mano de obra y acarreos en 1a. estación.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	NO. DE CONTRATO	MAJ-FAISMUN/426-2023/LP
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	PERIODO ESTIMADO	DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	No. ESTIMACIÓN	01 (UNO)
		FECHA	01 DE OCTUBRE DEL 2023



D-CAR5A10.- Demolición a maquina de carpeta asfaltica de 5.00 a 10.00 cms. De espesor. Incluye mano de obra y acarreos en 1a. estación.



D-CAR5A10.- Demolición a maquina de carpeta asfaltica de 5.00 a 10.00 cms. De espesor. Incluye mano de obra y acarreos en 1a. estación.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ESOR-06 REV-1

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

ACAPULCO

BIENESTAR

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	ANCHO	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A1	**PRELIMINARES**									
D-BANQU	Demolicion mecanica de banqueta de 10.00 cms. De espesor, incluye: herramienta menor, equipo y mano de obra									
	ANCHO PROMEDIO DEMOLICION BANQUETA									**LAD-IZQ.**
	LADO IZQ.									
	A.- 1.63+1.52 =3.15 /2 =**1.57**	0+006.550	0+010.000		1.57	3.45		M2	5.41	A
	B.- 1.52+1.96=3.48/2=**1.74**	0+010.000	0+020.000		1.74	10.00		M2	17.40	B
	C.- 1.96+1.74=3.70/2=**1.85**	0+020.000	0+030.000		1.85	10.00		M2	18.50	C
	D.- 1.74+1.71=3.45/2=**1.72**	0+030.000	0+040.000		1.72	10.00		M2	17.20	D
	E.-1.71+1.71=3.42/2=**1.71**	0+040.000	0+050.000		1.71	10.00		M2	17.10	E
	F.-1.71+1.76=3.47/2=**1.73**	0+050.000	0+060.000		1.73	10.00		M2	17.30	F
	G.-1.76+1.95=3.71/2=**1.85**	0+060.000	0+070.000		1.85	10.00		M2	18.50	G
	H.-1.95+2.41=4.36/2=**2.18**	0+070.000	0+080.000		2.18	10.00		M2	21.80	H
	I.-2.41+1.92=4.33/2=**2.16**	0+080.000	0+084.970		2.16	4.97		M2	10.73	I
	I'.-1.92+0.53=2.45/2=**1.22**	0+084.970	0+087.790		1.22	2.82		M2	3.44	I'
	J.-1. 90+2.03=3.93/2=**1.96**	0+096.350	0+100.000		1.96	3.65		M2	7.15	J
	K.- 2.03+2.00=4.03/2=**2.01**	0+100.000	0+110.000		2.01	10.00		M2	20.10	K
	L.- 2.00+1.84=3.84/2=**1.92**	0+110.000	0+113.200		1.92	3.20		M2	6.14	L
	L'.- 1.84+0.20=2.04/2=**1.02**	0+113.200	0+120.000		1.02	6.80		M2	6.93	L'
						SUBTOTAL HOJA 1		**M2**	**187.70**	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	N Ú M E R O S G E N E R A D O R E S		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	ANCHO	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A1	**PRELIMINARES**									
D-BANQU	Demolicion mecanica de banqueta de 10.00 cms. De espesor, incluye: herramienta menor, equipo y mano de obra									
	ANCHO PROMEDIO DEMOLICION BANQUETA									**LAD. DER.**
	LADO DER.									
	G.-0.68+0.65=1.33/2=**0.66**	0+063.380	0+070.000		0.66	6.62		M2	4.36	G
	H.-0.81+0.82=1.63/2=**0.81**	0+073.490	0+080.000		0.81	6.51		M2	5.27	H
	I.-0.82+0.89=1.71/2=**0.85**	0+080.000	0+090.000		0.85	10.00		M2	8.50	I
	T.-0.65+0.69=1.29/2=**0.67**	0+199.340	0+200.000		0.67	0.66		M2	0.44	T
	U.-0.65+1.41=2.06/2=**1.03**	0+200.000	0+210.000		1.03	10.00		M2	10.30	U
	V.-1.41+1.78=3.19/2=**1.59**	0+210.000	0+216.000		1.59	6.00		M2	9.54	V
						SUBTOTAL HOJA 2		**M2**	**38.41**	
						SUBTOTAL HOJA 1		**M2**	**187.70**	
						SUBTOTAL HOJA 2		**M2**	**38.41**	
			TOTAL M2 DE DEMOLICION MECANICA DE BANQUETA =					**M2**	**226.11**	
			EN ESTA ESTIMACIÓN SÓLO SE COBRA LA CANTIDAD DE PRESUPUESTO =					**M2**	**146.04**	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
		FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A1 **PRELIMINARES**

D-BANQU DEMOLICION MECANICA DE BANQUETA DE 10.00 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y MANO DE OBRA



IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
		FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A1 **PRELIMINARES**

D-BANQU DEMOLICION MECANICA DE BANQUETA DE 10.00 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y MANO DE OBRA



IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
		FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A1 **PRELIMINARES**

D-BANQU DEMOLICION MECANICA DE BANQUETA DE 10.00 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y MANO DE OBRA



IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
		FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A1 **PRELIMINARES**

D-BANQU DEMOLICION MECANICA DE BANQUETA DE 10.00 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y MANO DE OBRA

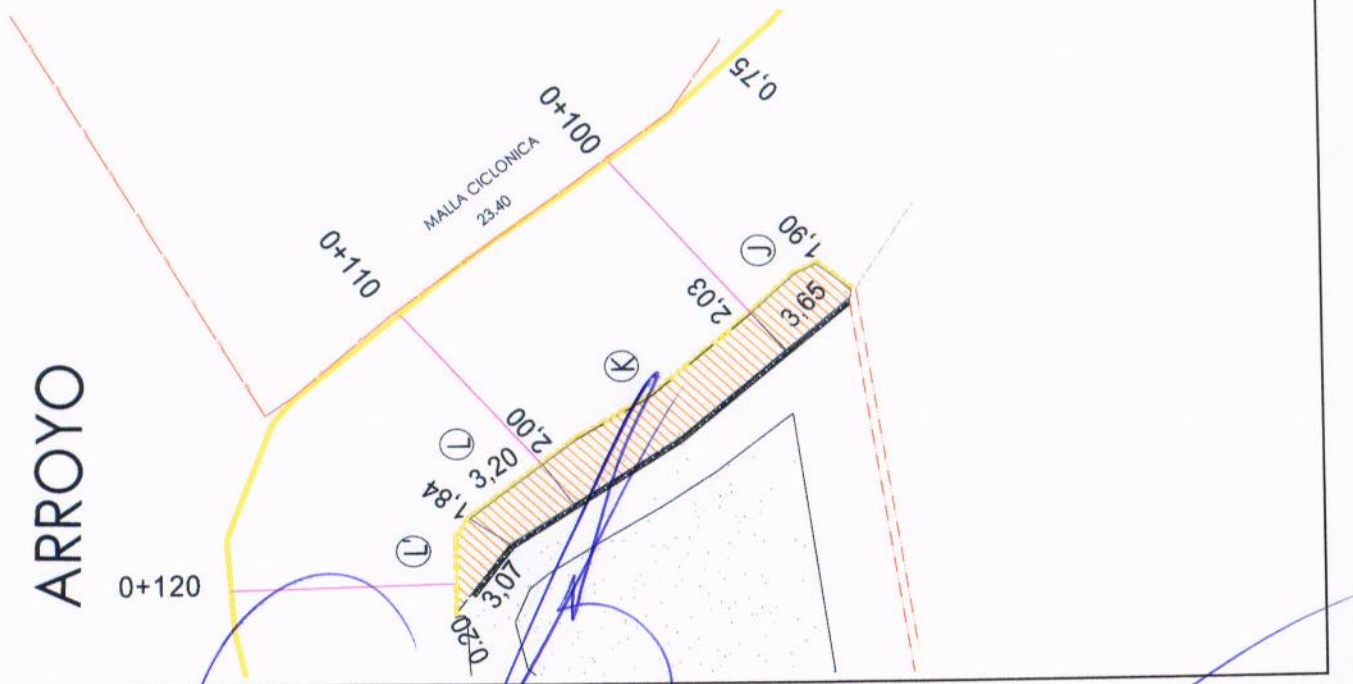

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
		FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A1 **PRELIMINARES**

D-BANQU DEMOLICION MECANICA DE BANQUETA DE 10.00 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y MANO DE OBRA



IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMÉNEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO)
		FECHA	01 DE OCTUBRE DEL 2023



D-BANQU -. Demolición mecánica de banqueta de 10 cms. de espesor incluye: herramienta menor, equipo y mano de obra.




D-BANQU -. Demolición mecánica de banqueta de 10 cms. de espesor incluye: herramienta menor, equipo y mano de obra.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO)
		FECHA	01 DE OCTUBRE DEL 2023

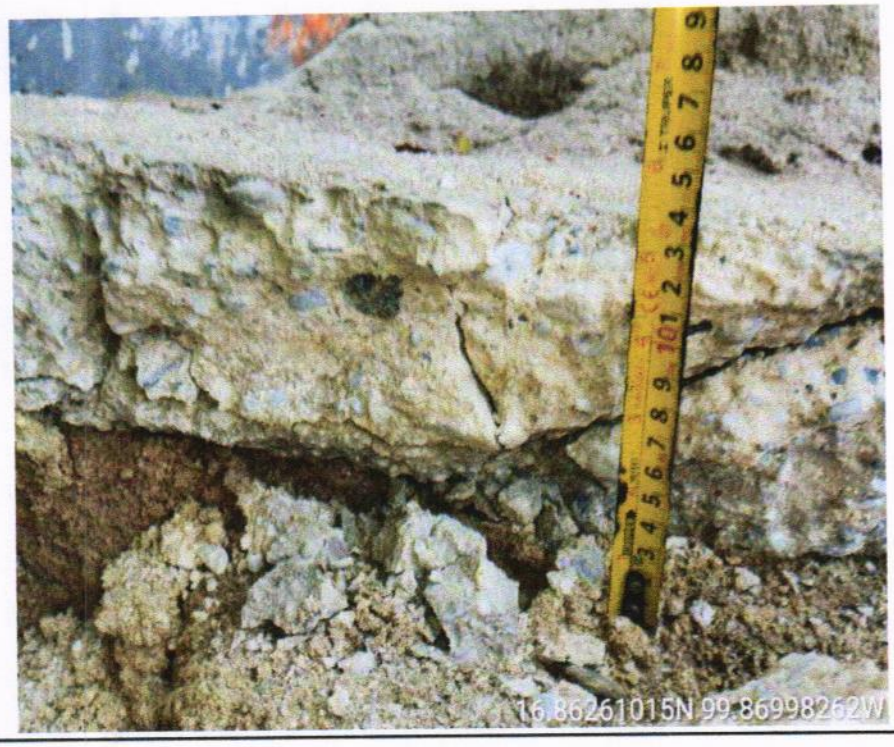

D-BANQU -. Demolición mecánica de banqueta de 10 cms. de espesor incluye: herramienta menor, equipo y mano de obra.




D-BANQU -. Demolición mecánica de banqueta de 10 cms. de espesor incluye: herramienta menor, equipo y mano de obra.


IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO)
		FECHA	01 DE OCTUBRE DEL 2023

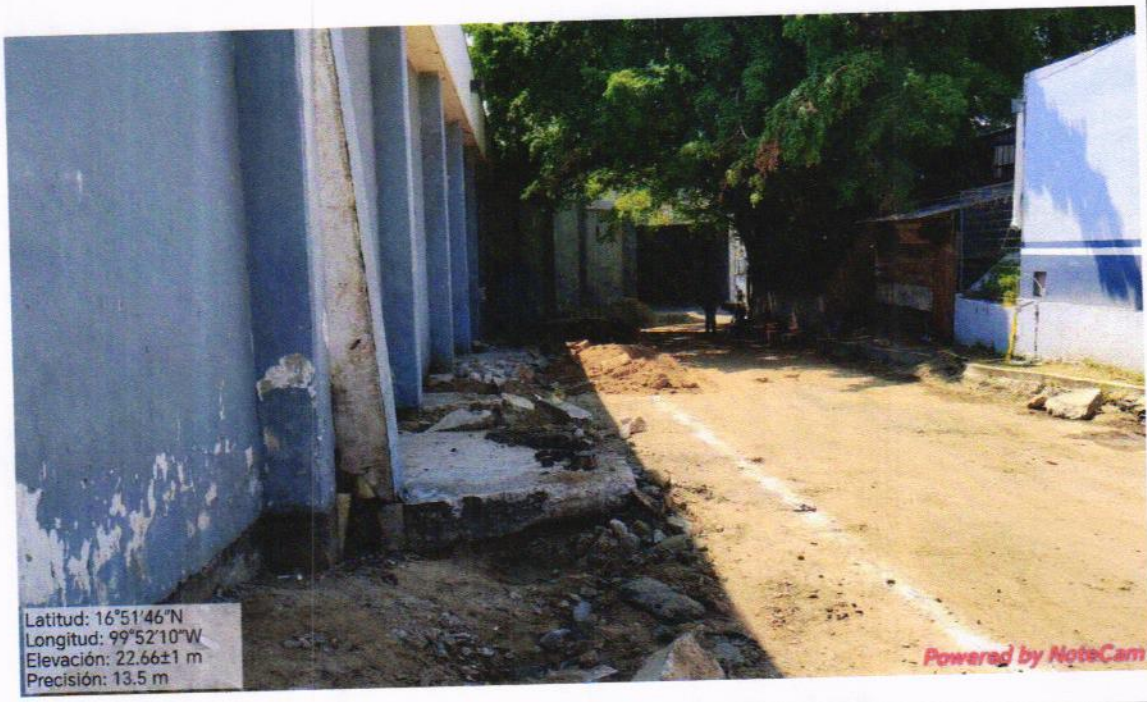

D-BANQU -. Demolición mecánica de banqueta de 10 cms. de espesor incluye: herramienta menor, equipo y mano de obra.

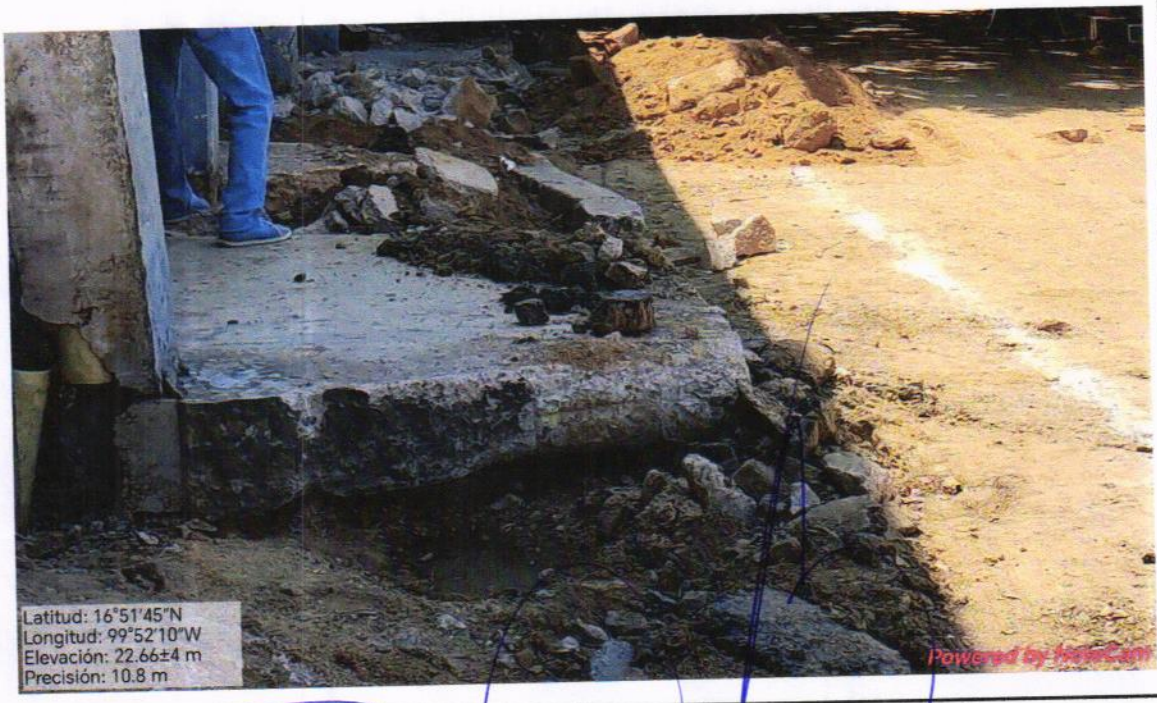


D-BANQU -. Demolición mecánica de banqueta de 10 cms. de espesor incluye: herramienta menor, equipo y mano de obra.


IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO)
		FECHA	01 DE OCTUBRE DEL 2023

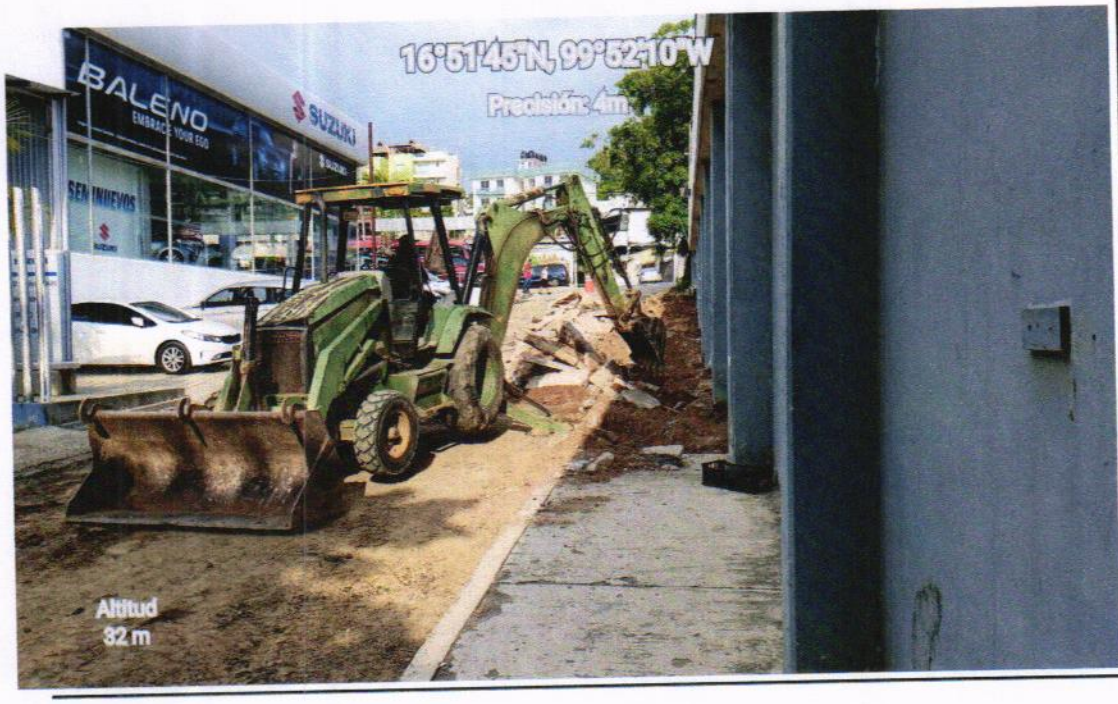

D-BANQU -. Demolición mecánica de banqueta de 10 cms. de espesor incluye: herramienta menor, equipo y mano de obra.

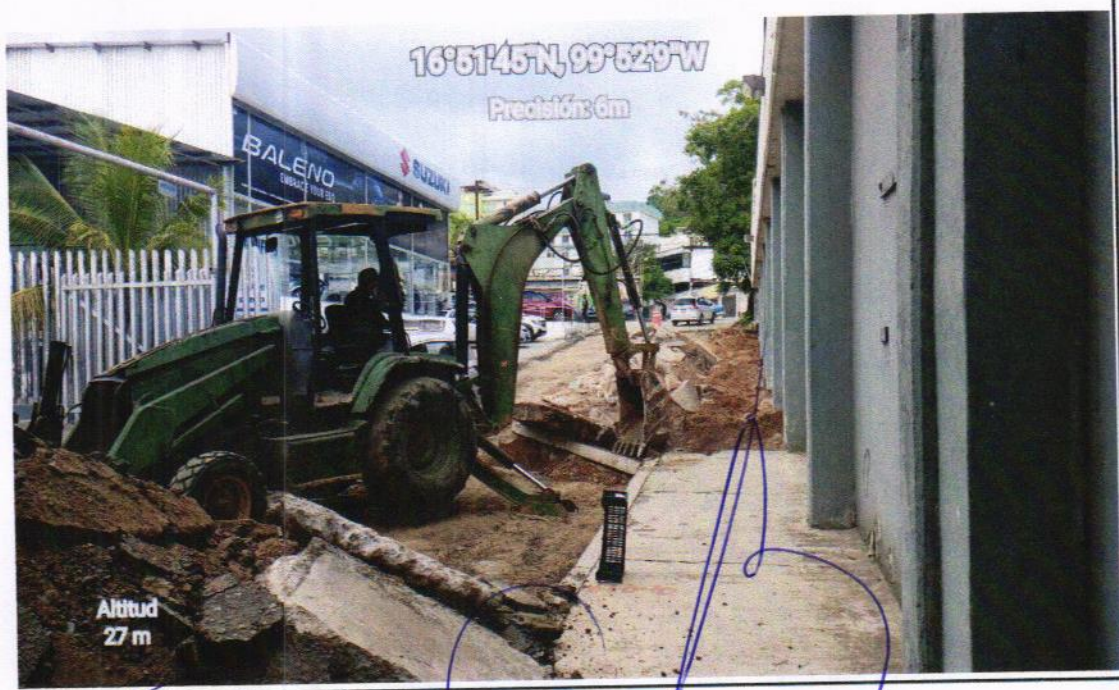

D-BANQU -. Demolición mecánica de banqueta de 10 cms. de espesor incluye: herramienta menor, equipo y mano de obra.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ESOR-06 REV-1

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A1	**PRELIMINARES**									
D-GUARM	Demolicion mecanica de guarnicón de 15x20x50 cm, . , incluye: extracion de pedaceria, mano de obra, equipo y herramienta.									
		0+010.000	0+020.000			10.00		M	10.00	Lado Der.
		0+020.000	0+030.000			10.00		M	10.00	Lado Der.
		0+030.000	0+040.000			10.00		M	10.00	Lado Der.
		0+040.000	0+050.000			10.00		M	10.00	Lado Der.
		0+050.000	0+060.000			10.00		M	10.00	Lado Der.
		0+060.000	0+070.000			10.00		M	10.00	Lado Der.
		0+070.000	0+080.000			10.00		M	10.00	Lado Der.
		0+080.000	0+090.000			10.00		M	10.00	Lado Der.
		0+090.000	0+100.000			10.00		M	10.00	Lado Der.
		0+100.000	0+110.000			10.00		M	10.00	Lado Der.
		0+110.000	0+115.460			5.46		M	5.46	Lado Der.
		0+115.460	0+120.760			5.30		M	5.30	Lado Der.
		0+120.760	0+124.690			3.93		M	3.93	Lado Der.
		0+124.690	0+128.920			4.23		M	4.23	Lado Der.
		0+128.920	0+132.700			3.78		M	3.78	Lado Der.
		0+200.000	0+210.000			10.00		M	10.00	Lado Der.
		0+210.000	0+216.000			6.00		M	6.00	Lado Der.
		0+013.000	0+020.000			7.00		M	7.00	Lado Izq.
						SUBTOTAL HOJA 1		**M**	**145.70**	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: MAJ/426	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/426-2023/LP	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A1	**PRELIMINARES**									
D-GUARM	Demolicion mecanica de guarnicón de 15x20x50 cm, . ,									
	incluye: extracion de pedaceria, mano de obra, equipo y									
	herramienta.									
		0+020.000	0+030.000			10.00		M	10.00	Lado Izq.
		0+030.000	0+040.000			10.00		M	10.00	Lado Izq.
		0+040.000	0+050.000			10.00		M	10.00	Lado Izq.
		0+050.000	0+060.000			10.00		M	10.00	Lado Izq.
		0+060.000	0+070.000			10.00		M	10.00	Lado Izq.
		0+070.000	0+080.000			10.00		M	10.00	Lado Izq.
		0+080.000	0+085.100			5.10		M	5.10	Lado Izq.
		0+085.100	0+088.090			2.99		M	2.99	Lado Izq.
		0+095.000	0+100.000			5.00		M	5.00	Lado Izq.
		0+100.000	0+110.000			10.00		M	10.00	Lado Izq.
		0+110.000	0+117.820			7.82		M	7.82	Lado Izq.
						SUBTOTAL HOJA 2		**M**	**90.91**	
					SUBTOTAL HOJA 1			**M**	**145.70**	
					SUBTOTAL HOJA 2			**M**	**90.91**	
					TOTAL M DE DEMOLICION MECANICA DE GUARNICION =			**M**	**236.61**	
					EN ESTA ESTIMACIÓN SÓLO SE COBRA LA CANTIDAD DE PRESUPUESTO =			**M**	**183.67**	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
		FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		


C R O Q U I S

A1 **PRELIMINARES**

D-GUARM DEMOLICION MECANICA DE GUARNICIÓN DE 15X20X50 CM, INCLUYE: EXTRACION DE PEDACERIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



SECCIÓN
GUARNICIÓN

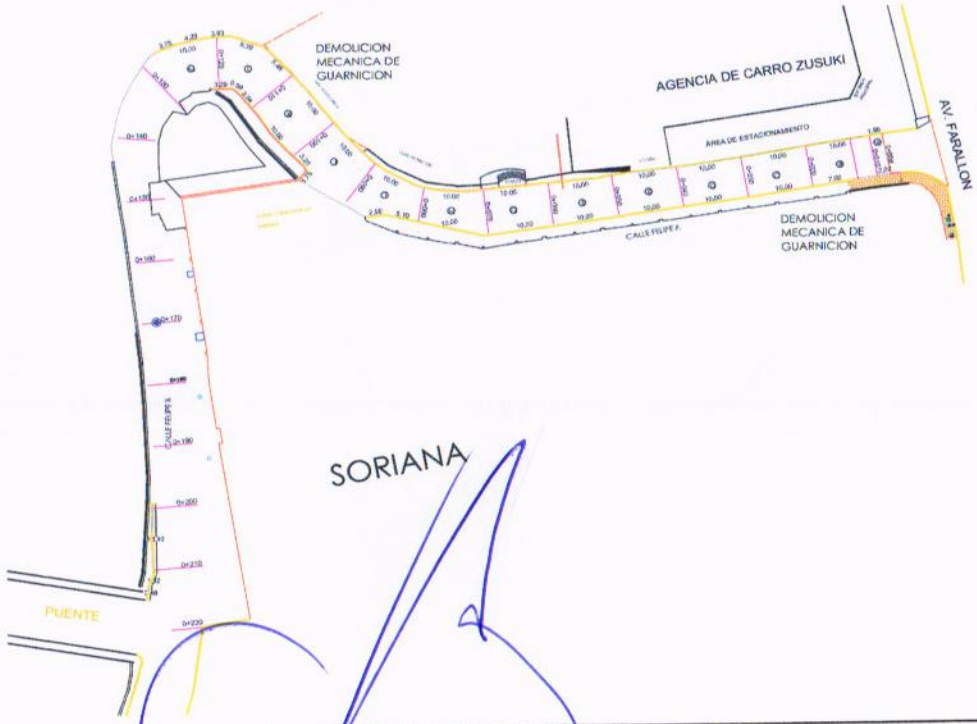

SORIANA

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
		FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A1 **PRELIMINARES**

D-GUARM DEMOLICION MECANICA DE GUARNICIÓN DE 15X20X50 CM, INCLUYE: EXTRACION DE PEDACERIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



SECCIÓN GUARNICIÓN



IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA:	**MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
	FECHA:	01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.			

C R O Q U I S

A1 **PRELIMINARES**

D-GUARM DEMOLICION MECANICA DE GUARNICIÓN DE 15X20X50 CM, INCLUYE: EXTRACION DE PEDACERIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.





SECCIÓN GUARNICIÓN

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
		FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A1 **PRELIMINARES**

D-GUARM DEMOLICION MECANICA DE GUARNICIÓN DE 15X20X50 CM, INCLUYE: EXTRACION DE PEDACERIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.





SECCIÓN GUARNICIÓN

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO)
		FECHA	01 DE OCTUBRE DEL 2023



D-GUARM .- Demolición mecánica de guarnición de 15x20x50 cm., incluye extracción de pedacería, mano de obra, equipo y herramienta.




D-GUARM .- Demolición mecánica de guarnición de 15x20x50 cm., incluye extracción de pedacería, mano de obra, equipo y herramienta.


IMEXA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO)
		FECHA	01 DE OCTUBRE DEL 2023

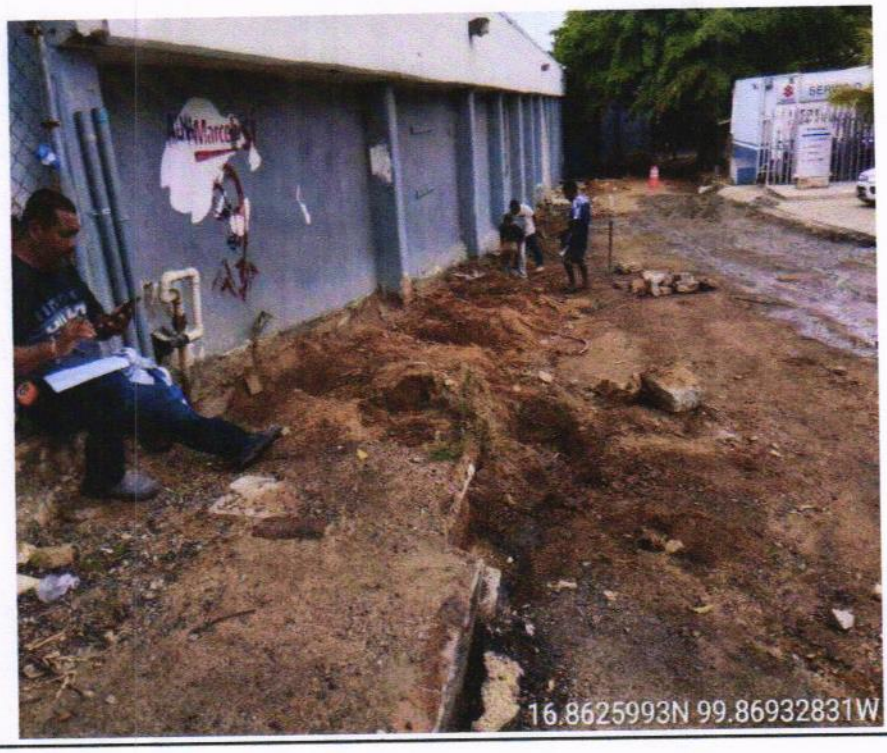

D-GUARM.- Demolición mecánica de guarnición de 15x20x50 cm., incluye extracción de pedacería, mano de obra, equipo y herramienta.

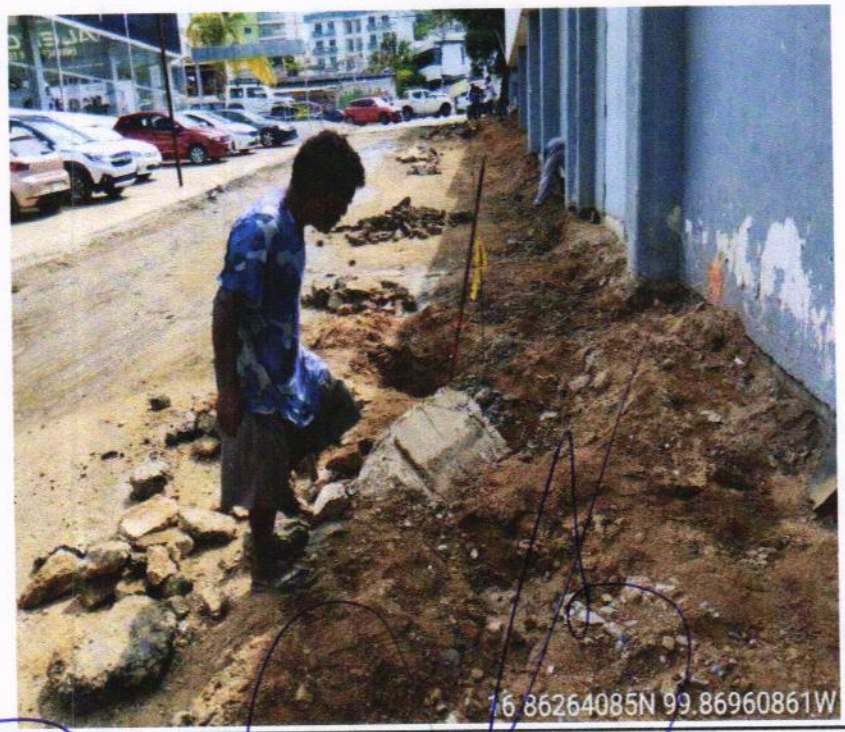

D-GUARM.- Demolición mecánica de guarnición de 15x20x50 cm., incluye extracción de pedacería, mano de obra, equipo y herramienta.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO)
		FECHA	01 DE OCTUBRE DEL 2023



D-GUARM .- Demolición mecánica de guarnición de 15x20x50 cm., incluye extracción de pedacería, mano de obra, equipo y herramienta.



D-GUARM .- Demolición mecánica de guarnición de 15x20x50 cm., incluye extracción de pedacería, mano de obra, equipo y herramienta.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ESOR-06 REV-1

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A1	**PRELIMINARES**									
EXC-001	Excavacion por medios mecánicos en cepas de 0.00 A 2.00 mts de profundidad en material tipo II incluye afine de talud y fondo, acarreos a primera estación de 20 mts									
	ANCHO PROMEDIO DE MURO				**AREA**					
	MURO 1 A1.- 3.50 + 4.20=7.70 /2 = **3.85**		**MURO 1**	A1	3.85	10.87	1.48	M3	61.93	
	A2.- 2.90+4.37=7.27/2=**3.63**			A2	3.63	10.87	2.96	M3	116.79	
	A3.- 0.56X2.96=1.65/2= **0.83**				**AREA**					
				A3	0.83	10.87		M3	9.02	TRIANGULO
	MURO 2 A1.- 4.75+6.44=11.19/2=**5.59**		**MURO 2**	A1	5.59	11.13	3.35	M3	208.42	
	A2.- 3.95+5.05=9.00/2=**4.50**			A2	4.50	11.13	2.30	M3	115.19	
	A3.- 1.86X2.30=4.27 / 2 = **2.14**				**AREA**					
				A3	2.14	11.13		M3	23.81	
	MURO 3 A1.- 3.70+4.70=8.40/2=**4.20**		**MURO 3**	A1	4.20	10.00	2.00	M3	84.00	
	A2.- 3.68+5.61=9.29/2=**4.64**			A2	4.64	10.00	3.80	M3	176.32	
	A3.- 0.73 X 3.80 = 2.69 / 2 = **1.39**				**AREA**					
				A3	1.39	10.00		M3	13.90	
	MURO 4 A1.- 1.00X0.70=**0.70**				**AREA**					
	A2.- 0.70X0.81/2=**0.28**		**MURO 4**	A1	0.70	22.00		M3	15.40	
	A3.- 0.50X0.70=0.35/2=**0.17**			A2	0.56	22.00		M3	12.32	
	A4.- 0.13X0.81=0.10/2=**0.05**			A3	0.17	22.00		M3	3.74	
	A5.-041X0.81=0.33/2=**0.17**			A4	0.05	22.00		M3	1.10	
	A6.-0.11X0.70=0.077/2=**0.038**			A5	0.17	22.00		M3	3.74	
				A6	0.04	22.00		M3	0.83	
	TOTAL M3 DE EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MUROS DE MAMP. DE PIEDRA =							**M3**	**846.51**	
	EN ESTA ESTIMACIÓN SÓLO SE COBRA LA CANTIDAD DE PRESUPUESTO =							**M3**	**699.43**	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA:	**MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
	FECHA:	01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.			

C R O Q U I S

A1 **PRELIMINARES**

EXC-001 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II INCLUYE AFINE DE TALUD Y FONDO, ACARREOS A PRIMERA ESTACIÓN DE 20 MTS.

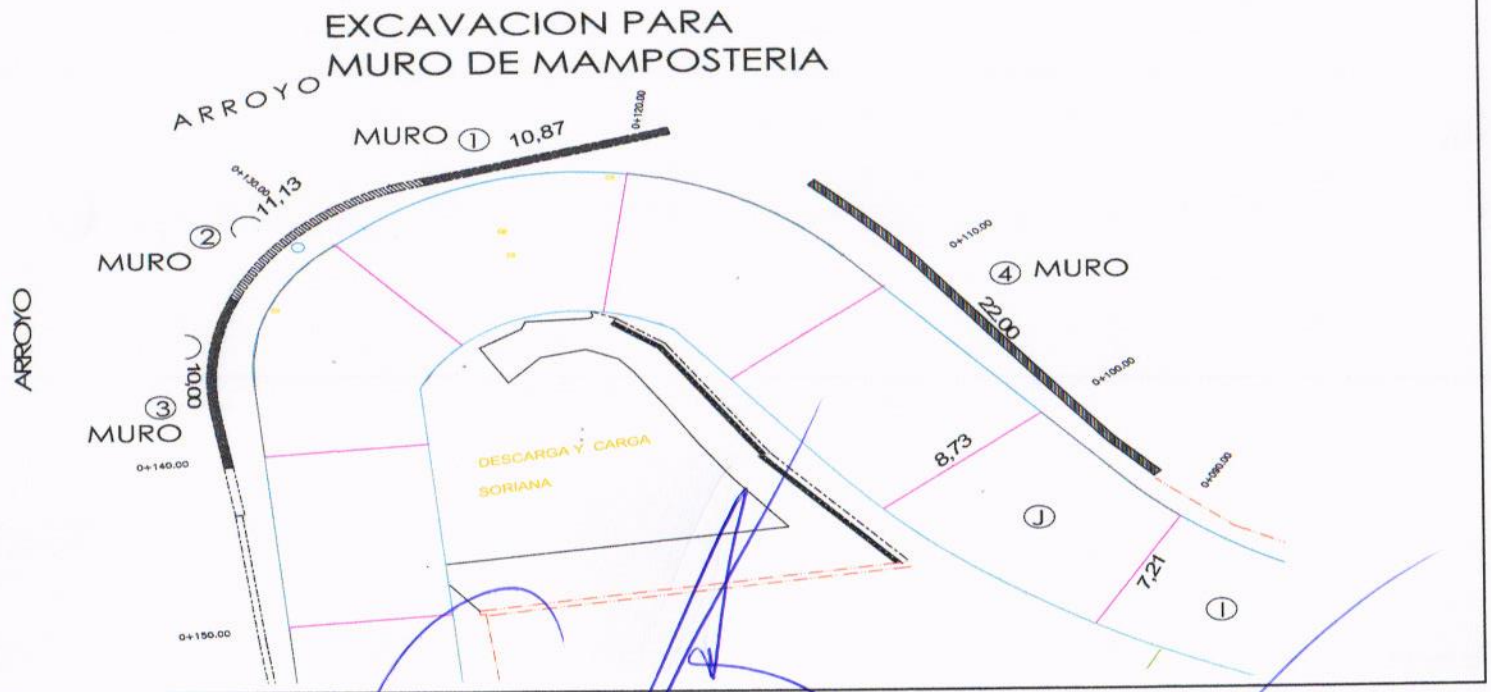

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA:	**MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
	FECHA:	01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.			

C R O Q U I S

A1 **PRELIMINARES**

EXC-001 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II INCLUYE AFINE DE TALUD Y FONDO, ACARREOS A PRIMERA ESTACIÓN DE 20 MTS.

MURO 1

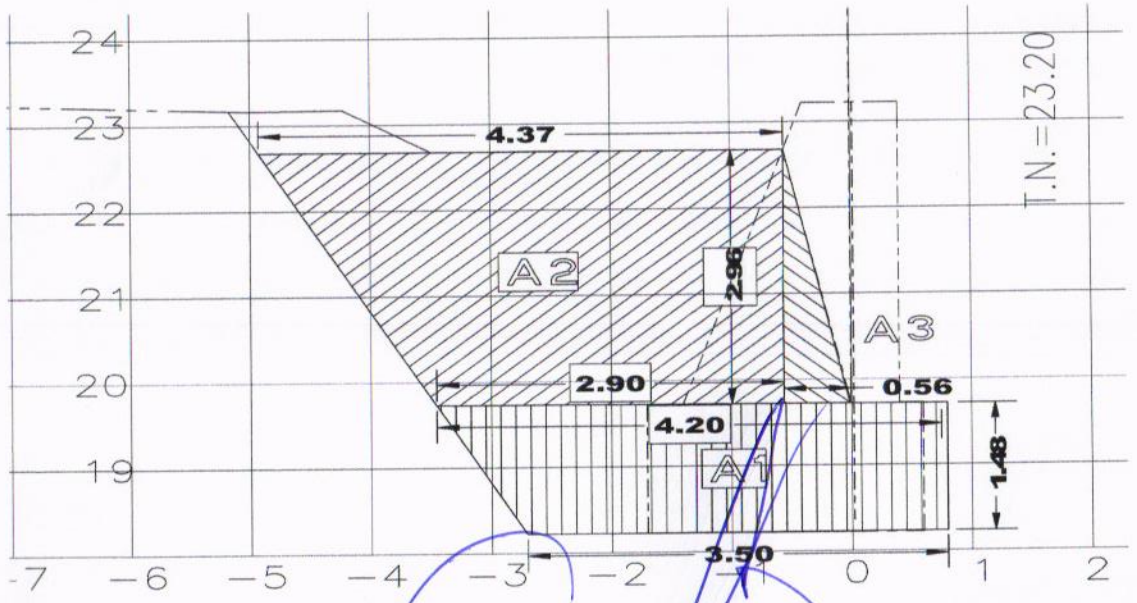

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA:	**MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
	FECHA:	01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.			

C R O Q U I S

A1 **PRELIMINARES**

EXC-001 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II INCLUYE AFINE DE TALUD Y FONDO, ACARREOS A PRIMERA ESTACIÓN DE 20 MTS.

MURO 2

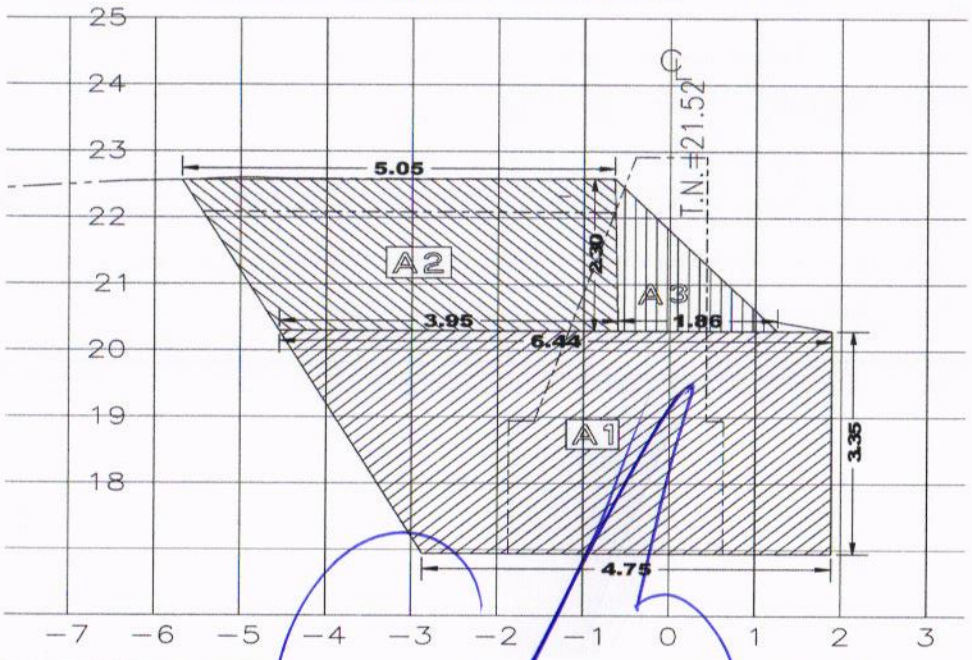

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA:	**MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
	FECHA:	01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.			

C R O Q U I S

A1 **PRELIMINARES**

EXC-001 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II INCLUYE AFINE DE TALUD Y FONDO, ACARREOS A PRIMERA ESTACIÓN DE 20 MTS.

MURO 3

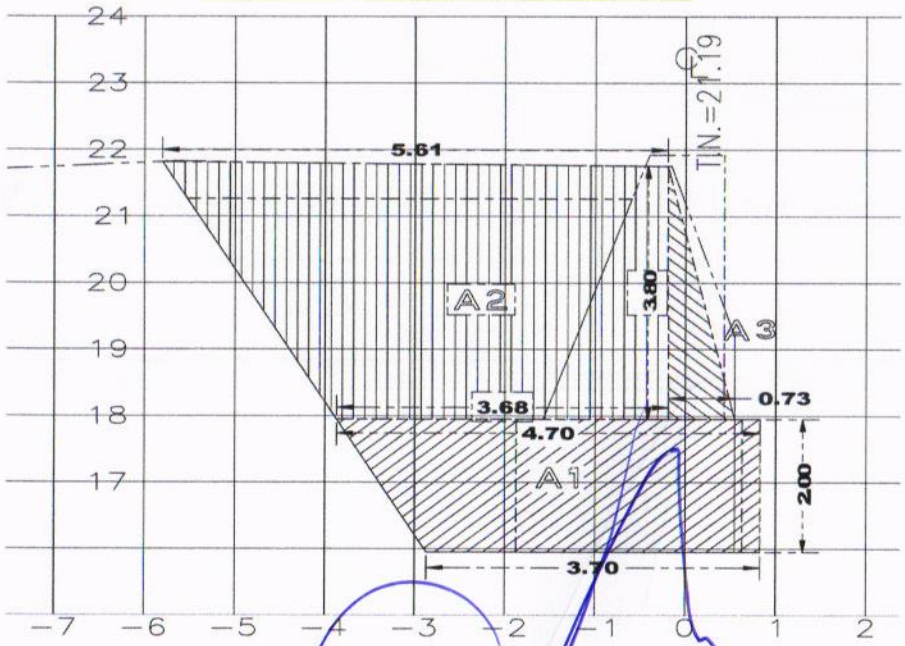

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
		FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A1 **PRELIMINARES**

EXC-001 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II INCLUYE AFINE DE TALUD Y FONDO, ACARREOS A PRIMERA ESTACIÓN DE 20 MTS.

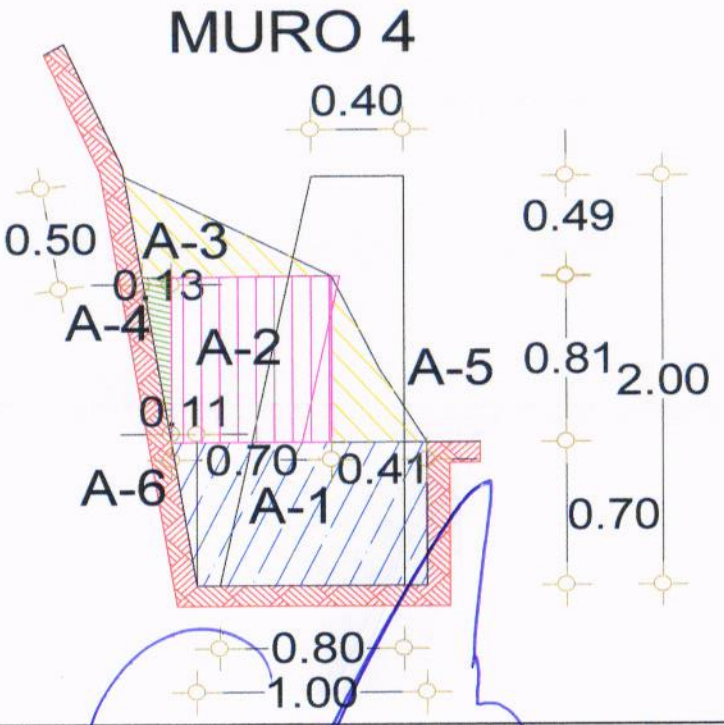

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO)
		FECHA	01 DE OCTUBRE DEL 2023

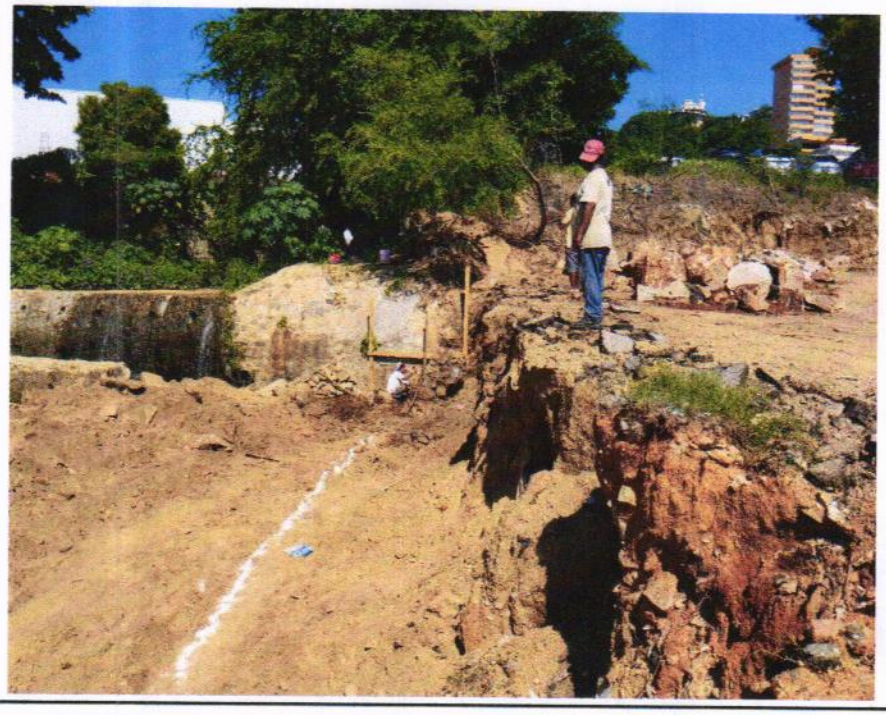

EXC-001 - Excavación por medios mecánicos en cepas de 0.00 A 2.00 mts de profundidad en material tipo II incluye afine de talud y fondo, acarreos a primera estación de 20 mts.

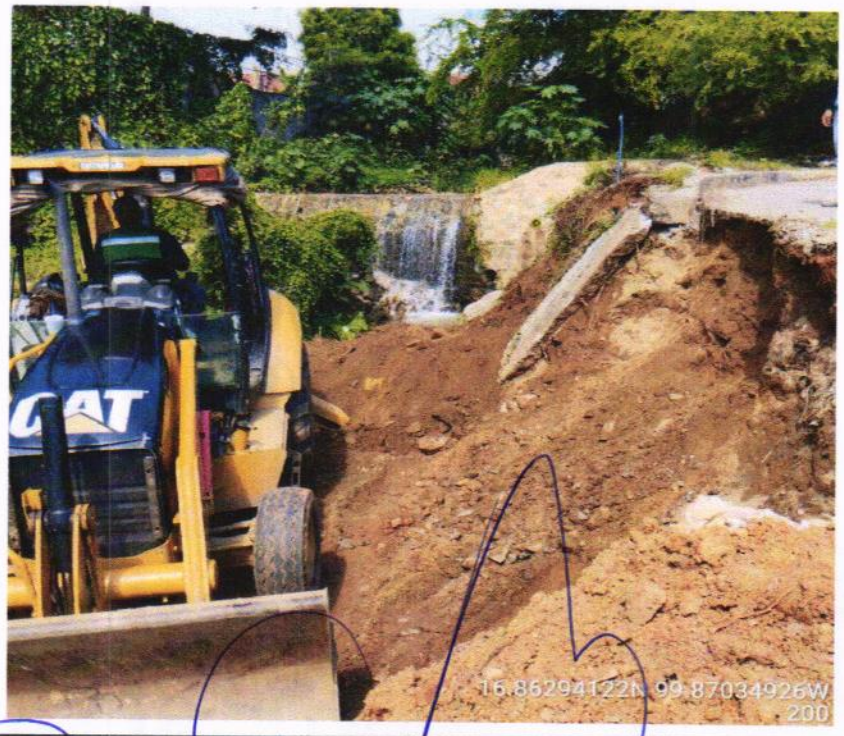

EXC-001 - Excavación por medios mecánicos en cepas de 0.00 A 2.00 mts de profundidad en material tipo II incluye afine de talud y fondo, acarreos a primera estación de 20 mts.


IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO)
		FECHA	01 DE OCTUBRE DEL 2023



EXC-001 - Excavación por medios mecánicos en cepas de 0.00 A 2.00 mts de profundidad en material tipo II incluye afine de talud y fondo, acarreos a primera estación de 20 mts.

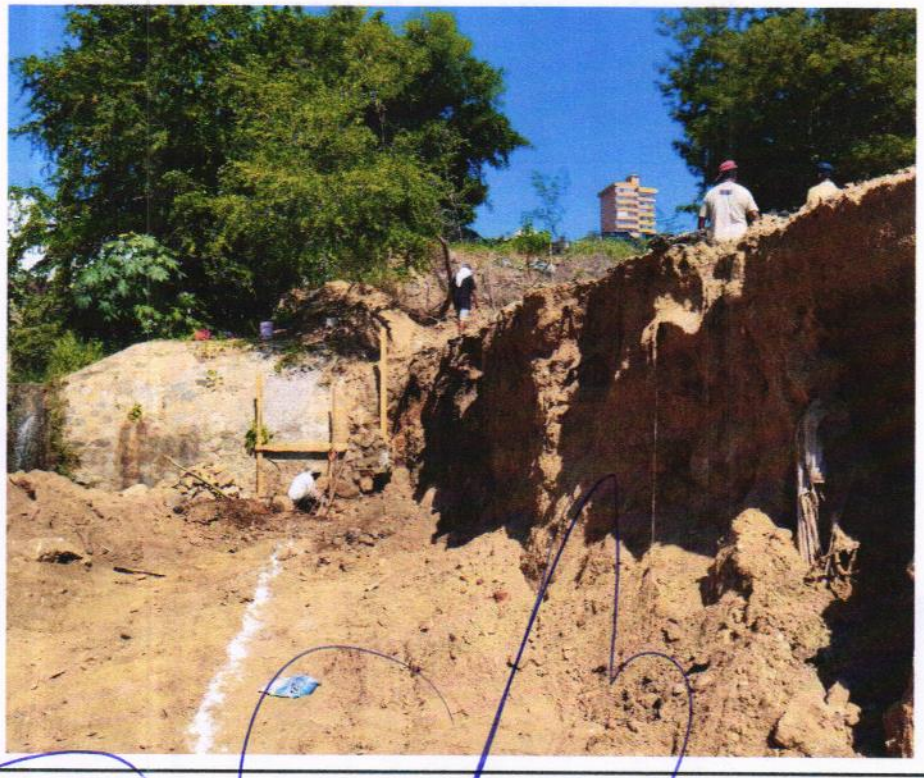

EXC-001 - Excavación por medios mecánicos en cepas de 0.00 A 2.00 mts de profundidad en material tipo II incluye afine de talud y fondo, acarreos a primera estación de 20 mts.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO)
		FECHA	01 DE OCTUBRE DEL 2023



EXC-001 - Excavación por medios mecánicos en cepas de 0.00 A 2.00 mts de profundidad en material tipo II incluye afine de talud y fondo, acarreos a primera estación de 20 mts.



EXC-001 - Excavación por medios mecánicos en cepas de 0.00 A 2.00 mts de profundidad en material tipo II incluye afine de talud y fondo, acarreos a primera estación de 20 mts.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO)
		FECHA	01 DE OCTUBRE DEL 2023



EXC-001 - Excavación por medios mecánicos en cepas de 0.00 A 2.00 mts de profundidad en material tipo II incluye afine de talud y fondo, acarreos a primera estación de 20 mts.



EXC-001 - Excavación por medios mecánicos en cepas de 0.00 A 2.00 mts de profundidad en material tipo II incluye afine de talud y fondo, acarreos a primera estación de 20 mts.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A1	**PRELIMINARES**									
9-0139	Relleno de material producto de excavacion compactado con pison de mano y agua en capas de 20 cms, de espesor incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.									
					AREA					
	ANCHO PROMEDIO DE RELLENO			A1	2.32	10.87	5.31	M3	133.90	
	MURO 1 A1.- 1.00 + 3.65=4.65 /2 = **2.32**		**RELLENO MURO 1**	A2	0.79	10.87	3.31	M3	28.42	
	A2.- 0.30+1.28=1.58/2=**0.79**									
				A3	0.20	10.87	2.00	M3	4.34	
	MURO 2 A1.- 1.00 + 3.57=4.57 /2 = **2.28**			A1	2.28	11.13	5.14	M3	130.43	
	A2.- 0.30+1.23=1.53/2=**0.76**		**RELLENO MURO 2**	A2	0.76	11.13	3.14	M3	26.56	
				A3	0.20	11.13	2.00	M3	4.45	
					SUBTOTAL HOJA 1			**M3**	**328.10**	
					SUBTOTAL HOJA 1			**M3**	**328.10**	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A1	**PRELIMINARES**									
9-0139	Relleno de material producto de excavacion compactado con pison de mano y agua en capas de 20 cms, de espesor incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.									
	ANCHO PROMEDIO DE RELLENO									
	MURO 3 A1.- 1.00+3.57=4.57/2=**2.28**		**RELLENO MURO 3**	A1	2.28	10.00	5.14	M3	117.19	
	A2.- 0.30+1.20=1.50/2=0.75			A2	0.75	10.00	3.14	M3	23.55	
				A3	0.20	10.00	2.00	M3	4.00	
	MURO 4 A1.- 0.10+0.60=0.70/2=**0.35**		**RELLENO MURO 4**	A1	0.35	22.00	2.00	M3	15.40	
				A2	0.10	22.00	0.70	M3	1.54	
					SUBTOTAL HOJA 2			**M3**	**161.68**	
					SUBTOTAL HOJA 1			**M3**	**328.10**	
					SUBTOTAL HOJA 2			**M3**	**161.68**	
	TOTAL M3 DE RELLENO POR MEDIOS MECANICOS EN MUROS DE MAMP. DE PIEDRA =							**M3**	**489.78**	
	EN ESTA ESTIMACIÓN SÓLO SE COBRA LA CANTIDAD DE PRESUPUESTO =							**M3**	**420.29**	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA:	**MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
	FECHA:	01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.			

C R O Q U I S

A1 **PRELIMINARES**

9-0139 RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.

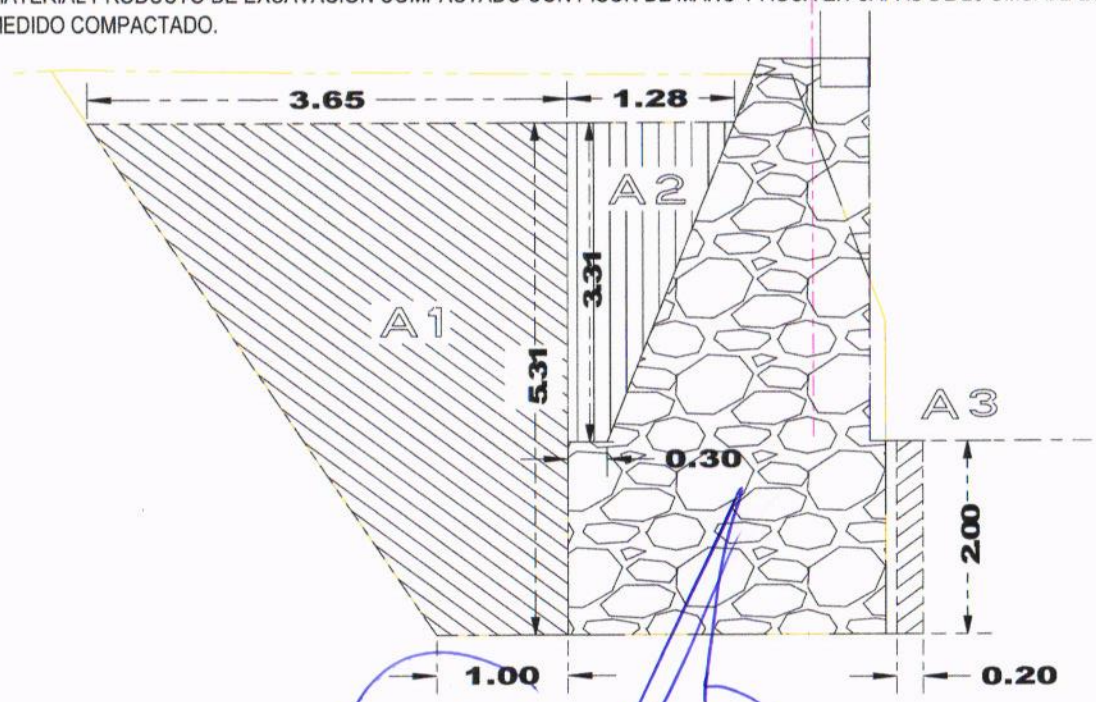

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
		FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A1 **PRELIMINARES**

9-0139 RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.

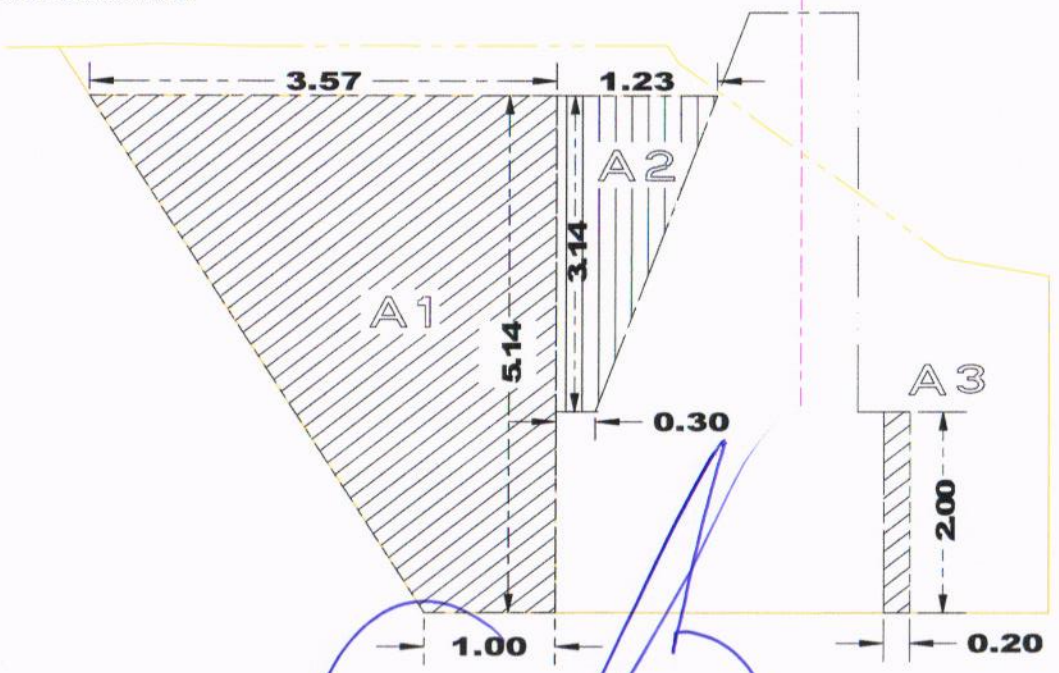

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA:	**MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
	FECHA:	01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.			

C R O Q U I S

A1 **PRELIMINARES**

9-0139 RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.

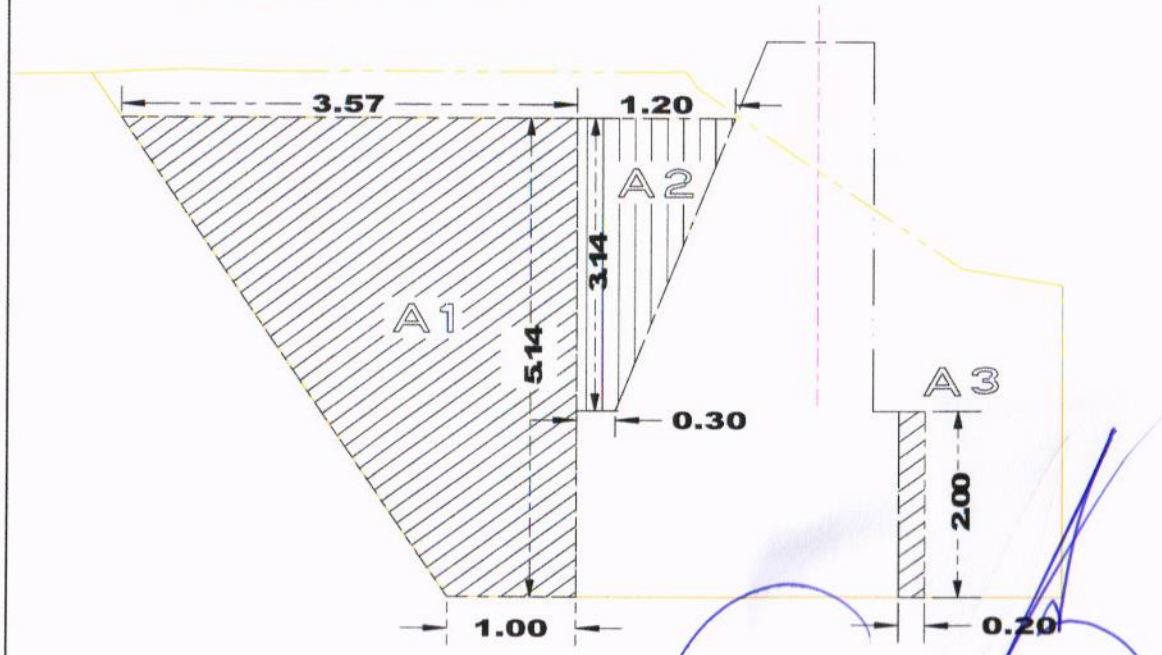

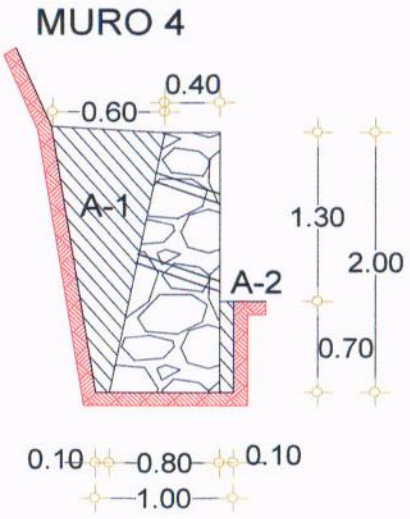

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
		FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A1 **PRELIMINARES**

9-0139 RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.

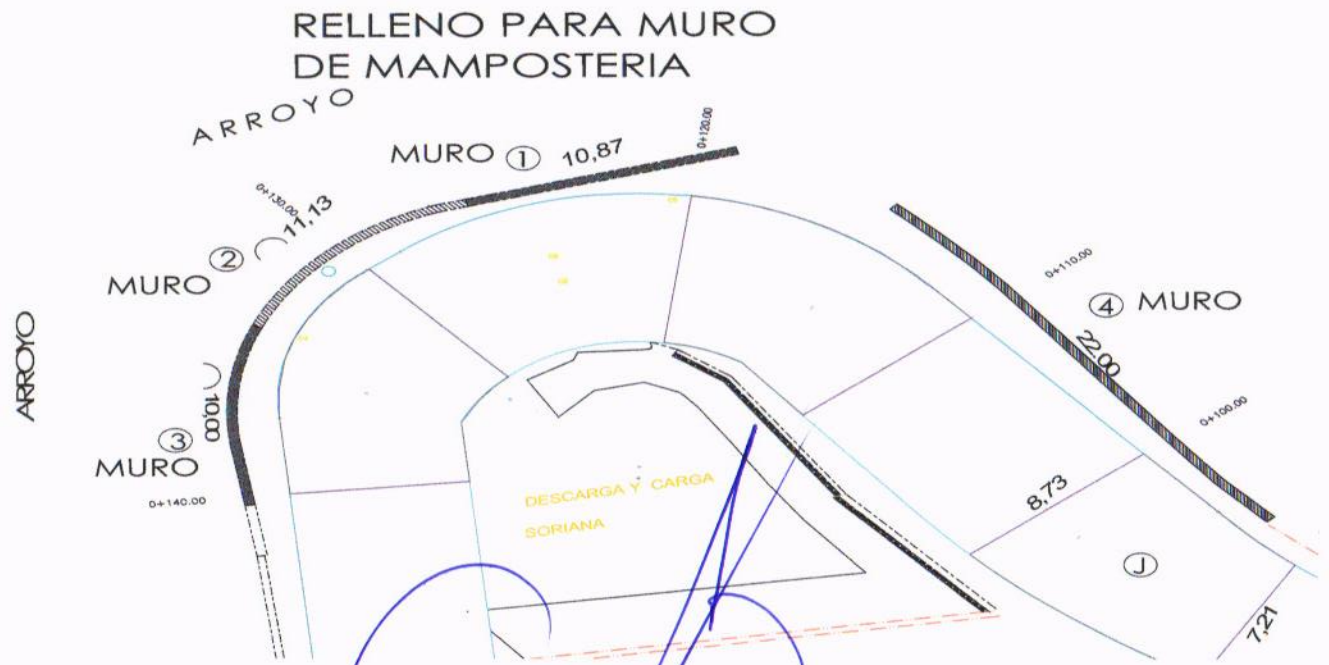

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO)
		FECHA	01 DE OCTUBRE DEL 2023



9-0139 - Relleno de material producto de excavación compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor, incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.

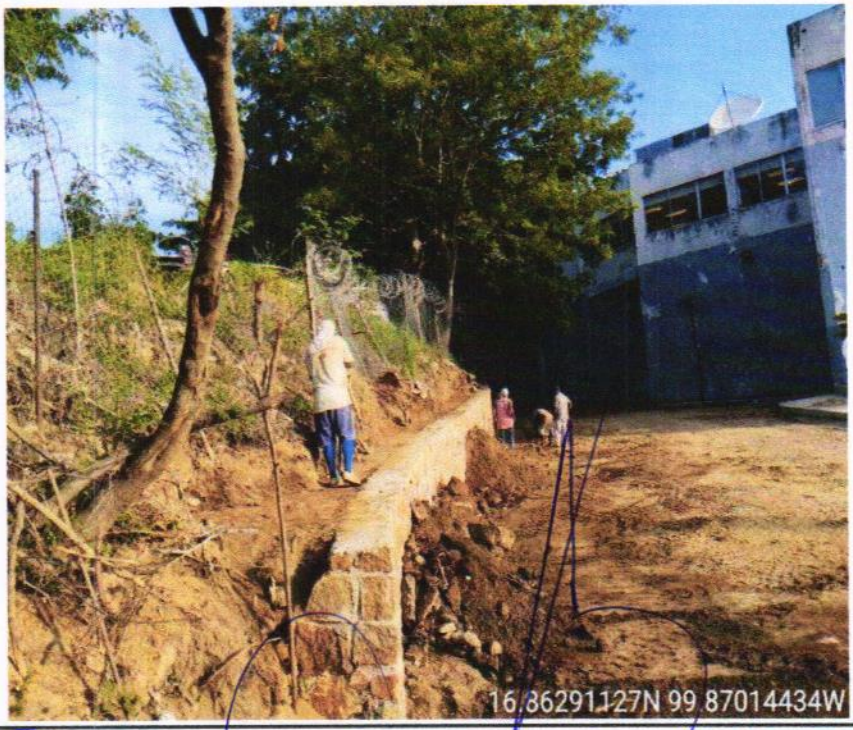

9-0139 - Relleno de material producto de excavación compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor, incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A2	**TERRACERIAS**									
32-0466	Afine y compactación en banquetas, andadores y plazas a mano incluye acarreos a primera estación.									
	ANCHO PROMEDIO									**LADO DERECHO**
	LAD.DER.									
	E.- 0.54+0.66=1.2/2=**0.60**	0+047.210	0+050.000		0.60	2.79		M2	1.67	E
	F.-0.66+1.48=2.14/2=**1.07**	0+050.000	0+055.890		1.07	5.89		M2	6.30	F
	F'.-1.48+1.06=2.54/2=**1.27**	0+055.890	0+060.000		1.27	4.11		M2	5.22	F'
	G.- 1.06+0.70=1.70/2=**0.88**	0+060.000	0+070.000		0.88	10.00		M2	8.80	G
	H.- 0.70+0.68=1.38/2=**0.69**	0+070.000	0+080.000		0.69	10.00		M2	6.90	H
	I.- 0.68+0.93=1.61/2=**0.80**	0+080.000	0+090.000		0.80	10.00		M2	8.00	I
	J.- 0.93+1.44=2.37/2=**1.18**	0+090.000	0+100.000		1.18	10.00		M2	11.80	J
	K.- 1.44+1.75=3.19/2=**1.59**	0+100.000	0+110.000		1.59	10.00		M2	15.90	K
	LAD. IZQ.									**LADO IZQUIERDO**
	A.- 1.58+1.51=3.09/2=1.54	0+006.440	0+010.000		1.54	3.56		M2	5.48	A
	B.- 1.51+1.89=3.40/2=1.70	0+010.000	0+020.000		1.70	10.00		M2	17.00	B
	C.- 1.89+1.43=3.32/2=1.66	0+020.000	0+030.000		1.66	10.00		M2	16.60	C
	D.- 1.43+1.38=2,81/2=1.40	0+030.000	0+040.000		1.40	10.00		M2	14.00	D
	E.- 1.38+1.03.=2.41/2=1.20	0+040.000	0+050.000		1.20	10.00		M2	12.00	E
	F.- 1.03+0.84=1.87/2=0.93	0+050.000	0+060.000		0.93	10.00		M2	9.30	F
	G.- 0.84+1.75=2.59/2=1.29	0+060.000	0+070.000		1.29	10.00		M2	12.90	G
	H.- 1.75+1.61=3.36/2=1.68	0+070.000	0+080.000		1.68	10.00		M2	16.80	H
	I.- 1.61+1.21=2.82/2=1.41	0+080.000	0+087.710		1.41	7.71		M2	10.87	I
							TOTAL	**M2**	**179.55**	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
		FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A2 **TERRACERIAS**

32-0466 Afine y compactación en banquetas, andadores y plazas a mano incluye acarreos a primera estación.



IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
		FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A2 **TERRACERIAS**

32-0466 Afine y compactación en banquetas, andadores y plazas a mano incluye acarreos a primera estación.



IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S				
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
		FECHA:	01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.			

C R O Q U I S

A2 **TERRACERIAS**

32-0466 Afine y compactación en banquetas, andadores y plazas a mano incluye acarreos a primera estación.

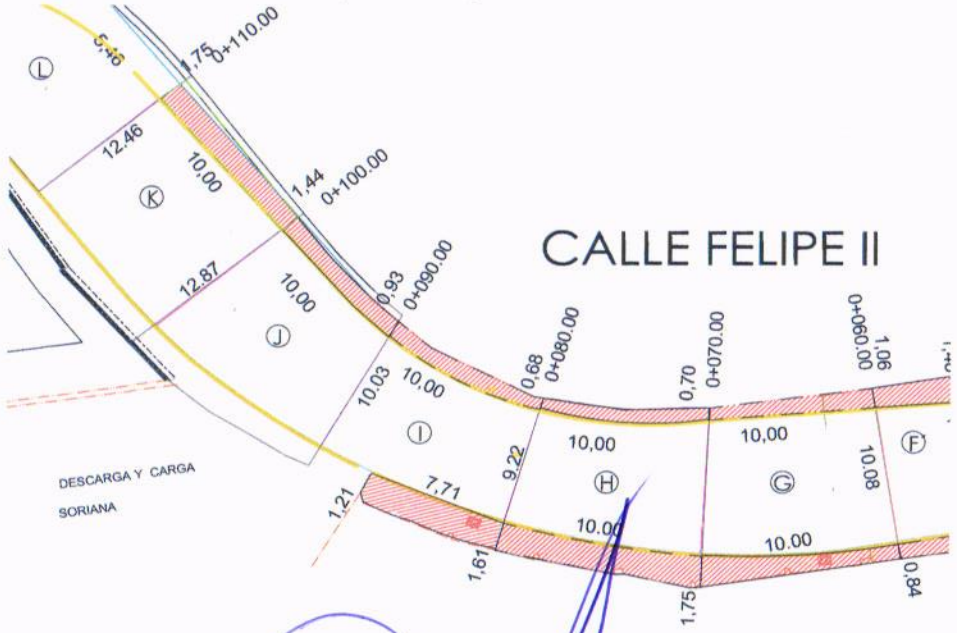

SORIANA.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO)
		FECHA	01 DE OCTUBRE DEL 2023



32-0466 .- AFINE Y COMPACTACIÓN EN BANQUETAS, ANDADORES Y PLAZAS A MANO INCLUYE ACARREOS A PRIMERA ESTACIÓN.

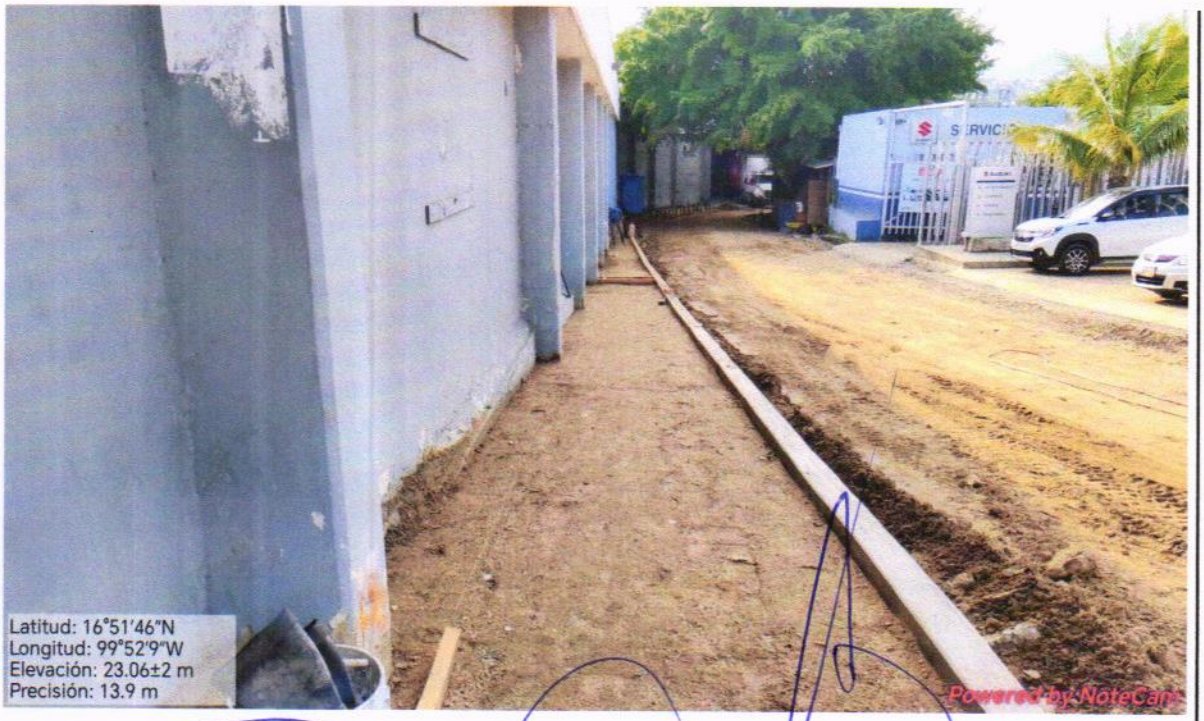


32-0466 .- AFINE Y COMPACTACIÓN EN BANQUETAS, ANDADORES Y PLAZAS A MANO INCLUYE ACARREOS A PRIMERA ESTACIÓN.


IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO)
		FECHA	01 DE OCTUBRE DEL 2023

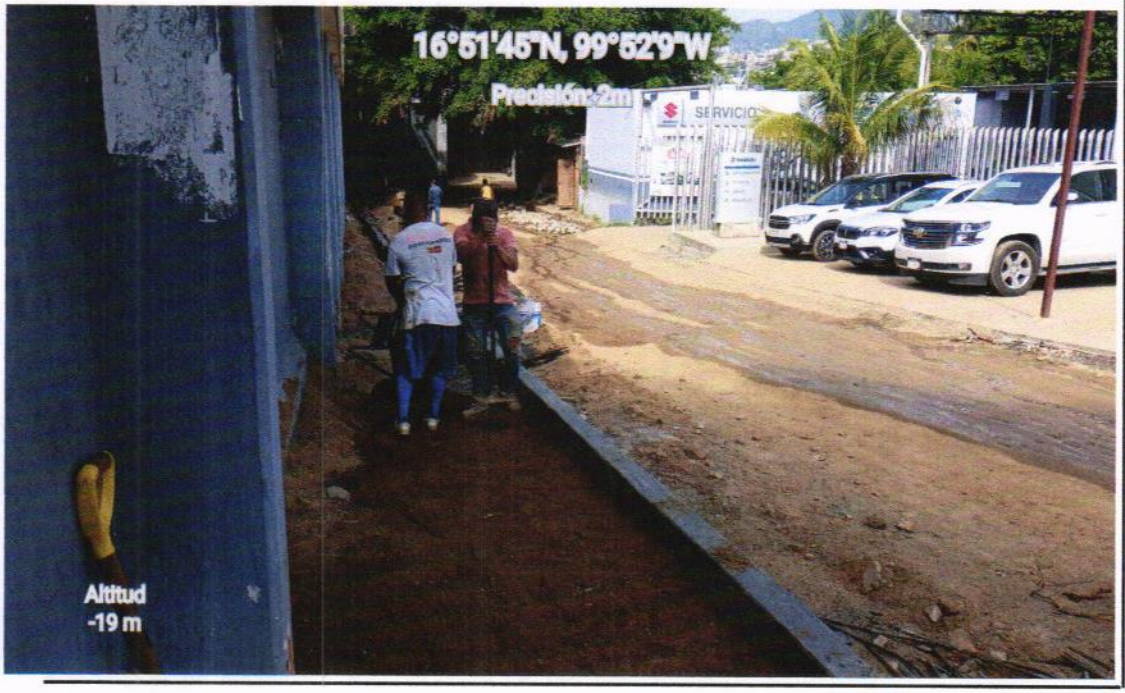

32-0466 .- AFINE Y COMPACTACIÓN EN BANQUETAS, ANDADORES Y PLAZAS A MANO INCLUYE ACARREOS A PRIMERA ESTACIÓN.

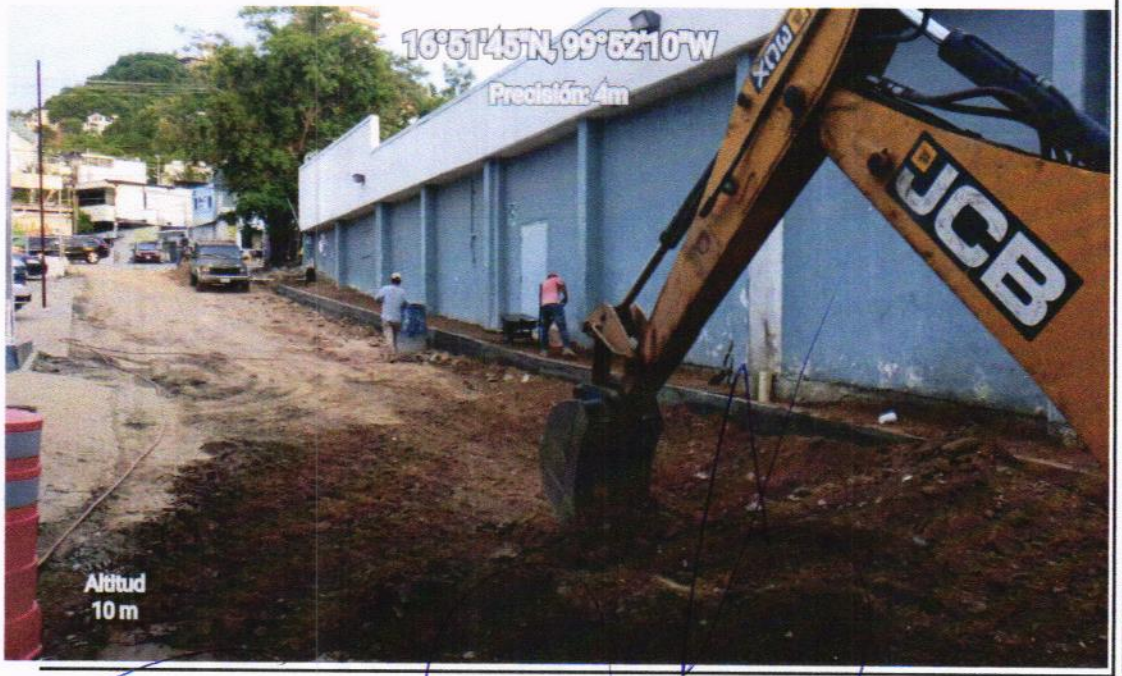

32-0466 .- AFINE Y COMPACTACIÓN EN BANQUETAS, ANDADORES Y PLAZAS A MANO INCLUYE ACARREOS A PRIMERA ESTACIÓN.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

E50R-06 REV-1

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A3	**INSTALACION HIDRAULICA**									
4-0080	Excavacion a mano en material tipo II-A, en seco y barreta de 0.00 a 2.00 mts, de profundidad, depositando el producto de excavacion a orilla de cepa, cualquier zona.									
		RED AGUA POTABLE								
		0+007.000	0+086.000		0.60	79.00	0.80	M3	37.92	tuberia 3" PVC
	TOTAL M3 DE EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II PARA COLOC. DE TUBERIA PVC DE 3" =							**M3**	**37.92**	
	EN ESTA ESTIMACIÓN SÓLO SE COBRA LA CANTIDAD DE PRESUPUESTO =							**M3**	**16.00**	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
		FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A3 **INSTALACION HIDRAULICA**

4-0080 EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO LL-A, EN SECO Y BARRETA DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, DEPOSITANDO EL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A ORILLA DE CEPA, CUALQUIER ZONA..



IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO)
		FECHA	01 DE OCTUBRE DEL 2023

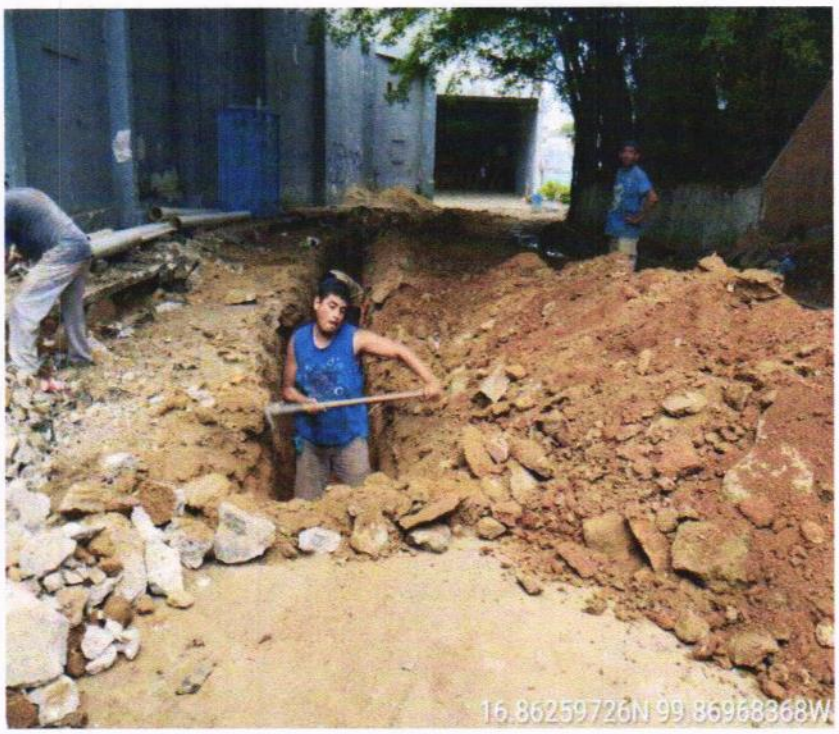

4-0080.- Excavación a mano en material tipo II-A, en seco y barreta de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad, depositando el producto de excavación a orilla de cepa, cualquier zona.

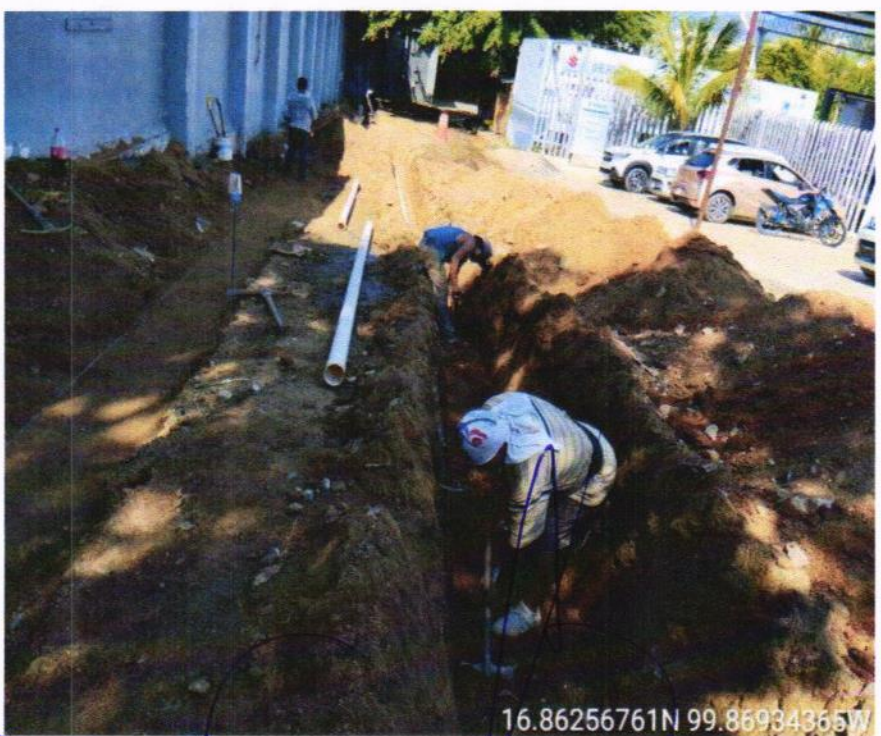

4-0080.- Excavación a mano en material tipo II-A, en seco y barreta de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad, depositando el producto de excavación a orilla de cepa, cualquier zona.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO)
		FECHA	01 DE OCTUBRE DEL 2023



4-0080.- Excavación a mano en material tipo II-A, en seco y barreta de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad, depositando el producto de excavación a orilla de cepa, cualquier zona.



4-0080.- Excavación a mano en material tipo II-A, en seco y barreta de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad, depositando el producto de excavación a orilla de cepa, cualquier zona.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A3	**INSTALACION HIDRAULICA**									
9-0139	Relleno de material producto de excavacion compactado con pison de mano y agua en capas de 20 cms, de espesor, incluye acarreo de la obra, medido compactado.									
		RED AGUA POTABLE								
		0+007.000	0+086.000		0.60	79.00	0.70	M3	33.18	tuberia principal
					AREA					
		DESCUENTO DE TUBO DE 3"			-0.0043	79.00		M3	-0.3397	
		0.0375X 0.0375=0.0014								
		0.0014X3.1416=**0.0043**								
	TOTAL M3 DE RELLENO DE MATERIAL PROD. DE EXC. EN CEPA DE TUBERIA DE 3" =							**M3**	**32.84**	
	EN ESTA ESTIMACIÓN SÓLO SE COBRA LA CANTIDAD DE PRESUPUESTO =							**M3**	**15.80**	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
		FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A3 **INSTALACION HIDRAULICA**

9-0139 RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS, DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.

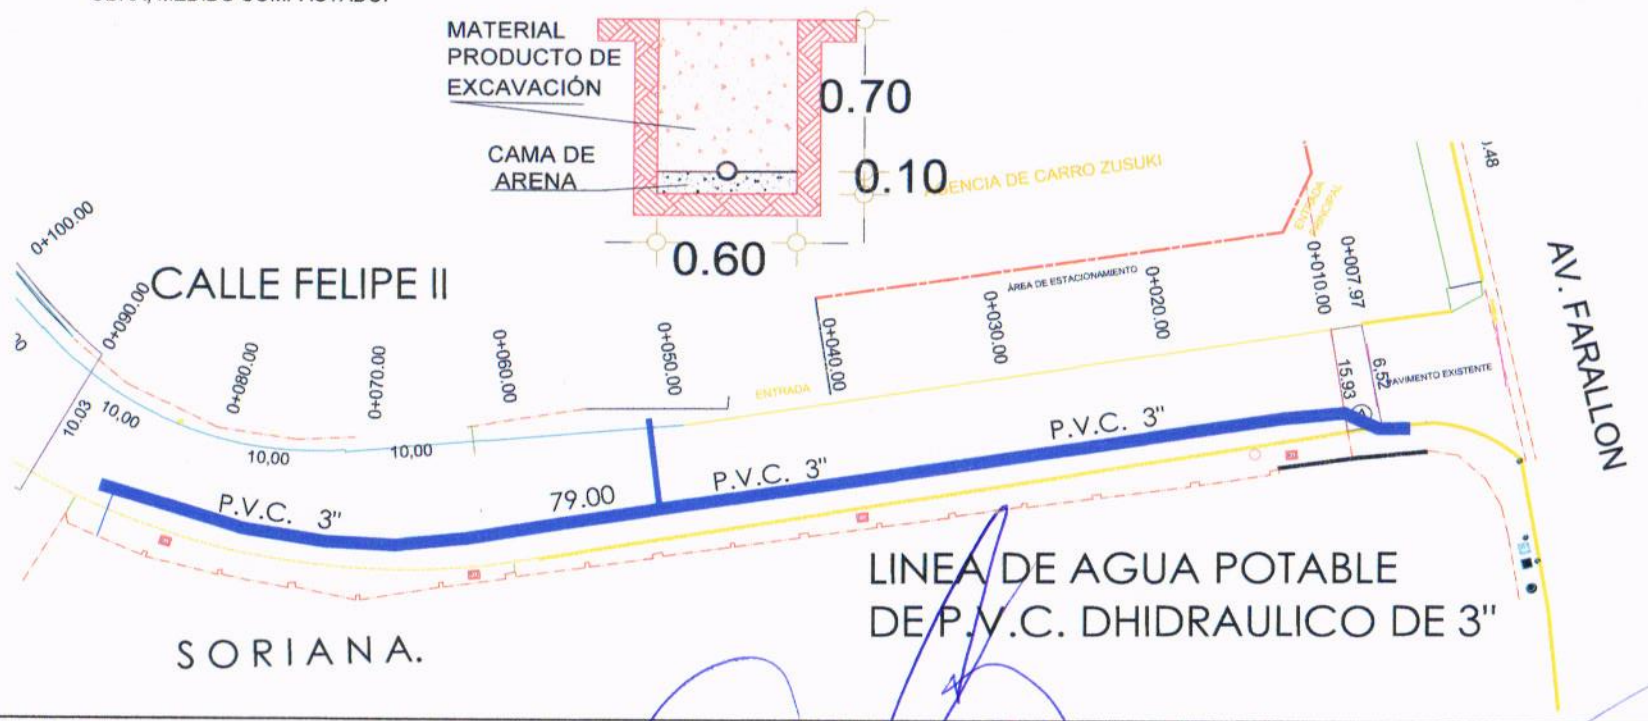

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/426-2023/LP
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO)
		FECHA	01 DE OCTUBRE DEL 2023



9-0139.- Relleno de material producto de excavación compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor, incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.



9-0139.- Relleno de material producto de excavación compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor, incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO)
		FECHA	01 DE OCTUBRE DEL 2023



9-0139.- Relleno de material producto de excavación compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor, incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.



9-0139.- Relleno de material producto de excavación compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor, incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A3	**INSTALACION HIDRAULICA**									
5-0102	Cama de arena para instalacion de tuberia incluye; acostillado, acarreo de material en 1ra, estacion, material, y mano de obra.									
		RED AGUA POTABLE								
		0+007.000	0+086.000		0.60	79.00	0.10	M3	4.74	tuberia principal
	TOTAL M3 DE CAMA DE ARENA EN CEPA PARA COLOC. DE TUBERIA DE 3" =							**M3**	**4.74**	
	EN ESTA ESTIMACIÓN SÓLO SE COBRA LA CANTIDAD DE PRESUPUESTO =							**M3**	**2.00**	-

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
		FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A3 **INSTALACION HIDRAULICA**

5-0102 CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA INCLUYE; ACOSTILLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1RA, ESTACION, MATERIAL, Y MANO DE OBRA.

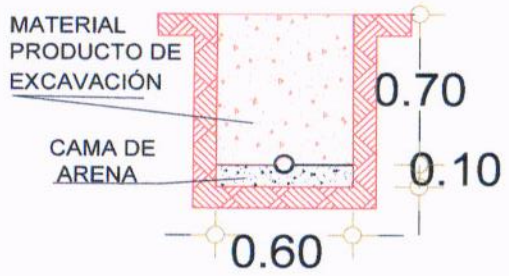

cama de arena



IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO)
		FECHA	01 DE OCTUBRE DEL 2023

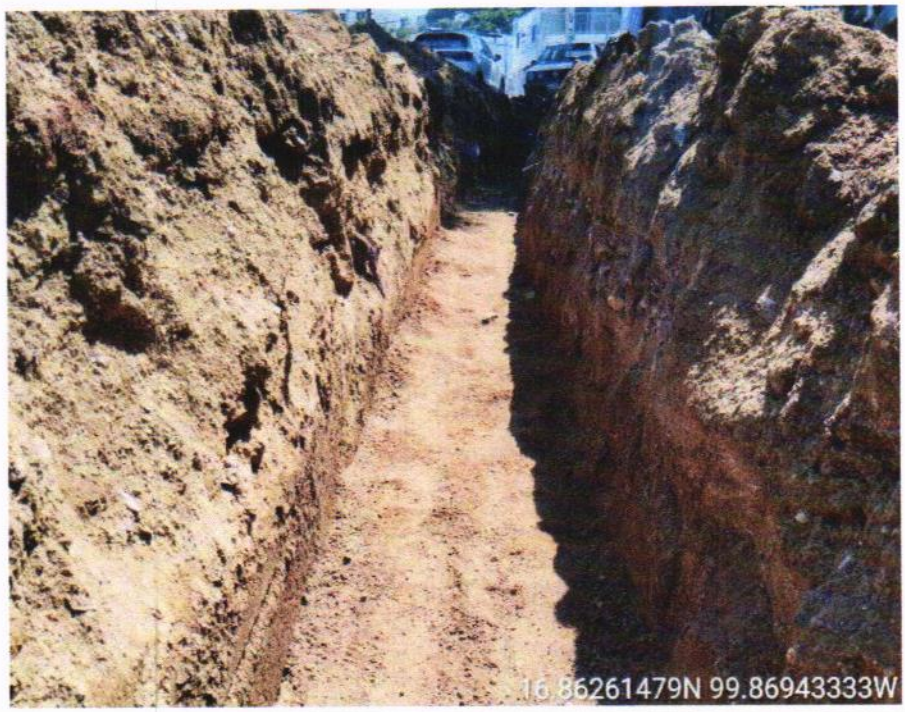

5-0102.- Cama de arena para instalación de tubería incluye: acostillado, acarreo de material en 1ra. estación, material y mano de obra.



5-0102.- Cama de arena para instalación de tubería incluye: acostillado, acarreo de material en 1ra. estación, material y mano de obra.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO)
		FECHA	01 DE OCTUBRE DEL 2023



5-0102.- Cama de arena para instalación de tubería incluye: acostillado, acarreo de material en 1ra. estación, material y mano de obra.



5-0102.- Cama de arena para instalación de tubería incluye: acostillado, acarreo de material en 1ra. estación, material y mano de obra.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: MAJ/426	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/426-2023/LP	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A3	INSTALACIÓN HIDRAULICA									
27-0412	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 3" CED. RD. 26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE; SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRASNECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.									
		0+007.000	0+086.000			79.00		ML	79.00	tuberia principal
					TOTAL ML DE TUBERIA DE 3" =			ML	79.00	
					EN ESTA ESTIMACIÓN SÓLO SE COBRA LA CANTIDAD DE PRESUPUESTO =			ML	50.00	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA:	**MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
	FECHA:	01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.			

C R O Q U I S

A3 **INSTALACION HIDRAULICA**

27-0412 SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 3" CED. RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

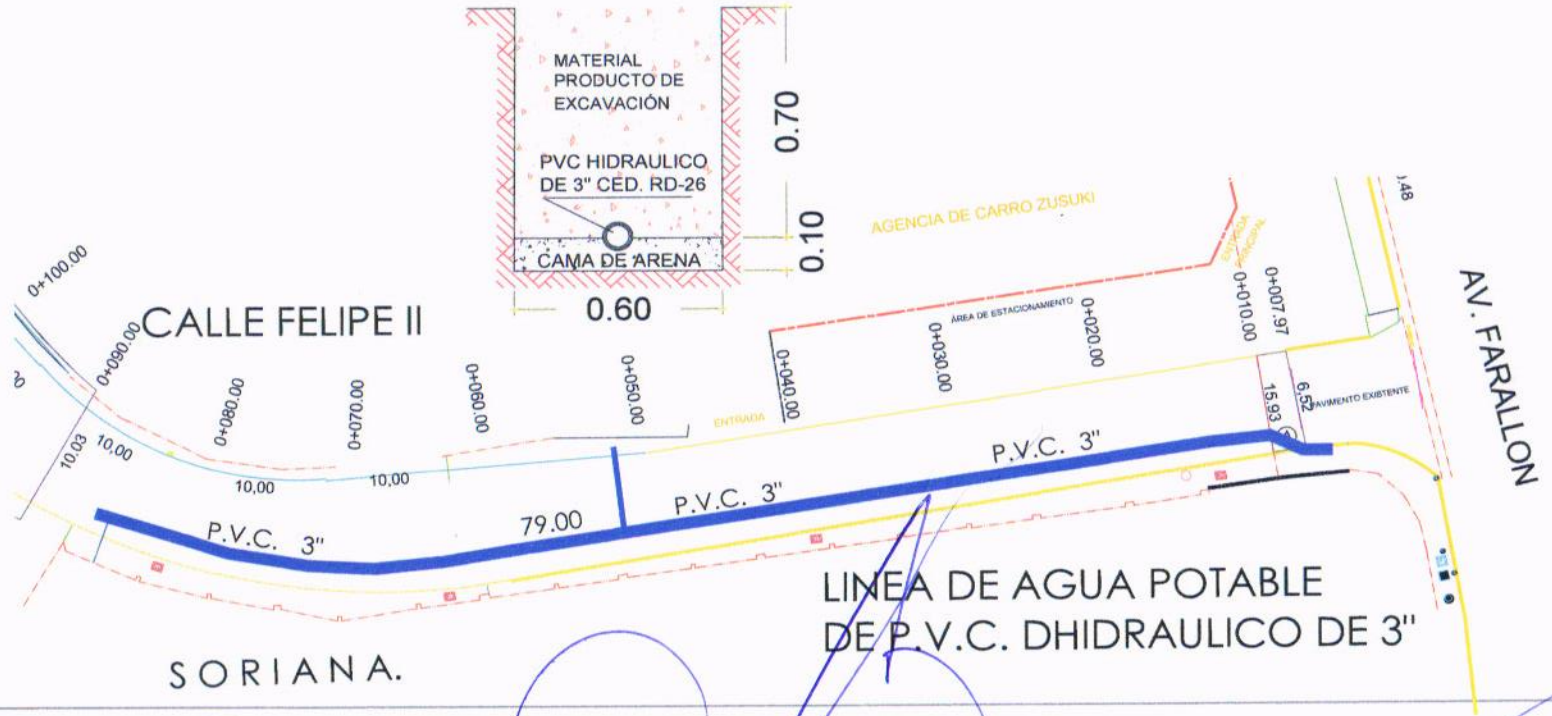

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO)
		FECHA	01 DE OCTUBRE DEL 2023



27-0412.- SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 3" CED. RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.



27-0412 -SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 3" CED. RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO)
		FECHA	01 DE OCTUBRE DEL 2023



27-0412 -SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 3" CED. RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.




27-0412 -SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 3" CED. RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO)
		FECHA	01 DE OCTUBRE DEL 2023

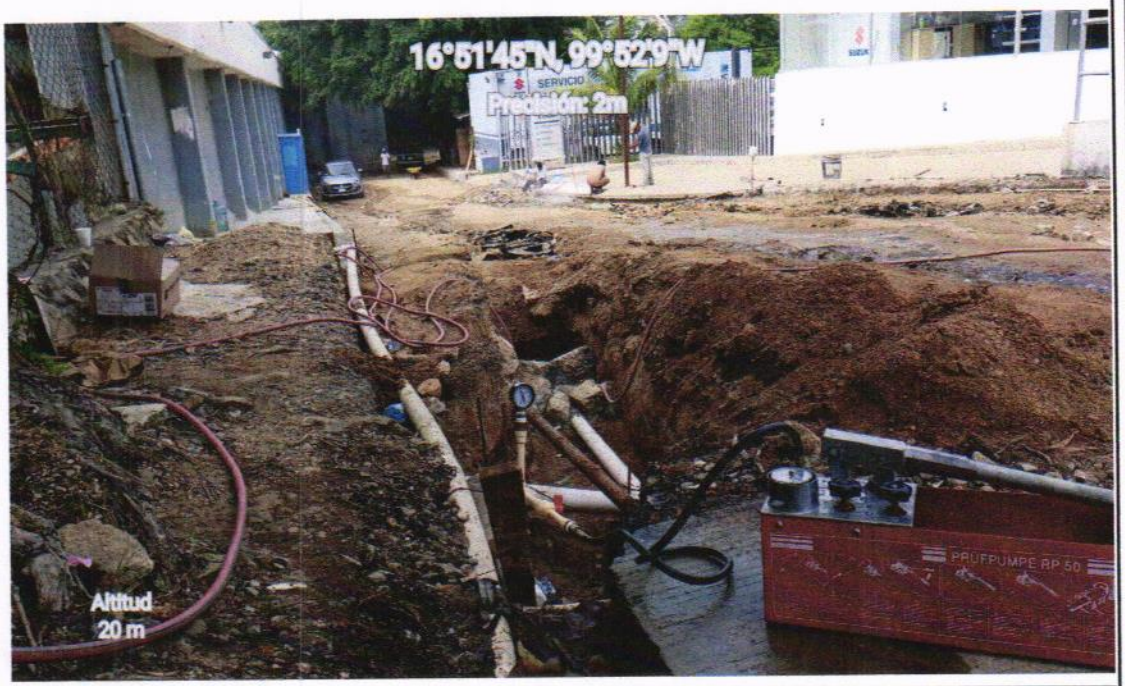

27-0412 -SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 3" CED. RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.



27-0412 -SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 3" CED. RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

E502-06 REV-1

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A5	**ALBAÑILERIA**									
18-0296	Muro de piedra brasa de la region asentada con mortero cemento arena 1:5 acabado comun incluye: acarreo de materiales a 1ra, estación de 20 mts.									
	ANCHO PROMEDIO (BM+CORONA/2)									
	MURO 1 2.50+0.40=2.90/2=**1.45**		**MURO 1**	BASE	2.50	10.87	2.00	M3	54.35	
	ALT. PROM.=3.50+3.19/2=**3.34**				1.45	10.87	3.34	M3	52.64	
	MURO 2 2.50+0.40=2.90/2=**1.45**		**MURO 2**	BASE	2.50	11.13	2.00	M3	55.65	
	ALT. PROM.=3.98+3.48/2=**3.73**				1.45	11.13	3.73	M3	60.19	
	MURO 3 2.50+0.40=2.90/2=**1.45**		**MURO 3**	BASE	2.50	10.00	2.00	M3	50.00	
	ALT. PROM.=3.48+2.98/2=**3.23**				1.45	10.00	3.23	M3	46.83	
	MURO 4 0.80+0.40=1.20/2=**0.60**		**MURO 4**	BASE	0.60	22.00	2.00	M3	26.40	
			MURO 5	BASE	2.50	8.80	1.66	M3	36.52	
		TOTAL M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA =						M3	382.58	
		EN ESTA ESTIMACIÓN SÓLO SE COBRA LA CANTIDAD DE PRESUPUESTO =						**M3**	**276.52**	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
		FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A5 **ALBAÑILERIA**

18-0296 MURO DE PIEDRA BRASA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 ACABADO COMUN INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES A 1RA, ESTACIÓN DE 20 MTS.

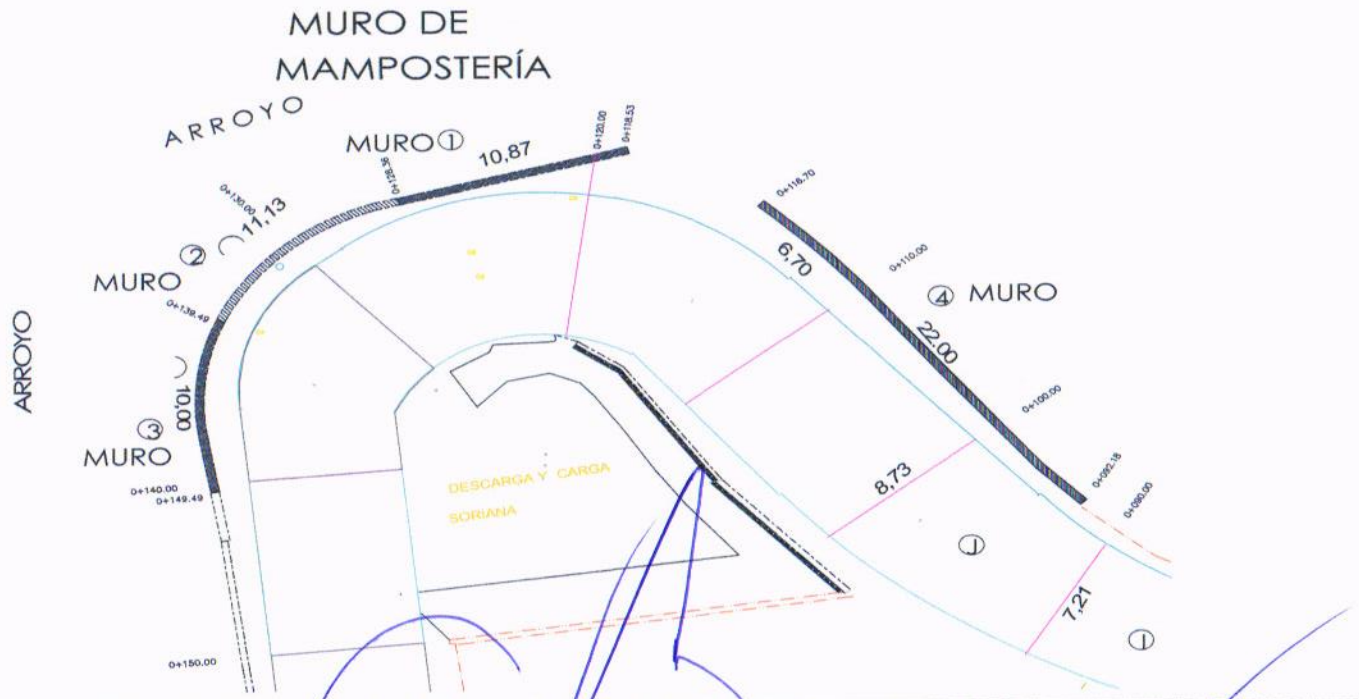

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/426	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
		FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/426-2023/LP	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		


C R O Q U I S


A5 **ALBAÑILERIA**

18-0296 MURO DE PIEDRA BRASA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 ACABADO COMUN INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES A 1RA, ESTACIÓN DE 20 MTS.

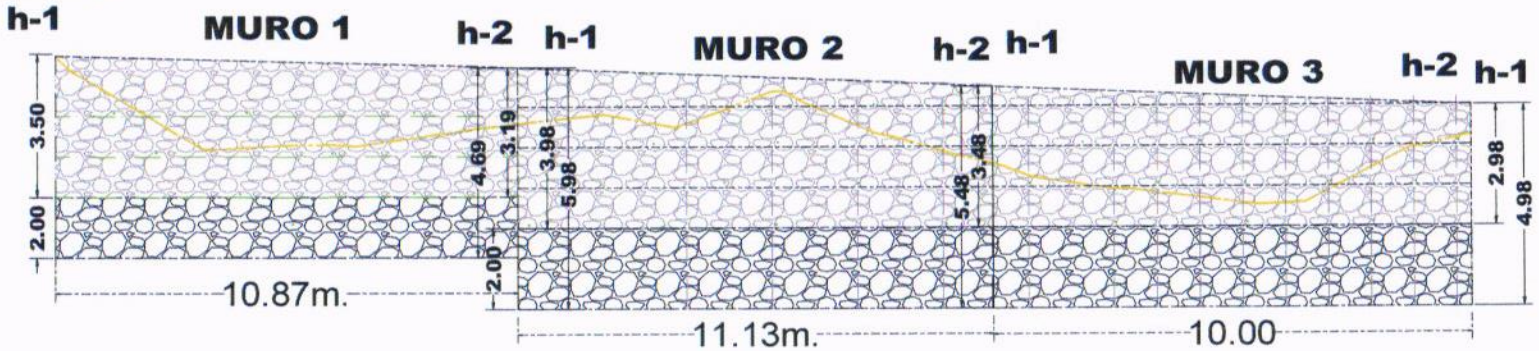

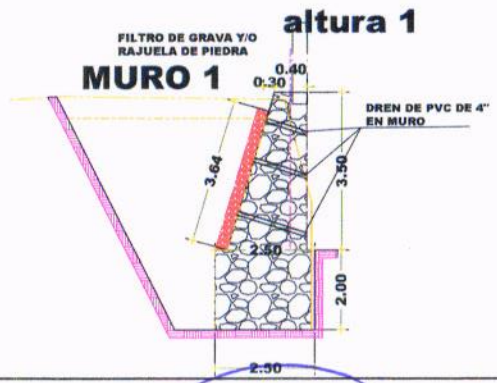

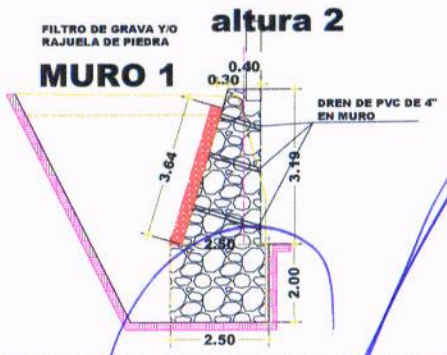

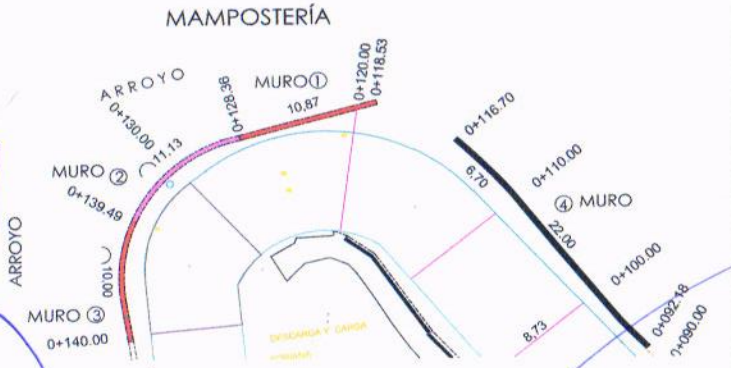

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
		FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		


C R O Q U I S

A5 **ALBAÑILERIA**

18-0296 MURO DE PIEDRA BRASA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 ACABADO COMUN INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES A 1RA, ESTACIÓN DE 20 MTS.

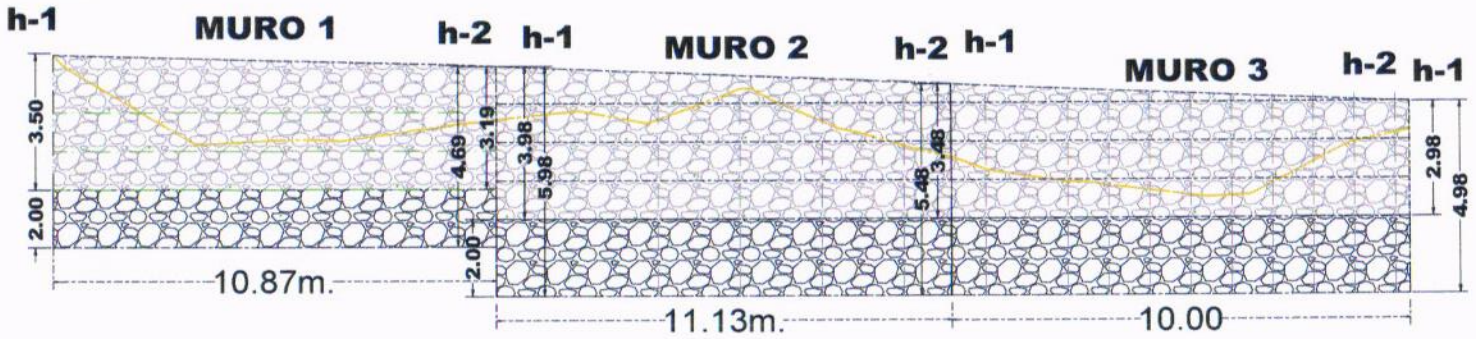

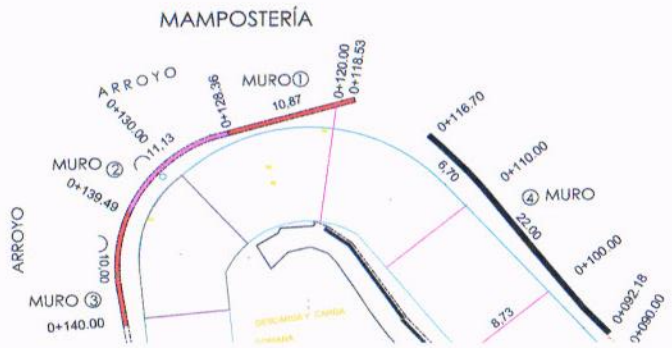

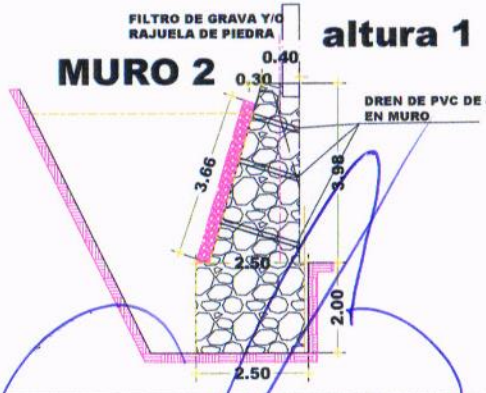



IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
		FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		


C R O Q U I S


A5 **ALBAÑILERIA**

18-0296 MURO DE PIEDRA BRASA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 ACABADO COMUN INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES A 1RA, ESTACIÓN DE 20 MTS.

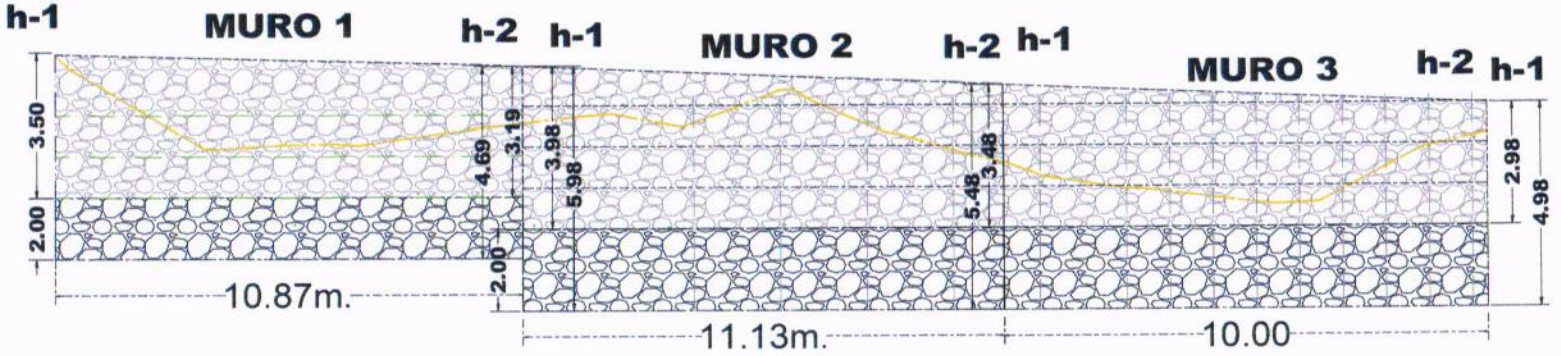

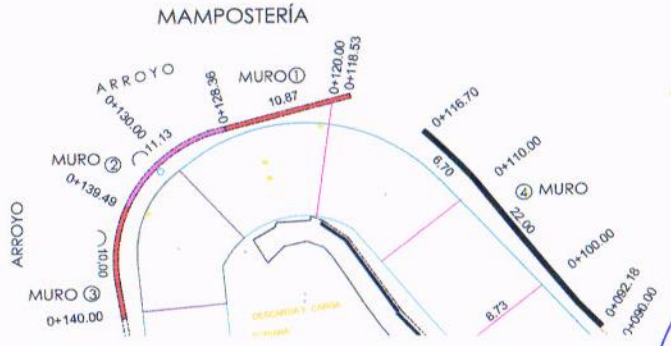

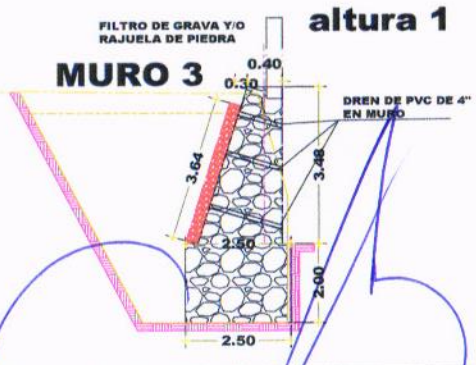

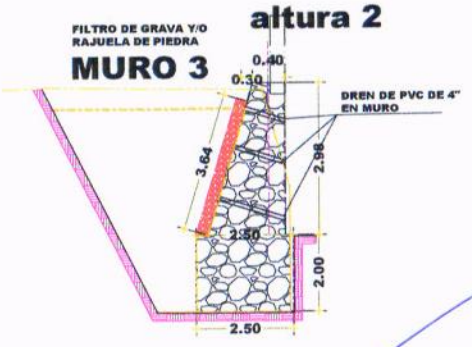

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
		FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A5 **ALBAÑILERIA**

18-0296 MURO DE PIEDRA BRASA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 ACABADO COMUN INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES A 1RA, ESTACIÓN DE 20 MTS.

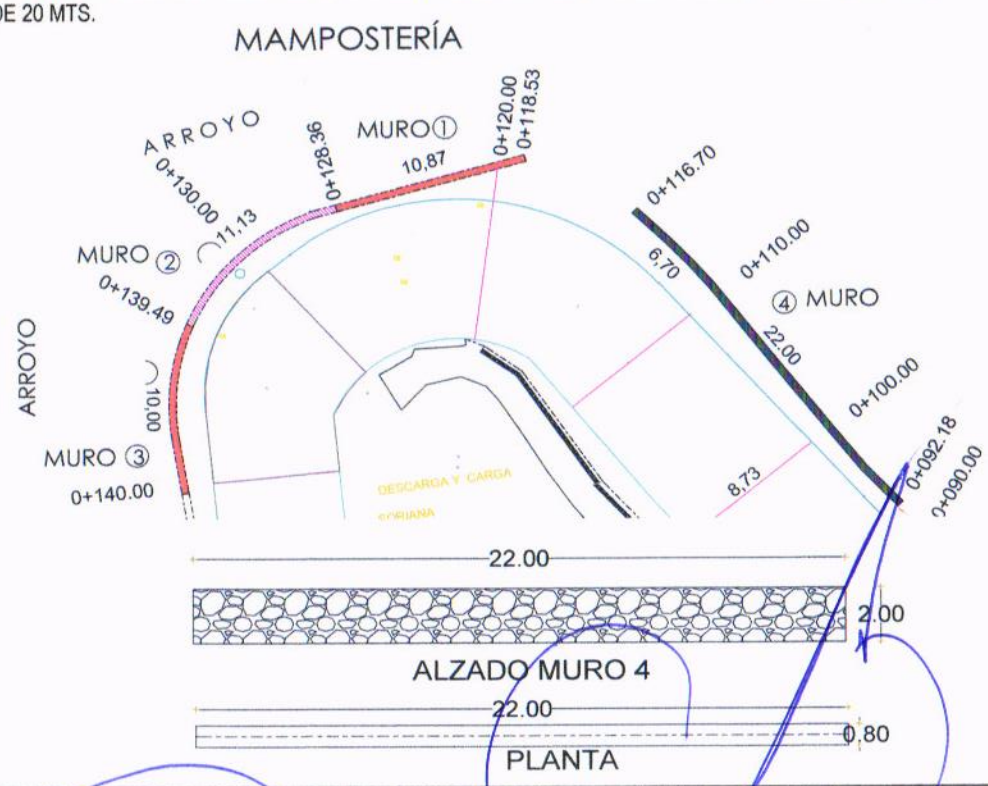

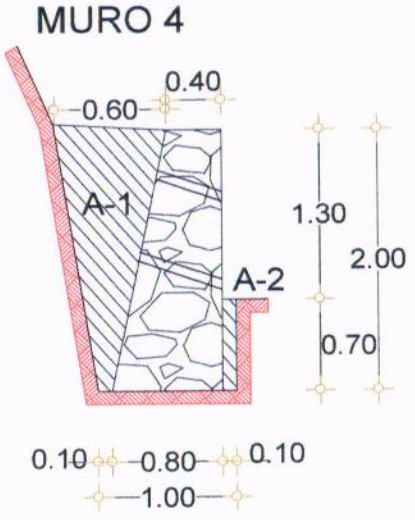

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
		FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S


A5 **ALBAÑILERIA**

18-0296 MURO DE PIEDRA BRASA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 ACABADO COMUN INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES A 1RA, ESTACIÓN DE 20 MTS.






ALZADO DE MURO



PLANTA

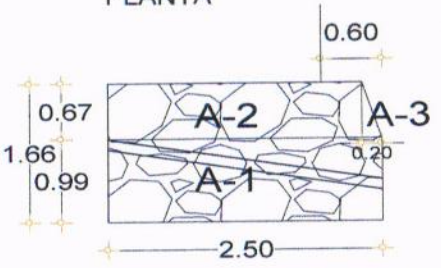

SECCION MURO 5

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
		FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		


C R O Q U I S

A5 **ALBAÑILERIA**

18-0296 MURO DE PIEDRA BRASA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 ACABADO COMUN INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES A 1RA, ESTACIÓN DE 20 MTS.

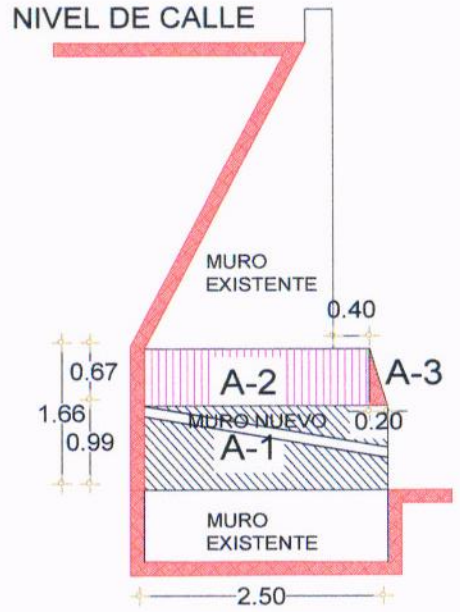

SECCION MURO 5

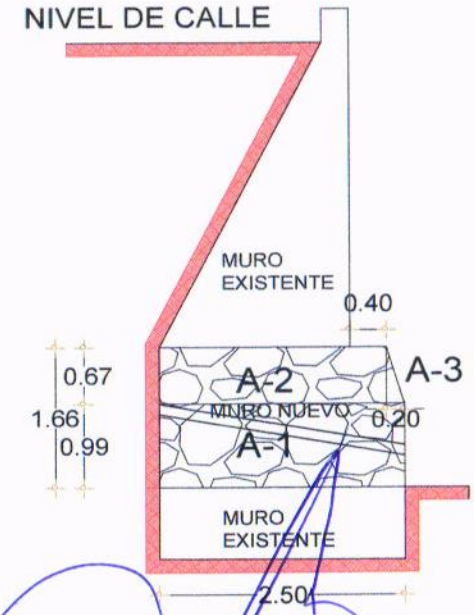

SECCION MURO 5



IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO)
		FECHA	01 DE OCTUBRE DEL 2023



18-0296 .- Muro de piedra braza de la región, asentada con mortero cemento arena 1:5, acabado común incluye: acarreo de materiales en 1ra. erstación de 20 mts.




18-0296 .- Muro de piedra braza de la región, asentada con mortero cemento arena 1:5, acabado común incluye: acarreo de materiales en 1ra. erstación de 20 mts.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO)
		FECHA	01 DE OCTUBRE DEL 2023

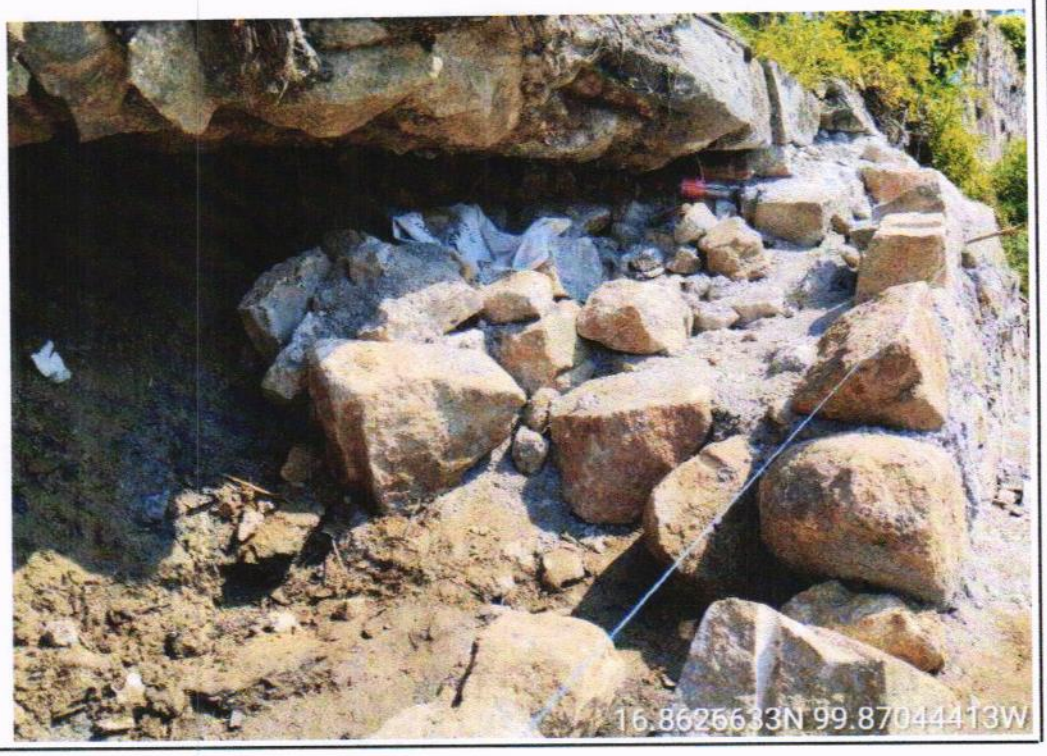

18-0296 .- Muro de piedra braza de la región, asentada con mortero cemento arena 1:5, acabado común incluye: acarreo de materiales en 1ra. erstación de 20 mts.



18-0296 .- Muro de piedra braza de la región, asentada con mortero cemento arena 1:5, acabado común incluye: acarreo de materiales en 1ra. erstación de 20 mts.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	**RESIDENTE DE OBRA** ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA** ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO)
		FECHA	01 DE OCTUBRE DEL 2023



18-0296 .- Muro de piedra braza de la región, asentada con mortero cemento arena 1:5, acabado común incluye: acarreo de materiales en 1ra. erstación de 20 mts.




18-0296 .- Muro de piedra braza de la región, asentada con mortero cemento arena 1:5, acabado común incluye: acarreo de materiales en 1ra. erstación de 20 mts.


IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO)
		FECHA	01 DE OCTUBRE DEL 2023

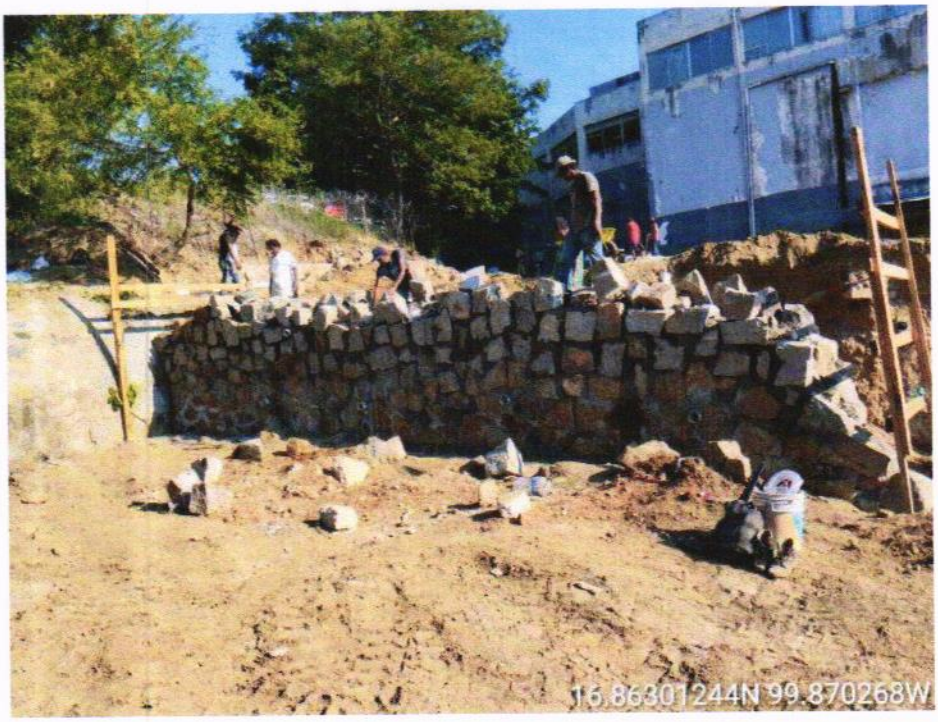

18-0296 .- Muro de piedra braza de la región, asentada con mortero cemento arena 1:5, acabado común incluye: acarreo de materiales en 1ra. erstación de 20 mts.

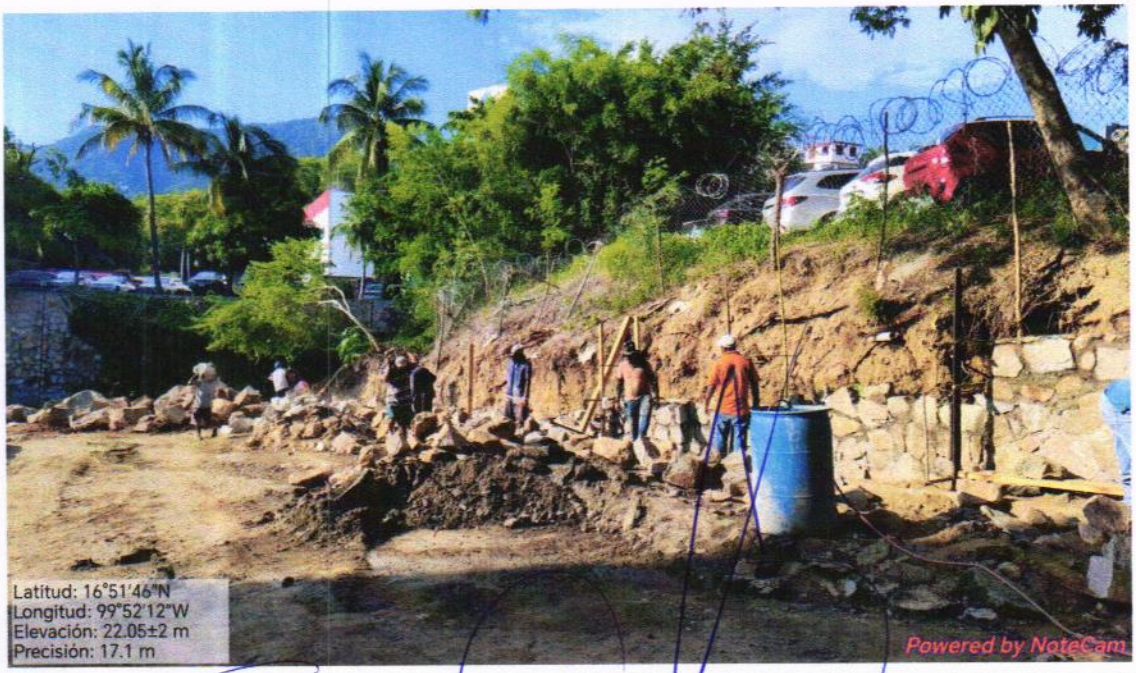

18-0296 .- Muro de piedra braza de la región, asentada con mortero cemento arena 1:5, acabado común incluye: acarreo de materiales en 1ra. erstación de 20 mts.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ESOR-06 REV-1

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO)
		FECHA	01 DE OCTUBRE DEL 2023



18-0296 .- Muro de piedra braza de la región, asentada con mortero cemento arena 1:5, acabado común incluye: acarreo de materiales en 1ra. estación de 20 mts.



18-0296 .- Muro de piedra braza de la región, asentada con mortero cemento arena 1:5, acabado común incluye: acarreo de materiales en 1ra. estación de 20 mts.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: MAJ/426	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/426-2023/LP	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A5	ALBAÑILERIA									
18-0313	Dren para muro de mamposteria a base de P.V.C. 4" tipo rigido incluye material y mano de obra.									
										MURO
		0+116.000	0+140.000	11.00		2.50		ML	27.50	1,2,3
		0+116.000	0+140.000	10.00		1.30		ML	13.00	1,2,3
		0+092.000	0+140.000	14.00		0.60		ML	8.40	4
	TOTAL ML DE DREN PARA MURO DE MAMPOSTERIA A BASE DE P.V.C. DE 4" =							ML	48.90	
	EN ESTA ESTIMACIÓN SÓLO SE COBRA LA CANTIDAD DE PRESUPUESTO =							ML	26.00	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA:	**MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
	FECHA:	01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.			


C R O Q U I S

A5 **ALBAÑILERIA**

18-0313 DREN PARA MURO DE MAMPOSTERIA A BASE DE P.V.C. 4" TIPO RIGIDO INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.



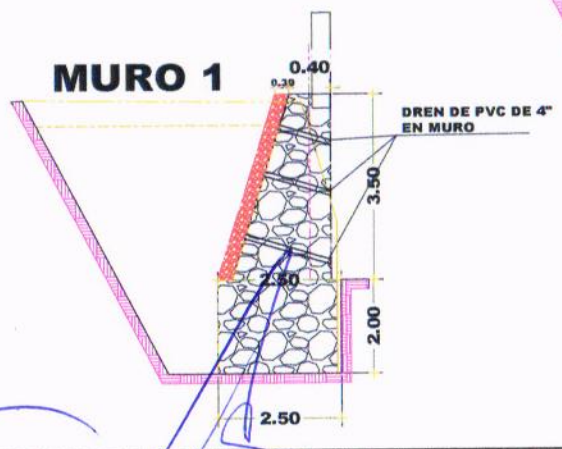

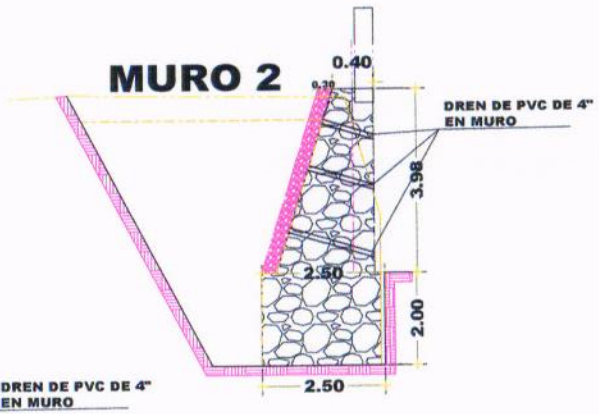

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO)
		FECHA	01 DE OCTUBRE DEL 2023

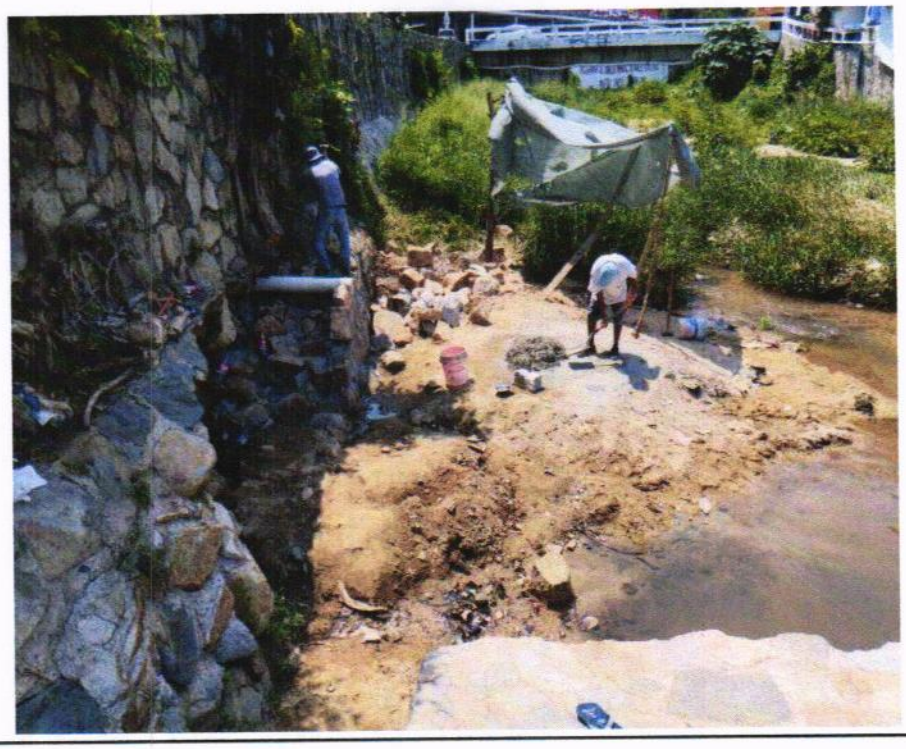

18-0313 -Dren para muro de mampostería a base de P.V.C. 4" tipo rígido incluye material y mano de obra.



18-0313 -Dren para muro de mampostería a base de P.V.C. 4" tipo rígido incluye material y mano de obra.


IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO)
		FECHA	01 DE OCTUBRE DEL 2023



18-0313 -Dren para muro de mampostería a base de P.V.C. 4" tipo rígido incluye material y mano de obra.

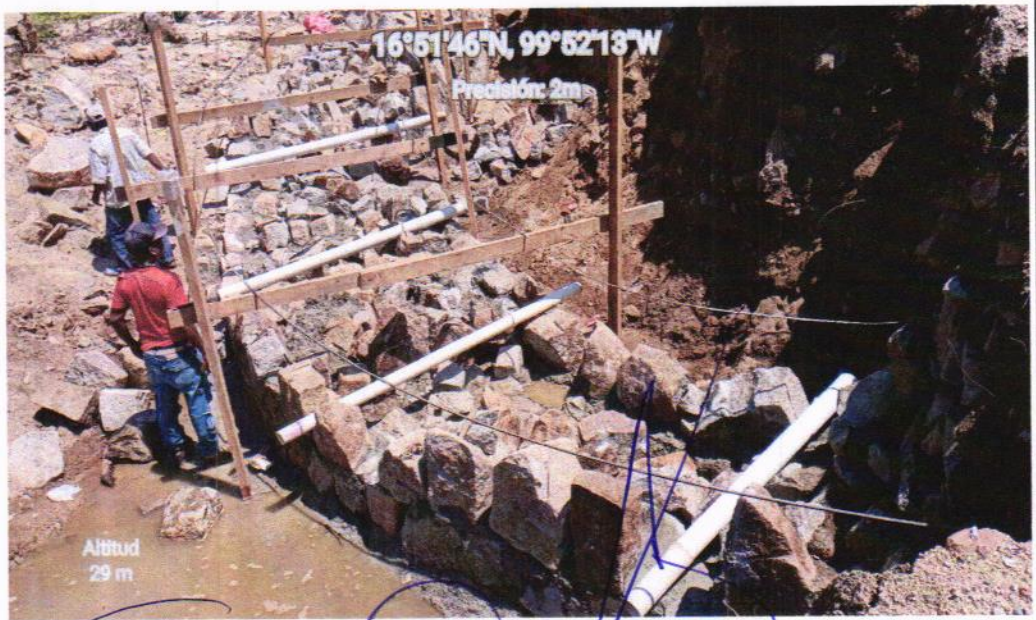

18-0313 -Dren para muro de mampostería a base de P.V.C. 4" tipo rígido incluye material y mano de obra.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARSON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

E-SOR-06 REV-1

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A5	**ALBAÑILERIA**									
18-0318	Filtro de grava y/o rajuela de piedra de 30 cms, de espesor incluye material mano de obra.									
		LADO IZQUIERDO								
	MURO 1	0+117.420	0+147.430		0.30	10.87	3.64	M3	11.87	
	MURO 2				0.30	11.13	3.66	M3	12.22	
	MURO 3				0.30	10.00	3.64	M3	10.92	
							TOTAL	**M3**	**35.01**	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S				
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
		FECHA:	01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.			

C R O Q U I S

A5 **ALBAÑILERIA**

118-0318 FILTRO DE GRAVA Y/O RAJUELA DE PIEDRA DE 30 CMS DE ESPESOR INCLUYE MATERIAL y MANO DE OBRA.

FILTRO DE GRAVA Y/O RAJUELA DE PIEDRA

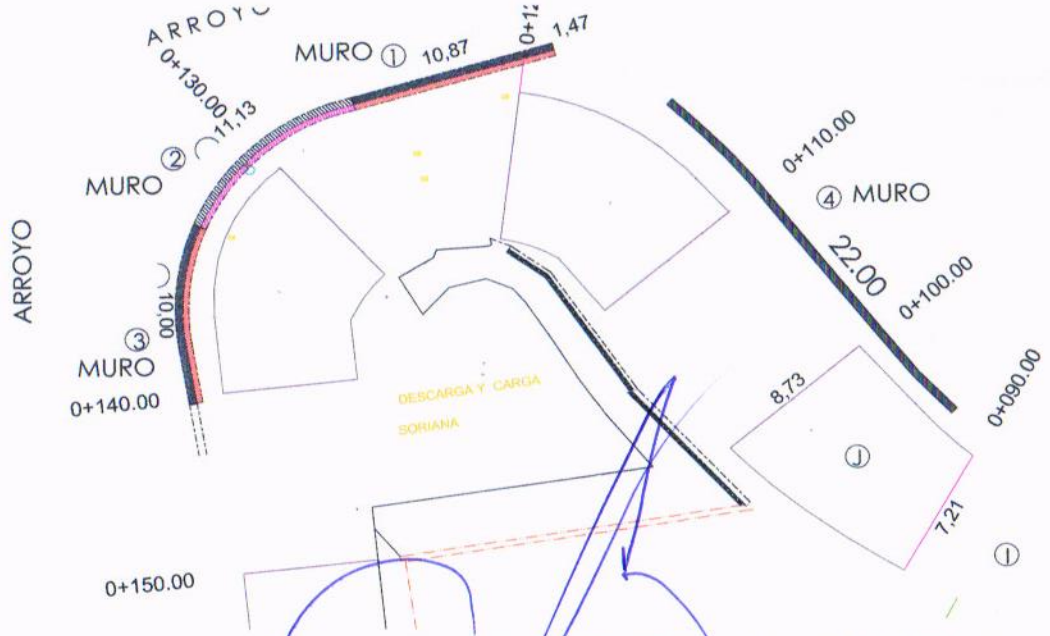

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S				
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	MAJ/426	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
		FECHA:	01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/426-2023/LP	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.			

C R O Q U I S

A5 **ALBAÑILERIA**

118-0318 FILTRO DE GRAVA Y/O RAJUELA DE PIEDRA DE 30 CMS DE ESPESOR INCLUYE MATERIAL y MANO DE OBRA.

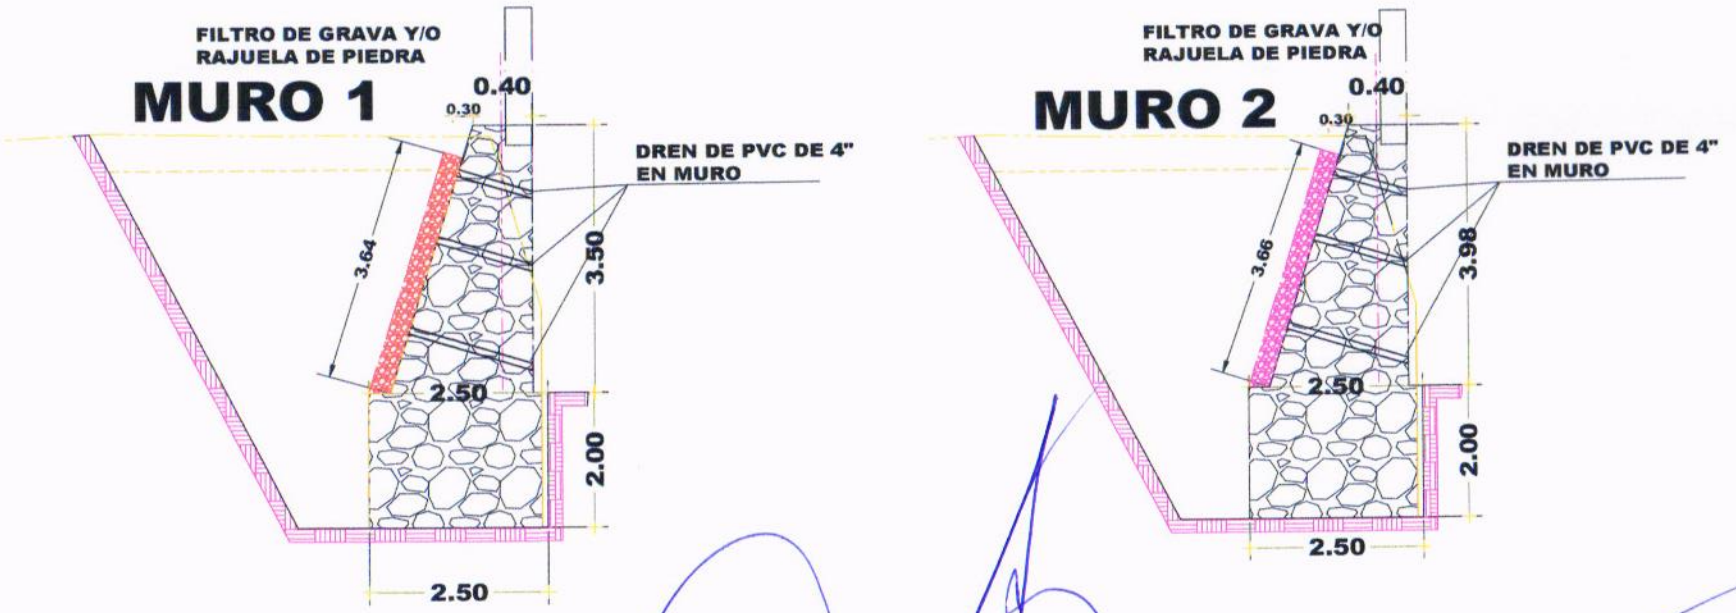

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/426-2023/LP
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO)
		FECHA	01 DE OCTUBRE DEL 2023



18-0318.- FILTRO DE GRAVA Y/O RAJUELA DE PIEDRA DE 30 CMS DE ESPESOR INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA

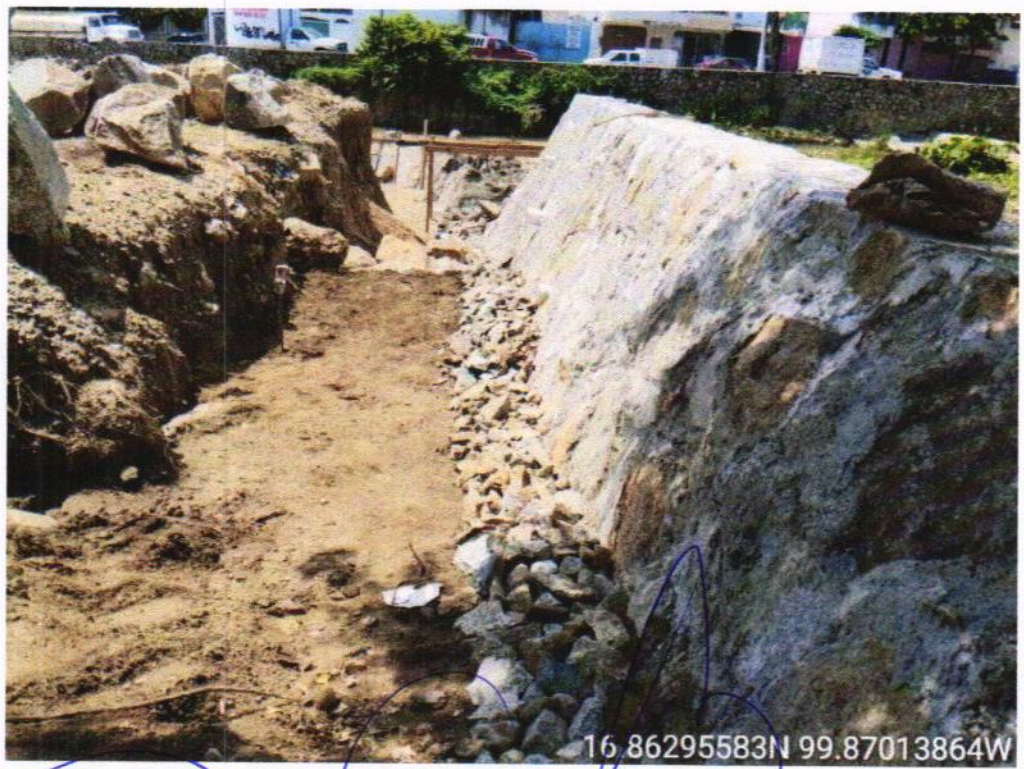

18-0318.- FILTRO DE GRAVA Y/O RAJUELA DE PIEDRA DE 30 CMS DE ESPESOR INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA .

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO)
		FECHA	01 DE OCTUBRE DEL 2023



18-0318 -FILTRO DE GRAVA Y/O RAJUELA DE PIEDRA DE 30 CMS DE ESPESOR INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA .

18-0318 -FILTRO DE GRAVA Y/O RAJUELA DE PIEDRA DE 30 CMS DE ESPESOR INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA .

IMEXA CONSTRUCTORES , S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PIBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ESOR-06 REV-1

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A6	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y LUMINARIAS**									
TUB-PESA50	Suministro y tendido de tubo conduit pvc pesado 50 mm de diámetro incluye conexión, trazo, excavación, relleno, cama de arena, herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra.									
		DEL CADENAMIENTO								**REGISTRO L. IZQ.**
		0+008.000	0+080.000			20.70		M	20.70	R1 AL R2
						23.76		M	23.76	R2 AL R3
						26.26		M	26.26	R3 AL R4
							TOTAL	**M**	**70.72**	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
		FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A6 **INSTALACIONES ELECTRICAS Y LUMINARIAS**

TUB-PESA50 SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO 50 MM DE DIÁMETRO INCLUYE CONEXIÓN, TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CAMA DE ARENA, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

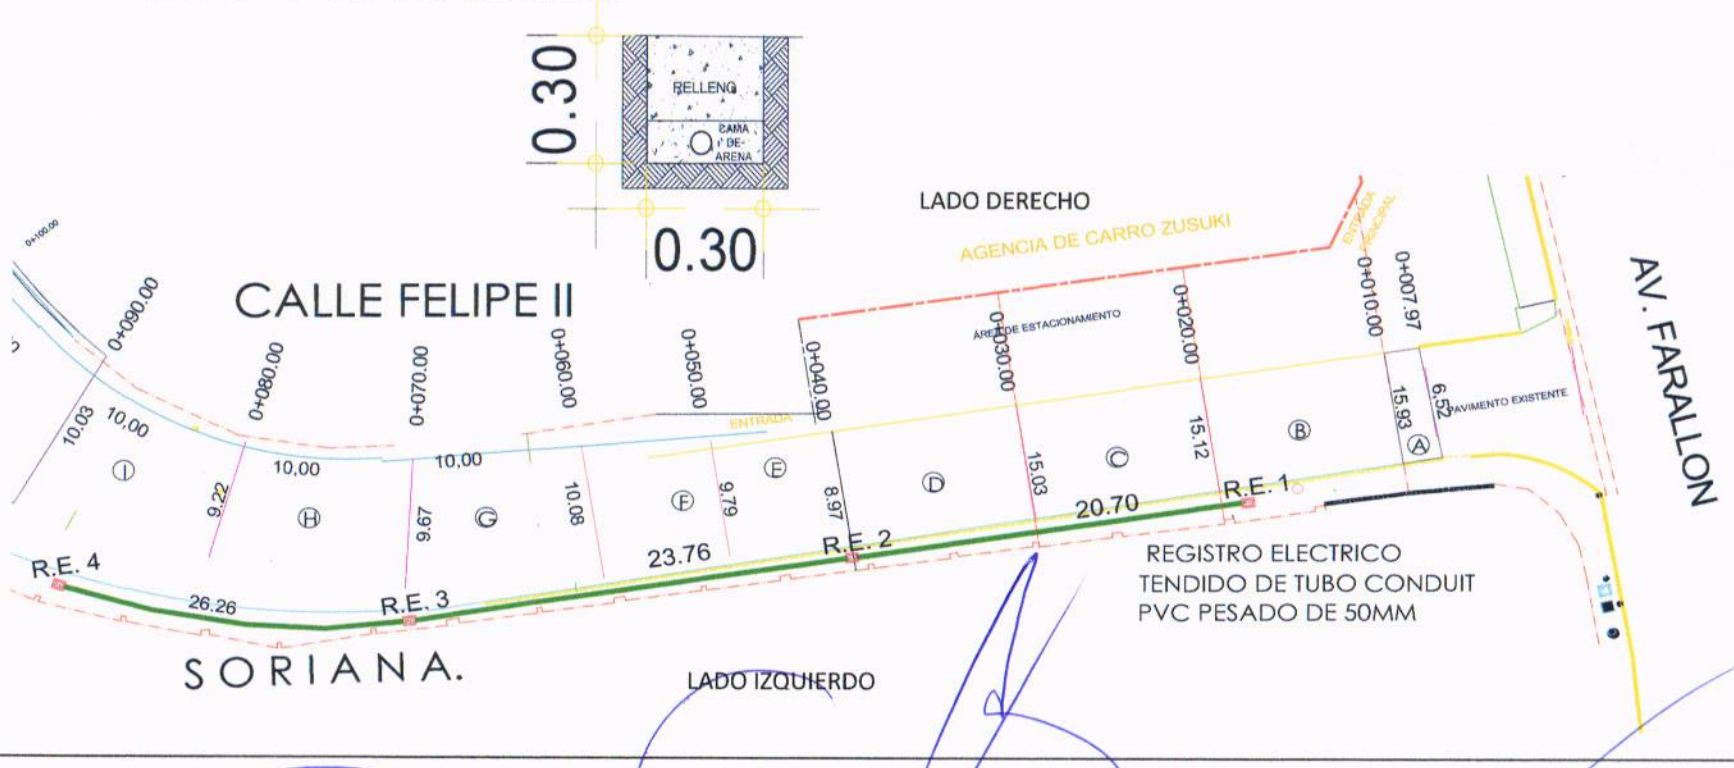

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO)
		FECHA	01 DE OCTUBRE DEL 2023

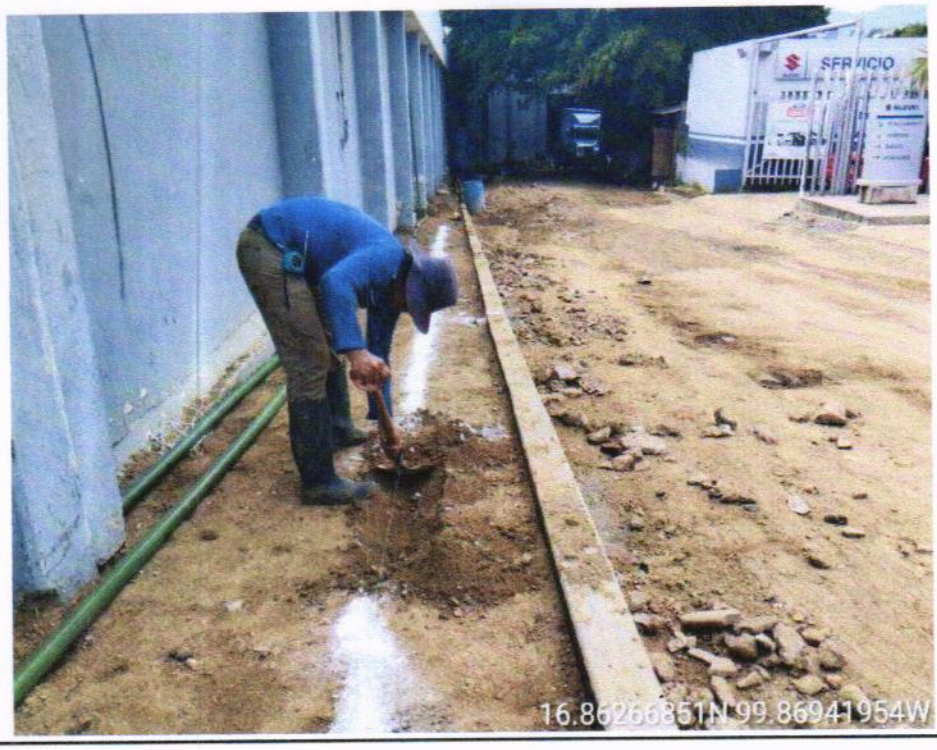

TUB-PESA50.- Suministro y tendido de tubo conduit pvc pesado 50 mm de diámetro incluye conexión, trazo, excavación, relleno, cama de arena, herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra.



TUB-PESA50.- Suministro y tendido de tubo conduit pvc pesado 50 mm de diámetro incluye conexión, trazo, excavación, relleno, cama de arena, herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO)
		FECHA	01 DE OCTUBRE DEL 2023



TUB-PESA50 -Suministro y tendido de tubo conduit pvc pesado 50 mm de diámetro incluye conexión, trazo, excavación, relleno, cama de arena, herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra.



TUB-PESA50 -Suministro y tendido de tubo conduit pvc pesado 50 mm de diámetro incluye conexión, trazo, excavación, relleno, cama de arena, herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

ACAPULCO

BIENESTAR

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: MAJ/426	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/426-2023/LP	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A7	**PAVIMENTACION**									
4-0080	Excavacion a mano en material tipo II-A, en seco y barreta de 0.00 a 2.00 mts, de profundidad depositando el producto de excavacion a orilla de cepa, cualquier zona.									
		PARA GUARNICION								
		0+002.000	0+010.000		0.30	8.00	0.20	M3	0.48	Lado Der.
		0+010.000	0+020.000		0.30	10.00	0.20	M3	0.60	Lado Der.
		0+020.000	0+030.000		0.30	10.00	0.20	M3	0.60	Lado Der.
		0+030.000	0+040.000		0.30	10.00	0.20	M3	0.60	Lado Der.
		0+040.000	0+050.000		0.30	10.00	0.20	M3	0.60	Lado Der.
		0+050.000	0+060.000		0.30	10.00	0.20	M3	0.60	Lado Der.
		0+060.000	0+070.000		0.30	10.00	0.20	M3	0.60	Lado Der.
		0+070.000	0+080.000		0.30	10.00	0.20	M3	0.60	Lado Der.
		0+080.000	0+090.000		0.30	10.00	0.20	M3	0.60	Lado Der.
		0+090.000	0+100.000		0.30	10.00	0.20	M3	0.60	Lado Der.
		0+100.000	0+110.000		0.30	10.00	0.20	M3	0.60	Lado Der.
		0+008.000	0+010.000		0.30	2.00	0.20	M3	0.12	Lado Izq.
		0+010.000	0+020.000		0.30	10.00	0.20	M3	0.60	Lado Izq.
		0+020.000	0+030.000		0.30	10.00	0.20	M3	0.60	Lado Izq.
		0+030.000	0+040.000		0.30	10.00	0.20	M3	0.60	Lado Izq.
		0+040.000	0+050.000		0.30	10.00	0.20	M3	0.60	Lado Izq.
		0+050.000	0+060.000		0.30	10.00	0.20	M3	0.60	Lado Izq.
		0+060.000	0+070.000		0.30	10.00	0.20	M3	0.60	Lado Izq.
		0+070.000	0+080.000		0.30	10.00	0.20	M3	0.60	Lado Izq.
		0+080.000	0+087.70		0.30	7.70	0.20	M3	0.46	Lado Izq.
		0+100.000	0+113.00		0.30	13.00	0.20	M3	0.78	Lado Izq.
							TOTAL	M3	12.04	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
		FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A7 **PAVIMENTACIÓN**

4-0080 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO LL-A, EN SECO Y BARRETA DE 0.00 A 2.00 MTS, DE PROFUNDIDAD DEPOSITANDO EL PRODUCTO DE EXCAVACION A ORILLA DE CEPA, CUALQUIER ZONA.



IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
		FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A7 **PAVIMENTOS**

4-0080 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO LL-A, EN SECO Y BARRETA DE 0.00 A 2.00 MTS, DE PROFUNDIDAD DEPOSITANDO EL PRODUCTO DE EXCAVACION A ORILLA DE CEPA, CUALQUIER ZONA.

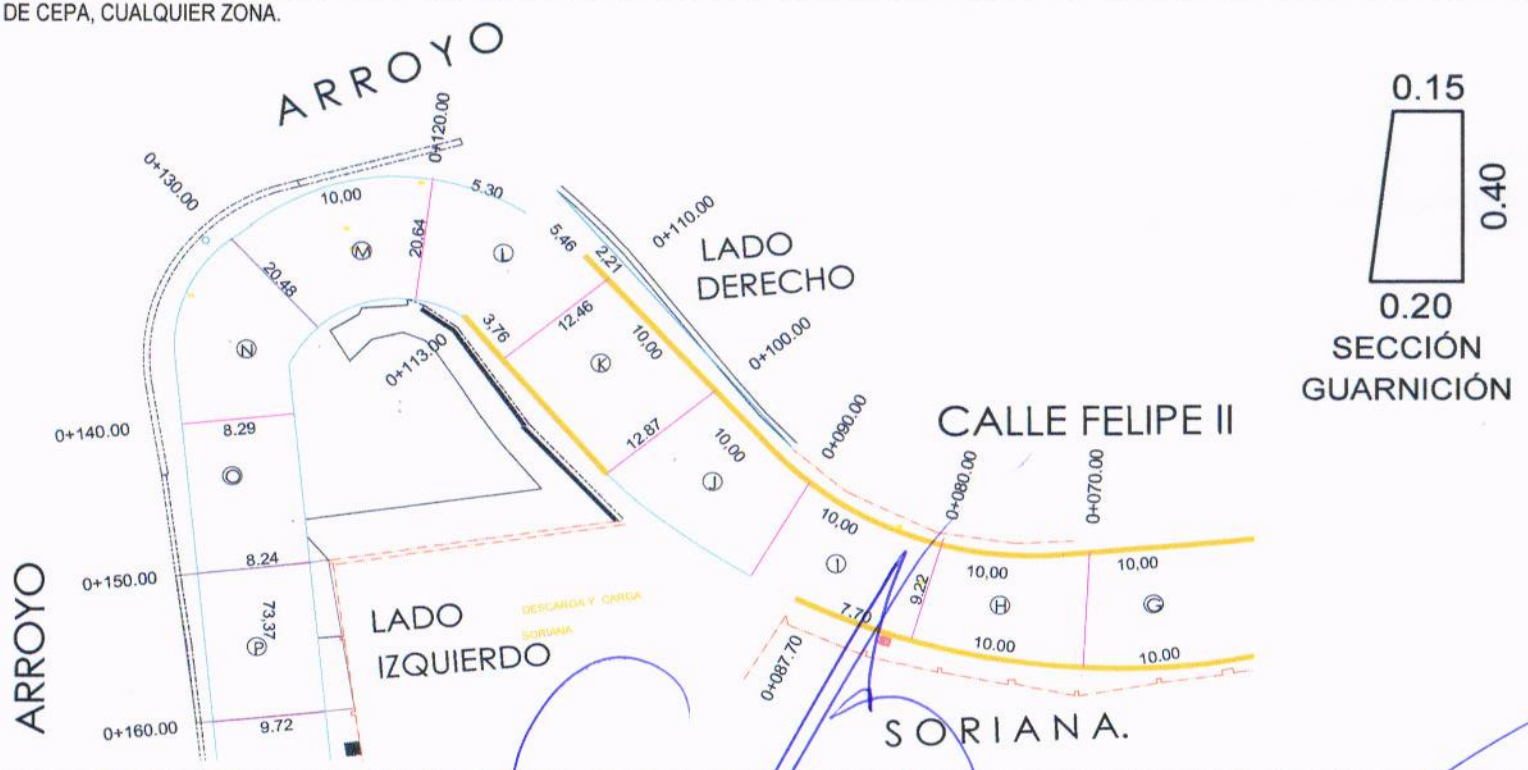

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO)
		FECHA	01 DE OCTUBRE DEL 2023

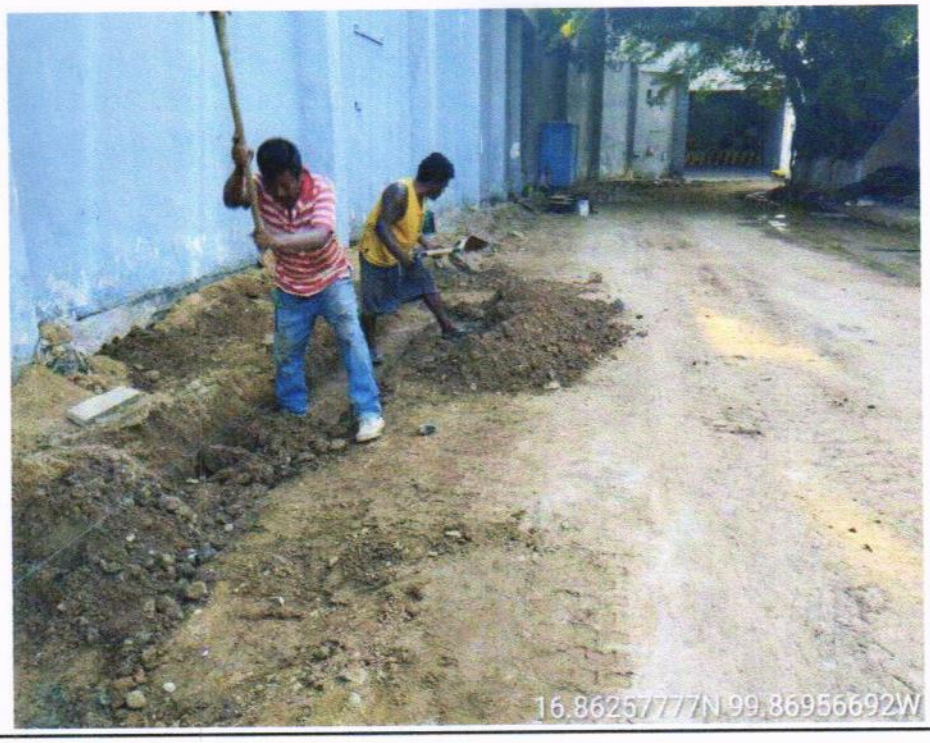

4-0080.- EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II-A, EN SECO Y BARRETA DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, DEPOSITANDO EL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A ORILLA DE CEPA, CUALQUIER ZONA.

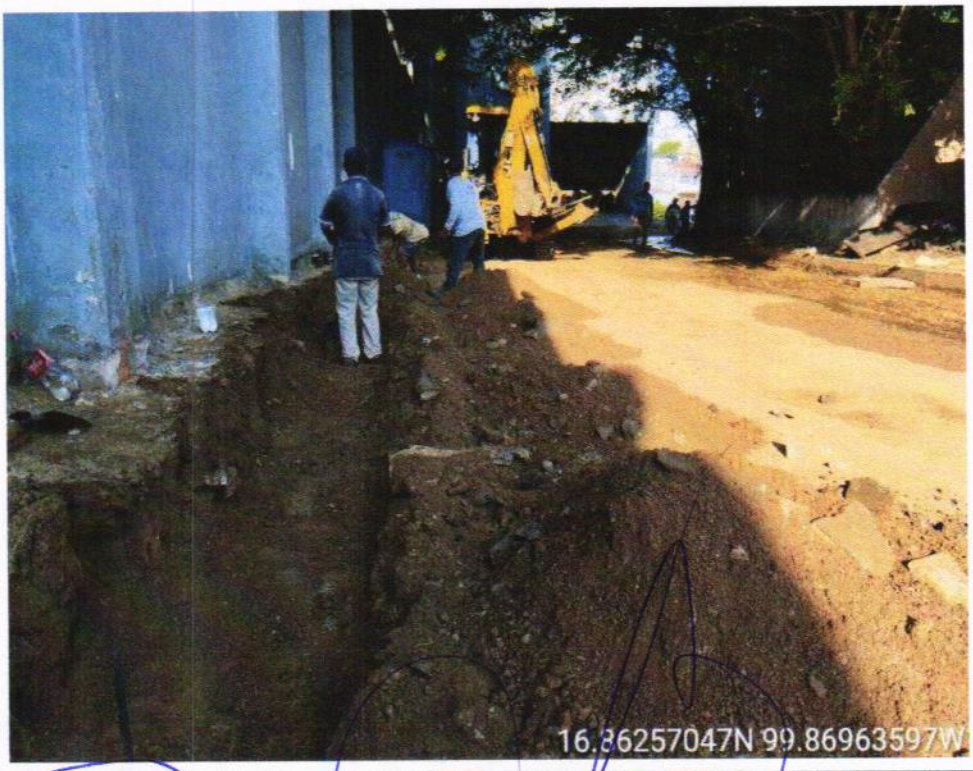

4-0080.- EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II-A, EN SECO Y BARRETA DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, DEPOSITANDO EL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A ORILLA DE CEPA, CUALQUIER ZONA.


IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/426-2023/LP
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO)
		FECHA	01 DE OCTUBRE DEL 2023



4-0080 .- EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II-A, EN SECO Y BARRETA DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, DEPOSITANDO EL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A ORILLA DE CEPA, CUALQUIER ZONA.

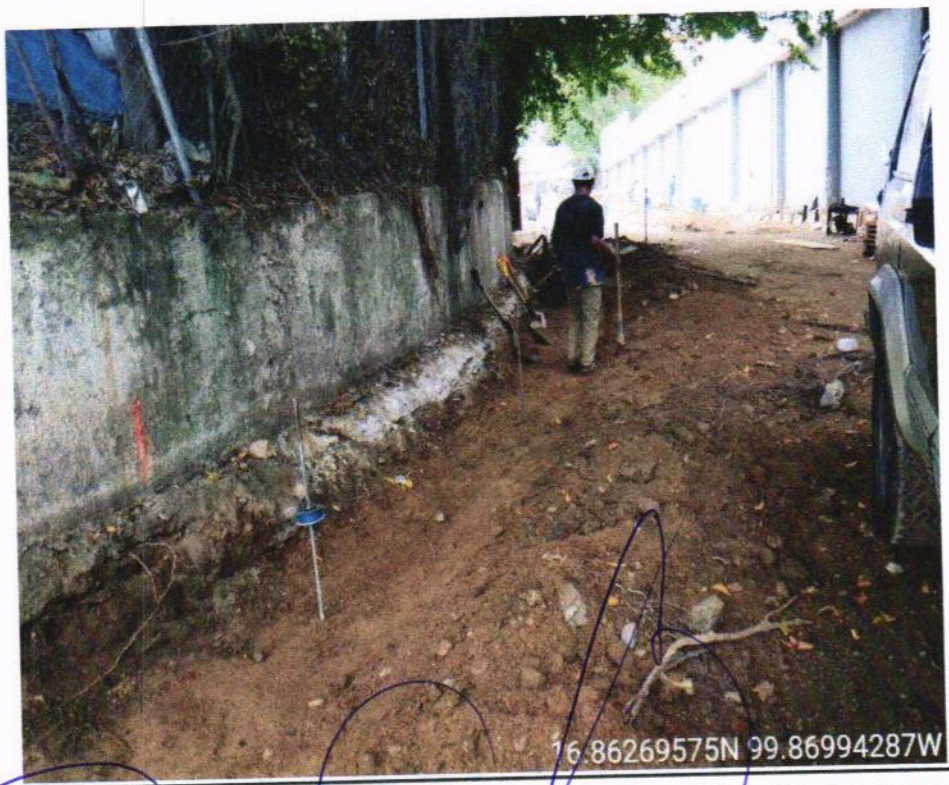

4-0080 .- EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II-A, EN SECO Y BARRETA DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, DEPOSITANDO EL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A ORILLA DE CEPA, CUALQUIER ZONA.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A7	**PAVIMENTACIÓN**									
32-0471	Guarnición de concreto simple de f´c=200 kg/cm2 de 15x20x40cm, de seccion T.M.A. 3/4" incluye cimbrado, decimbrado, materiales y mano de obra.									
		DEL CADENAMIENTO								
		0+002.000	0+010.000			8.00		ML	8.00	Lado Der.
		0+010.000	0+020.000			10.00		ML	10.00	Lado Der.
		0+020.000	0+030.000			10.00		ML	10.00	Lado Der.
		0+030.000	0+040.000			10.00		ML	10.00	Lado Der.
		0+040.000	0+050.000			10.00		ML	10.00	Lado Der.
		0+050.000	0+060.000			10.00		ML	10.00	Lado Der.
		0+060.000	0+070.000			10.00		ML	10.00	Lado Der.
		0+070.000	0+080.000			10.00		ML	10.00	Lado Der.
		0+080.000	0+090.000			10.00		ML	10.00	Lado Der.
		0+090.000	0+100.000			10.00		ML	10.00	Lado Der.
		0+100.000	0+110.000			10.00		ML	10.00	Lado Der.
		0+008.000	0+010.000			2.00		ML	2.00	Lado Izq.
		0+010.000	0+020.000			10.00		ML	10.00	Lado Izq.
		0+020.000	0+030.000			10.00		ML	10.00	Lado Izq.
		0+030.000	0+040.000			10.00		ML	10.00	Lado Izq.
		0+040.000	0+050.000			10.00		ML	10.00	Lado Izq.
		0+050.000	0+060.000			10.00		ML	10.00	Lado Izq.
		0+060.000	0+070.000			10.00		ML	10.00	Lado Izq.
		0+070.000	0+080.000			10.00		ML	10.00	Lado Izq.
		0+080.000	0+087.70			7.70		ML	7.70	Lado Izq.
		0+100.000	0+113.00			13.00		ML	13.00	Lado Izq.
							TOTAL	**ML**	**200.70**	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/426	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
		FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/426-2023/LP	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A7 **PAVIMENTOS**

32-0471 GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE F´C= 200 KG/CM2 DE 20X15X40 CM. DE SECCIÓN T.M.A. 3/4" INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.



SECCIÓN
GUARNICIÓN



IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
		FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A7 **PAVIMENTOS**

32-0471 GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE F´C= 200 KG/CM2 DE 20X15X40 CM. DE SECCIÓN T.M.A. 3/4" INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.

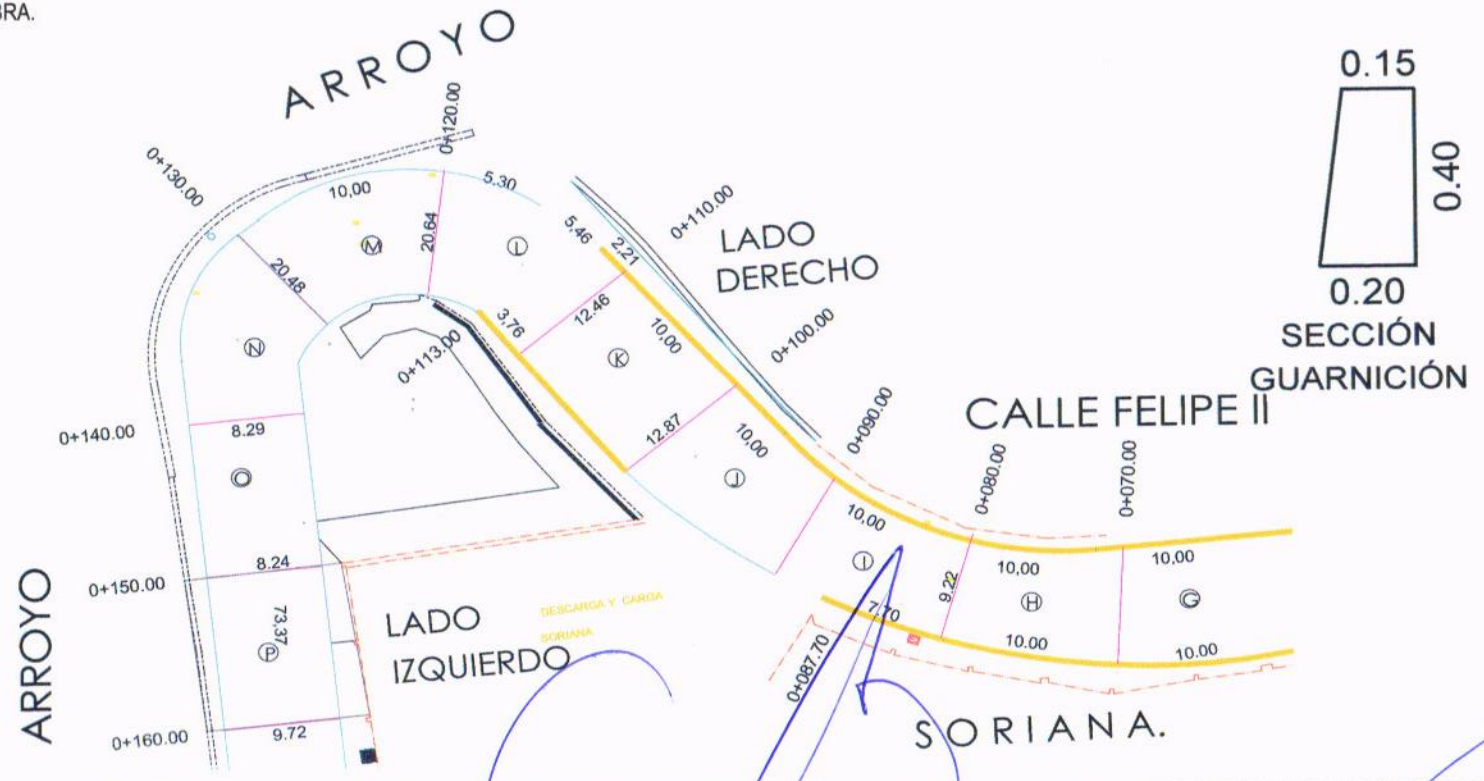

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO)
		FECHA	01 DE OCTUBRE DEL 2023



32-0471 .- Guarnición de concreto simple de f'c= 200 kg/cm2 de 20x15x40 cm. de sección T.M.A. 3/4" Incluye cimbrado, descimbrado, materiales y mano de obra.



32-0471 .- Guarnición de concreto simple de f'c= 200 kg/cm2 de 20x15x40 cm. de sección T.M.A. 3/4" Incluye cimbrado, descimbrado, materiales y mano de obra.


IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO)
		FECHA	01 DE OCTUBRE DEL 2023



32-0471 .- Guarnición de concreto simple de f´c= 200 kg/cm2 de 20x15x40 cm. de sección T.M.A. 3/4" Incluye cimbrado, descimbrado, materiales y mano de obra.

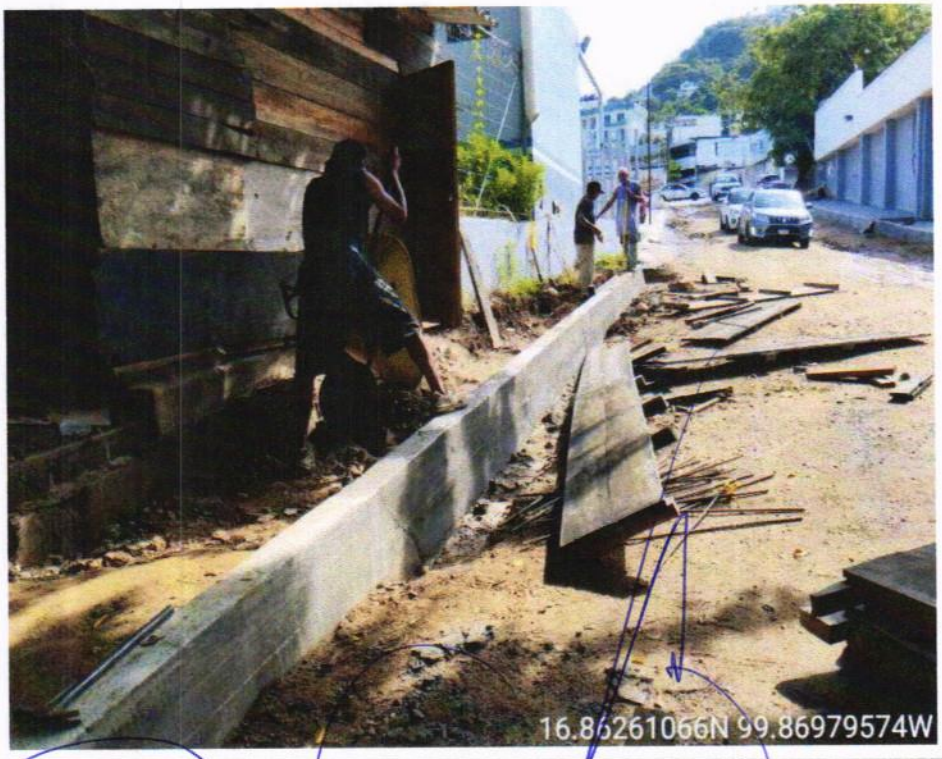

32-0471 .- Guarnición de concreto simple de f´c= 200 kg/cm2 de 20x15x40 cm. de sección T.M.A. 3/4" Incluye cimbrado, descimbrado, materiales y mano de obra.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO)
		FECHA	01 DE OCTUBRE DEL 2023



32-0471 .- Guarnición de concreto simple de f´c= 200 kg/cm2 de 20x15x40 cm. de sección T.M.A. 3/4" Incluye cimbrado, descimbrado, materiales y mano de obra.



32-0471 .- Guarnición de concreto simple de f´c= 200 kg/cm2 de 20x15x40 cm. de sección T.M.A. 3/4" Incluye cimbrado, descimbrado, materiales y mano de obra.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. DRIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A7	**PAVIMENTO**									
32-0468	BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE F´C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, T.M.A. 3/4", INCLUYE CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.									
	ANCHO PROMEDIO									LADO DERECHO
	E.- 0.54+0.66=1.2/2=**0.60**	0+047.210	0+050.000		0.60	2.79		M2	1.67	E
	F.-0.66+1.48=2.14/2=**1.07**	0+050.000	0+055.890		1.07	5.89		M2	6.30	F
	F´.-1.48+1.06=2.54/2=**1.27**	0+055.890	0+060.000		1.27	4.11		M2	5.22	F´
	G.- 1.06+0.70=1.70/2=**0.88**	0+060.000	0+070.000		0.88	10.00		M2	8.80	G
	H.- 0.70+0.68=1.38/2=**0.69**	0+070.000	0+080.000		0.69	10.00		M2	6.90	H
	I.- 0.68+0.93=1.61/2=**0.80**	0+080.000	0+090.000		0.80	10.00		M2	8.00	I
	J.- 0.93+1.44=2.37/2=**1.18**	0+090.000	0+100.000		1.18	10.00		M2	11.80	J
	K.- 1.44+1.75=3.19/2=**1.59**	0+100.000	0+110.000		1.59	10.00		M2	15.90	K
	LAD. IZQ.									
	A.- 1.58+1.51=3.09/2=**1.54**	0+006.440	0+010.000		1.54	3.56		M2	5.48	A
	B.- 1.51+1.89=3.40/2=**1.70**	0+010.000	0+020.000		1.70	10.00		M2	17.00	B
	C.- 1.89+1.43=3.32/2=**1.66**	0+020.000	0+030.000		1.66	10.00		M2	16.60	C
	D.- 1.43+1.38=2,81/2=**1.40**	0+030.000	0+040.000		1.40	10.00		M2	14.00	D
	E.- 1.38+1.03.=2.41/2=**1.20**	0+040.000	0+050.000		1.20	10.00		M2	12.00	E
	F.- 1.03+0.84=1.87/2=**0.93**	0+050.000	0+060.000		0.93	10.00		M2	9.30	F
	G.- 0.84+1.75=2.59/2=**1.29**	0+060.000	0+070.000		1.29	10.00		M2	12.90	G
	H.- 1.75+1.61=3.36/2=**1.68**	0+070.000	0+080.000		1.68	10.00		M2	16.80	H
	I.- 1.61+1.21=2.82/2=**1.41**	0+080.000	0+087.710		1.41	7.71		M2	10.87	I
							TOTAL	**M2**	**179.55**	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA:	**MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
	FECHA:	01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.			

C R O Q U I S

A7 **PAVIMENTOS**

32-0468 BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE F´C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, T.M.A. 3/4", INCLUYE CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA



IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
		FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A7 **PAVIMENTOS**

32-0468 BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE F´C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, T.M.A. 3/4", INCLUYE CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA

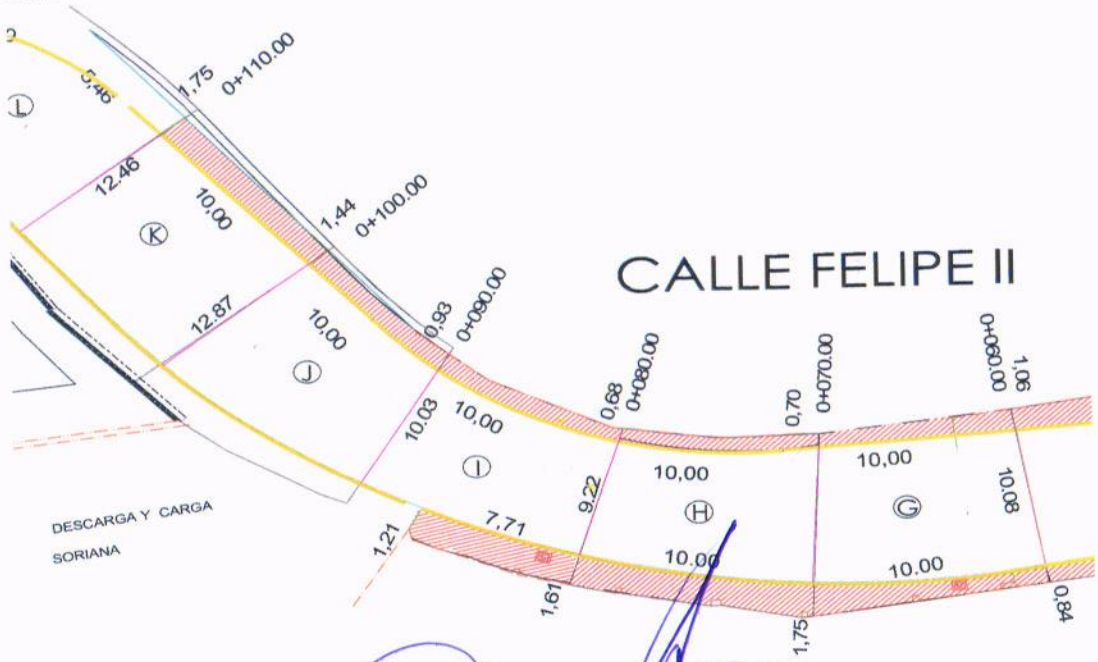

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO)
		FECHA	01 DE OCTUBRE DEL 2023

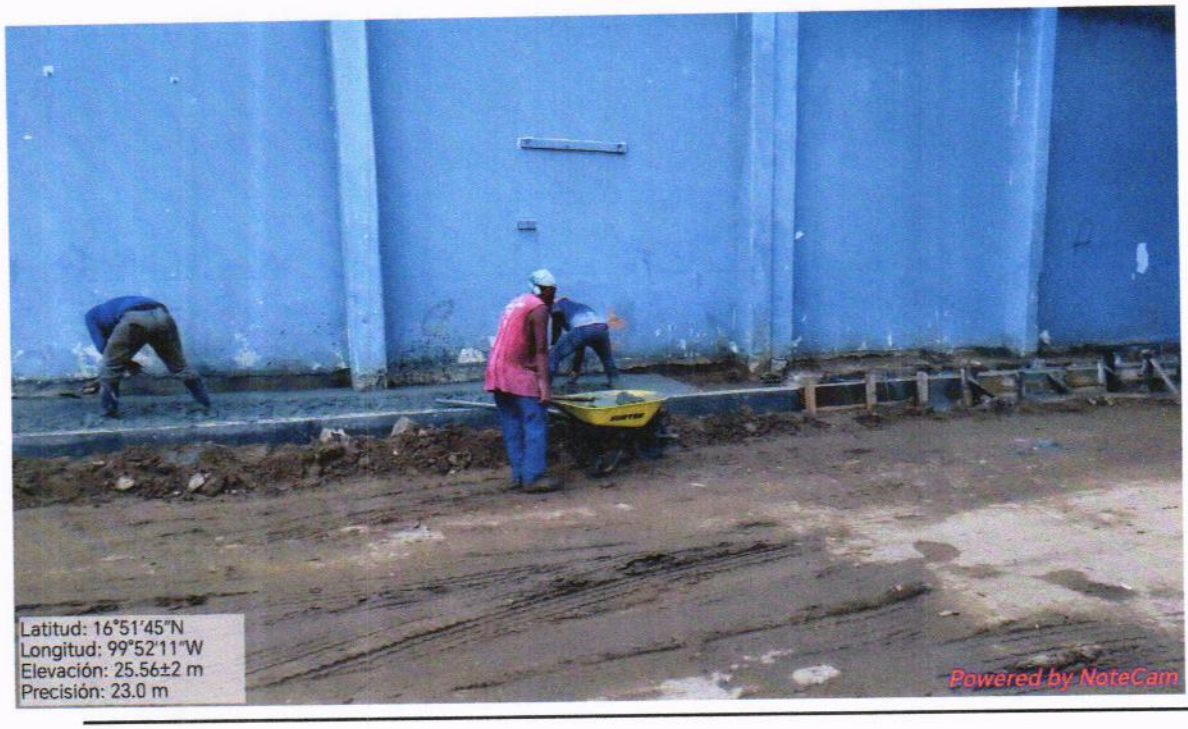

32-0468 .- Banqueta de concreto hidráulico hecho en obra de f´c=150 kg/cm2 de 10 cms de espesor, T.M.A. 3/4", incluye curado, cimbrado, descimbrado, material y mano de obra.

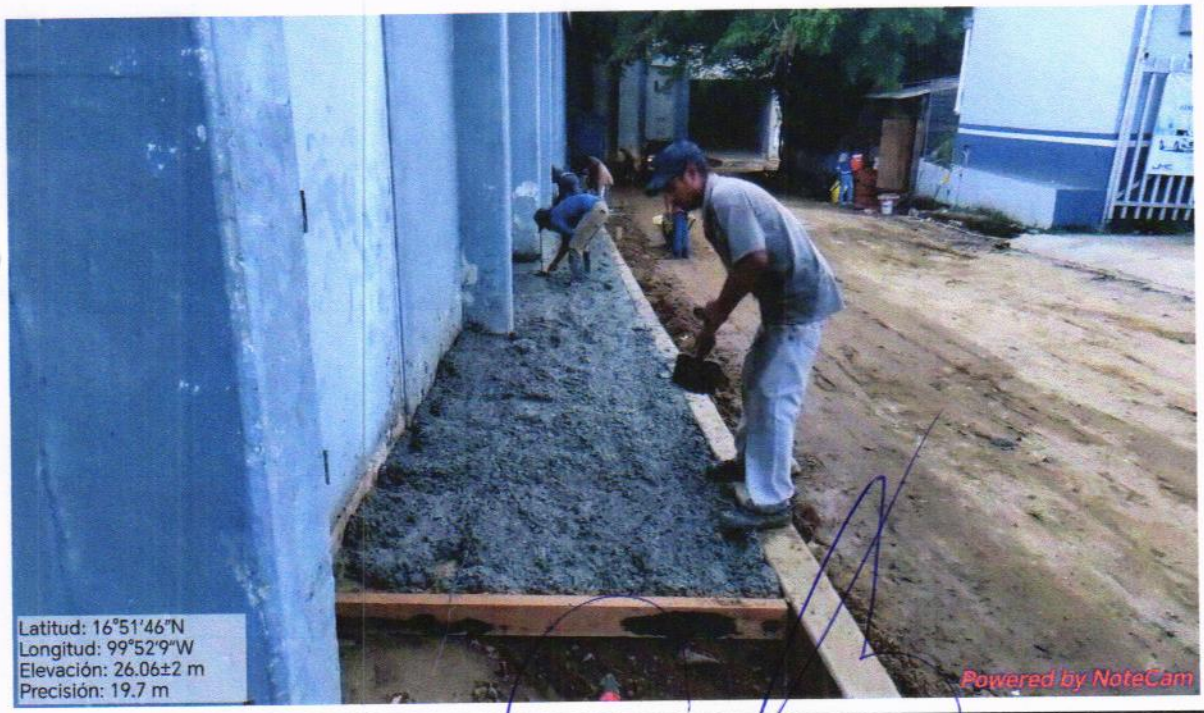


32-0468 .- Banqueta de concreto hidráulico hecho en obra de f´c=150 kg/cm2 de 10 cms de espesor, T.M.A. 3/4", incluye curado, cimbrado, descimbrado, material y mano de obra.


IMEGA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	**RESIDENTE DE OBRA** ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA** ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO)
		FECHA	01 DE OCTUBRE DEL 2023

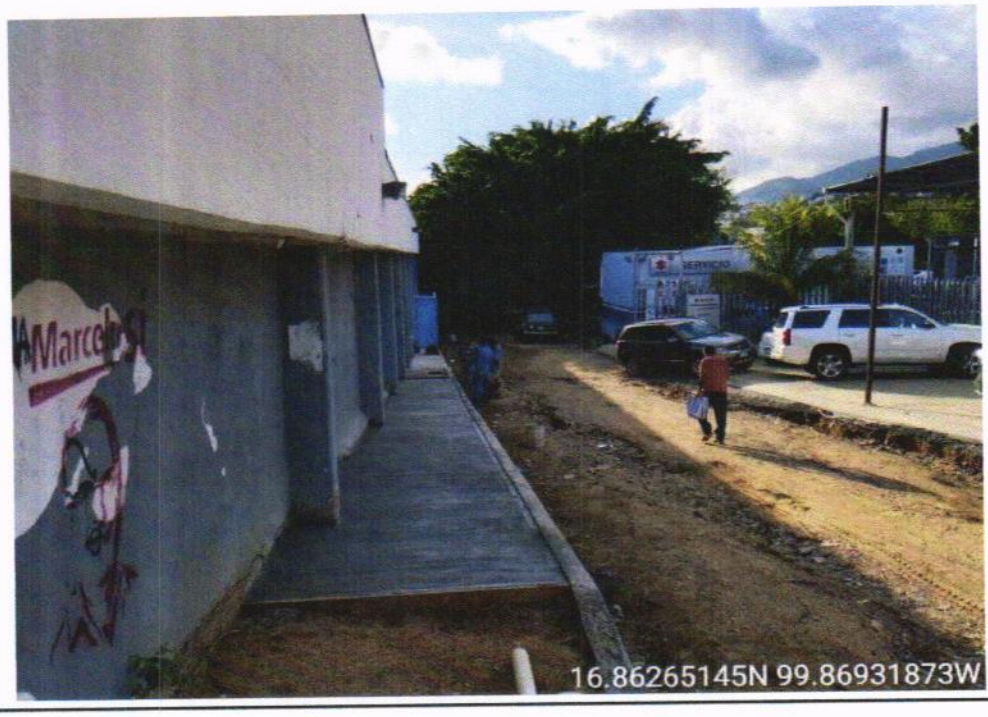

32-0468 .- Banqueta de concreto hidráulico hecho en obra de f´c=150 kg/cm2 de 10 cms de espesor, T.M.A. 3/4", incluye curado, cimbrado, descimbrado, material y mano de obra.

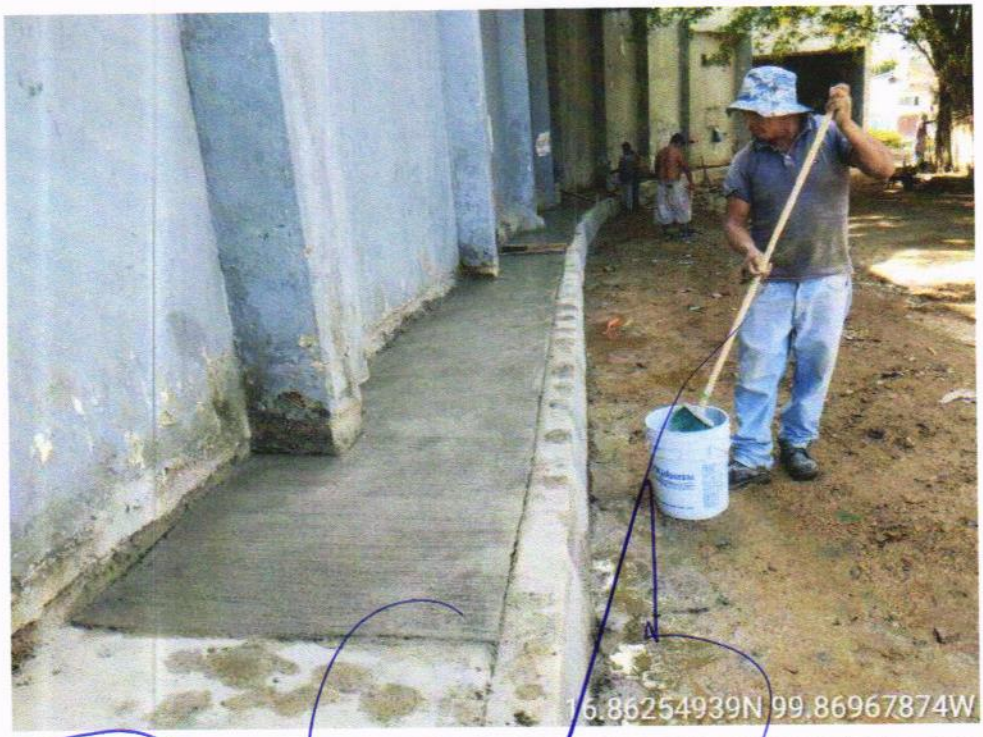

32-0468 .- Banqueta de concreto hidráulico hecho en obra de f´c=150 kg/cm2 de 10 cms de espesor, T.M.A. 3/4", incluye curado, cimbrado, descimbrado, material y mano de obra.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A8	**ACARREOS Y LIMPIEZA**									
CARGA	CARGA MECÁNICA CON USO DE RETROEXCAVADORA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A TIRO LIBRE.									
	CARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION DE ASFALTO (HOJA 1)									
	ANCHO PROMEDIO									
	A.- 6.54+6.55=13.09/2=6.54	0+008.000	0+010.000		6.54	2.00	0.10	M3	1.31	A
	B.-6.55+6.60=13.15/2=6.57	0+010.000	0+020.000		6.57	10.00	0.10	M3	6.57	B
	C.-6.60+6.48=13.08/2=6.54	0+020.000	0+030.000		6.54	10.00	0.10	M3	6.54	C
	D.-6.48+6.42=12.90/2=6.45	0+030.000	0+040.000		6.45	10.00	0.10	M3	6.45	D
	E.- 6.42+6.69=13.11/2=6.55	0+040.000	0+050.000		6.55	10.00	0.10	M3	6.55	E
	F.-6.69+6.94=13.63/2=6.81	0+050.000	0+060.000		6.81	10.00	0.10	M3	6.81	F
	G.-6.94+7.34=14.28/2=7.14	0+060.000	0+070.000		7.14	10.00	0.10	M3	7.14	G
	H.-7.34+5.56=12.90/2=6.45	0+070.000	0+080.000		6.45	10.00	0.10	M3	6.45	H
	I.-5.56+8.31=13.87/2=6.93	0+080.000	0+090.000		6.93	10.00	0.10	M3	6.93	I
	J.-8.31+8.14=16.45/2=8.22	0+090.000	0+100.000		8.22	10.00	0.10	M3	8.22	J
	K.- 8.14+8.03=16.17/2=8.08	0+100.000	0+110.000		8.08	10.00	0.10	M3	8.08	K
	L.- 8.03+8.30=16.33/2=8.16	0+110.000	0+120.000		8.16	10.00	0.10	M3	8.16	L
	M.-8.30+8.28=16.58/2=8.29	0+120.000	0+130.000		8.29	10.00	0.10	M3	8.29	M
						SUB - TOTAL HOJA 1		**M3**	**87.50**	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: MAJ/426	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/426-2023/LP	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A8	ACARREOS Y LIMPIEZA									
CARGA	CARGA MECÁNICA CON USO DE RETROEXCAVADORA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A TIRO LIBRE.									
		CARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION DE ASFALTO (HOJA 2)								
	ANCHO PROMEDIO									
	N.- 8.28+7.08=15.36/2=7.68	0+130.000	0+140.000		7.68	10.00	0.10	M3	7.68	N
	O.- 7.08+6.56=13.64/2=6.82	0+140.000	0+147.100		6.82	7.10	0.10	M3	4.84	O
	O'- 4.88+4.72=9.60/2=4.80	0+147.100	0+150.000		4.80	2.90	0.10	M3	1.39	O´
	P..-4.72+6.35=11.35/2=5.53	0+150.000	0+155.570		5.53	5.57	0.10	M3	3.08	P
	P´.- 9.17+9.58=18.75/2=9.37	0+155.570	0+160.000		9.37	4.43	0.10	M3	4.15	P´
		DESCUENTO REGISTROS		-6.00	1.00	1.00	0.10	M3	-0.60	
	Q.-9.58+10.15=19.73/2=9.86	0+160.000	0+170.000		9.86	10.00	0.10	M3	9.86	Q
	R.-10.15+10.26=20.41/2=10.20	0+170.000	0+180.000		10.20	10.00	0.10	M3	10.20	R
	S.-10.26+11.40=21.66/2=10.83	0+180.000	0+190.000		10.83	10.00	0.10	M3	10.83	S
	T.-11.40+11.86=23.26/2=11.63	0+190.000	0+200.000		11.63	10.00	0.10	M3	11.63	T
	U.-11.86+13.37=25.23/2=12.61	0+200.000	0+210.000		12.61	10.00	0.10	M3	12.61	U
	V.-13.37+16=29.37/2=14.68	0+210.000	0+216.000		14.68	6.00	0.10	M3	8.81	V
		SUB - TOTAL (ACARREO DEMOLICION ASFALTO) HOJA 2 =						M3	84.48	
		SUB - TOTAL HOJA 2						M3	84.48	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A8	**ACARREOS Y LIMPIEZA**									
CARGA	CARGA MECÁNICA CON USO DE RETROEXCAVADORA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A TIRO LIBRE.	**CARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION DE BANQUETA (HOJA 3)**								**LADO IZQ.**
	ANCHO PROMEDIO DEMOLICION DE BANQUETA									A
	LADO IZQ.									B
	A.- 1.63+1.52 =3.15 /2 =**1.57**	0+006.550	0+010.000		1.57	3.45	0.10	M3	0.54	C
	B.- 1.52+1.96=3.48/2=**1.74**	0+010.000	0+020.000		1.74	10.00	0.10	M3	1.74	D
	C.- 1.96+1.74=3.70/2=**1.85**	0+020.000	0+030.000		1.85	10.00	0.10	M3	1.85	E
	D.- 1.74+1.71=3.45/2=**1.72**	0+030.000	0+040.000		1.72	10.00	0.10	M3	1.72	F
	E.-1.71+1.71=3.42/2=**1.71**	0+040.000	0+050.000		1.71	10.00	0.15	M3	2.57	G
	F.-1.71+1.76=3.47/2=**1.73**	0+050.000	0+060.000		1.73	10.00	0.25	M3	4.32	H
	G.-1.76+1.95=3.71/2=**1.85**	0+060.000	0+070.000		1.85	10.00	0.15	M3	2.78	I
	H.-1.95+2.41=4.36/2=**2.18**	0+070.000	0+080.000		2.18	10.00	0.10	M3	2.18	I´
	I.-2.41+1.92=4.33/2=**2.16**	0+080.000	0+084.970		2.16	4.97	0.10	M3	1.07	J
	I'.-1.92+0.53=2.45/2=**1.22**	0+084.970	0+087.790		1.22	2.82	0.10	M3	0.34	K
	J.-1. 90+2.03=3.93/2=**1.96**	0+096.350	0+100.000		1.96	3.65	0.10	M3	0.71	L
	K.- 2.03+2.00=4.03/2=**2.01**	0+100.000	0+110.000		2.01	10.00	0.10	M3	2.01	L´
	L.- 2.00+1.84=3.84/2=**1.92**	0+110.000	0+113.200		1.92	3.20	0.10	M3	0.61	L´
	L´.- 1.84+0.20=2.04/2=**1.02**	0+113.200	0+120.000		1.02	6.80	0.10	M3	0.69	**LADO DERECHO**
	LADO DER.									G
	G.-0.68+0.65=1.33/2=**0.66**	0+063.380	0+070.000		0.66	6.62	0.10	M3	0.44	H
	H.-0.81+0.82=1.63/2=**0.81**	0+073.490	0+080.000		0.81	6.51	0.10	M3	0.53	I
	I.-0.82+0.89=1.71/2=**0.85**	0+080.000	0+090.000		0.85	10.00	0.10	M3	0.85	T
	T.-0.65+0.69=1.29/2=**0.67**	0+199.340	0+200.000		0.67	0.66	0.10	M3	0.04	U
	U.-0.65+1.41=2.06/2=**1.03**	0+200.000	0+210.000		1.03	10.00	0.10	M3	1.03	V
	V.-1.41+1.78=3.19/2=**1.59**	0+210.000	0+216.000		1.59	6.00	0.10	M3	0.95	
						SUB - TOTAL HOJA 3		**M3**	**26.96**	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: MAJ/426	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/426-2023/LP	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A8	**ACARREOS Y LIMPIEZA**									
CARGA	CARGA MECÁNICA CON USO DE RETROEXCAVADORA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A TIRO LIBRE.	**CARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION DE GUARNICION (HOJA 4)**								
						AREA				
		0+010.000	0+020.000			10.00	0.18	M3	1.75	Lado Der.
		0+020.000	0+030.000			10.00	0.18	M3	1.75	Lado Der.
		0+030.000	0+040.000			10.00	0.18	M3	1.75	Lado Der.
		0+040.000	0+050.000			10.00	0.18	M3	1.75	Lado Der.
	AREA DE GUARNICION	0+050.000	0+060.000			10.00	0.18	M3	1.75	Lado Der.
		0+060.000	0+070.000			10.00	0.18	M3	1.75	Lado Der.
	BASE MATOR = 0.20	0+070.000	0+080.000			10.00	0.18	M3	1.75	Lado Der.
	BASE MENOR= 0.15	0+080.000	0+090.000			10.00	0.18	M3	1.75	Lado Der.
	ALTURA= 0.50	0+090.000	0+100.000			10.00	0.18	M3	1.75	Lado Der.
		0+100.000	0+110.000			10.00	0.18	M3	1.75	Lado Der.
	AREA= 0.15+0.20/2= **0.175**	0+110.000	0+115.460			5.46	0.18	M3	0.96	Lado Der.
		0+115.460	0+120.760			5.30	0.18	M3	0.93	Lado Der.
		0+120.760	0+124.690			3.93	0.18	M3	0.69	Lado Der.
		0+124.690	0+128.920			4.23	0.18	M3	0.74	Lado Der.
		0+128.920	0+132.700			3.78	0.18	M3	0.66	Lado Der.
		0+200.000	0+210.000			10.00	0.18	M3	1.75	Lado Der.
		0+210.000	0+216.000			6.00	0.18	M3	1.05	Lado Der.
		0+013.000	0+020.000			7.00	0.18	M3	1.23	Lado Izq.
						SUB - TOTAL HOJA 4		**M3**	**25.50**	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	N Ú M E R O S G E N E R A D O R E S		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A8	**ACARREOS Y LIMPIEZA**									
CARGA	CARGA MECÁNICA CON USO DE RETROEXCAVADORA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A TIRO LIBRE.	**CARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION DE GUARNICION (HOJA 5)**								
						AREA				
		0+020.000	0+030.000			10.00	0.18	M3	1.75	Lado Izq.
		0+030.000	0+040.000			10.00	0.18	M3	1.75	Lado Izq.
		0+040.000	0+050.000			10.00	0.18	M3	1.75	Lado Izq.
		0+050.000	0+060.000			10.00	0.18	M3	1.75	Lado Izq.
		0+060.000	0+070.000			10.00	0.18	M3	1.75	Lado Izq.
		0+070.000	0+080.000			10.00	0.18	M3	1.75	Lado Izq.
		0+080.000	0+085.100			5.10	0.18	M3	0.89	Lado Izq.
		0+085.100	0+088.090			2.99	0.18	M3	0.52	Lado Izq.
		0+095.000	0+100.000			5.00	0.18	M3	0.88	Lado Izq.
		0+100.000	0+110.000			10.00	0.18	M3	1.75	Lado Izq.
		0+110.000	0+117.820			7.82	0.18	M3	1.37	Lado Izq.
		SUB - TOTAL (ACARREO DEMOLICION DE GUARNICION) HOJA 5 =						**M3**	**15.91**	
						SUB - TOTAL HOJA 5		**M3**	**15.91**	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: MAJ/426	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/426-2023/LP	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A8	**ACARREOS Y LIMPIEZA**									
CARGA	CARGA MECÁNICA CON USO DE RETROEXCAVADORA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A TIRO LIBRE.									
	ANCHO PROMEDIO DE MURO									
	MURO 1 A1.- 3.50 + 4.20=7.70 /2 = **3.85**									
	A2.- 2.90+4.37=7.27/2=**3.63**									
	A3.- 0.56X2.96=1.65/2= **0.83**									
	MURO 2 A1.- 4.75+6.44=11.19/2=**5.59**									
	A2.- 3.95+5.05=9.00/2=**4.50**									
	A3.- 1.86X2.30=4.27 / 2 = **2.14**									
	MURO 3 A1.- 3.70+4.70=8.40/2=**4.20**									
	A2.- 3.68+5.61=9.29/2=**4.64**									
	A3.- 0.73 X 3.80 = 2.69 / 2 = **1.39**									
	MURO 4 A1.- 1.00X0.70=**0.70**									
	A2.- 0.70X0.81/2=**0.28**									
	A3.- 0.50X0.70=0.35/2=**0.17**									
	A4.- 0.13X0.81=0.10/2=**0.05**									
	A5.-041X0.81=0.33/2=**0.17**									
	A6.-0.11X0.70=0.077/2=**0.038**									
	CARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CEPA DE MUROS DE MAMP. DE PIEDRA (HOJA 6)									
					AREA					
			MURO 1	A1	3.85	10.87	1.48	M3	61.93	
				A2	3.63	10.87	2.96	M3	116.79	
					AREA					
				A3	0.83	10.87		M3	9.02	TRIANGULO
			MURO 2	A1	5.59	11.13	3.35	M3	208.42	
				A2	4.50	11.13	2.30	M3	115.19	
					AREA					
				A3	2.14	11.13		M3	23.81	
			MURO 3	A1	4.20	10.00	2.00	M3	84.00	
				A2	4.64	10.00	3.80	M3	176.32	
					AREA					
				A3	1.39	10.00		M3	13.90	
					AREA					
			MURO 4	A1	0.70	22.00		M3	15.40	
				A2	0.56	22.00		M3	12.32	
				A3	0.17	22.00		M3	3.74	
				A4	0.05	22.00		M3	1.10	
				A5	0.17	22.00		M3	3.74	
				A6	0.04	22.00		M3	0.83	
						SUB - TOTAL HOJA 6		M3	846.51	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: MAJ/426	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/426-2023/LP	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A8	ACARREOS Y LIMPIEZA									
CARGA	CARGA MECÁNICA CON USO DE RETROEXCAVADORA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A TIRO LIBRE.	CARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CEPA DE MUROS DE MAMP. DE PIEDRA (HOJA 7)								
		0+002.000	0+010.000		0.30	8.00	0.20	M3	0.48	Lado Der.
		0+010.000	0+020.000		0.30	10.00	0.20	M3	0.60	Lado Der.
		0+020.000	0+030.000		0.30	10.00	0.20	M3	0.60	Lado Der.
		0+030.000	0+040.000		0.30	10.00	0.20	M3	0.60	Lado Der.
		0+040.000	0+050.000		0.30	10.00	0.20	M3	0.60	Lado Der.
		0+050.000	0+060.000		0.30	10.00	0.20	M3	0.60	Lado Der.
		0+060.000	0+070.000		0.30	10.00	0.20	M3	0.60	Lado Der.
		0+070.000	0+080.000		0.30	10.00	0.20	M3	0.60	Lado Der.
		0+080.000	0+090.000		0.30	10.00	0.20	M3	0.60	Lado Der.
		0+090.000	0+100.000		0.30	10.00	0.20	M3	0.60	Lado Der.
		0+100.000	0+110.000		0.30	10.00	0.20	M3	0.60	Lado Der.
		0+008.000	0+010.000		0.30	2.00	0.20	M3	0.12	Lado Izq.
		0+010.000	0+020.000		0.30	10.00	0.20	M3	0.60	Lado Izq.
		0+020.000	0+030.000		0.30	10.00	0.20	M3	0.60	Lado Izq.
		0+030.000	0+040.000		0.30	10.00	0.20	M3	0.60	Lado Izq.
		0+040.000	0+050.000		0.30	10.00	0.20	M3	0.60	Lado Izq.
		0+050.000	0+060.000		0.30	10.00	0.20	M3	0.60	Lado Izq.
		0+060.000	0+070.000		0.30	10.00	0.20	M3	0.60	Lado Izq.
		0+070.000	0+080.000		0.30	10.00	0.20	M3	0.60	Lado Izq.
		0+080.000	0+087.70		0.30	7.70	0.20	M3	0.46	Lado Izq.
		0+100.000	0+113.00		0.30	13.00	0.20	M3	0.78	Lado Izq.
						SUB - TOTAL HOJA 7		M3	12.04	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

ACAPULCO

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/426	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/426-2023/LP	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	ANCHO P.	LARGO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A8	**ACARREOS Y LIMPIEZA**									
CARGA	CARGA MECÁNICA CON USO DE RETROEXCAVADORA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A TIRO LIBRE.									
	RESUMEN DE CARGA Y ACARREO									
	SUB -TOTAL DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA (HOJA 1) =							M3	87.50	
	SUB -TOTAL DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA (HOJA 2) =							M3	84.48	
	SUB - TOTAL DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO (HOJA 3) =							M3	26.96	
	SUB - TOTAL DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO (HOJA 4) =							M3	25.50	
	SUB - TOTAL DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO (HOJA 5) =							M3	15.91	
	SUB - TOTAL ACARREO DE MATERIAL PROD. DE EXCAVACION EN CEPA DE MUROS DE MAMP. DE PIEDRA (HOJA 6) =							M3	846.51	
	SUB - TOTAL ACARREO DE MATERIAL PROD. DE EXCAVACION EN CEPA DE MUROS DE MAMP. DE PIEDRA (HOJA 7) =							M3	12.04	
	(-) MENOS RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVCION EN MUROS DE MAMPOSTERIA							M3	-489.78	
	(-) MENOS RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVCION EN GUARNICIÓN							M3	-6.77	
	SUB-TOTAL M3 DE CARGA Y ACARREO DE MAT. PROD. DE DEMOLICION Y EXCAVACION =							**M3**	**602.35**	
	ABUNDAMIENTO 30% =							M3	**180.71**	
	TOTAL M3 DE CARGA Y ACARREO DE MAT. PROD. DE DEMOLICION Y/O EXCAVACION =							**M3**	**783.06**	
	TOTAL M3 DE CARGA MECANICA Y ACARREO =							**M3**	**783.06**	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
		FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A8 **ACARREOS Y LIMPIEZA**

CARGA CARGA MECÁNICA CON USO DE RETROEXCAVADORA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A TIRO LIBRE.



IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
		FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A8 **ACARREOS Y LIMPIEZA**

CARGA CARGA MECÁNICA CON USO DE RETROEXCAVADORA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A TIRO LIBRE.

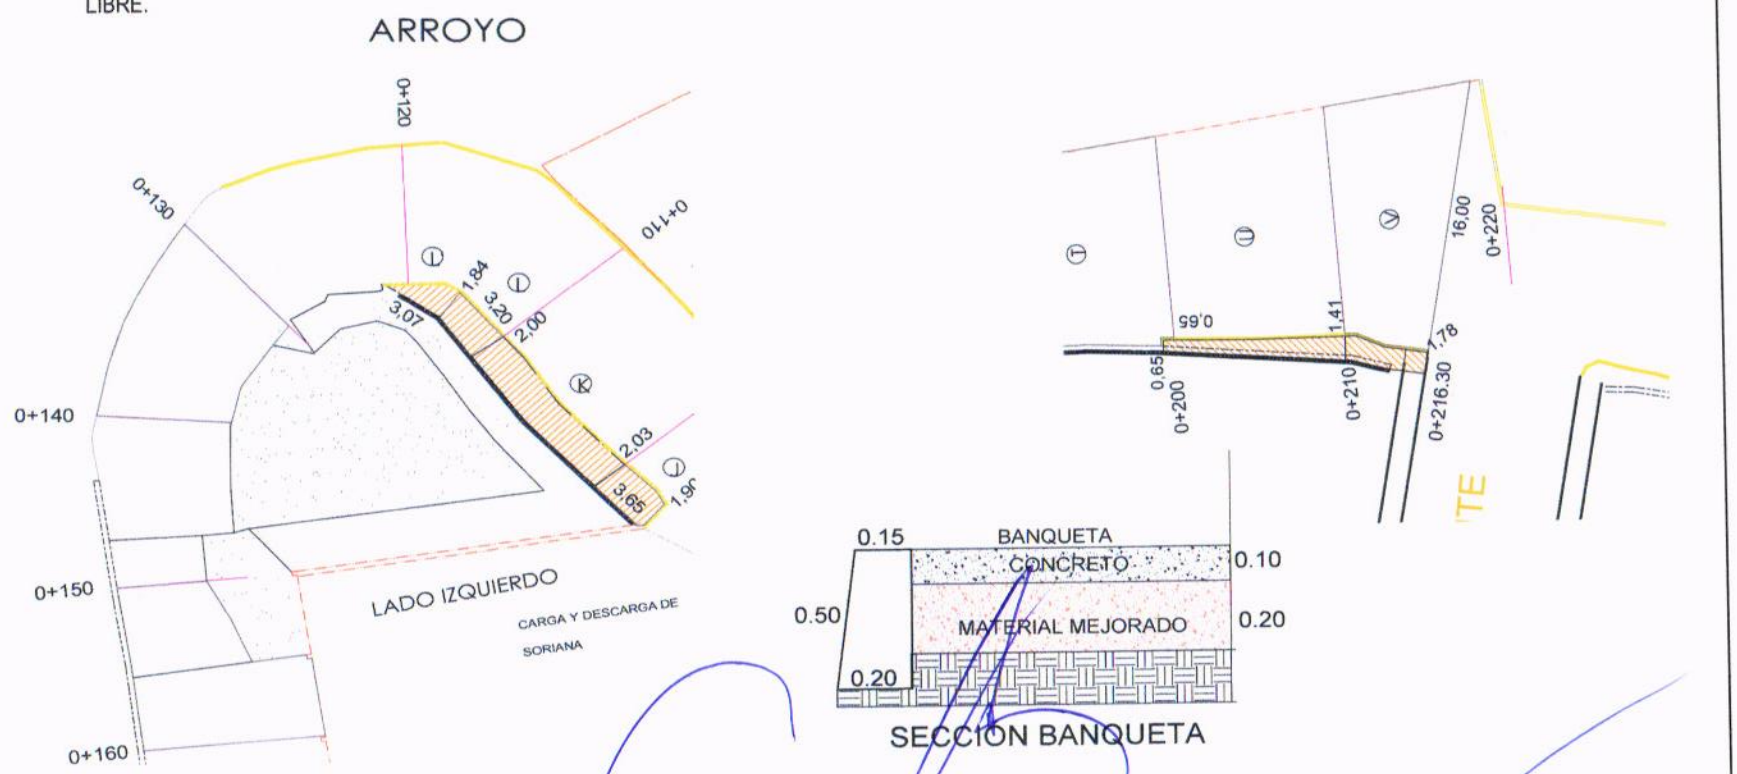

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
		FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A8 **ACARREOS Y LIMPIEZA**


CARGA CARGA MECÁNICA CON USO DE RETROEXCAVADORA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A TIRO LIBRE.

LADO IZQUIERDO (E)




SECCIÓN BANQUETA

LADO IZQUIERDO (F)



SECCIÓN BANQUETA

LADO IZQUIERDO (F)



SECCIÓN BANQUETA

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
		FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A8 **ACARREOS Y LIMPIEZA**

CARGA CARGA MECÁNICA CON USO DE RETROEXCAVADORA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A TIRO LIBRE.



ACARREO DE MATERIAL PROD. DE DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
		FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A8 **ACARREOS Y LIMPIEZA**

CARGA CARGA MECÁNICA CON USO DE RETROEXCAVADORA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A TIRO LIBRE.

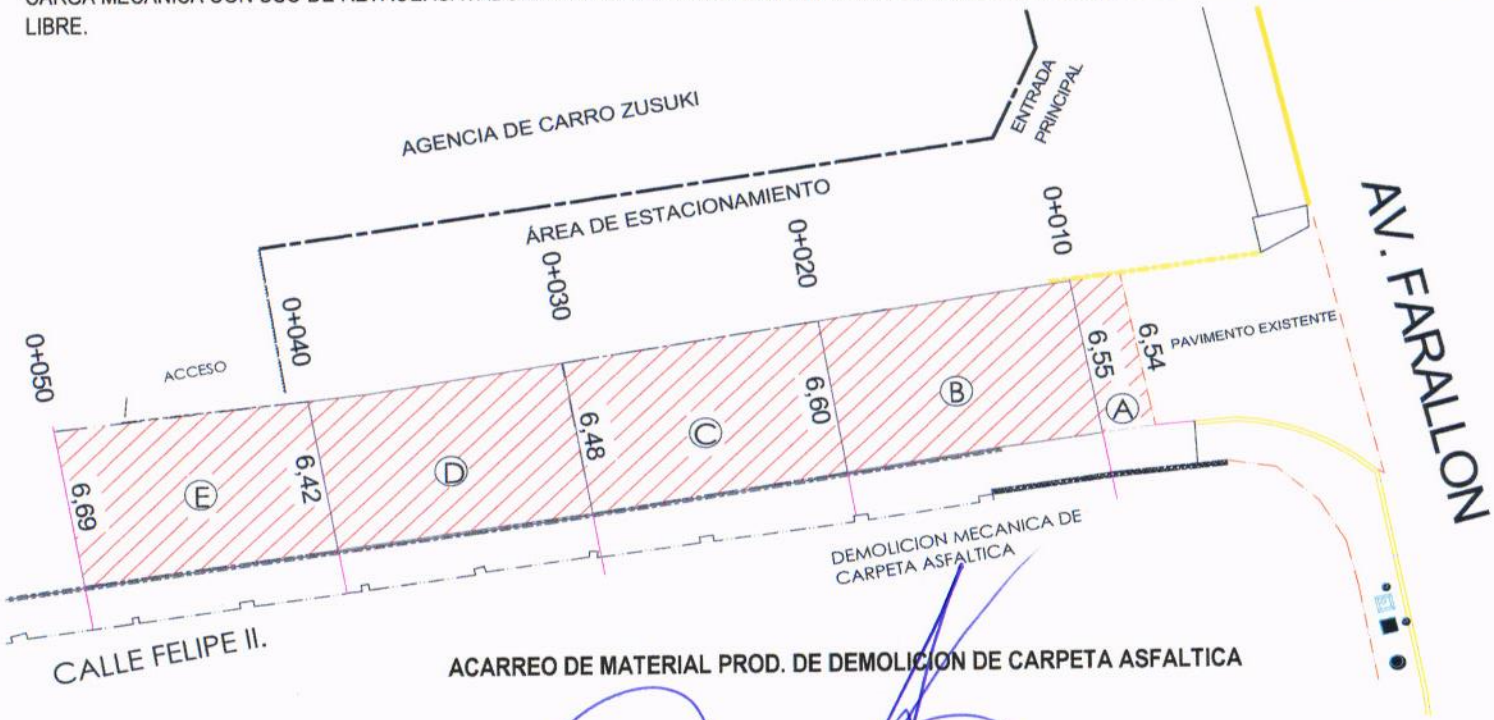

ACARREO DE MATERIAL PROD. DE DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
		FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A8 **ACARREOS Y LIMPIEZA**

CARGA CARGA MECÁNICA CON USO DE RETROEXCAVADORA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A TIRO LIBRE.

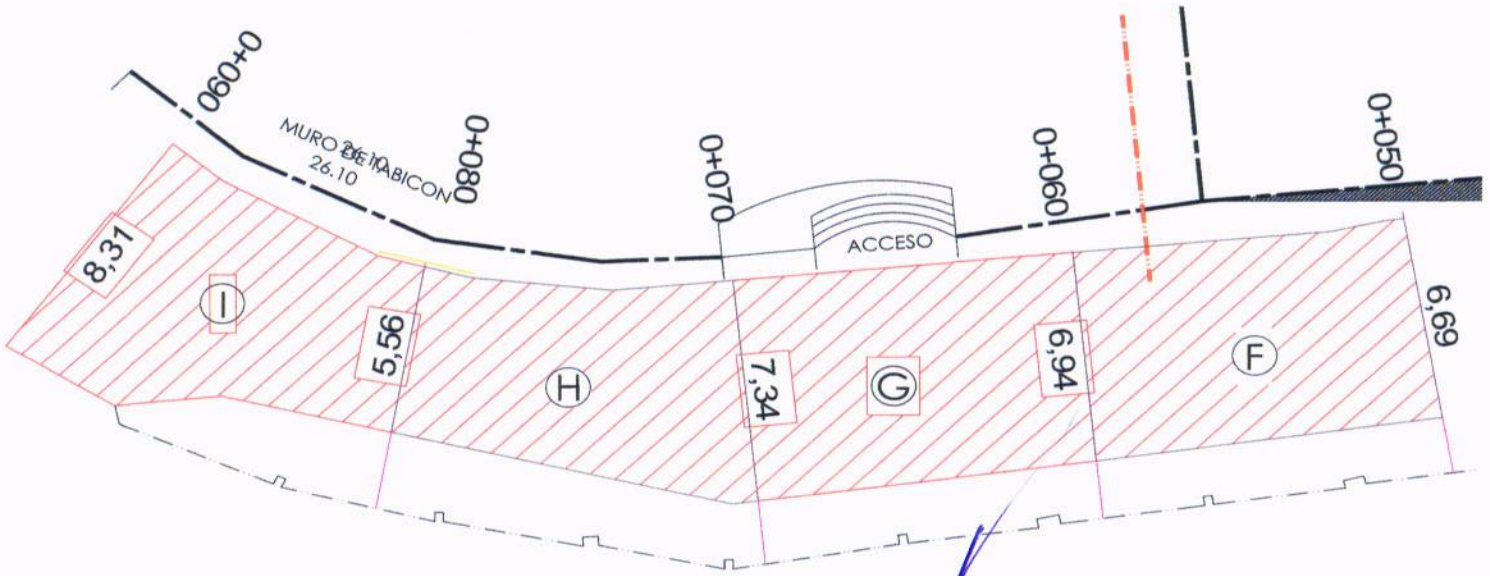

ACARREO DE MATERIAL PROD. DE DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: MAJ/426	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
		FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/426-2023/LP	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A8 **ACARREOS Y LIMPIEZA**

CARGA CARGA MECÁNICA CON USO DE RETROEXCAVADORA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A TIRO LIBRE.

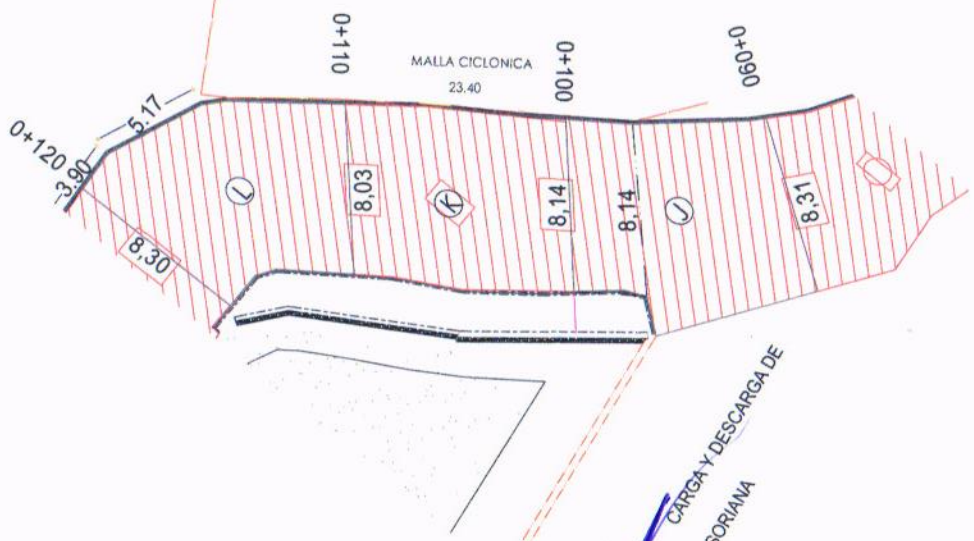

ACARREO DE MATERIAL PROD. DE DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
		FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A8 **ACARREOS Y LIMPIEZA**

CARGA CARGA MECÁNICA CON USO DE RETROEXCAVADORA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A TIRO LIBRE.

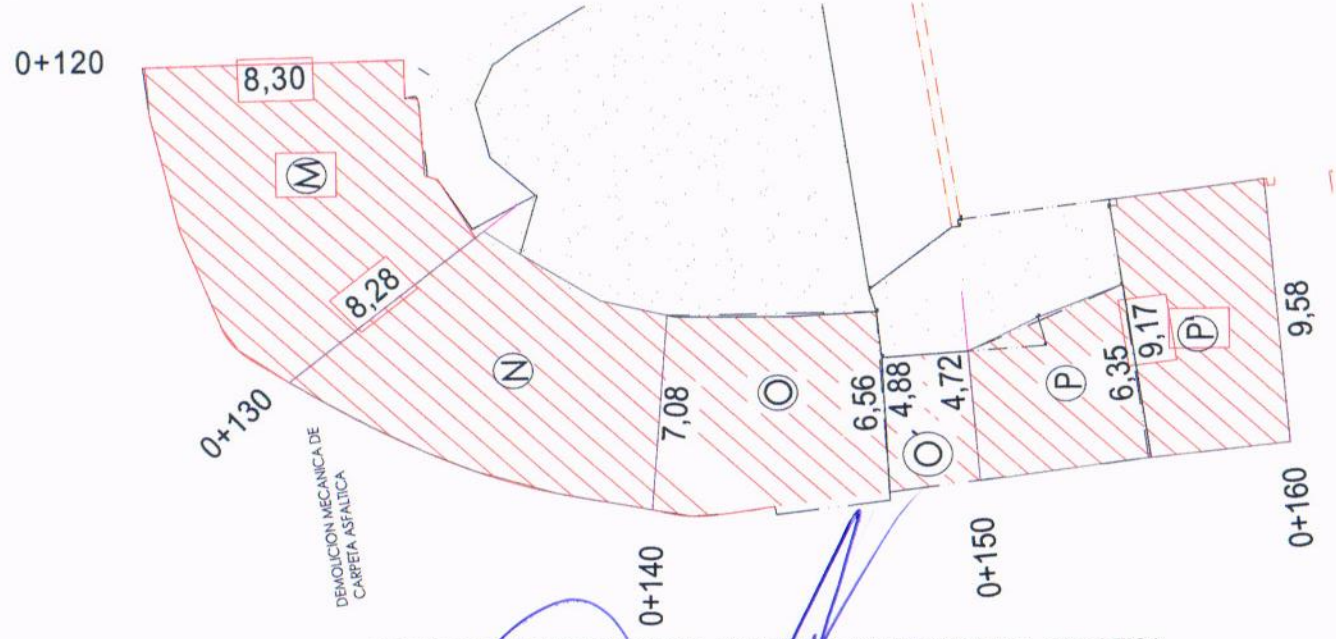

ACARREO DE MATERIAL PROD. DE DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
		FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A8 **ACARREOS Y LIMPIEZA**

CARGA CARGA MECÁNICA CON USO DE RETROEXCAVADORA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A TIRO LIBRE.

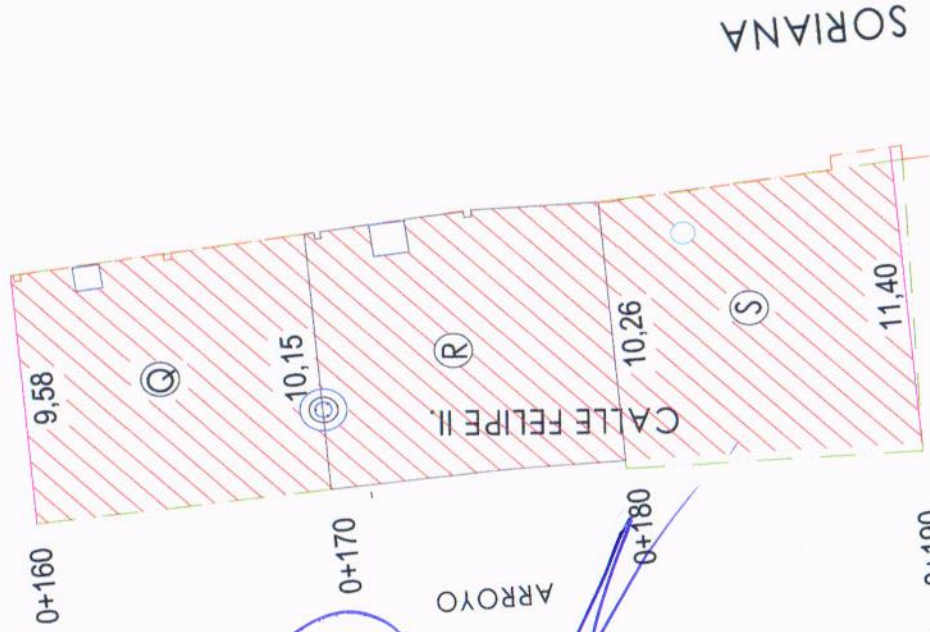

ACARREO DE MATERIAL PROD. DE DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/426**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
		FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2023	DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**	AL: 01 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	IMEXA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.		

C R O Q U I S

A8 **ACARREOS Y LIMPIEZA**

CARGA CARGA MECÁNICA CON USO DE RETROEXCAVADORA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A TIRO LIBRE.



ACARREO DE MATERIAL PROD. DE DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO)
		FECHA	01 DE OCTUBRE DEL 2023



CARGA .- Carga mecánica con uso de retroexcavadora y acarreo en camión de volteo (6M3) de material producto de excavación y/o demolición a tiro libre.

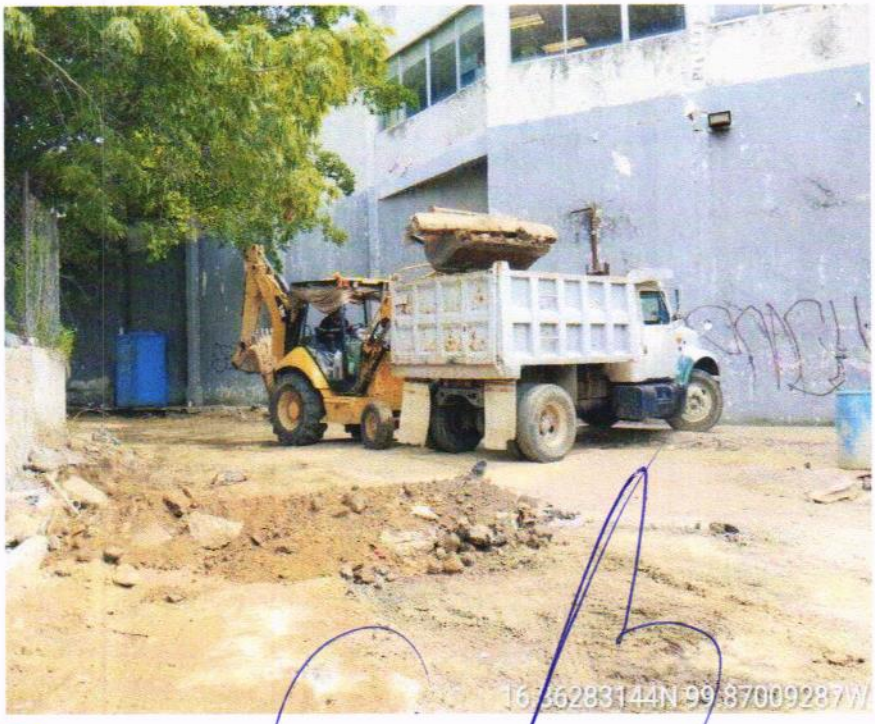

CARGA .- Carga mecánica con uso de retroexcavadora y acarreo en camión de volteo (6M3) de material producto de excavación y/o demolición a tiro libre.


IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO)
		FECHA	01 DE OCTUBRE DEL 2023



CARGA .- Carga mecánica con uso de retroexcavadora y acarreo en camión de volteo (6M3) de material producto de excavación y/o demolición a tiro libre.

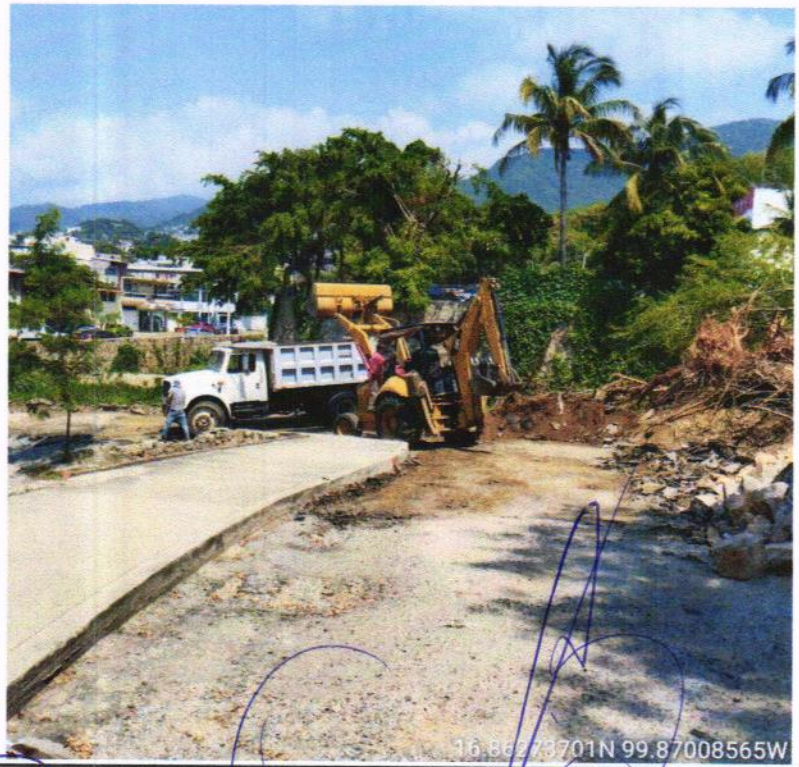

CARGA .- Carga mecánica con uso de retroexcavadora y acarreo en camión de volteo (6M3) de material producto de excavación y/o demolición a tiro libre.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	**RESIDENTE DE OBRA** ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA** ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO)
		FECHA	01 DE OCTUBRE DEL 2023



CARGA .- Carga mecánica con uso de retroexcavadora y acarreo en camión de volteo (6M3) de material producto de excavación y/o demolición a tiro libre.



CARGA -Carga mecánica con uso de retroexcavadora y acarreo en camión de volteo (6M3) de material producto de excavación y/o demolición a tiro libre.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.	**NO. DE CONTRATO**	**MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
UBICACIÓN	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO)
		FECHA	01 DE OCTUBRE DEL 2023



CARGA .- Carga mecánica con uso de retroexcavadora y acarreo en camión de volteo (6M3) de material producto de excavación y/o demolición a tiro libre.



CARGA -Carga mecánica con uso de retroexcavadora y acarreo en camión de volteo (6M3) de material producto de excavación y/o demolición a tiro libre.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA DE OBRA

REGISTRO DE FIRMAS

EL CONTRATISTA
SUPERINTENDENTE

ARQ. VICENTE ALARCON OLIVERIANO

EL RESIDENTE DE OBRA
POR EL MUNICIPIO

ARQ. JOEL MAURICIO PALMERO JIMENEZ

FOLIO: Nº 306901

OBRA:

FECHA: 15 /AGOSTO/2023

UBICACION: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.

NOTA 1:

Con esta fecha y números de nota la supervisión de la SDUOP y la contratista

Nos encontramos reunidos en el sitio de la obra denominada REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO PARALELA AV. UNIVERSIDAD FRACC. MAGALLANES

La cual se encuentra ubicada en ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

Para efecto de llevar acabo la apertura de la presente Bitácora de Obra acordando los siguientes datos:

- No. de contrato. MAI-FAISMUN/426-2023/LP
- Nombre y Teléfono del ó la Contratista IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV. 74 44 49 09 12
- Nombre del Representante legal ING. JESUS OSCAR HERNANDEZ
- Nombre y Teléfono del Superintendente de Obra ARQ. VICENTE ALARCON CEVERINO. 74 42 35 47 19

Los cuales presentaron credencial expedida por el (IFE,INE) para identificarse y darle la legalidad necesaria a la apertura de la bitácora convencional. Solicitando la siguiente información del contrato otorgado por la dirección de obras públicas.

- Periodo contractual. 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
- Fecha de inicio. 15 DE AGOSTO DEL 2023
- Monto del contrato. $ 5,000,427.46
- Fecha del anticipo. 7 DE SEPTIEMBRE DE 2023
- Monto del anticipo. $ 1,500,128.24

ARQ. ORLEL MARCELO CARMEN GIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR

ARQ. VICENTE ALARCON CEVERINO
SUPERINTENDENTE

FOLIO: Nº 306902

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO PARCIAL

FECHA: 15/AGOSTO/2023 AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGISTRADOS ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

NOTA 2:

En cumplimiento a los artículos 53, 64, 65, 66 y 67 de la ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, del Estado de Guerrero No. 266. Y los artículos 93, 94, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 122, 123, 124 y 125 del Reglamento de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. El día de hoy los que intervienen y firman la presente Bitacora de Obra, nos encontramos reunidos en el lugar de ejecución de los trabajos por parte del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Gro.

El Residente de Obra Ing./Arq. ARQ. ABEL MAURICIO ORUMBEA JIMENEZ

El supervisor asignado para esta obra el Ing./Arq. _____

Por parte del(a) Contratista el Superintendente de Construcción Ing./Arq. VICENTE ALARCON SEVERIANO

Con la finalidad de definir los alcances y el trazo de la Obra antes mencionada.

También se acuerda como máximo un periodo de tres días hábiles para la contestación y/o petición de las notas que se asientan en esta Bitacora de Obra. También se informa a la contratista que las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una anticipación no mayor a un mes. El contratista deberá presentar a la Residencia de Obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la Dependencia.

ANOTACIONES GENERALES:

1. Los números generadores deberán concordar con los croquis, los cuales estarán referenciados con las cotas de las plantas de conjunto y detalles elaborando un croquis por cada concepto que se genere.

2. Presentar reporte fotográfico y explicativo de cada concepto por estimar (inicio, proceso y terminación). Cada fotografía deberá ser horizontal y estar geo-referenciada.

3. La contratista elaborará la Bitácora Social (Rotulo de Obra) que se colocará desde el inicio de los trabajos hasta la revisión por parte de la Contraloría General y los órganos verificadores de acuerdo a la procedencia del Recurso origen de la Obra.

4. Para la ejecución de las obras, se considera que la Bitácora deberá permanecer siempre disponible durante la ejecución de la obra.

5. Todo evento relevante de obra o cambio en el proyecto y proceso de la misma deberá ser autorizado por bitácora por parte de la residencia de Obra antes de llevarse a cabo.

ARQ. ABEL MAURICIO ORUMBEA JIMENEZ — RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR

VICENTE ALARCON SEVERIANO — SUPERINTENDENTE

FOLIO: Nº 306903

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO AZALEAS

FECHA: 15/AGOSTO/2023 AV. UNIVERSIDAD ENTRE C. MAGALLANES Y ACAPULCO DE JUAREZ. ACAPULCO

ANOTACIONES PARTICULARES:

1. El uso de la Bitácora es obligatorio en cada uno de los contratos de Obra y Servicios; debiendo permanecer en la Residencia de Obra, a fin de que las consultas requeridas se efectuen en el sitio, sin que la Bitácora pueda ser extraida del lugar de los trabajos. En casos necesarios de no contar con una oficina con la seguridad necesaria, la Bitácora de Obra permanecerá bajo la custodia del supervisor de la SDUOP durante el periodo de ejecución de la Obra.

2. Respecto al procedimiento constructivo de los materiales y acabados de cada uno de los conceptos así como sus especificaciones deberán apegarse al proyecto y presupuesto autorizado en el contrato. De no ejecutarse así se procederá a su corrección inmediatamente sea cual fuera el concepto en cuestión y bajo su propia responsabilidad económica.

3. Todas las autorizaciones en Bitácora de Obra, deberán ser firmadas por ambas partes de la emisora (cualquiera de las dos partes) como responsable de la nota y la receptora de enterado o conforme. En caso de inconformidad se contestara en la siguiente nota, por tanto SE CONCEDE UN PLAZO DE 48 HORAS PARA FIRMAR. De no hacerlo se acepta automáticamente el contenido de la nota en cuestión, perdiendo el derecho de inconformidad o a la aceptación bajo protesta.

NOTA 3

Con esta misma fecha y número de nota se hace del conocimiento del contratista los siguientes puntos:

- Que mediante notas de bitácoras se deberá registrar el proceso de la obra así como el avance físico semanal.
- Que para evitar accidentes o cualquier situación de riesgo, el contratista deberá colocar todas las señalizaciones preventivas y restrictivas que permitan a los habitantes tomar las preocupaciones necesarias al momento de transitar por el lugar de los trabajos.
- Como medida de prevención, todo el personal que se encuentre trabajando en la obrá deberá contar con el equipo de seguridad como cascos, botas y chalecos.
- Que toda omisión de estas medidas son responsabilidad para el contratista y el desacato implicará la suspensión de la obra hasta que se cumplan con los puntos anteriores.

ARQ. OZIEL MAURICIO DIVISION JIMENEZ		ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO
RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR	SUPERINTENDENTE

FOLIO Nº 306904

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FRACC. [illegible] AV. UNIVERSIDAD FRACC. MOLINOS, MUNICIPIO DE JUAREZ

FECHA: 15 AGOSTO/2023 FEBRERO

NOTA 4

SIENDO LAS 11:00 HRS EN EL LUGAR DONDE SE LLEVARA A CABO LA SUPERVISION DE LA OBRA DE NOMINADA REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FRACC. UNIVERSIDAD FRACC. MOLINOS, MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA CON NUMERO DE CONTRATO MAI-FDI-OBRA-420-2023/LP, LOS PRESENTES ARQ. UZIEL MAURICIO PALMERIN JIMENEZ, RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE JUAREZ, ELC. ARQ. VICENTE ALARCON OCHOA, SUPERINTENDENTE DE OBRA EN REPRESENTACION DE LA EMPRESA IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV. HACE LA ENTREGA DEL SITIO A LA EMPRESA IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV. DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CALLE, ASI TAMBIEN DE APERTURA ESTA BITACORA DE OBRA; DICHO DOCUMENTO TIENE COMO FINALIDAD DESCRIBIR EL DESARROLLO DE LA OBRA, HACER NOTAS DE AVANCE, NOTAS DE RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA, SERA FIRMADO AL CIERRE POR CADA NOTA ELABORADA, FIRMARAN NOS QUE EN ELLA INTERVENIMOS; EL C. ARQ. UZIEL MAURICIO PALMERIN JIMENEZ RESIDENTE DE OBRA, EL C. ARQ. VICENTE ALARCON OCHOA SUPERINTENDENTE DE OBRA, EN REPRESENTACION DE LA EMPRESA IMEXA CONSTRUCTORES SA. DE CV.

RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR	SUPERINTENDENTE
ARQ. UZIEL MAURICIO PALMERIN JIMENEZ		ARQ. VICENTE ALARCON OCHOA

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 306905

OBRA: DEMOLICIÓN DE CALLE FELIPE II, TRAMO AV. [illegible] Y BLVD. FRAY MARGARITAS, ACOPILCO DE JUAREZ, GUERRERO.

FECHA: 15/AGOSTO/2023

NOTA 5

CON ESTA NOTA DE BITACORA Y FIRMA LA CONTRATISTA DE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRAFICA, ASI MISMO SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO POR MEDIOS MECANICOS, ASI COMO EL DESPALME Y ACOPIO DE PRODUCTO DE DEMOLICIÓN YA QUE ESTA CALLE PRESENTA EL ACCESO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS AL ALMACEN DE LA TIENDA DE AUTOSERVICIO SOLICITA.

ARQ. JOEL MARCIAL CABRERA JIMENEZ
RESIDENTE

ARQ. VICENTE DURÓN CEVERINO
SUPERINTENDENTE.

NOTA NO 6

17/AGOSTO/2023

CON ESTA FECHA Y NOTA DE BITACORA LA CONTRATISTA SE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA QUE SE CONTINUA CON LA DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO Y SIMULTANEAMENTE SE INICIA CON LA CARGA Y ACARREO A TIRO LIBRE DE ESTE; ASI MISMO SE CHIA Y INICIA CON OTRO EQUIPO MECANICO RETROEXCAVADORA; LAS EXCAVACIONES PARA LA CONSTRUCCION DEL MURO I DE MAMPOSTERIA DE PROTECCION DEL ENCAUSAMIENTO CTOPOS AL CT 135 APROXIMADAMENTE EN LOS CONSTRUCTOS. A Y B.

(CONTINUA NOTA 6...)

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. JOEL MARCIAL CABRERA JIMENEZ

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
ARQ. VICENTE DURÓN CEVERINO


ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 306905

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MISIONES, ACAPULCO

FECHA: 17/AGOSTO/2023 DE CONCRETO HIDRAULICO

CONTINUA NOTA NO 6

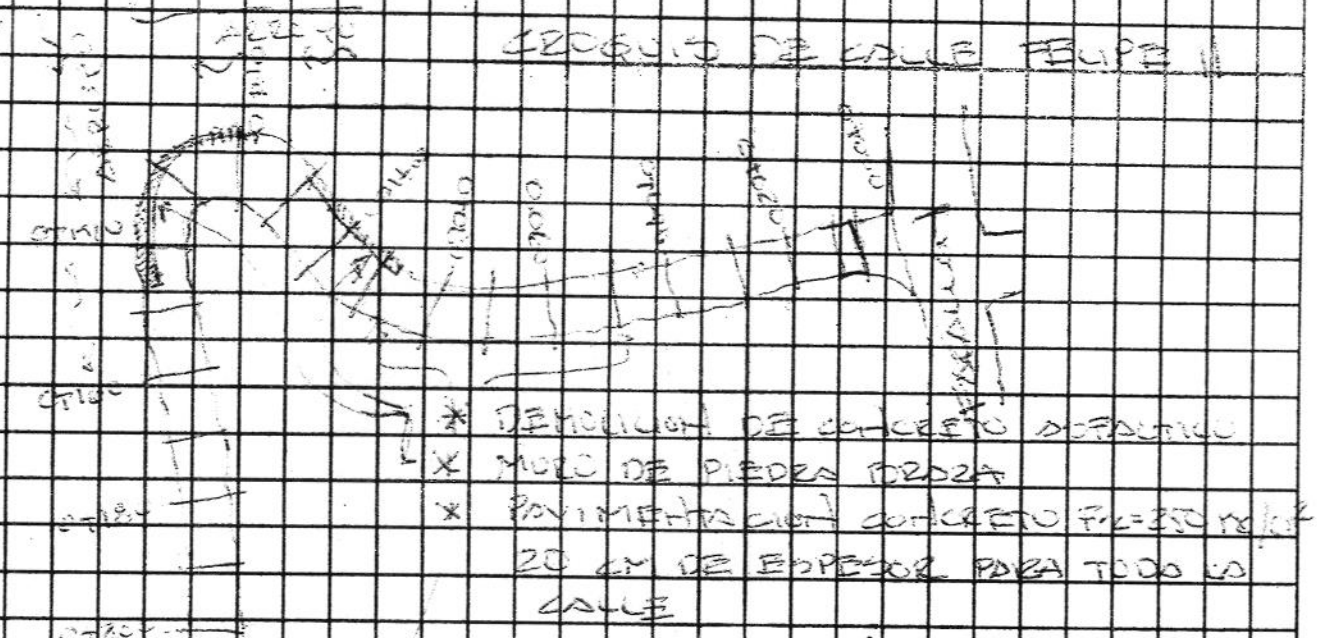

* DEMOLICION DE CONCRETO ASFALTICO
* MURO DE PIEDRA BRAZA
* PAVIMENTACION CONCRETO F'c=250 kg/cm² 20 cm DE ESPESOR PARA TODO LA CALLE

ARQ. ISRAEL MANCILLA JIMENEZ.
RESIDENTE

ARQ. VICENTE MORALES S.
SUPERINTENDENTE

NOTA NO. 7

22/AGOSTO/2023

CON ESTA FECHA Y NOTA DE NOTA EN VISITA DE OBRA EN RESIDENCIA DE OBRA SE REALIZA EL RECORRIDO Y OBSERVA QUE LOS TRABAJOS DE DEMOLICION DE CONCRETO ASFALTICO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION ESTAN A UN 40% Y DE CONFORMIDAD CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION MECANICA Y SE HA TOPADO CON EL DESPLANTE DEL MURO DE MAMPOSTERIA JUNTO A LA CORTINA EXISTENTE.

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. ISRAEL MANCILLA JIMENEZ

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
ARQ. VICENTE MORALES JEREMIAS

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 306907

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FRACCION AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGNOLIAS

FECHA: 15/AGOSTO/2023 ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

NOTA NO 8

CON ESTA FECHA Y NOTA DE BITACORA LA CONTRATISTA INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA, QUE SE HA CONCLUIDO LOS TRABAJOS DE DEMOLICION DE LA CARPETA ASFALTICA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+216.20 Y SE CONTINUA CON EL RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, CARGADO CON EQUIPO MECANICO FUERA DE LA OBRA, DANDO INICIO A LA DEMOLICION DE CADENAS Y BANQUETAS, SE INFORMA TAMBIEN QUE SE CONTINUA CON LA EXCAVACION Y CONSTRUCCION DEL MURO DE PIEDRA BRAZA, ASI COMO LA REPARACION DE LOS MUROS INFERIORES DEL CAUSE DEL ARROYO POR EROSION.

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ
RESIDENTE

ARQ. VICENTE ALARCON OVERIANO
SUPERINTENDENTE.

NOTA NO 9

24/AGOSTO/2023

CON ESTA FECHA Y NOTA DE BITACORA LA CONTRATISTA SE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA. QUE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DEL MURO DE PIEDRA BRAZA; ASIENDO LA OBSERVACION DE QUE AMPLIARA LA BASE DE DESPLANTE DEL MURO YA QUE EN DETERMINADO CADENAMIENTO EL FLUJO DEL CAUSE DEL ARROYO ES DE MAYOR FRICCION YA QUE EN ESTA PARTE DEL MURO CONVERGEN LOS ARROYOS PROVENIENTES DE LA CAÑADA DE LOS ANIMALES Y EL CAUSE DE LA CARITA DICHA MODIFICACION AUMENTARA LOS VOLUMENES DE EXCAVACION Y PIEDRA BRAZA, RELLENO Y TERRAPLEN. (CONTINUA NOTA 9 ...)

RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR	SUPERINTENDENTE
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ		ARQ. VICENTE ALARCON OVERIANO


FOLIO Nº 306908

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO PARALELA AV. UNIVERSIDAD FRACC. MAGISTRADOS

FECHA: 25 AGOSTO/2023 ZAMPUCO DE JUAREZ GUERRERO.

CONTINUA NOTA 9..

CROQUIS.

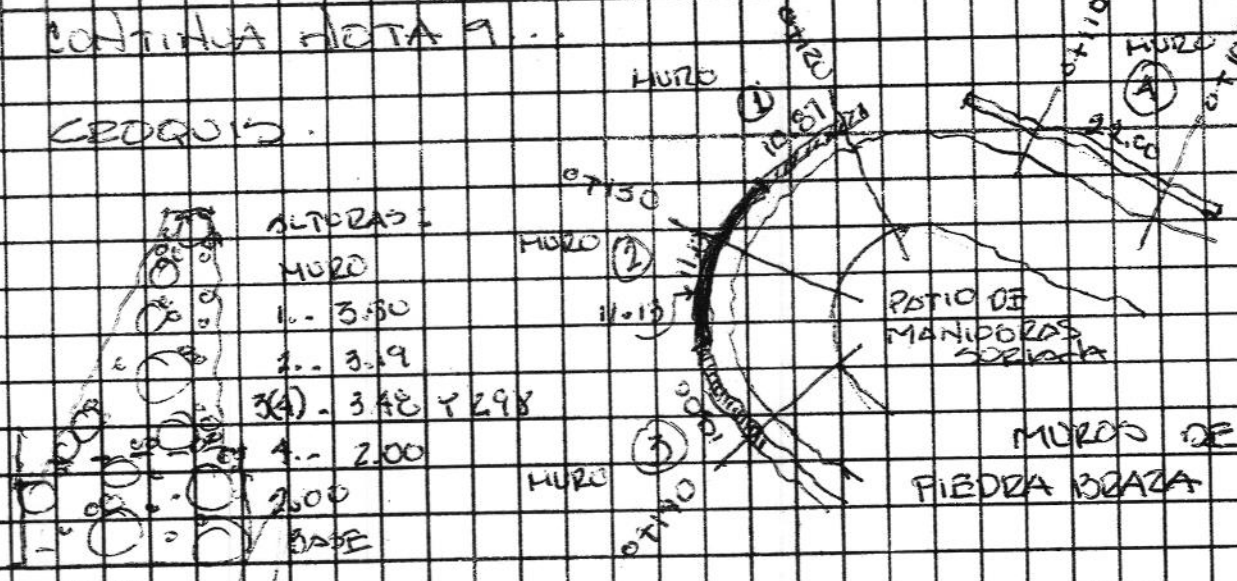

ARQ. URIEL MAURICIO CALMECAC JIMENEZ.
RESIDENTE

ARQ. VICENTE DIARCO DEVERANO
SUPERINTENDENTE

NOTA NO 10

31 AGOSTO / 2023

CON ESTA FECHA Y NOTA DE BITACORA DE OBRA, LA RESIDENCIA DE OBRA REALIZA UNA VISITA DE OBRA, Y EN RECORRIDO OBSERVA QUE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MUROS DE PIEDRA BRAZA SE ENCUENTRAN EN UN 25% Y SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS DE EXCAVACION A MANO PARA ALOJAR LAS CIMENTACIONES; POR LOS MODIFICACIONES AL MURO DE MAMPOSTERIA SE LE PIDE A LA CONTRATISTA QUE REALICE UN REPLANTEO DE LOS VOLUMENES DE OBRA PARA SU ANALISIS Y SEAN AUTORIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS

RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR	SUPERINTENDENTE
ARQ. URIEL MAURICIO CALMECAC JIMENEZ		ARQ. VICENTE DIARCO DEVERANO.

FOLIO Nº 306909

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II. TRAMO FRACCION DEL CONVENTO DEL FRACC. MACALLANES.
FECHA: 6/ SEPTIEMBRE /2023 ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

NOTA NO 11

CON ESTA FECHA Y NOTA DE BITACORA LA CONTRATISTA LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA QUE SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DEL MURO DE PIEDRA BRAZA. EL CUAL SE ENCUENTRA EN UN 50 %; ASI MISMO SE INFORMA DEL INICIO DE CONSTRUCCION DE FUNDICION DEL CODENAMIENTO ESTABA AL OTOÑA, ASI COMO EL INICIO DE LA EXCAVACION MANUAL PARA COLOCAR LA TUBERIA HIDRAULICA CON TUBO DE PVC RD-26 DE 3"

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ
RESIDENTE

ARQ. VICENTE ALARCON DEVERIANO
SUPERINTENDENTE

NOTA NO 12

8/ SEPTIEMBRE /2023

CON ESTA FECHA Y NOTA DE BITACORA LA RESIDENCIA DE OBRA LE INFORMA QUE PRESENTE A LA CONTRATISTA SUS ESTIMACIONES DE OBRA UNA VEZ PRESENTADA LA ESTIMACION UNO (UNO) PARA DEDUCIDAS EN LA ESTIMACION POSTERIOR

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ
RESIDENTE

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
ARQ. VICENTE ALARCON DEVERIANO
SUPERINTENDENTE

FOLIO Nº 306910


REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON

OBRA: AV. UNIVERSIDAD FRACC. MAGALLANES

FECHA: 12/SEPTIEMBRE/2025 ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

NOTA NO 13

CON ESTA FECHA Y NOTA DE BITACORA LA CONTRATISTA INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA QUE EL MURO DE PIEDRA BRAZA SE ENCUENTRA A UN 60% Y SE HA RELLENADO EN CAPAS DE 20 CM. COMPACTADO A MANO ADJUNTO ME HASTA SU RELLENO FINAL. DE INFORME QUE EL COLADO DE GUARNICION SE CONTINUA CON UN 80% DE AVANCE TOTAL Y EN LO QUE RESPECTA A LA INSTALACION HIDRAULICA SE HA COLOCADO LA CAMA DE ARENA Y SE INICIO EL RELLENO EN CAPAS DE LA ESTACION 0+000 A LA 0+078 Y SE HA ELABORADO 3 REGISTROS ELECTRICOS

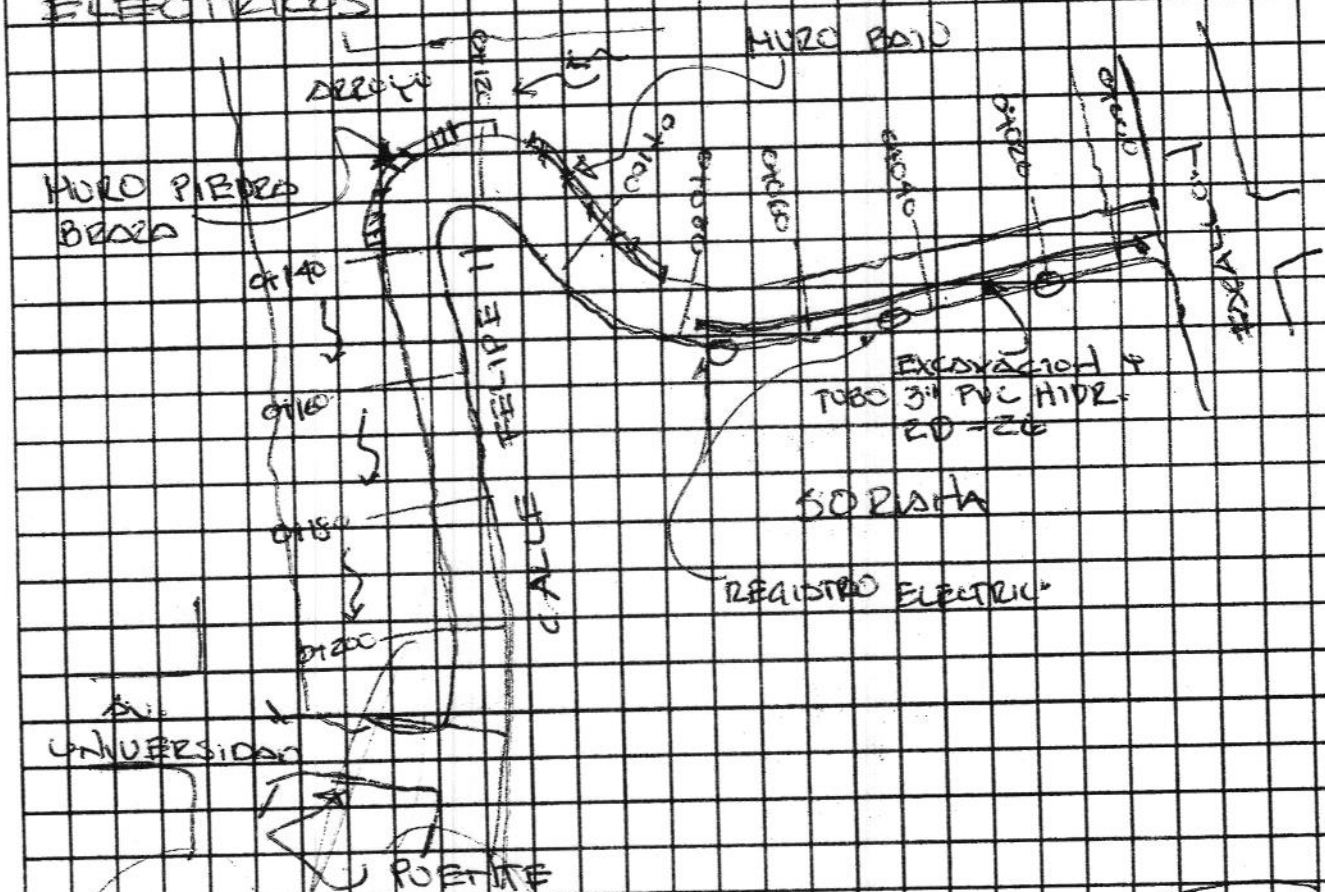

RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR	SUPERINTENDENTE
ARQ. URIEL MAURICIO JAIMEROS JIMENEZ		ARQ. VICENTE DAMIAN DENEGRIO

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 306911

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO TABACHIN AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.

FECHA: 18 SEPTIEMBRE/2013 ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

NOTA No 14

CON ESTA FECHA Y NOTA DE BITACORA ESTA RESIDENCIA DE OBRA EN RECORRIDO, OBSERVA QUE LA CONTRATISTA A REALIZADO LOS TRABAJOS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS EN UN 80% Y LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS DE PIEDRA BRAZA EN UN 75%, Y SE ENCUENTRAN COLOCANDO CIMBRA Y COMPACTANDO BANQUETAS, ASI COMO LA ELABORACION DE REGISTROS ELECTRICOS Y TUBERIA DE PVC CONDUIT. POR LO QUE SE LE PIDE QUE PREPARE AREA PARA APERTURAR CAJA DE SUS TIERRACERIAS.

ARQ. URIEL MAURICIO
OLMEDO JIMENEZ.
RESIDENTE

ARQ. VICENTE ALARCON
OSEGUERA
SUPERINTENDENTE

NOTA No 15 19 (2T)/SEPTIEMBRE/2013

CON ESTA FECHA Y NOTA DE BITACORA LA CONTRATISTA SE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA QUE SE HA REALIZADO LA PRUEBA HIDROSTATICA A LA TUBERIA HIDRAULICA DE PVC RD-26 DE 3" SATISFACTORIAMENTE Y SE LE INFORMA QUE LOS MUROS DE PIEDRA BRAZA SE ENCUENTRAN A UN 90% Y YA SE ESTAN COLOCANDO LOS FIRMES DE LAS BANQUETAS, ASI TAMBIEN SE HA INICIADO LAS EXCAVACIONES PARA ALOJAR TUBERIA ESPECIALES DEL CADENAMIENTO 0+160 AL 0+200

RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR	SUPERINTENDENTE
ARQ. URIEL MAURICIO OLMEDO JIMENEZ		ARQ. VICENTE ALARCON OSEGUERA

FOLIO Nº 306912

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON A AV. UNIVERSIDAD FRACC. MACROLOTES

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE 2023 ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

NOTA 16

CON ESTA FECHA Y NOTA DE BITACORA ESTA RESIDENCIA DE OBRA OBSERVA QUE LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN GENERAL SE ENCUENTRAN A UN 35% POR LO QUE LE PIDE A LA CONTRATISTA, QUE PREPARE LA ESTIMACION 01 (UNO) PARA SU REVISION Y CUANTIFICACION.

ARQ. ORIEL MAURICIO SOLMERON JIMENEZ
RESIDENTE

ARQ. VICENTE ALARCON CEVERINO
SUPERINTENDENTE

NOTA NO 17

01/OCTUBRE/2023

CON ESTA FECHA Y NOTA DE BITACORA LA RESIDENCIA DE OBRA Y LA CONTRATISTA MEXA CONSTRUCTORES SA DE C.V., VERIFICAN LOS TRABAJOS POR MEDIO DE UN LEVANTAMIENTO CON CINTA LOS CONCEPTOS PLASMADOS EN LA ESTIMACION 01 (UNO), CON PERIODO DEL 15 DE AGOSTO DE 2023 AL 01 DE OCTUBRE DE 2023 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD FRACC. MACROLOTES, ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. UNA VEZ CONCLUIDO SE LE AUTORIZA PARA QUE REALICE EL TRAMITE DE COBRO DE DICHA ESTIMACION.

ARQ. ORIEL MAURICIO SOLMERON JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR

ARQ. VICENTE ALARCON CEVERINO
SUPERINTENDENTE

ESOR-02
REV.02

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

EJERCICIO 2023

ANTICIPO

SUBMODALIDAD: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III) RAMO XXXIII.**

CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**

OBRA/PROYECTO/ACCIÓN: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.**

UBICACIÓN: **ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO**

CONTRATISTA: **IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.**

NUMERO DE ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA: **(ZAP): 2721**

CLAVE DE LA LOCALIDAD: **12001 0001**

NUMERO DE (AGEB) : **12001 0001 2721**

ORIGINAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
2021 - 2027

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

ACAPULCO

COMPARATIVO PRESUPUESTAL

MODALIDAD: **CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2023**
OF. AUTORIZACION:

SUBMODALIDAD: **FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**
OF. APROBACION:

PROGRAMA: **RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS**
PROYECTO SOCIAL:

SUBPROGRAMA:
DEPENDENCIA EJECUTORA: **12M01 H. A. ACAPULCO**

ESTADO: **12 GUERRERO**
MUNICIPIO: **001 ACAPULCO DE JUAREZ**
No. DE OBRA:

AVANCE FISICO: _____ AVANCE FINANCIERO: _____

LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	INVERSION			SALDO
		APROBADA	COMPROBADA	ACUMULADA	
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES	5,000,427.46	1,500,128.24	1,500,128.24	3,500,299.22

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

REMISION DE DOCUMENTOS

MODALIDAD: **CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2023**
SUBMODALIDAD: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III) RAMO XXXIII**
OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES. ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.**
CONTRATO No.: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**
DOCUMENTOS REMITIDOS A LA: **AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO**
DEPENDENCIA EJECUTORA: **12M01 H. A. ACAPULCO**

No. PROG.	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
			TOTAL	RETENCIONES	NETO
1	22-ago.-23	IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. FACT. No 3BC4	1,500,128.24		1,500,128.24
		SUBTOTAL $	**1,500,128.24**	**-**	**1,500,128.24**
		TOTAL $	**1,500,128.24**	**-**	**1,500,128.24**

jueves 31 de agosto de 2023

IMEXA CONSTRUCTORES S A DE C V

R.F.C. ICO091216UUA
Calle Corregidora No. 4 Col. Morelos, C.P. 39530
Acapulco de Juárez, Gro.

CLIENTE:

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
R.F.C. MAJ010101NA3
AV. CUAUHTÉMOC S/N INTERIOR PARQUE PAPAGAYO COL. HORNOS INSURGENTES. CP. 39350

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES

UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
PERIODO DEL CONTRATO: DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
No. DE OBRA: MAJ/426

CONTRATO No.	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE CON I.V.A.	ANTICIPO CON I.V.A.
MAJ-FAISMUN/426-2023/LP	15 DE AGOSTO DEL 2023	$5,000,427.46	$1,500,128.24

TIPO DE OBRA: DOMINIO PUBLICO

METAS PROGRAMADAS: 1,471.35 M2

GEORREFERENCIAS
LATITUD 16° 51' 52.658" N
LONGITUD 99° 52' 17.197" O

POBLACION BENEFICIADA: 488 HABITANTES

RECIBI DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, A TRAVES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III) QUE TIENE COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO EL RAMO XXXIII. APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, LA CANTIDAD DE: $ 1,500,128.24 (UN MILLON QUINIENTOS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 24/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30% EL CUAL SERA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA; 10% PARA INICIO DE LA OBRA Y 20% PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES,** UBICADA EN: **ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.** DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO No. **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**.

OPERADO
FAISMUN - 2023

REPRESENTANTE LEGAL

ING. IRINA SALGADO HERNÁNDEZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 2021 - 2024

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

L.C. ERIC ROMERO MORALES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR.CARLOS ARMANDO MORILLON RAMIREZ

SUBTOTAL	$1,293,214.00
IMPUESTOS TRASLADOS IVA 16.0000%	$206,914.24
TOTAL	**$1,500,128.24**

CANTIDAD CON LETRA
(UN MILLON QUINIENTOS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 24/100 M.N.)

RFC emisor:	ICO091216UUA	**Folio fiscal:**	16B95E98-177E-4C9D-A824-48A631053BC4
Nombre emisor:	IMEXA CONSTRUCTORES	**No. de serie del CSD:**	00001000000501616651
RFC receptor:	MAJ010101NA3	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	39530 2023-08-22 00:02:33
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Código postal del receptor:	39350	**Régimen fiscal:**	General de Ley Personas Morales
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	**Exportación:**	No aplica
Uso CFDI:	Construcciones.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
72141103		1.00	E48	Unidad de servicio	1,293,214.00	1,293,214.00		Sí objeto de impuesto.

Descripción: ANTICIPO NOMBRE DE LA OBRA:REHABILITACION DE CALLE FELIPE II TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD FRACC. MAGALLANES UBICADA EN: ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO. CON CARGO AL FONDO III RAMO 33 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023 SEGUN CONTRATO MAJ-FAISMUN/426-2023/LP DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2023: PERIODO DE CONTRATO: 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	1,293,214.00	Tasa	16.00%	206,914.24

Número de pedimento	Número de cuenta predial

Moneda:	Peso Mexicano
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago:	Pago en una sola exhibición

Subtotal			$ 1,293,214.00
Impuestos trasladados	IVA	16.00%	$ 206,914.24
Total			**$ 1,500,128.24**

Sello digital del CFDI:

Rl6wsCoUXngyuiSIHE0f+jlkZglR6xcGGqPk64z564EAVHUyrH3m2PTfXM+IC2bzQ/waEXCdy2QlmtBSadFGngygi4enSANDTRgbZnOArN4r37QAGv+5wuoxgWgKUTwJKD1wlTJ+7fiTlGwCxj+TesRCMhzRXCZDx5T/NYo+TADw0mQpW+PTWNox0EaEHkMVQ5Z0Eu1Lz2oO/d/i4SEEsW21D4vA1B0ioE3C+IhAPOYNeK31YTbBnJsaiFzblarf6YTKMNgpYHiJ/pnJPiQe3R1IQQKZOrM42QixKHQMVkyc6L7cjWZL3FFR/se6lno14pHEmL7kUZO1cKoTvwU5Xw==

Sello digital del SAT:

kNFntzGVF/hhm3v6G9Bw+gasRw13MmH4T4Xv1cqq129rQp4M4YOi0dRSsTaDPQWq8J/ejRNiOnGiuo+khC0/WJResQU7JljWW9acH2q9HGz7Pf7blzGD+Df3KtzI/AsHddnB17tGvG78Bli7hTpLDAC6Dq1xgtQMEB08Y/cLwVwfaK/NeCLEEdaAFJNQTKw5z1dJ7yP8/2evvesRi95qWpvsdPp3XQZENKq4ZYjUYs15b/Iye2QzSlZr0/VTBSGtlWOnxqFLnZ8yqRAanxi/qKWly5SQaVh/NfLDD64AjT8BU6abig1HUqijMgwd8At00LFo/4sm0eVDYwhzoxjj9g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|16B95E98-177E-4C9D-A824-48A631053BC4|2023-08-22T00:04:25|SAT970701NN3|Rl6wsCoUXngyuiSIHE0f+jlkZglR6xcGGqPk64z564EAVHUyrH3m2PTfXM+IC2bzQ/waEXCdy2QlmtBSadFGngygi4enSANDTRgbZnOArN4r37QAGv+5wuoxgWgKUTwJKD1wlTJ+7fiTlGwCxj+TesRCMhzRXCZDx5T/NYo+TADw0mQpW+PTWNox0EaEHkMVQ5Z0Eu1Lz2oO/d/i4SEEsW21D4vA1B0ioE3C+IhAPOYNeK31YTbBnJsaiFzblarf6YTKMNgpYHiJ/pnJPiQe3R1IQQKZOrM42QixKHQMVkyc6L7cjWZL3FFR/se6lno14pHEmL7kUZO1cKoTvwU5Xw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-22 00:04:25

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

OPERADO
FAISMUN - 2023

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 2021 - 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" LugarExpedicion="39530"
MetodoPago="PUE" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="1500128.24" Moneda="MXN" SubTotal="1293214.00"
Certificado="MIIF/zCCA+egAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDE2MTY2NTEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQ
NoCertificado="00001000000501616651" FormaPago="03"
Sello="Rl6wsCoUXngyuiSIHE0f+jlkZglR6xcGGqPk64z564EAVHUyrH3m2PTfXM+IC2bzQ/waEXCdy2QlmtBSadFGngygi4enSANDTRgbZnOArN4r37QAGv+5v
Fecha="2023-08-22T00:02:33" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
    <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="IMEXA CONSTRUCTORES" Rfc="ICO091216UUA"/>
    <cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ" Rfc="MAJ010101NA3" UsoCFDI="I01" RegimenFiscalReceptor="603"
        DomicilioFiscalReceptor="39350"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="1293214.00" ValorUnitario="1293214.00" Descripcion="ANTICIPO NOMBRE DE LA
        OBRA:REHABILITACION DE CALLE FELIPE II TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD FRACC. MAGALLANES UBICADA EN: ACAPULCO
        DE JUAREZ GUERRERO. CON CARGO AL FONDO III RAMO 33 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023 SEGUN CONTRATO MAI-FAISMUN/426-
        2023/LP DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2023: PERIODO DE CONTRATO: 15 DE AGOSTO DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023."
        Unidad="Unidad de servicio" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" ClaveProdServ="72141103">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="206914.24" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1293214.00"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="206914.24">
    - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="206914.24" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1293214.00"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
      <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
        http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
        SelloSAT="kNFntzGVF/hhm3v6G9Bw+gasRw13MmH4T4Xv1cqq129rQp4M4YOi0dRSsTaDPQWq8J/ejRNiOnGiuo+khC0/WJResQU7JIjWW9acH
        NoCertificadoSAT="00001000000504465028"
        SelloCFD="Rl6wsCoUXngyuiSIHE0f+jlkZglR6xcGGqPk64z564EAVHUyrH3m2PTfXM+IC2bzQ/waEXCdy2QlmtBSadFGngygi4enSANDTRgbZnO
        RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2023-08-22T00:04:25" UUID="16B95E98-177E-4C9D-A824-48A631053BC4"
        xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```


OPERADO
FAISMUN - 2023

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

HACIENDA | SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ICO091216UUA	IMEXA CONSTRUCTORES	MAJ010101NA3	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
16B95E98-177E-4C9D-A824-48A631053BC4	2023-08-22T00:02:33	2023-08-22T00:04:25	SAT970701NN3
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$1,500,128.24	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
FAISMUN - 2023

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

ACAPULCO

CÉDULA DE REGISTRO DEL PADRÓN MUNICIPAL DE CONTRATISTA

REGISTRO: 2848
FOLIO ANUAL: 192

ESPECIALIDADES:
* Edificación y Urbanización

REGISTRO: PERSONA MORAL

NOMBRE DE LA EMPRESA:	**IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.**
REPRESENTANTE LEGAL:	**IRINA SALGADO HERNANDEZ**
DOMICILIO:	CALLE CORREGIDORA NO. 4, COL. MORELOS, C.P. 39530, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
TELÉFONO:	744 485 9501, 744 449 0912, 744 235 4717
CORREO ELECTRÓNICO:	gno_0301@hotmail.com
RFC:	ICO091216UUA
IMSS:	B61-59781-10-7
INFONAVIT:	B61-59781-10-7
REPRESENTANTE TÉCNICO:	**ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO**
CÉDULA PROFESIONAL:	2220846
FECHA DE CÉDULA:	02 DE JULIO DEL 2012
RFC:	AASV6812211Z7
TELÉFONO:	744 235 4717
CORREO ELECTRONICO:	viasev@hotmail.com
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	**21 DE JUNIO DEL 2016**
AFILIACIÓN:	**NO APLICA**

ESCRITURA PÚBLICA


LICENCIADO:	LIC. SHUNASHI JAZMIN ALTAMIRANO PINEDA	
NOTARÍA:	CORREDOR PUBLICO NO. 5 EN EL ESTADO DE GUERRERO.	
CIUDAD:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	
No. DE ACTA:	1585	FECHA: 16 DE DICIEMBRE DEL 2009
No. REG. PUB.:	10160 * 17	FECHA: 17 DE FEBRERO DEL 2010

VIGENCIA: 14 DE JUNIO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2024

IRINA SALGADO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

M. I. VLADIMIR HERNÁNDEZ ALEMÁN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AOBR-01
REV. 02

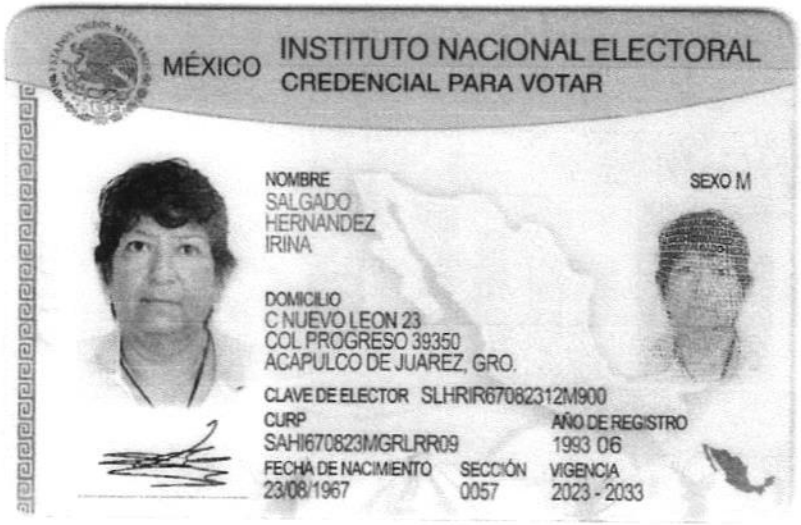

MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
SALGADO
HERNANDEZ
IRINA

SEXO M

DOMICILIO
C NUEVO LEON 23
COL PROGRESO 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE DE ELECTOR SLHRIR67082312M900


CURP
SAHI670823MGRLRR09

AÑO DE REGISTRO
1993 06

FECHA DE NACIMIENTO
23/08/1967

SECCIÓN
0057

VIGENCIA
2023 - 2033

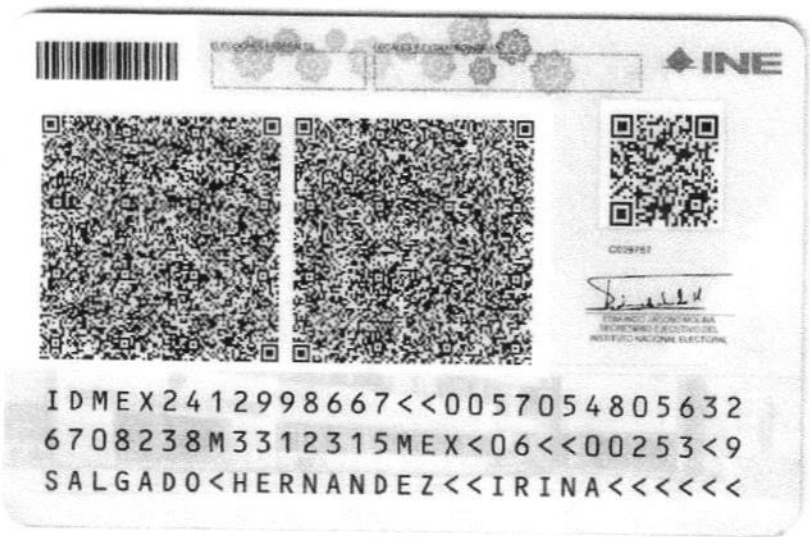

INE

IDMEX2412998667<<0057054805632
6708238M3312315MEX<06<<00253<9
SALGADO<HERNANDEZ<<IRINA<<<<<<

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

2023 AÑO DE Francisco VILLA

ORDEN DE TRABAJO	Contrato No. MAJ-FAISMUN/426-2023/LP
2848 **IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.** Registro Nombre o razón social **IRINA SALGADO HERNANDEZ** Representante legal **CALLE CORREGIDORA NO. 4, COL. MORELOS, C.P. 39530, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO..** Dirección social R.F.C. **ICO091216UUA** IMSS **B61-59781-10-7** TEL. **744 485 9501, 744 449 0912, 744 235 4717**	**REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES** Nombre de la Obra **ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO** Ubicación **ACAPULCO DE JUAREZ** Localidad y Entidad federativa
Rgtro. Sria. De Prog. Ppto.	Contrato de Obra Publica

Num. De Obra: **MAJ/426** Oficio: **SEPLADE/321/2023**	Autorización de Inversión: **RAMO 33 (FONDO 3)** Fecha: **08 de Mayo de 2023**

LICITACION PUBLICA ESTATALNo. 4106004-016-2023.

$ 4,310,713.33

REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES
Nombre de la Obra

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO .
Ubicación

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2021-2024

DESCRIPCION DE LA OBRA:
Ver. Especif. de Conceptos en Presupuesto Anexo.

SUBTOTAL	$ 4,310,713.33
16% IVA	$ 689,714.13
TOTAL	**$ 5,000,427.46**

NOTAS IMPORTANTES

Fecha de inicio: 15 de Agosto del 2023	Fecha de terminación: 12 de Diciembre del 2023

Forma de pago contra la presentación de estimaciones debidamente autorizadas.

Secretaria de Desarrollo Urbano
y Obras Públicas

Acapulco, Gro., 15 de Agosto del 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

PCOR-01
REV. 02

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 2021 - 2024

CONTRATO No. MAJ-FAISMUN/426-2023/LP

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP,** RELATIVO A LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES** UBICADA EN **ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO**, GUERRERO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, **LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ**, GUERRERO A QUIEN SE DENOMINARÁ **"LA SECRETARÍA"**, REPRESENTADA POR LA **C. ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA,** EN SU CARÁCTER DE **SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS**, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO., Y POR LA OTRA **IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.** REPRESENTADA POR C. **IRINA SALGADO HERNANDEZ, CON NÚMERO DE REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS 2848,** EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL A QUIEN SE DENOMINARÁ **"EL CONTRATISTA"** DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

OPERADO
FAISMUN - 2023

D E C L A R A C I O N E S

I.- DECLARA "LA SECRETARÍA" MEDIANTE SUS REPRESENTANTES.

1.- QUE EN TÉRMINO DE LO PREVISTO POR EL **ARTÍCULO 115 FRACCIONES I, II Y III A), D), E), F), G), H), I), Y IV), B), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS** Y ARTÍCULO 3 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO, ES UN MUNICIPIO GOBERNADO POR UN AYUNTAMIENTO DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA, INVESTIDO DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CON LIBRE ADMINISTRACIÓN DE SU HACIENDA, RECURSOS Y SERVICIOS DESTINADOS A LA COMUNIDAD, SIN MÁS LÍMITES QUE LOS SEÑALADOS EXPRESAMENTE EN LAS LEYES APLICABLES.

1.1.- **QUE CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 170 NUMERAL 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO**; 26, 29, 30, 31 DEL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO, Y; 2 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, EL AYUNTAMIENTO ES EL ÓRGANO DE GOBIERNO A CUYA DECISIÓN SE SOMETEN LOS ASUNTOS DE LA VIDA PÚBLICA MUNICIPAL Y LOS DE SU PROPIA ADMINISTRACIÓN QUE LAS LEYES PREVÉN, ASÍ COMO LA DE EJERCER VIGILANCIA DIRECTA DE LOS ACTOS DE SUS MIEMBROS EN TODO MOMENTO, CUYAS FACULTADES DE EJECUCIÓN ESTÁN DEPOSITADAS EN EL PRESIDENTE MUNICIPAL.

1.2.- QUE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 29 FRACCIONES I, V, Y VII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO EN VIGOR, TUVO A BIEN DESIGNAR COMO **SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS A LA C. ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA,** Y POR ENDE, TIENE LA FACULTAD Y REPRESENTACIÓN LEGAL PARA CELEBRAR CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SUS SERVICIOS A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 72 Y 73 FRACCIONES IX Y X DE LA LEY ORGÁNICA INVOCADA EN RELACIÓN CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS **27 FRACCIONES XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXVIII, Y 28 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO**, Y SUS DEMÁS DISPOSICIONES, EN VIRTUD DE QUE **"LA SECRETARÍA"**, ES LA ENTIDAD MUNICIPAL ENCARGADA DE ORDENAR LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS, REGULAR EL DESARROLLO URBANO, ASÍ COMO CONDUCIR, NORMAR, PROYECTAR Y EJECUTAR

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

LAS OBRAS PÚBLICAS, INSERTAS EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES EN LA MATERIA.

1.3.- SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, EL UBICADO EN LA AV. CUAUHTÉMOC S/N INTERIOR PARQUE PAPAGAYO, COL. HORNOS INSURGENTES, ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. C. P. 39350.

1.4.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SE AUTORIZÓ LA INVERSIÓN MEDIANTE EL **RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33 (FONDO 3)) 2023. AUTORIZADO MEDIANTE EL OFICIO SEPLADE/321/2023, DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2023.** CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE A SU VEZ SE HAYA INCLUIDO EN EL PROGRAMA DE OBRAS PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2023.

1.5.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICÓ A **"EL CONTRATISTA"** PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS A QUE SE DESTINA LA INVERSIÓN AUTORIZADA QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACIÓN 1.4, A TRAVÉS DE **LICITACION PUBLICA ESTATAL** COMO LO SEÑALA **LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 EN SU ARTÍCULO 39 FRACCIÓN I.**

OPERADO FAISMUN - 2023

2. "EL CONTRATISTA" DECLARA:

2.1.- ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO **1585 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2009,** OTORGADA ANTE LA FE DEL **LIC. SHUNASHI JAZMIN ALTAMIRANO PINEDA CORREDOR PUBLICO NO. 5 EN EL ESTADO DE GUERRERO., ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.** CON REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO **10160 * 17 DE FECHA 17 DE FEBRERO DEL 2010.**

2.2.- EL C. **IRINA SALGADO HERNANDEZ,** QUIEN SE IDENTIFICA CON **CREDENCIAL DE ELECTOR**, ACREDITA SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO **1585 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2009** OTORGADA ANTE LA FE DEL **LIC. SHUNASHI JAZMIN ALTAMIRANO PINEDA CORREDOR PUBLICO NO. 5 EN EL ESTADO DE GUERRERO., ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.** INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, BAJO EL FOLIO **10160 * 17** DE FECHA **17 DE FEBRERO DEL 2010.** MANDATO QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO NI REVOCADO, LO QUE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

2.3.- TENER ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN **CALLE CORREGIDORA NO. 4, COL. MORELOS, C.P. 39530, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.,** MISMO QUE SEÑALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

2.4.- QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

2.5.- QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, SE OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

2.6.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE, CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO BAJO PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

2.7.- QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACIÓN, LOS CUALES ESTÁN VIGENTES.

- REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO NO. **ICO091216UUA.**

- REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ N°. **2848.**

- REGISTRO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL E INSTITUTO DEL FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES NO. **B61-59781-10-7.**

2.8.- QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NINGUNA DE LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE ESTA SOCIEDAD DESEMPEÑA ALGÚN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO, ASÍ COMO QUE NO TIENE IMPEDIMENTO LEGAL ALGUNO QUE LE IMPOSIBILITE A OBLIGARSE EN TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO.

2.9.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN **LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, Y EL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**, ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS APLICABLES Y ANEXOS.

2.10.- CONOCER EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, Y CONSECUENTEMENTE, HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN.

3. AMBAS PARTES DECLARAN:

3.1.- SUJETARSE ESTRICTAMENTE A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO; ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE **LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 Y EL REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.** ASÍ COMO EL MANUAL ÚNICO DE OPERACIÓN DEL RAMO **(XXXIII, VARIA DEPENDIENDO EL RAMO).**

3.2.- QUE EL PRESENTE CONTRATO, SUS ANEXOS Y LA BITÁCORA DE LOS TRABAJOS, SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

3.3.- CONOCER EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 Y EL REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y, EN GENERAL, TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES Y DEFINICIONES ANTERIORES, SUSCRIBEN DE CONFORMIDAD LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S

OPERADO FAISMUN - 2023

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

"LA SECRETARÍA" ENCOMIENDA A **"EL CONTRATISTA"** LA REALIZACIÓN DE LA OBRA CONSISTENTE EN: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES,** UBICADA EN **ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO,** DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, **CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, DEMOLICIONES, RELLENO DE MATERIAL, TERRACERIAS, FORMACION DE BASE, INSTALACION HIDRAULICA, TUBERIA PVC 3" CED. RD-26, TOMAS DOMICILIARIAS, INSTALACION SANITARIA, POZOS DE VISITA, REGISTROS SANITARIOS, ALBAÑILERIA, MURO DE PIEDRA BRAZA, LOSA DE CONCRETO F'c= 250 KG/CM2, LUMINARIAS, GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE F'c= 200 KG/CM2, PAVIMENTO PREMEZCLADO F'c= 300 KG/CM2, ACARREOS Y LIMPIEZAS.** Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN LA DECLARACIÓN 3.3 DE ESTE CONTRATO Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO; SIENDO **"EL CONTRATISTA"** RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y QUE ÉSTOS CUMPLAN CON TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR **"LA SECRETARÍA"**, COMO SON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO SI SE INSERTASEN A LA LETRA COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO. FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA **(ANEXO I)** EL CUAL CONTIENE: EL CATALOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES, GENERADORES, PROGRAMA DE OBRA, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMA DE OBRA Y PLANOS DEL PROYECTO.

OPERADO FAISMUN - 2023

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA CUYA EJECUCIÓN SE CONTRATA ES POR LA CANTIDAD DE: **$4,310,713.33 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 33/100 M.N.),** MÁS IMPUESTO AL VALOR AGREGADO **$689,714.13 (SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 13/100 M.N.)**, CONSECUENTEMENTE EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO RESULTA DE **$5,000,427.46 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 46/100 M.N.),** DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO DE OBRA PRESENTADO POR **"EL CONTRATISTA"**.

EL MONTO TOTAL DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO CUBRE A **"EL CONTRATISTA"** TODAS LAS PRESTACIONES, GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA MISMA, INCLUYENDO LOS IMPUESTOS O DERECHOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE SE CAUSEN, SIENDO IMPROCEDENTE EL INCREMENTO AL PRECIO DE OPERACIÓN ESTABLECIDO.

"LA SECRETARÍA" LLEVARÁ A CABO LAS RETENCIONES FISCALES CORRESPONDIENTES, QUE SE ORIGINEN POR CONCEPTO DE LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN.

EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ES DE **120 DIAS** NATURALES, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA **15 DE AGOSTO DEL 2023** Y A TERMINARLOS A MÁS TARDAR EL DÍA **12 DE DICIEMBRE DEL 2023,** DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA PRESENTADO POR **"EL**

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

CONTRATISTA". TODOS LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN ESTE CONTRATO SE ENTENDERÁN COMO DÍAS CALENDARIO, COMPRENDIENDO AQUELLOS QUE SEGÚN LA LEY SEAN INHÁBILES PERO CUANDO UN PLAZO TERMINE EN UN DÍA INHÁBIL, CONCLUIRÁ A LAS 24 HORAS DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE.

ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO QUE EL DÍA DE INICIO DE LOS TRABAJOS LA **RESIDENCIA**, HAGA LA APERTURA A LA BITÁCORA DE OBRA, INSTRUMENTO EN EL QUE DEBERÁN REFERIRSE LOS ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y POR MEDIO DE EL DAR INSTRUCCIONES Y RECIBIR SOLICITUDES QUE SE FORMULEN ENTRE **LA RESIDENCIA Y LA SUPERINTENDENCIA**, EL USO DE LA BITÁCORA SE REGIRÁ CONFORME AL CAPÍTULO IV FRACCIÓN II, ARTÍCULOS 122, 123, 124 Y 125 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

OPERADO FAISMUN - 2023

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

"LA SECRETARÍA" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE **"EL CONTRATISTA",** PREVIAMENTE A LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO; EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. EL DIFERIMIENTO SE CONSIGNARÁ EN EL CONVENIO QUE PARA TAL EFECTO CELEBREN LAS PARTES.

ASÍ MISMO, **"EL SECRETARIA"**, DEBERÁ TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS, ASÍ COMO LA PROPIEDAD O LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE VÍA Y EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES SOBRE LOS CUALES SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PREVISTAS POR LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERA PARA LA INICIACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS AMPARADOS POR EL PRESENTE CONTRATO.

QUINTA: ANTICIPO, PORCENTAJE, AMORTIZACIÓN Y COMPROBACIÓN.

PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, INICIO DE TRABAJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES, TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES DE INSTALACIÓN PERMANENTE Y DEMÁS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, **"LA SECRETARÍA"** OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL **30 % (TREINTA POR CIENTO)** DE LA ASIGNACIÓN APROBADA AL CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE **$1,293,214.00 (UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.)** MAS EL I.V.A.

DICHO ANTICIPO SE OTORGARÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA PARA SU CORRECTA APLICACIÓN, DEBIENDO SER PAGADO EL MISMO, CONTRA LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA POR **"EL CONTRATISTA"** QUE ACREDITE ESTAR DEBIDAMENTE FACULTADA. PARA EL CASO DE QUE **"LA SECRETARÍA"**, POR CAUSAS IMPUTABLES A LA MISMA, NO ENTREGASE A **"EL CONTRATISTA"** EL ANTICIPO EN LA FECHA PREVISTA, SE PODRÁ DIFERIR SIN MODIFICAR EL PLAZO PACTADO EN LA CLÁUSULA TERCERA, PARA CUYO EFECTO DEBERÁ SUSCRIBIRSE ENTRE LAS PARTES EL CONVENIO DE DIFERIMIENTO RESPECTIVO, EL QUE CONTENDRÁ LAS NUEVAS FECHAS DE INICIACIÓN Y CONCLUSIÓN DE LA OBRA.

LA FALTA DE EXHIBICIÓN OPORTUNA DE LA FIANZA O SU PRESENTACIÓN EN TÉRMINOS DIFERENTES A LOS ESTABLECIDOS, ACARREARAN AUTOMÁTICAMENTE EL ATRASO EN LA FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO Y EN TAL EVENTO NO SERÁ PROCEDENTE EL OTORGAMIENTO DEL CONVENIO DE DIFERIMIENTO, POR LO TANTO **"EL CONTRATISTA"** DEBERÁ INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA CLÁUSULA TERCERA.

"LA SECRETARÍA", PODRÁ PRACTICAR REVISIONES Y AUDITORIAS EN CUALQUIER TIEMPO PARA COMPROBAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO, PARA TAL EFECTO, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A DAR LAS FACILIDADES NECESARIAS Y ACREDITAR FEHACIENTEMENTE LA APLICACIÓN DEL MISMO, EXHIBIENDO LAS FACTURAS DE LOS PAGOS EFECTUADOS A SUS PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

SI **"EL CONTRATISTA"** DESTINA EL IMPORTE DEL ANTICIPO A FINES DISTINTOS A LOS CONSIGNADOS, **"LA SECRETARÍA"**, PODRÁ OPTAR POR EXIGIR DE INMEDIATO A **"EL CONTRATISTA"** LA DEVOLUCIÓN DEL MISMO, Y ADEMÁS, OPTAR POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO QUE SE ESTABLECE EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.

EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL REMANENTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL.

EN EL SUPUESTO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS, CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, COMO SI SE TRATARÁ DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL TÉRMINO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE LA **"LA SECRETARÍA"**,

EN CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A REINTEGRAR A **"LA SECRETARÍA"**, EL SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA QUE SE DA POR RESCINDIDO ESTE CONTRATO, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS A SATISFACCIÓN DE **"LA RESIDENCIA"**, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADO, A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LOS TRABAJOS Y **"EL CONTRATISTA"** SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

EN EL SUPUESTO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL TÉRMINO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, ÉSTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES; DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"LA SECRETARÍA"**

OPERADO FAISMUN - 2023

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

LA PÓLIZA DE FIANZA DEL ANTICIPO, QUE GARANTICE LA CORRECTA INVERSIÓN Y EXACTA AMORTIZACIÓN Y EN SU CASO, DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS QUE:

a) LA FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD Y ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, PARA GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSIÓN DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO DE LA CONTRATANTE OTORGA A LA EMPRESA **IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.** Y SE COMPROMETE A PAGAR HASTA LA CANTIDAD QUE IMPORTE ESTA FIANZA, EN CASO DE QUE SU FIADO NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN O SEA RESCINDIDO EL CONTRATO.

b) EN EL CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA Y PARA EL CASO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN O EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE;

c) CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"** Y ESTE EFECTUÉ LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, **"LA SECRETARÍA"**, DEBERÁ LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA SIEMPRE Y CUANDO SEA PROCEDENTE EN LOS TÉRMINOS AQUÍ ESTIPULADOS

d) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO, **"LA SECRETARÍA"**, QUE LA PRODUCIRÁ CUANDO EL IMPORTE DEL ANTICIPO HAYA SIDO AMORTIZADO O DEVUELTO EN SU TOTALIDAD Y SE HAYAN PAGADO EN SU CASO LOS ACCESORIOS.

e) QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

f) LA COMPAÑÍA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 279, 280, 281 Y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR, OTORGANDO LA AFIANZADORA EL CONSENTIMIENTO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 179 DEL CITADO ORDENAMIENTO.

g) QUE PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO SE SOMETE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO GUERRERO, RENUNCIANDO CUALQUIER OTRA QUE TUVIERE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO OFICIAL, EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. FIN DEL TEXTO

SEXTA: FORMA DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, QUE ABARCARÁN PERIODOS NO MAYOR DE UN MES CALENDARIO Y SERÁN PRESENTADAS POR **"EL CONTRATISTA"** A LA RESIDENCIA, DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA

OPERADO FAISMUN - 2023

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

FECHA DE CORTE CORRESPONDIENTE, CONTANDO CON UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN A LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN PARA QUE **"LA SECRETARÍA"**, INICIE SU TRÁMITE DE PAGO.

EL RESIDENTE DE OBRA EFECTUARÁ LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE QUINCE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTE DE COSTOS POR PARTE DE **"LA SECRETARÍA"**, ÉSTA A SOLICITUD DE **"EL CONTRATISTA"** Y DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, PAGARÁ GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"EL CONTRATISTA".**

OPERADO FAISMUN - 2023

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO **"EL CONTRATISTA",** ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "LA DEPENDENCIA".

NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"** SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁN COMO ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE **"LA SECRETARÍA."** TENDRÁ EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

SI **"EL CONTRATISTA"** REALIZA TRABAJOS EXCEDENTES O EXTRAORDINARIOS, SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL **"RESIDENTE Y DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS"**, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI LA MODIFICACIÓN ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ÉSTOS O POR SU PRESENTACIÓN INCORRECTA O EXTEMPORÁNEA, NO SERÁ MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS. PARA QUE "**EL CONTRATISTA"** PUEDA CANCELAR SU(S) FACTURA(S) UNA VEZ QUE SE HA(N) VALIDADO LA(S) MISMA(S), SERÁ NECESARIO CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE **"LA SECRETARIA".** LA CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS SIN ESTE REQUISITO, LIBERA AL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

DE LA OBLIGATORIEDAD DEL PAGO. SE GIRARA OFICIO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE DICHA CANCELACIÓN PARA LO CONDUCENTE

SÉPTIMA: LUGAR DE PAGO:

EL PAGO POR CONCEPTO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS, LOS EFECTUARÁ **LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS** DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, UBICADA EN COSTERA MIGUEL ALEMÁN No. 315 COL. CENTRO. C.P. 39300 EN ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO A TRAVÉS DE LA FORMA: TRANSFERENCIA BANCARIA MEDIANTE VÍA ELECTRÓNICA O CHEQUE NOMINATIVO. EL PLAZO PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE RIGE POR EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266.

OPERADO FAISMUN - 2023

OCTAVA: GARANTÍAS.

A) GARANTÍA DE LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA CARTA DE ADJUDICACIÓN, DEBERÁ PRESENTAR A FAVOR Y A SATISFACCIÓN DEL **MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ**, FIANZA POR EL TOTAL DEL IMPORTE DEL ANTICIPO MAS I.V.A., OTORGADA POR INSTITUCIONES DE FIANZAS, DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

LA GARANTÍA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DE LOS ANTICIPOS, SE CANCELARÁ CUANDO **"EL CONTRATISTA"** HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DE LOS MISMOS, PREVIA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE **"LA SECRETARÍA"** EN EL CASO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** NO HAYA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO EN LA FECHA SEÑALADA EN LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE, SE HARÁ EFECTIVA LA FIANZA Y SE LE PENALIZARÁ CON LOS GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICIÓN DE **"LA SECRETARÍA"**

ESTA GARANTÍA SOLAMENTE SE LIBERARÁ CUANDO SE HAYA AMORTIZADO TOTALMENTE EL ANTICIPO CONCEDIDO.

B) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE HABER RECIBIDO LA CARTA DE ADJUDICACIÓN A CONSTITUIR UNA FIANZA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, MISMA QUE ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"**, Y ÉSTE HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FINIQUITO, **"LA SECRETARÍA"** DEBERÁ LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA; EN CASO CONTRARIO, **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS.

C) GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, **"EL CONTRATISTA"** MEDIANTE FIANZA EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO MAS I.V.A. EXPEDIDA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN CONTRAVENCIÓN AL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS DATOS DEL PROYECTO ANEXO A ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN **EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266; 89, 94, 95, 96, 97 Y 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SUS DEMÁS APLICABLES EN LA LEY.**

OPERADO FAISMUN - 2023

LA PÓLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS QUE.

a) LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD;

b) LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS;

c) CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN MÁS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ÉSTA FIANZA SE SUBSTITUIRÁ EN EL O LOS SIGUIENTES EJERCICIOS POR OTRO U OTRAS EQUIVALENTES AL IMPORTE DE LOS TRABAJOS FALTANTES POR EJECUTAR, ACTUALIZANDO LOS IMPORTES DE ACUERDO CON LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS Y MODIFICACIONES CONVENIDAS SI LAS HUBIERE;

d) EN EL CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA Y PARA EL CASO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN O EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE

e) LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACIÓN DE **"LA SECRETARÍA"**.

f) ÉSTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DE **"EL CONTRATISTA"** O DE **"LA SECRETARÍA"**, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA;

g) QUE LA FIANZA SE OTORGA TAMBIÉN PARA GARANTIZAR LA CORRECCIÓN DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN QUE RESULTEN, DE LOS VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO **"EL CONTRATISTA"** CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

h) LA FIANZA SE CANCELARÁ CUANDO **"EL CONTRATISTA"** L CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE **"LA SECRETARÍA"**, SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERÁ LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ÉSTA CONTINUARÁ VIGENTE;

i) CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA Y ESTE EFECTUÉ LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, **"LA SECRETARÍA"**, DEBERÁ LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA, SIEMPRE Y CUANDO SEA PROCEDENTE EN LOS TÉRMINOS AQUÍ ESTIPULADOS

j) LA FIANZA CONTINUARA EN VIGOR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO ALGUNA RESPONSABILIDAD A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"** POR DEFECTOS DE LA OBRA, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO **"EL CONTRATISTA"**, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, **"EL CONTRATISTA"** GARANTIZA LOS MISMOS EN LOS TÉRMINOS DE LOS **ARTÍCULOS 77 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 Y 95 DEL REGLAMENTO**, POR LO QUE TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE) MESES, SIN QUE EXISTA RECLAMACIÓN ALGUNA POR PARTE DE **"LA SECRETARÍA"**, LA FIANZA QUEDARÁ CANCELADA, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE **"LA SECRETARÍA"**, PARA CANCELAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDOS A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"** LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE.

k) EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS POR PARTE DE **"EL CONTRATISTA"**, **"LA SECRETARÍA"** LO COMUNICARÁ DE INMEDIATO Y POR ESCRITO A LA AFIANZADORA A EFECTO DE QUE ÉSTA NO SEA CANCELADA Y NOTIFICARA POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ÉSTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, TRANSCURRIDO ÉSTE TÉRMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO, **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA ESTA FIANZA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO AL CONTRATISTA LA RESOLUCIÓN DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. SI LA CORRECCIÓN O REPOSICIÓN REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, **"EL CONTRATISTA"** Y **"LA SECRETARÍA"**, PODRÁN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE ESTA PÓLIZA DE FIANZA;

l) LA FIANZA SE HARÁ EFECTIVA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA AL CONTRATISTA LA RESOLUCIÓN DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO;

m) LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 279, 280 281 Y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR, OTORGANDO LA AFIANZADORA EL CONSENTIMIENTO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 179 DEL CITADO ORDENAMIENTO

OPERADO FAISMUN - 2023

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

SI **"EL CONTRATISTA"** NO PRESENTARA LAS GARANTÍAS EN LA FORMA Y TÉRMINOS SEÑALADOS, **"LA SECRETARÍA"** PODRÁ DETERMINAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

NOVENA: AJUSTE DE COSTOS.

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO Y AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE.

PARA OBTENER EL AJUSTE DE LOS PRECIOS UNITARIOS SE CONSIDERARAN LOS TÉRMINOS Y **PROCEDIMIENTOS DEL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266**, DE LA MANERA SIGUIENTES:

I. LA REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE;

II. LA REVISIÓN POR GRUPO DE PRECIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN CUANDO MENOS EL OCHENTA POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO; Y

III. EN CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE SE TENGA ESTABLECIDA LA PROPORCIÓN EN QUE INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO PODRÁ DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN DICHAS PROPORCIONES.

LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DESCRITOS SE SUJETARÁ A LO SIGUIENTE:

A) LOS AJUSTES SE CALCULARÁN A PARTIR DEL MES EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, CON RESPECTO AL PROGRAMA CONVENIDO. CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A **"EL CONTRATISTA"**, PROCEDERÁ EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO.

CUANDO POR CAUSA IMPUTABLE AL **"CONTRATISTA"** EXISTIERA ATRASO, PROCEDERÁ EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA PRESENTADO EN SU PROPUESTA.

B) LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERÁN CALCULADOS CON BASE EN LOS ÍNDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR/ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE OBRAS PÚBLICAS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO. CUANDO LOS ÍNDICES QUE REQUIERAN TANTO **"EL CONTRATISTA"** COMO **"LA SECRETARÍA"**, NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO, **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A CALCULARLOS EN CONJUNTO CON **"EL CONTRATISTA"** CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN, POR MERCADEO DIRECTO O EN

OPERADO FAISMUN - 2023

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS NACIONALES O INTERNACIONALES CONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES DISTINTAS O UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE EXPIDA EL BANCO DE MÉXICO.

C) LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS QUE **"EL CONTRATISTA"** HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA; Y

D) A LOS DEMÁS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO EMITA LA CONTRALORÍA.

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DEBERÁ CUBRIRSE POR PARTE DE **"LA SECRETARÍA"** A SOLICITUD DE **"EL CONTRATISTA"** A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE **"LA SECRETARÍA"** RESUELVA POR ESCRITO SOBRE LA PROCEDENCIA DE SU PETICIÓN. APLICANDO AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIÉNDOSE APLICAR LOS ÚLTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERÁN ACUMULARSE. EN CASO DE PRESENTARSE REDUCCIÓN EN LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SE PRACTICARÁ UNA REVISIÓN, Y DE SER PROCEDENTE, SE EFECTUARÁ EL AJUSTE CORRESPONDIENTE.

OPERADO FAISMUN - 2023

DECIMA: SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.

"LA SECRETARÍA" A TRAVÉS DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRÁ EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A **"EL CONTRATISTA"** POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCIÓN EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE SEAN ORDENADAS.

POR SU PARTE **"LA SECRETARÍA"** EN APEGO A LO DISPUESTO POR LOS **ARTÍCULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266** Y 112 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DESIGNA COMO SU **RESIDENTE** EN LA OBRA PARA PODER TRATAR LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON O DERIVADOS DE LOS TRABAJOS, A EL **C. ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ**, **"LA SECRETARÍA"** DESIGNARÁ POR ESCRITO AL **RESIDENTE** RESPONSABLE DE LA OBRA, CON LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES MENCIONADAS EN EL ARTÍCULO **113 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**.

"LA SECRETARÍA" PODRÁ ORDENAR LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA DE LOS TRABAJOS CUANDO **"EL CONTRATISTA"** NO CUMPLA LAS ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO O EN SU CASO, A LAS INSTRUCCIONES RECIBIDAS POR ESCRITO O EN LA BITÁCORA DE OBRA POR PARTE DEL SUPERVISOR, DEBIENDO **"EL CONTRATISTA"** REALIZARLAS POR SU CUENTA Y SIN DERECHO A RETRIBUCIÓN ALGUNA. ASÍ MISMO **"LA SECRETARÍA"** PODRÁ ORDENAR LA **SUSPENSIÓN** TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA CONTRATADA, EN TANTO SE LLEVEN A CABO LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN O REPOSICIÓN, SIN QUE SEA MOTIVO DE AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

"EL CONTRATISTA" DEBERA CONTAR CON LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES PARA LAS PRUEBAS DE SUS OBRAS, EL CUAL DEBERÁ ESTAR ACREDITADO ANTE "**LA SECRETARIA"**. NO SE ACEPTARÁN PRUEBAS DE LABORATORIOS QUE NO ESTEN ACREDITADOS.

PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS CONTRATADAS, **"LA SECRETARIA"** CONTARA CON LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES EXTERNO, EL CUAL ELABORARÁ LAS PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, REVENIMIENTO, RESISTENCIA DE LOS CONCRETOS Y CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LAS OBRAS CONTRATADAS.

OPERADO FAISMUN - 2023

DÉCIMA PRIMERA: REPRESENTANTE DEL "CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER LA RESIDENCIA DE OBRA DEBIENDO ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE SERÁ **EL SUPERINTENDENTE** DE CONSTRUCCIÓN Y PARA TAL EFECTO "EL CONTRATISTA" DESIGNA AL **ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO** CON CEDULA PROFESIONAL **No 2220846,** EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, EL **02 DE JULIO DEL 2012**, REGISTRADO COMO **SUPERINTENDENTE**, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES TÉCNICAS EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

QUE DEBERÁ CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, CATÁLOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCIÓN Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN Y NORMAS DE CALIDAD, BITÁCORA, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DESIGNADO POR **"EL CONTRATISTA"**, TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE CONOCER EL CONTRATO, EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEBERÁ ESTAR FACULTADO PARA DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA ACEPTAR U OBJETAR LAS ESTIMACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN Y, EN GENERAL, PARA ACTUAR A NOMBRE DEL **"CONTRATISTA"** CON LAS FACULTADES LEGALES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DEBE ESTAR FACULTADO POR **"EL CONTRATISTA"**, PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, ASÍ COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"LA SECRETARÍA" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, Y DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCIÓN DEL MISMO, Y **"EL CONTRATISTA"** EN UN PLAZO DE CINCO DÍAS NATURALES TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOMBRAR A OTRO QUE REÚNA LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DE ESTA CLÁUSULA.

DÉCIMA SEGUNDA: RELACIONES LABORALES.

"EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL.

"EL CONTRATISTA" CONVIENE, POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE **"LA SECRETARÍA",** QUIEN QUEDA EXCLUIDO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD ANTE RECLAMACIONES JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES.

DE IGUAL FORMA, **"EL CONTRATISTA"** RESPONDERÁ POR CUALQUIER RELACIÓN JURÍDICA QUE SE ORIGINE POR ACTOS JURÍDICOS CONTRAÍDOS CON PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS Y DEMÁS OPERARIOS QUE CONTRATE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, MATERIA DE ESTE CONTRATO.

OPERADO FAISMUN - 2023

DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DEL "CONTRATISTA".

CON EL OBJETO DE LLEVAR UNA PERMANENTE VIGILANCIA DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN **"EL CONTRATISTA"** DEBERÁ RESPONDER POR LA DEBIDA CAPACIDAD Y PROFESIONALISMO DE SUS TÉCNICOS Y TRABAJADORES QUE EJECUTEN LA OBRA, PERMITIENDO EN TODO MOMENTO Y OTORGANDO TODAS LAS FACILIDADES NECESARIAS AL PERSONAL TÉCNICO DE **"LA SECRETARÍA"** PARA REALIZAR LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN, PROPORCIONANDO TODA LA INFORMACIÓN QUE SEA REQUERIDA.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS, Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE **"LA SECRETARÍA";** ASÍ, COMO A RESPONDER, POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, SE LLEGUEN A CAUSAR A **"LA SECRETARÍA",** O A TERCEROS; EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO HASTA POR SU MONTO TOTAL.

IGUALMENTE, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES Y TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARAN ESTE CONTRATO (ESTIMACIONES DE OBRA, FACTURAS O CONTRA RECIBOS) SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE **"LA SECRETARÍA".**

"EL CONTRATISTA" NO PODRÁ SUBCONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA O PARTE DE LA MISMA.

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CUANDO ÉSTOS NO SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE POR ESCRITO LE PROPORCIONE **"LA SECRETARÍA"** ÉSTE ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA Y SERÁN POR CUENTA DE **"EL CONTRATISTA".**

"EL CONTRATISTA" DEBERÁ SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD QUE **"LA SECRETARÍA"** TENGA ESTABLECIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, A LOS DEMÁS REGLAMENTOS U ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

"EL CONTRATISTA" SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A **"LA SECRETARÍA"** O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS POR NO AJUSTARSE AL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES. LOS RIESGOS Y LA CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA DEFINITIVA A **"A SECRETARÍA",** SERÁN A CARGO DE **"EL CONTRATISTA".**

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE TODOS LOS ADEUDOS QUE FRENTE AL FISCO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL TENGA, CON MOTIVO DE CONTRIBUCIONES QUE SE CAUSEN COMO CONSECUENCIA Y EN EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE CONTRATAN (IMPUESTOS, DERECHOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL).

OPERADO FAISMUN - 2023

DÉCIMA CUARTA: MODIFICACIONES AL CONTRATO.

"LA SECRETARÍA" PODRÁ DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, MODIFICAR ESTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARÍAN EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRÁN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERÁN SER SUSCRITOS BAJO RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE HAYAN FIRMADO EL CONTRATO O QUIENES LOS SUSTITUYAN EN EL CARGO. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRÁN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO **DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266**.

LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRÁN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE EN REDUCCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN O MONTO DEL MISMO. SI SE MODIFICA EL PLAZO, LOS PERIODOS SE EXPRESARÁN EN DÍAS NATURALES, Y LA DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE VARIACIÓN SE HARÁ CON RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO; EN TANTO QUE SI ES AL MONTO, LA COMPARACIÓN SERÁ CON BASE EN EL MONTO CONVENIDO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SERÁN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AÚN CUANDO PARA FINES DE SU FORMALIZACIÓN PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.

LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO LAS PARTES CONVIENEN EN QUE **"EL CONTRATISTA"** PODRÁ SOLICITAR POR ESCRITO UNA AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, SIEMPRE QUE POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR, CASOS FORTUITOS O CUALESQUIERA OTRA CAUSA NO IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA",** LE FUERE IMPOSIBLE CUMPLIR CABALMENTE EN EL PLAZO ESTABLECIDO.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

LAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN QUE **"LA SECRETARÍA"** TIENE LA FACULTAD DE AUTORIZAR O DENEGAR LA SOLICITUD, CUANDO A SU JUICIO EXISTAN LOS ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEN FEHACIENTEMENTE O NO LA PROCEDENCIA.

SE DEBERÁ SUSTENTAR EL DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, SEGÚN SEA EL CASO, CONSIDERÁNDOSE ÉSTOS PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA **"EL CONTRATISTA"** Y **"LA SECRETARÍA"** LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN.

DÉCIMA QUINTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.

"LA SECRETARÍA" EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA, PARA LO CUAL SE ELABORARÁ UN DICTAMEN QUE JUSTIFIQUE LAS CAUSAS QUE MOTIVAN LA SUSPENSIÓN, ESTABLECIENDO EL PLAZO DE LA SUSPENSIÓN, QUE PODRÁ PRORROGARSE SI LAS CIRCUNSTANCIAS QUE DIERON ORIGEN A LA INTERRUPCIÓN PERSISTEN, DEBIENDO INFORMAR EL CONTENIDO DE ESTA RESOLUCIÓN A **"EL CONTRATISTA"**; EN ESTE CASO SE INTERRUMPIRÁ EL CALENDARIO ORIGINALMENTE PREVISTO PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, SIN QUE ESTO IMPLIQUE LA CANCELACIÓN, EXTINCIÓN O DISMINUCIÓN DE LAS GARANTÍAS OTORGADAS.

OPERADO FAISMUN - 2023

CUANDO OCURRA LA SUSPENSIÓN, EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR **"LA SECRETARÍA"** NOTIFICARÁ POR ESCRITO A **"EL CONTRATISTA"**, SEÑALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

EN CASO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** HAYA SUSPENDIDO LOS TRABAJOS, CON BASE A LA INSTRUCCIÓN RECIBIDA POR ESCRITO, LA FECHA DE TERMINACIÓN SE PRORROGARÁ EN IGUAL PROPORCIÓN AL PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSIÓN, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIDO, FORMALIZÁNDOLA MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN, LA QUE CONTENDRÁ COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR **EL ARTÍCULO 147 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**.

CUANDO LA SUSPENSIÓN SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"**, DEBIENDO ÚNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE SUSPENSIÓN Y LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAJOS RESULTEN DAÑADOS O DESTRUIDOS Y ÉSTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERÁN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO EN LOS TÉRMINOS DEL **ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266**, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRÉ EL CONVENIO PARA CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA"**.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

NO SERÁ MOTIVO DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE **"EL CONTRATISTA"**.

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS O SI LA SUSPENSIÓN EXCEDE SEIS MESES **"EL CONTRATISTA"** TENDRÁ DERECHO A SOLICITAR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO, ATENDIENDO A LAS CIRCUNSTANCIAS DE CADA CASO EN CONCRETO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN.

DÉCIMA SEXTA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

"LA SECRETARÍA" PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL MUNICIPIO; O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS. DE PRESENTARSE ESTA SITUACIÓN, **"LA SECRETARÍA"** PAGARÁ A **"EL CONTRATISTA"** LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

OPERADO FAISMUN - 2023

DE IGUAL FORMA, CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, **"EL CONTRATISTA"** PODRÁ SUSPENDER LAS OBRAS EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR SU SOLICITUD A **"LA SECRETARÍA",** QUIEN RESOLVERÁ DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA MISMA, EN CASO DE NEGATIVA, SERÁ NECESARIO QUE **"EL CONTRATISTA"** OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL CORRESPONDIENTE LA DECLARATORIA RESPECTIVA.

SE ENTIENDE POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, AQUELLOS FENÓMENOS DE LA NATURALEZA O HECHOS DE PERSONAS CON AUTORIDAD PÚBLICA, GENERAL, INSUPERABLE, IMPREVISIBLE, O QUE PREVIÉNDOSE NO SE PUEDAN EVITAR, Y QUE ORIGINEN QUE UNA PERSONA REALICE UNA CONDUCTA DAÑOSA, CONTRARIA A UN DEBER JURÍDICO O A UNA OBLIGACIÓN. FENÓMENOS DE LA NATURALEZA O HECHOS DEL HOMBRE, TALES COMO (ENUNCIATIVAMENTE MAS NO LIMITATIVA) MOTINES, ACTOS DE TERRORISMO, CUARENTENAS, EPIDEMIAS, GUERRAS (DECLARADAS O NO), DISTURBIOS CIVILES, INSURRECCIONES, INCENDIOS (CUANDO NO SE HAYA DADO CAUSA O CONTRIBUIDOS A ELLOS) TORMENTAS, IMPIDIÉNDOLE TEMPORALMENTE O DEFINITIVAMENTE EN FORMA ABSOLUTA EL CUMPLIMIENTO PARCIAL O TOTAL DE LA OBLIGACIÓN, SIN QUE TALES HECHOS LE SEAN IMPUTABLES DIRECTA O INDIRECTAMENTE Y CUYA AFECTACIÓN NO PUEDE EVITARSE CON LOS INSTRUMENTOS DE QUE NORMALMENTE SE DISPONGA, YA PARA PREVENIR EL ACONTECIMIENTO O PARA OPONERSE A EL Y RESISTIRLO.

ASÍ MISMO, LA EXTINCIÓN O PÉRDIDA DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE **"EL CONTRATISTA"** DARÁ LUGAR A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, ACORDÁNDOSE PAGAR A SUS SUCESORES O BENEFICIARIOS LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERÁN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITÁCORA, DEBIENDO **"LA SECRETARÍA"** LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS INDICADOS POR EL ARTÍCULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO A **"EL CONTRATISTA"** POR **"LA SECRETARÍA"** ÉSTA PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE **"EL CONTRATISTA"**, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A **"LA SECRETARÍA"** EN UN TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

CUANDO SE DÉ POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, DEBERÁ ELABORARSE EL FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN **LOS ARTÍCULOS 168, 169, 170, 171 Y 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.**

OPERADO FAISMUN - 2023

DÉCIMA SÉPTIMA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

"LA SECRETARÍA2 PODRÁ, EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA"** POR LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE **EL ART. 72 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, Y 154, 155, Y 157 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS** Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO, SUS ANEXOS Y EN SU CASO, DE SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS.

DARÁN LUGAR A DETERMINAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN LOS SUPUESTOS SIGUIENTES:

I. POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME AL ART. **73 LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 Y EL REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**;

II. INTERRUMPA INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O SE NIEGUE A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS QUE SE HAYA DETECTADO COMO DEFECTUOSA POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD;

III. NO EJECUTE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATE LAS ÓRDENES DADAS POR EL RESIDENTE;

IV. NO DÉ CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN CONVENIDOS POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y, A JUICIO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO. NO IMPLICARÁ RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO Y, POR TANTO, NO SE CONSIDERARÁ COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISIÓN, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR LA FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES O LA FALTA DE INFORMACIÓN REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FÍSICA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, DE LICENCIAS Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR LA CONTRATANTE, ASÍ COMO CUANDO LA DEPENDENCIA O ENTIDAD HAYA ORDENADO LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS;

V. SEA DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANÁLOGA;

VI. SUBCONTRATE PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD;

VII. TRANSFIERA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD;

VIII. NO DÉ A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS;

IX. CAMBIE SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD;

X. SI SIENDO EXTRANJERO, INVOQUE LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL CONTRATO;

XI. INCUMPLA CON EL COMPROMISO QUE, EN SU CASO, HAYA ADQUIRIDO AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, RELATIVO A LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, Y

XII. EN GENERAL, INCUMPLA CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO.

LAS CAUSALES REFERIDAS DAN LUGAR A LA RESCISIÓN INMEDIATA DE ESTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA **"LA SECRETARÍA"**, ADEMÁS DE QUE SE LE APLIQUEN A **"EL CONTRATISTA"** LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISIÓN, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACIÓN DE UNO O DE OTRO, INDEPENDIENTEMENTE DE HACER EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y APLICARSE EN SU CASO A **"EL CONTRATISTA"** LOS DEMÁS CARGOS QUE PROCEDAN.

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** SE ENCUENTRE EN ALGUNA DE LAS CAUSALES INDICADAS EN LA CLÁUSULA ANTERIOR, EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA SE SUJETARÁ A LO SIGUIENTE:

1. EL PROCEDIMIENTO INICIARÁ A PARTIR DE QUE **"LA SECRETARÍA"** LE NOTIFIQUE A **"EL CONTRATISTA"** POR OFICIO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, SEÑALANDO LOS

OPERADO FAISMUN - 2023

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVARON SU DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, RELACIONÁNDOLO CON LAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

2. TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE EL NUMERAL ANTERIOR, **"LA SECRETARÍA"** RESOLVERÁ CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER **"EL CONTRATISTA".**

3. LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO POR PARTE DE **"LA SECRETARÍA"**, DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 1(UNO) DE ESTA CLÁUSULA.

UNA VEZ NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, **"LA SECRETARÍA"** SE ABSTENDRÁ, COMO MEDIDA PRECAUTORIA, DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA COMUNICACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS.

EN EL FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME EL PROGRAMA VIGENTE, ATENDIENDO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 162 Y 163 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO **"LA SECRETARÍA"** LE HAYA ENTREGADO A **"EL CONTRATISTA"**, ASÍ COMO CONSIDERAR EN SU INTEGRACIÓN LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE HAYA REALIZADO **"EL CONTRATISTA"** HASTA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO LOS EQUIPOS, MATERIALES QUE SE HUBIERAN INSTALADO EN LA OBRA O SE ENCUENTREN EN PROCESO DE FABRICACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SEAN SUSCEPTIBLES DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 Y 161 DE SU REGLAMENTO.

EL SOBRECOSTO QUE SE DETERMINE AL ELABORAR EL FINIQUITO, SERÁ INDEPENDIENTE DE LAS GARANTÍAS, PENAS CONVENCIONALES Y DEMÁS CARGOS QUE DEBAN CONSIDERARSE EN LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.

COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO PROCEDERÁ A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE **"EL CONTRATISTA"**, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN Y ANTES DE SU CONCLUSIÓN, **"LA SECRETARÍA"** PODRÁ A SU JUICIO, SUSPENDER EL TRÁMITE DEL CITADO PROCEDIMIENTO, CUANDO SE HUBIERE INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO. EN EL CASO DE QUE SE DETERMINE NO RESCINDIR EL CONTRATO, SE REPROGRAMARÁN LOS TRABAJOS UNA VEZ NOTIFICADA LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE POR **"LA SECRETARÍA"** A **"EL CONTRATISTA"**.

OPERADO FAISMUN - 2023

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

"LA SECRETARÍA" PODRÁ OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISIÓN, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACIÓN DE UNAS O DE OTRO.

DECIMA OCTAVA: PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE ESTE CONTRATO, **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** CONVIENEN LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES RETENCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES:

A).- "LA SECRETARÍA" TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR MENSUALMENTE SI LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR **"EL CONTRATISTA"** DE ACUERDO CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO; PARA LO CUAL, **"LA SECRETARÍA"** COMPARARÁ EL AVANCE MES A MES CONTRA EL PROGRAMA, Y LOS TRABAJOS EFECTIVOS EJECUTADOS.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE, **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A HACER LAS RETENCIONES ECONÓMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN QUE SE DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA, HASTA LA DE REVISIÓN. LAS RETENCIONES SERÁN DETERMINADAS ÚNICAMENTE EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO OPORTUNAMENTE CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

CUANDO **"EL CONTRATISTA"** REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO SEÑALADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN, PODRÁ RECUPERAR LAS RETENCIONES ECONÓMICAS QUE SE LE HAYAN EFECTUADO, POR LO QUE **"LA SECRETARÍA"** LE REINTEGRARÁ EL IMPORTE DE LAS MISMAS QUE AL MOMENTO DE LA REVISIÓN TUVIERA ACUMULADAS.

LA APLICACIÓN DE ESTAS RETENCIONES TENDRÁ EL CARÁCTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, ÉSTOS NO SE HAN CONCLUIDO.

B).- SI **"EL CONTRATISTA"** NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO Y EN EL PROGRAMA DE TRABAJO, **"LA SECRETARÍA"** LE APLICARÁ LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR CADA MES O FRACCIÓN QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACIÓN PACTADA EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO HASTA EL MOMENTO DE SU TERMINACIÓN. DICHAS PENAS NO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES SE DESCONTARÁN ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN Y EL DE LAS PENAS CONVENCIONALES EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, Y SE APLICARÁN, SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE

OPERADO
FAISMUN - 2023

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

LOS TRABAJOS SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA"** Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL QUE A JUICIO DE **"LA SECRETARÍA"** NO SE ATRIBUYA A CULPA DE **"EL CONTRATISTA"**.

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN, **"LA SECRETARÍA"** PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, O BIEN, LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA GARANTÍA DEL ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGÚN PROCEDA EN LA RESCISIÓN, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

SI **"LA SECRETARÍA"** OPTA POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, SE APEGARÁ A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA DE ESTE CONTRATO.

DECIMA NOVENA: TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARÁ A TRAVÉS DE LA BITÁCORA O POR ESCRITO A **"LA SECRETARÍA"** SOBRE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS ANEXANDO LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRÁ UNA RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA, Y ÉSTA VERIFICARÁ DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, SALVO QUE SE PACTE EXPRESAMENTE OTRO PLAZO, QUE LOS MISMOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS.

OPERADO FAISMUN - 2023

SI DURANTE LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, **"LA SECRETARÍA"** ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, DEBERÁ SOLICITAR A **"EL CONTRATISTA"** SU REPARACIÓN, A EFECTO DE QUE ÉSTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS. EN TAL CASO, EL PLAZO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE PODRÁ PRORROGAR POR EL PERIODO QUE ACUERDEN **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** PARA LA REPARACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE **"LA SECRETARÍA"** OPTE POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO.

UNA VEZ QUE SE HAYA CONSTATADO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A LA RECEPCIÓN FORMAL DE LOS MISMOS, EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, SUSCRIBIENDO EL **"ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN"** EN LA QUE CONSTE ESTE HECHO, DEBIENDO CONTENER COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 166 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR **A "LA SECRETARÍA"** DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE **A "LA SECRETARÍA"** HAYA CONSTATADO LA TERMINACIÓN REAL DE LOS TRABAJOS, TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL **FINIQUITO DEL CONTRATO**, INCLUYENDO ESTIMACIONES POR CONCEPTO DE OBRA EJECUTADA, CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA FUERA DE CATÁLOGO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, SOLICITUD DE AJUSTE A LOS COSTOS POR CONCEPTO DE IMPACTO INFLACIONARIO (EN CASO DE EXISTIR) Y **PLANO DE OBRA TERMINADA** EN EL QUE SE PLASMEN TODAS LAS MODIFICACIONES Y ADECUACIONES AL PROYECTO ORIGINAL PROPORCIONADO A **"EL CONTRATISTA"** PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, TODO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

DEBIDAMENTE JUSTIFICADO Y CON LOS APOYOS NECESARIOS PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN POR PARTE DE **A "LA SECRETARÍA".**

"LA SECRETARÍA" NO ESTARÁ OBLIGADA A DAR TRÁMITE A LAS SOLICITUDES O DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTE SI **"EL CONTRATISTA"** NO CUMPLIESE CON LA ENTREGA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN ESTA CLÁUSULA.

VIGÉSIMA: FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** EN ESTE CONTRATO, SE DEBERÁ ELABORAR EL **FINIQUITO DE OBRA** CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS.

OPERADO FAISMUN - 2023

"LA SECRETARÍA" DEBERÁ NOTIFICAR POR OFICIO A **"EL CONTRATISTA"** LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL FINIQUITO; **"EL CONTRATISTA"** TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE ACUDIR AL LLAMADO QUE SE LE HAGA MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO.

EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERÁ REUNIR COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTÍCULO 170 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS EL FINIQUITO DEBERÁ SER ELABORADO POR **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, HACIÉNDOSE CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE, DEBIENDO EXPONER, EN SU CASO, LAS RAZONES DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, **"EL CONTRATISTA"** NO ACUDA CON **"LA SECRETARÍA"** PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL TÉRMINO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR POR OFICIO SU RESULTADO A **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DEL TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A **"EL CONTRATISTA"**, ÉSTE TENDRÁ EL TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA; SI TRANSCURRIDO ESTE TÉRMINO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO.

SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE **"EL CONTRATISTA"**, **"LA SECRETARÍA"** DEBERÁ LIQUIDARLOS DENTRO DEL TÉRMINO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES. SI RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE **"LA SECRETARÍA"** EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRÁ DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES ÉSTOS, DEBERÁ EXIGIRSE POR OFICIO SU REINTEGRO, MÁS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"LA SECRETARÍA"**, EN

CASO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO, **"LA SECRETARÍA"** PODRÁ HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES. EN FORMA SIMULTÁNEA, SE LEVANTARÁ EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DÉ POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** EN ESTE CONTRATO, LA QUE DEBERÁ REUNIR COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS SEÑALADOS POR EL ARTÍCULO 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA LIQUIDACIÓN DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO PODRÁ UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** EN ESTE CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR ÚNICAMENTE UNA MANIFESTACIÓN DE **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE TENDRÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN. AL NO SER FACTIBLE EL PAGO EN EL TÉRMINO INDICADO, SE PROCEDERÁ A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA, QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** EN ESTE CONTRATO.

OPERADO FAISMUN - 2023

VIGÉSIMA PRIMERA: OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS.

"EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

- **EL 0.005** (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN PARA CUMPLIR CON EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, LO ANTERIOR, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

- **EL 0.005** (CINCO AL MILLAR) PARA LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES AFILIADAS A LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO DE FECHA **02 DE MAYO DE 2022**, CELEBRADO POR LA MENCIONADA CÁMARA Y EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN CON **"LA SECRETARÍA"**, CON EL OBJETO DE APOYAR LA CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

VIGÉSIMA SEGUNDA: JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES.

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CON SEDE EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, POR LO TANTO, **"EL CONTRATISTA"** RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LEÍDO POR LAS PARTES QUE EN ÉL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS FOJAS

ÚTILES EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO, EL DÍA **15 DE AGOSTO DEL 2023.**

POR "LA SECRETARÍA".

C. ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
2021 - 2024

"EL CONTRATISTA".

IRINA SALGADO HERNANDEZ
IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

OPERADO
FAISMUN - 2023

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

DORAMA

Datos de la Fianza

FOLIO 1827937

Movimiento :	POLIZA	**R.F.C. Fiado :**	ICO091216UUA	**Monto Afianzado del Movimiento**	**$500,042.75**
Fianza :	23A42208	**Endoso :**	23A42208	**Prima :**	**$7,973.28**
Ramo :	ADMINISTRATIVO				
Subramo :	OBRA			Gastos de Expedición y D.I.V. :	$2,279.06
Obligación :	CUMPLIMIENTO Y BUENA CALIDAD			Otros Gastos :	$0.00
Moneda :	PESOS	**Código Seguridad:**	1800023A422081827	Gasto de Seguro :	$0.00
Agente :	855350	**C.C. :**	3002070	Gasto de Servicio de Ajuste :	$0.00
Nombre :	EFREN JESUS LOPEZ FLORES			**Sub Total :**	**$10,252.34**
División :	METROPOLITANA			I.V.A. 16.00%	$1,640.37
Monto Total de la Fianza:	**$500,042.75**			**Prima Total :**	**$11,892.71**

Dorama, Institución de Garantías, S.A. En ejercicio de la autorización que le fue concedida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas

FIANZA OTORGADA ANTE: EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. CON DOMICILIO EN AV. CUAUHTEMOC S/N INTERIOR PARQUE PAPAGAYO, COL. HORNOS INSURGENTES, C.P. 39350, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO., Y CON RFC: MAJ010101NA3.

PARA GARANTIZAR POR IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN CALLE CORREGIDORA No. 4, COL. MORELOS, C.P. 39530, ACAPULCO, GRO., Y R.F.C. ICO-091216-UUA, EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO N° MAJ-FAISMUN/426-2023/LP DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2023, CELEBRADO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, REPRESENTADA POR SU TITULAR LA ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA, CUYO OBJETO CONSISTE EN: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, CON UN IMPORTE TOTAL DE $5,000,427.46 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 46/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO N° 266, Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE LA MATERIA, EN LO QUE NO SE OPONGA A LA CITADA LEY. LA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A) LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B) LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C) CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUBSTITUIRA EN EL O LOS SIGUIENTES EJERCICIOS POR OTRO U OTRAS EQUIVALENTES AL IMPORTE DE LOS TRABAJOS FALTANTES POR EJECUTAR, ACTUALIZANDO LOS IMPORTES DE ACUERDO CON LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS Y MODIFICACIONES CONVENIDAS SI LAS HUBIERE; D) EN EL CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO, SE DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA POLIZA Y PARA EL CASO DE AMPLIACION DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION O EJECUCION DE LOS TRABAJOS O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA

*Esta Fianza sólo es válida hasta por la cantidad de: $500,042.75 (***QUINIENTOS MIL CUARENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N.***)*

rk8fea52yqn5sYFxcfxU8qIbYNuAXCCEhkmUDSmoFSU/1CzzJoLgRuZtnowC/o69HJqWIfVUcWUF4Q4+wbksOvk3eVhiqQYL8x5kIOJRx/5b1biMIT4N2A3IUxZHVTHAWEEn5sOjmZL4qQYBixLvxHEaVfMF1x/SSrW/QbXr0=

CINTHYA CRISTINA GARCIA VILLALBA

JEFE DE OFICINA

CUERNAVACA, MORELOS, A 15 DE AGOSTO DE 2023

La presente póliza únicamente será válida si contiene la firma del responsable de su expedición.
Condiciones Generales adjuntas o en www.dorama.mx
Esta Fianza es nula y sin ningún valor si se expide:
a) Como complementaria de otra(s) que ampare(n) la misma obligación.
b) Por la cantidad mayor indicada al margen con la máquina protectora.

Dorama, Institución de Garantías, S.A.
Av. Patriotismo No. 201 Piso 1
Col. San Pedro de los Pinos C.P. 03800,
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México
Tel. 5487 6100 • 01 800 DORAMA 1 (367262-1)
R.F.C. FDO9411098R8

Para validar su fianza ingrese a www.dorama.mx

LÍNEA DE VALIDACIÓN: 1800 023A 4220 8182 7937

DORAMA

Datos de la Fianza

FOLIO 1827937

Movimiento :	POLIZA	**R.F.C. Fiado :**	ICO091216UUA	**Monto Afianzado del Movimiento**	**$500,042.75**
Fianza :	23A42208	**Endoso :**	23A42208	**Prima :**	**$7,973.28**
Ramo :	ADMINISTRATIVO				
Subramo :	OBRA			Gastos de Expedición y D.I.V. :	$2,279.06
Obligación :	CUMPLIMIENTO Y BUENA CALIDAD			Otros Gastos :	$0.00
Moneda :	PESOS	**Código Seguridad:**	1800023A422081827	Gasto de Seguro :	$0.00
Agente :	855350	**C.C. :**	3002070	Gasto de Servicio de Ajuste :	$0.00
Nombre :	EFREN JESUS LOPEZ FLORES			**Sub Total :**	**$10,252.34**
División :	METROPOLITANA			I.V.A. 16.00%	$1,640.37
Monto Total de la Fianza:	**$500,042.75**			**Prima Total :**	**$11,892.71**

Dorama, Institución de Garantías, S.A. En ejercicio de la autorización que le fue concedida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas

PRORROGA O ESPERA, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORANEAMENTE; E) LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ; F) ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O DE (LA CONVOCANTE), HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACORTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; G) QUE LA FIANZA SE OTORGA TAMBIEN PARA GARANTIZAR LA CORRECCION DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION QUE RESULTEN, DE LOS VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; H) LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE (LA CONVOCANTE), SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA CONTINUARA VIGENTE; I) CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA Y ESTE EFECTUE LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, DEBERA LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA, SIEMPRE Y CUANDO SEA PROCEDENTE EN LOS TERMINOS AQUÍ ESTIPULADOS; J) LA FIANZA CONTINUARA EN VIGOR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LA OBRA, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO ALGUNA RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA POR DEFECTOS DE LA OBRA, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA, EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCION FISICA DE LA OBRA, EL CONTRATISTA GARANTIZA LOS MISMOS EN LOS TERMINOS DEL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO Nº 266 Y 95 DE SU REGLAMENTO, POR LO QUE TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE) MESES, SIN QUE EXISTA RECLAMACION ALGUNA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, LA FIANZA QUEDARA CANCELADA, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD

Esta Fianza sólo es válida hasta por la cantidad de:
*(***QUINIENTOS MIL CUARENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N.***)*
$500,042.75

rk8fca52xjqn5sYFxcfxU8qBjYNuAXCCEhkmUDSmoFSU/1CizJoLgRuZm6wC/6s9HJqWhVUcWUFdQ4+wbksOvk3eYhiqQYL8c5h1OJRx/5b1b1MIT4N2A3IUzZHVTHAWEEn5sOjmZL4qQYBixLvxHEaVMF1x/SSsW/QbXr0=

CINTHYA CRISTINA GARCIA VILLALBA
JEFE DE OFICINA

CUERNAVACA, MORELOS, A 15 DE AGOSTO DE 2023

La presente póliza únicamente será válida si contiene la firma del responsable de su expedición.
Condiciones Generales adjuntas o en www.dorama.mx
Esta Fianza es nula y sin ningún valor si se expide:
a) Como complementaria de otra(s) que ampare(n) la misma obligación.
b) Por la cantidad mayor indicada al margen con la máquina protectora.

Dorama, Institución de Garantías, S.A.
Av. Patriotismo No. 201 Piso 1
Col. San Pedro de los Pinos C.P. 03800,
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México
Tel. 5487 6100 • 01 800 DORAMA 1 (367262-1)
R.F.C. FDO9411098R8

Para validar su fianza ingrese a www.dorama.mx
LÍNEA DE VALIDACIÓN: 1800 023A 4220 8182 7937

DORAMA

Datos de la Fianza

FOLIO 1827937

Movimiento :	POLIZA	**R.F.C. Fiado :**	ICO091216UUA	**Monto Afianzado del Movimiento**	**$500,042.75**
Fianza :	23A42208	**Endoso :**	23A42208	**Prima :**	**$7,973.28**
Ramo :	ADMINISTRATIVO				
Subramo :	OBRA			Gastos de Expedición y D.I.V. :	$2,279.06
Obligación :	CUMPLIMIENTO Y BUENA CALIDAD			Otros Gastos :	$0.00
Moneda :	PESOS	**Código Seguridad:**	1800023A422081827	Gasto de Seguro :	$0.00
Agente :	855350	**C.C. :**	3002070	Gasto de Servicio de Ajuste :	$0.00
Nombre :	EFREN JESUS LOPEZ FLORES			**Sub Total :**	**$10,252.34**
División :	METROPOLITANA			I.V.A. 16.00%	$1,640.37
Monto Total de la Fianza:	**$500,042.75**			**Prima Total :**	**$11,892.71**

Dorama, Institución de Garantías, S.A. En ejercicio de la autorización que le fue concedida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas

EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA, LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE; K) EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS POR PARTE DEL CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO A LA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS A EFECTO DE QUE ESTA NO SEA CANCELADA Y NOTIFICARA POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA FIANZA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO AL CONTRATISTA LA RESOLUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. SI LA CORRECCION O REPOSICION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; L) LA FIANZA SE HARA EFECTIVA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA AL CONTRATISTA LA RESOLUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO; M) LA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS Nº 178, 279, 280 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR; OTORGANDO LA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS EL CONSENTIMIENTO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTICULO Nº 179 DEL CITADO ORDENAMIENTO.
*** FIN DE TEXTO ***

Esta Fianza sólo es válida hasta por la cantidad de:
*(***QUINIENTOS MIL CUARENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N. ***)*
$50

rk8fca52xjqm5yYFxefkU8qJbYNuAXCCEhkmUDSmoFSU/1CizJoLgRuZm6wC/o69HJqWtVUcWUFdQ4+wbksOvk3eVhiqQYL8x5klOJRx/5b1bIMIT4N2A3IUxZHVTHAWEEn5sOjmZL4qQYBlxLvxHEaVfMF1x/SSsW/QbXr0=

CINTHYA CRISTINA GARCIA VILLALBA
JEFE DE OFICINA

CUERNAVACA, MORELOS, A 15 DE AGOSTO DE 2023

La presente póliza únicamente será válida si contiene la firma del responsable de su expedición.
Condiciones Generales adjuntas o en www.dorama.mx
Esta Fianza es nula y sin ningún valor si se expide:
a) Como complementaria de otra(s) que ampare(n) la misma obligación.
b) Por la cantidad mayor indicada al margen con la máquina protectora.

Dorama, Institución de Garantías, S.A.
Av. Patriotismo No. 201 Piso 1
Col. San Pedro de los Pinos C.P. 03800,
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México
Tel. 5487 6100 • 01 800 DORAMA 1 (367262-1)
R.F.C. FDO9411098R8

Para validar su fianza ingrese a www.dorama.mx
LÍNEA DE VALIDACIÓN: 1800 023A 4220 8182 7937

DORAMA
La certeza de un respaldo

H@Z

Usted está en Validación de fianzas

Para Fianzas Dorama es prioridad la seguridad de sus pólizas, para lo cual le ofrece la plataforma
***H@Z** tu validación en línea*

Código de validación: 000023 318279 370001

Fianza 23A42208

FIADO	BENEFICIARIO	ESTATUS	OBLIGACIÓN	MONTO	MONEDA	FECHA INICIO	FECHA FIN
IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.	VIGENTE	CUMPLIMIENTO Y BUENA CALIDAD	500,042.75	PESOS	15/08/2023	12/12/2024

Movimiento

FOLIO	CLAVE ENDOSO	TIPO MOVIMIENTO	MONTO	FECHA EMISIÓN	INICIO VIGENCIA	FIN VIGENCIA
1827937	23A42208	EMISION	500,042.75	15/08/2023	15/08/2023	12/12/2024

Regresar

Para cualquier aclaración en el proceso de validación de su fianza por favor contáctenos al
Tel. ***01-800-DORAMA-1 Ext.6120*** o a través de la cuenta de correo: ***helpdesk@dorama.mx***

por Heurística Soluciones S.A. de C.V.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
2021 - 2024

DORAMA

Datos de la Fianza

FOLIO 1827931

Movimiento :	POLIZA	**R.F.C. Fiado :**	ICO091216UUA	**Monto Afianzado del Movimiento**	**$1,500,128.24**
Fianza :	23A42203	**Endoso :**	23A42203	**Prima :**	**$18,001.54**
Ramo :	ADMINISTRATIVO				
Subramo :	OBRA			Gastos de Expedición y D.I.V. :	$2,630.05
Obligación :	ANTICIPO			Otros Gastos :	$450.00
Moneda :	PESOS	**Código Seguridad:**	1800023A422031827	Gasto de Seguro :	$0.00
Agente :	855350	**C.C. :**	3002070	Gasto de Servicio de Ajuste :	$0.00
Nombre :	EFREN JESUS LOPEZ FLORES			**Sub Total :**	**$21,081.59**
División :	METROPOLITANA			I.V.A. 16.00%	$3,373.06
Monto Total de la Fianza:	**$1,500,128.24**			**Prima Total :**	**$24,454.65**

Dorama, Institución de Garantías, S.A. En ejercicio de la autorización que le fue concedida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas

FIANZA OTORGADA ANTE: EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. CON DOMICILIO EN AV. CUAUHTEMOC S/N INTERIOR PARQUE PAPAGAYO, COL. HORNOS INSURGENTES, C.P. 39350, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO., Y CON RFC: MAJ010101NA3.

PARA GARANTIZAR POR IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN CALLE CORREGIDORA No. 4, COL. MORELOS, C.P. 39530, ACAPULCO, GRO., Y R.F.C. ICO-091216-UUA, LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACIÓN Y EN SU CASO, DEVOLUCION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30% (TREINTA POR CIENTO) PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $1,500,128.24 (UN MILLON QUINIENTOS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 24/100 M.N.) INCLUYE I.V.A. LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO N° 266, Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE LA MATERIA, EN LO QUE NO SE OPONGA A LA CITADA LEY, RESPECTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO N° MAJ-FAISMUN/426-2023/LP DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2023, CELEBRADO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, REPRESENTADA POR EL ING. LUZ MARÍA MERAZA RADILLA EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, CUYO OBJETO CONSISTE EN: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, CON UN IMPORTE TOTAL DE $5,000,427.46 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 46/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. LA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A) LA FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD Y ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, PARA GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSION DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO QUE LA CONTRATANTE OTORGA A LA EMPRESA IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., Y SE COMPROMETE A PAGAR HASTA LA CANTIDAD QUE IMPORTE ESTA FIANZA, EN CASO DE QUE SU FIADO NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN

Esta Fianza sólo es válida hasta por la cantidad de: $1,500,128.24 (MILLON QUINIENTOS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 24/100 M.N.

z9ldz0vN12plKdW1RM0VRGlnzjkdM9LJHmVRUXNNYBveWLerVimi4oHsdF7v1Inm2yczrGykIMmOXbg9XC3hGAN+keGpt6Z67cgx+ogPNfEQeCs1IBPjKbR/6TgR67B22A+UsiuFNAOVTuEK6J/JCbqt/ynfUsyet+nD8lj5c=

CINTHYA CRISTINA GARCIA VILLALBA

JEFE DE OFICINA

CUERNAVACA, MORELOS, A 15 DE AGOSTO DE 2023

La presente póliza únicamente será válida si contiene la firma del responsable de su expedición.
Condiciones Generales adjuntas o en www.dorama.mx
Esta Fianza es nula y sin ningún valor si se expide:

a) Como complementaria de otra(s) que ampare(n) la misma obligación.
b) Por la cantidad mayor indicada al margen con la máquina protectora.

Dorama, Institución de Garantías, S.A.
Av. Patriotismo No. 201 Piso 1
Col. San Pedro de los Pinos C.P. 03800,
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México
Tel. 5487 6100 • 01 800 DORAMA 1 (367262-1)
R.F.C. FDO9411098R8

Para validar su fianza ingrese a www.dorama.mx

LÍNEA DE VALIDACIÓN: 1800 023A 4220 3182 7931

DORAMA

Datos de la Fianza

FOLIO 1827931

Movimiento :	POLIZA	**R.F.C. Fiado :**	ICO091216UUA	**Monto Afianzado del Movimiento**	**$1,500,128.24**
Fianza :	23A42203	**Endoso :**	23A42203	**Prima :**	**$18,001.54**
Ramo :	ADMINISTRATIVO				
Subramo :	OBRA			Gastos de Expedición y D.I.V. :	$2,630.05
Obligación :	ANTICIPO			Otros Gastos :	$450.00
Moneda :	PESOS	**Código Seguridad:**	1800023A422031827	Gasto de Seguro :	$0.00
Agente :	855350	**C.C. :**	3002070	Gasto de Servicio de Ajuste :	$0.00
Nombre :	EFREN JESUS LOPEZ FLORES			**Sub Total :**	**$21,081.59**
División :	METROPOLITANA			I.V.A. 16.00%	$3,373.06
Monto Total de la Fianza:	**$1,500,128.24**			**Prima Total :**	**$24,454.65**

Dorama, Institución de Garantías, S.A. En ejercicio de la autorización que le fue concedida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas

O SEA RESCINDIDO EL CONTRATO; B) EN EL CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO, SE DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA POLIZA Y PARA EL CASO DE AMPLIACION DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION O EJECUCION DE LOS TRABAJOS O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORANEAMENTE; C) CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA Y ESTE EFECTUE LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, DEBERA LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA SIEMPRE Y CUANDO SEA PROCEDENTE EN LOS TERMINOS AQUÍ ESTIPULADOS; D) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, QUE LA PRODUCIRA CUANDO EL IMPORTE DEL ANTICIPO HAYA SIDO AMORTIZADO O DEVUELTO EN SU TOTALIDAD Y SE HAYAN PAGADO EN SU CASO LOS ACCESORIOS; E) QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; F) LA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN LOS ARTICULOS Nº 178, 279, 280 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR; OTORGANDO LA AFIANZADORA EL CONSENTIMIENTO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTICULO Nº 179 DEL CITADO ORDENAMIENTO; G) QUE PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO SE SOMETE A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO DE GUERRERO, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRA QUE TUVIERE POR RAZON DE SU DOMICILIO OFICIAL, EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
*** FIN DE
TEXTO ***

Esta Fianza sólo es válida hasta por la cantidad de: $1,500,128.24 (MILLON QUINIENTOS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 24/100 M.N.)

z9ld20vN12pIKdW1RM0VRGinzjkdM9LJHmVRUXNNYBveWLcrVitmi4oHsdF7v1lnmZyczrGykIMmOXbg9XC3hGAN+keGpt6Z7ugx+ogPMEQeCs1IBPjKbR/6TgR67B22A+UsuFNAOVTuEK6JJCbqt/ynf0Usyet+nD8lj5e=

CINTHYA CRISTINA GARCIA VILLALBA
JEFE DE OFICINA

CUERNAVACA, MORELOS, A 15 DE AGOSTO DE 2023

La presente póliza únicamente será válida si contiene la firma del responsable de su expedición.
Condiciones Generales adjuntas o en www.dorama.mx
Esta Fianza es nula y sin ningún valor si se expide:
a) Como complementaria de otra(s) que ampare(n) la misma obligación.
b) Por la cantidad mayor indicada al margen con la máquina protectora.

Dorama, Institución de Garantías, S.A.
Av. Patriotismo No. 201 Piso 1
Col. San Pedro de los Pinos C.P. 03800,
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México
Tel. 5487 6100 • 01 800 DORAMA 1 (367262-1)
R.F.C. FDO9411098R8

Para validar su fianza ingrese a www.dorama.mx
LÍNEA DE VALIDACIÓN: 1800 023A 4220 3182 7931



Usted está en Validación de fianzas

Para Fianzas Dorama es prioridad la seguridad de sus pólizas, para lo cual le ofrece la plataforma
H@Z tu validación en línea

Código de validación: 000023 318279 310001

Fianza 23A42203

FIADO	BENEFICIARIO	ESTATUS	OBLIGACIÓN	MONTO	MONEDA	FECHA INICIO	FECHA FIN
IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.	VIGENTE	ANTICIPO	1,500,128.24	PESOS	18/08/2023	17/08/2024

Movimiento

FOLIO	CLAVE ENDOSO	TIPO MOVIMIENTO	MONTO	FECHA EMISIÓN	INICIO VIGENCIA	FIN VIGENCIA
1827931	23A42203	EMISION	1,500,128.24	15/08/2023	18/08/2023	17/08/2024

Regresar

Para cualquier aclaración en el proceso de validación de su fianza por favor contáctenos al
Tel. ***01-800-DORAMA-1 Ext.6120*** o a través de la cuenta de correo: ***helpdesk@dorama.mx***

por Heurística Soluciones S.A. de C.V.



ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO., A 15 DE AGOSTO DE 2023

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E

CARTA DE PROTESTA

POR MEDIO DE ESTA CARTA DECLARO BAJO PROTESTA, DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARNOS EN LOS SUPUESTOS DEL **ART. 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266.**

FIRMO HACIENDOME RESPONSABLE DE CUALQUIER ACLARACION QUE PUDIERA FALTAR A LA VERDAD, AFIRMANDO QUE SOY LA REPRESENTANTE LEGAL PARA LA OBRA: **" REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES",** UBICADA EN: **ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO,** MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. CON **No. DE CONTRATO: MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO NO SIN ANTES MANIFESTARLE QUEDAR A SUS ORDENES PARA CUALQUIER ACLARACION.

ATENTAMENTE

ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01
CEL. 744 4490912 / 744 2354717 E-MAIL: imexa@telmexmail.com, gno_0301@hotmail.com

ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO., A 15 DE AGOSTO DE 2023

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E

CARTA DE SOLVENCIA ECONOMICA

COMO REPRESENTANTE O APODERADO DE LA EMPRESA, **IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.** MANIFIESTO Y PROTESTO LO NECESARIO QUE MI EMPRESA TIENE SOLVENCIA ECONOMICA PARA RESPONDER A LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS EN RELACION A LA OBRA PÚBLICA ASIGNADA CON EL NOMBRE DE: **" REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES"** UBICADA EN: **ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO,** MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. CON No. DE CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**

POR LA CONFIANZA REITERADA, QUIERO RECALCAR QUE SOMOS UNA EMPRESA CON AMPLIA SOLVENCIA MORAL Y ECONOMICA, COMO SE MUESTRA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS Y EN BASE A LOS SALDOS QUE REPORTA NUESTRA CUENTA QUE NOS DA LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA SOLVENTARLOS.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO NO SIN ANTES MANIFESTARLE QUEDAR A SUS ORDENES PARA CUALQUIER ACLARACION.

ATENTAMENTE

ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01
CEL. 744 4490912 / 744 2354717 E-MAIL: imexa@telmexmail.com, gno_0301@hotmail.com

ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO., A 15 DE AGOSTO DE 2023

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E

CARTA DE VISITA DE OBRA

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y EN MI CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.** HAGO CONSTAR QUE SE VISITO LA OBRA: **" REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES"** UBICADA EN: **ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.** CON No. DE CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP** Y A SU VEZ SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO DEL CUAL SE DERIVA EL PRESUPUESTO DE OBRA QUE CONTIENE TODOS LOS CONCEPTOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE DICHA OBRA.

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCION QUE SE SIRVA BRINDAR A LA PRESENTE, APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

C. ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01
CEL. 744 4490912 / 744 2354717 E-MAIL: imexa@telmexmail.com, gno_0301@hotmail.com

ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO., A 15 DE AGOSTO DE 2023

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E

CARTA DE INICIO DE OBRA

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE INFORMO QUE, CON FECHA DEL **15 DE AGOSTO DEL 2023**, ESTA EMPRESA DARA INICIO CON RECURSOS PROPIOS A LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA: **" REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES"** UBICADA EN: **ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO,** MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. CON No. DE CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP,** RESPETANDO LOS REGLAMENTOS INTERNOS DE ESTA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, LE REITERO UN CORDIAL SALUDO

ATENTAMENTE

ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01
CEL. 744 4490912 / 744 2354717 E-MAIL: imexa@telmexmail.com, gno_0301@hotmail.com

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 12

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Fecha: 03/08/2023
Duración: 90 días naturales
Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A	**Rehabilitación de calle Felipe II, Tramo Farallón Av. Universidad, Fracc. Magallanes.**					
A1	**Preliminares.**					
3-0073	Trazo y nivelación topográficas del terreno para estructuras estableciendo ejes y referencias, para superficie mayores a 300.00 m2 (vialidad) incluye: elaboración de planos topográficos.	M2	2,692.8100	$17.31	(* DIECISIETE PESOS 31/100 M.N. *)	$46,612.54
D-CAR5A10	Demolición a maquina de carpeta asfaltica de 5.00 a 10.00 cms. De espesor. Incluye mano de obra y acarreos en 1a. estación.	M2	1,649.0000	$73.31	(* SETENTA Y TRES PESOS 31/100 M.N. *)	$120,888.19
D-BANQU	Demolición mecánica de banqueta de 10 cms. de espesor incluye: herramienta menor, equipo y mano de obra.	M2	146.0400	$63.40	(* SESENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N. *)	$9,258.94
D-GUARM	Demolición mecánica de guarnición de 15x20x50 cm., incluye extracción de pedacería, mano de obra, equipo y herramienta.	M	183.6700	$69.73	(* SESENTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N. *)	$12,807.31
1-0056	Descoronamiento de muro de piedra braza de 30 cm de ancho incluye: acarreo de material fuera de la obra producto de la demolición.	M	120.0000	$108.12	(* CIENTO OCHO PESOS 12/100 M.N. *)	$12,974.40

000160

ADMINISTRADOR UNICO: ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ

Acumulado anterior:
Monto esta hoja: **$202,541.38**
Acumulado: **$202,541.38**

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 12

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Fecha: 03/08/2023
Duración: 90 días naturales
Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
EXC-001	Excavación por medios mecánicos en cepas de 0.00 A 2.00 mts de profundidad en material tipo II incluye afine de talud y fondo, acarreos a primera estación de 20 mts.	M3	699.4300	$74.30	(* SETENTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N. *)	$51,967.65
9-0139	Relleno de material producto de excavación compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor, incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.	M3	420.2900	$83.66	(* OCHENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N. *)	$35,161.46
9-0138	Relleno de material inerte de banco compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.	M3	30.0000	$498.99	(* CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N. *)	$14,969.70
A1	**TOTAL Preliminares.**					**$304,640.19**
A2	**Terracerías**					
31-0448	Apertura en caja por medios mecánicos en terreno tipo II-A, incluye acamellonamiento del material.	M3	558.0000	$82.27	(* OCHENTA Y DOS PESOS 27/100 M.N. *)	$45,906.66
31-0454	Afine y compactación de sub rasante al 90 % PROCTOR mínimo, por medios mecánicos.	M2	1,471.3500	$40.15	(* CUARENTA PESOS 15/100 M.N. *)	$59,074.70

ADMINISTRADOR UNICO: ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ

Acumulado anterior:	**$202,541.38**
Monto esta hoja:	**$207,080.17**
Acumulado:	**$409,621.55**

0001691

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 12

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Fecha: 03/08/2023
Duración: 90 días naturales
Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
31-0457	Formación de base de 30 cms. de espesor con material producto de banco con equipo mecánico incluye vertido, afine, compactado al 95 % PROCTOR y agua.	M3	442.6200	$519.14	(* QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 14/100 M.N. *)	$229,781.75
32-0466	Afine y compactación en banquetas, andadores y plazas a mano incluye acarreos a primera estación.	M2	556.6400	$39.85	(* TREINTA Y NUEVE PESOS 85/100 M.N. *)	$22,182.10
A2	**TOTAL Terracerías**					**$356,945.21**
A3	**Instalación Hidráulica.**					
4-0080	Excavación a mano en material tipo II-A, en seco y barreta de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad, depositando el producto de excavación a orilla de cepa, cualquier zona..	M3	16.0000	$200.62	(* DOSCIENTOS PESOS 62/100 M.N. *)	$3,209.92
9-0139	Relleno de material producto de excavación compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor, incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.	M3	15.8000	$83.66	(* OCHENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N. *)	$1,321.83
5-0102	Cama de arena para instalación de tubería incluye: acostillado, acarreo de material en 1ra. estación, material y mano de obra.	M3	2.0000	$475.56	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 56/100 M.N. *)	$951.12

ADMINISTRADOR UNICO: ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ

Acumulado anterior:	**$409,621.55**
Monto esta hoja:	**$257,446.72**
Acumulado:	**$667,068.27**

0001162

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO
AE - 12

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Fecha: 03/08/2023
Duración: 90 días naturales
Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
27-0412	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 3" CED. RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	50.0000	$449.24	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N. *)	$22,462.00
TOMDOM*	Toma domiciliaria de agua potable con tubo de CPVC de 13 mm. de 6 mts. de longitud, incluye: excavación, relleno, válvula de inserción, abrazadera de 4", acarreo de materiales, mano de obra y herramienta.	PZA	3.0000	$1,760.31	(* UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 31/100 M.N. *)	$5,280.93
314-IHS-07-087	Válvula de esfera de CPVC 13 mm, incluye: suministro de materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	3.0000	$242.93	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N. *)	$728.79
BOTA01	Caja para llave de banqueta (bota) incluye llave de cuadro roscable 1/2", herramienta menor, mano de obra, materiales y equipo.	PZA	3.0000	$1,388.40	(* UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N. *)	$4,165.20
A3	**TOTAL Instalación Hidráulica.**					**$38,119.79**
A4	**Instalación sanitaria.**					
EXC-001	Excavación por medios mecánicos en cepas de 0.00 A 2.00 mts de profundidad en material tipo II incluye afine de talud y fondo, acarreos a primera estación de 20 mts.	M3	47.2600	$74.30	(* SETENTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N. *)	$3,511.42

ADMINISTRADOR UNICO: ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ

Acumulado anterior:	**$667,068.27**
Monto esta hoja:	**$36,148.34**
Acumulado:	**$703,216.61**

000163

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 12

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Fecha: 03/08/2023
Duración: 90 días naturales
Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
9-0139	Relleno de material producto de excavación compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor, incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.	M3	31.7900	$83.66	(* OCHENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N. *)	$2,659.55
9-0138	Relleno de material inerte de banco compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.	M3	13.6200	$498.99	(* CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N. *)	$6,796.24
5-0102	Cama de arena para instalación de tubería incluye: acostillado, acarreo de material en 1ra. estación, material y mano de obra.	M3	3.3700	$475.56	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 56/100 M.N. *)	$1,602.64
28-0417	Pozo de visita de forma cónica de 0.60 a 1.20 mts. de diámetro interior por 1.50 mts. de altura a base de mamposteria, muro de tabique de 25 cms. con aplanado de mortero cemento arena 1:3 acabado pulido, incluye excavación, acarreo y relleno.	PZA	2.0000	$13,271.34	(* TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 34/100 M.N. *)	$26,542.68
37-0579BP	Suministro y colocación de brocal y tapa de Polietileno alta resistencia abierto o cerrado para pozo de visita de 60 cm de diámetro, incluye material y mano de obra.	PZA	2.0000	$4,210.10	(* CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 10/100 M.N. *)	$8,420.20

ADMINISTRADOR UNICO: ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ

Acumulado anterior:	**$703,216.61**
Monto esta hoja:	**$46,021.31**
Acumulado:	**$749,237.92**

0001164

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 12

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Fecha: 03/08/2023
Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
26-0390*	Registro sanitario de 0.40x0.60x0.60 mts., a base de tabicón10x14x28, asentado con mortero cemento arena 1:3, aplanado interior acabado fino con mortero cemento arena 1:3, piso de 10 cm, de concreto simple F'c= 150 Kg/cm2, tapa de concreto F'c=250 Kg/cm2, armado con varilla del No. 3 @ 20 cm. en ambos sentidos, de 15 cm. de espesor incluye trazo, nivelación, barrenado y demolición de roca, acarreo y m.o.	PZA	2.0000	$2,482.13	(* DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 13/100 M.N. *)	$4,964.26
TUBO 8"	Suministro e instalación de tubo PVC sanitario de 8" de diametro incluye acarreos, materiales secundarios, conexiones y mano de obra.	M	42.8000	$773.19	(* SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 19/100 M.N. *)	$33,092.53
SUM-COD2	Suministro y colocación de codo PVC sanitario de 6"X45*, incluye carga y descarga en almacén de obra.	PZA	2.0000	$356.10	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N. *)	$712.20
PU-6255	Suministro y colocación de unión de servicio de P.V.C. De 150 mm (6") de diámetro para alcantarillado sanitario incluye carga y descarga en almacén de obra.	PZA	2.0000	$624.14	(* SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 14/100 M.N. *)	$1,248.28
PU-6239	Suministro de tubo de PVC sanitario de norma liso de 150 mm de diámetro, incluye flete, carga y descarga en almacén de obra.	ML	18.0000	$483.03	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 03/100 M.N. *)	$8,694.54
A4	**TOTAL Instalación sanitaria.**					**$98,244.54**
A5	**Albañileria**					

ADMINISTRADOR UNICO: ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ

Acumulado anterior:	**$749,237.92**
Monto esta hoja:	**$48,711.81**
Acumulado:	**$797,949.73**

000165

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 12

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Fecha: 03/08/2023
Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
18-0296	Muro de piedra braza de la región, asentada con mortero cemento arena 1:5, acabado común incluye: acarreo de materiales en 1ra. erstación de 20 mts.	M3	276.5200	$2,755.36	(* DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N. *)	$761,912.15
18-0313	Dren para muro de mampostería a base de P.V.C. 4" tipo rígido incluye material y mano de obra.	ML	26.0000	$130.32	(* CIENTO TREINTA PESOS 32/100 M.N. *)	$3,388.32
18-0318	FILTRO DE GRAVA Y/O RAJUELA DE PIEDRA DE 30 CMS DE ESPESOR INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA	M3	53.7000	$1,019.51	(* UN MIL DIECINUEVE PESOS 51/100 M.N. *)	$54,747.69
11-0151*	Anclaje de castillo de 20 x 15 cms. 4 var. # 4 y estribos del # 2 a.c. 20 cms. Hasta una profundidad de 50 cms., concreto f'c = 200 kg/cm2 incluye material y mano de obra.	PZA	13.0000	$441.46	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 46/100 M.N. *)	$5,738.98
11-0160*	Cadena de desplante de concreto f'c=250 Kg/cm2, de 15x20 cm, armado con 6 varillas No.4 y estribos No. 2 a cada 25 cm, incluye cimbra común, acarreo de material 1ra. estación.	M	31.5300	$882.93	(* OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N. *)	$27,838.78
11-0221	Losa de concreto f´c= 250 kg/cm2 de 10 cms de espesor armada con var. No. 4 a cada 15 cm. En ambos sentidos, para paso peatonal, según planos estructurales incluye cimbrado, armado, colado y descimbrado, material y mano de obra.	M2	26.8000	$2,869.37	(* DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 37/100 M.N. *)	$76,899.12

ADMINISTRADOR UNICO: ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ

Acumulado anterior:	**$797,949.73**
Monto esta hoja:	**$930,525.04**
Acumulado:	**$1,728,474.77**

000166
937

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 12

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Fecha: 03/08/2023
Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
F-BARANDAL1	Suministro y colocación de barandal de tubo de acero negro de 1 1/2" con división de tubo de 1" con postes de 1 1/2" a cada metro soldado a placa de 1/2" de 15x15 cms. embutida en losa, incluye materiales, mano de obra, pintura, equipo y herramienta.	M	39.7800	$2,373.49	(* DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N. *)	$94,417.43
A5	**TOTAL Albañileria**					**$1,024,942.47**
A6	**Instalaciones eléctricas y luminarias.**					
REG-AUX	Registro auxiliar para alumbrado público de 50x60x65mts., de tabique rojo recocido 7x14x28 cms., con 14 cms. de espesor asentado y aplanado con mortero cemento arena 1:5 incluye: plantilla de concreto de 10 cms de espesor f'c=100kg/cm2, marco y contramarco de ángulo de 1 1/2"x3/16" concreto f'c=200kg/cm2 en tapa y fijación de marco, drén de grava de 20 cms de espesor, herramienta menor, materiales y mano de obra.	PZA	8.0000	$3,554.46	(* TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 46/100 M.N. *)	$28,435.68
TUB-PESA50	Suministro y tendido de tubo conduit pvc pesado 50 mm de diámetro incluye conexión, trazo, excavación, relleno, cama de arena, herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra.	M	200.0000	$201.24	(* DOSCIENTOS UN PESOS 24/100 M.N. *)	$40,248.00
A6	**TOTAL Instalaciones eléctricas y luminarias.**					**$68,683.68**
A7	**Pavimentación.**					

ADMINISTRADOR UNICO: ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ

Acumulado anterior:	**$1,728,474.77**
Monto esta hoja:	**$163,101.11**
Acumulado:	**$1,891,575.88**

0001647

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 12

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Fecha: 03/08/2023
Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
4-0080	Excavación a mano en material tipo II-A, en seco y barreta de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad, depositando el producto de excavación a orilla de cepa, cualquier zona..	M3	64.3500	$200.62	(* DOSCIENTOS PESOS 62/100 M.N. *)	$12,909.90
9-0138	Relleno de material inerte de banco compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.	M3	38.5500	$498.99	(* CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N. *)	$19,236.06
32-0471	Guarnición de concreto simple de f'c= 200 kg/cm2 de 20x15x40 cm. de sección T.M.A. 3/4" Incluye cimbrado, descimbrado, materiales y mano de obra.	ML	424.3500	$530.82	(* QUINIENTOS TREINTA PESOS 82/100 M.N. *)	$225,253.47
32-0475A	Pavimento premezclado F'c= 300 Kg/cm2, T.A.M. 3/4" de 20 cm. de espesor resistencia normal, acabado a regla incluye junta constructiva con chaflan de 1/2", en cada junta fria (al termino del colado) se procederá a colocar 8 conectores con varilla de 1/2" a cada 60 cms. 30-30 cms., fibra microsintetica, curado con curacreto, vibrado, acarreos de materiales a 1ra. estación.	M2	1,471.3500	$976.95	(* NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N. *)	$1,437,435.38
SUMPOL	Suministro y colocación de hule negro calibre 600 para evitar deshidratación del concreto, incluye materiales, herramienta y mano de obra.	M2	1,471.3500	$57.02	(* CINCUENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N. *)	$83,896.38

ADMINISTRADOR UNICO: ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ

Acumulado anterior:	**$1,891,575.88**
Monto esta hoja:	**$1,778,731.19**
Acumulado:	**$3,670,307.07**

000168

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO
AE - 12

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Fecha: 03/08/2023
Duración: 90 días naturales
Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CORTE01	Corte de juntas en piso de concreto con cortadora manual de disco diamantado, incluye limpieza de la junta.	ML	522.0000	$36.40	(* TREINTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N. *)	$19,000.80
32-0484	Calafateo en losas y guarniciones a base de asfalto oxidado incluye material, desperdicios, acarreos a primera estación y mano de obra.	ML	522.0000	$28.53	(* VEINTIOCHO PESOS 53/100 M.N. *)	$14,892.66
22-0333*	Pintura esmalte amarillo trafico en guarniciones con desarrollo de 30.0 cm., incluye material mano de obra y acarreos a primera estación.	ML	424.3500	$91.64	(* NOVENTA Y UN PESOS 64/100 M.N. *)	$38,887.43
32-0468	Banqueta de concreto hidráulico hecho en obra de f'c=150 kg/cm2 de 10 cms de espesor, T.M.A. 3/4", incluye curado, cimbrado, descimbrado, material y mano de obra.	M2	556.6400	$538.78	(* QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 78/100 M.N. *)	$299,906.50
A7	**TOTAL Pavimentación.**					**$2,151,418.58**
A8	**Acarreos y limpiezas.**					
CARGA	Carga mecánica con uso de retroexcavadora y acarreo en camión de volteo (6M3) de material producto de excavación y/o demolición a tiro libre.	M3	979.6400	$229.33	(* DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 33/100 M.N. *)	$224,660.84
33-0528	Limpieza ultima general de obra para entrega con acopio y acarreo horizontal a 20 mts.	M2	2,692.8100	$15.99	(* QUINCE PESOS 99/100 M.N. *)	$43,058.03

ADMINISTRADOR UNICO: ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ

Acumulado anterior:	**$3,670,307.07**
Monto esta hoja:	**$640,406.26**
Acumulado:	**$4,310,713.33**

000139

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 12

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Fecha: 03/08/2023
Duración: 90 días naturales
Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A8	TOTAL Acarreos y limpiezas.					$267,718.87
A	TOTAL Rehabilitación de calle Felipe II, Tramo Farallón Av. Universidad, Fracc. Magallanes.					$4,310,713.33

047000

ADMINISTRADOR UNICO: ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ

Acumulado anterior:	$4,310,713.33
Monto esta hoja:	
Acumulado:	$4,310,713.33

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 12

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Fecha: 03/08/2023
Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: **$4,310,713.33**
IVA 16.00% **$689,714.13**
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: **$5,000,427.46**
(* CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 46/100 M.N. *)

0001171

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO
AE - 12

Concurso No: 41066004-016-2023 **Fecha:** 03/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 14/08/2023
Fin obra: 11/11/2023
Cod. Obra: CALLE FELIPE II

Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Partida	Concepto	Importe
A	**REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.**	
A1	Preliminares.	$304,640.19
(* TRESCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 19/100 M.N. *)		
A2	Terracerías	$356,945.21
(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 21/100 M.N. *)		
A3	Instalación Hidráulica.	$38,119.79
(* TREINTA Y OCHO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 79/100 M.N. *)		
A4	Instalación sanitaria.	$98,244.54
(* NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 54/100 M.N. *)		
A5	Albañileria	$1,024,942.47
(* UN MILLON VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N. *)		
A6	Instalaciones eléctricas y luminarias.	$68,683.68
(* SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 68/100 M.N. *)		
A7	Pavimentación.	$2,151,418.58
(* DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 58/100 M.N. *)		
A8	Acarreos y limpiezas.	$267,718.87
(* DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 87/100 M.N. *)		
A	**TOTAL Pavimentación integral de calle Felipe II, Fraccionamiento Farallón del Obispo**	**$4,310,713.33**

Total del presupuesto mostrado sin IVA: **$4,310,713.33**
IVA 16.00% **$689,714.13**
Total del presupuesto mostrado: **$5,000,427.46**
(* CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 46/100 M.N. *)

ADMINISTRADOR UNICO: ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ


SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL (FONDO 3) 2023

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION-1

OBRA-. REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES
REGION: 07 ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

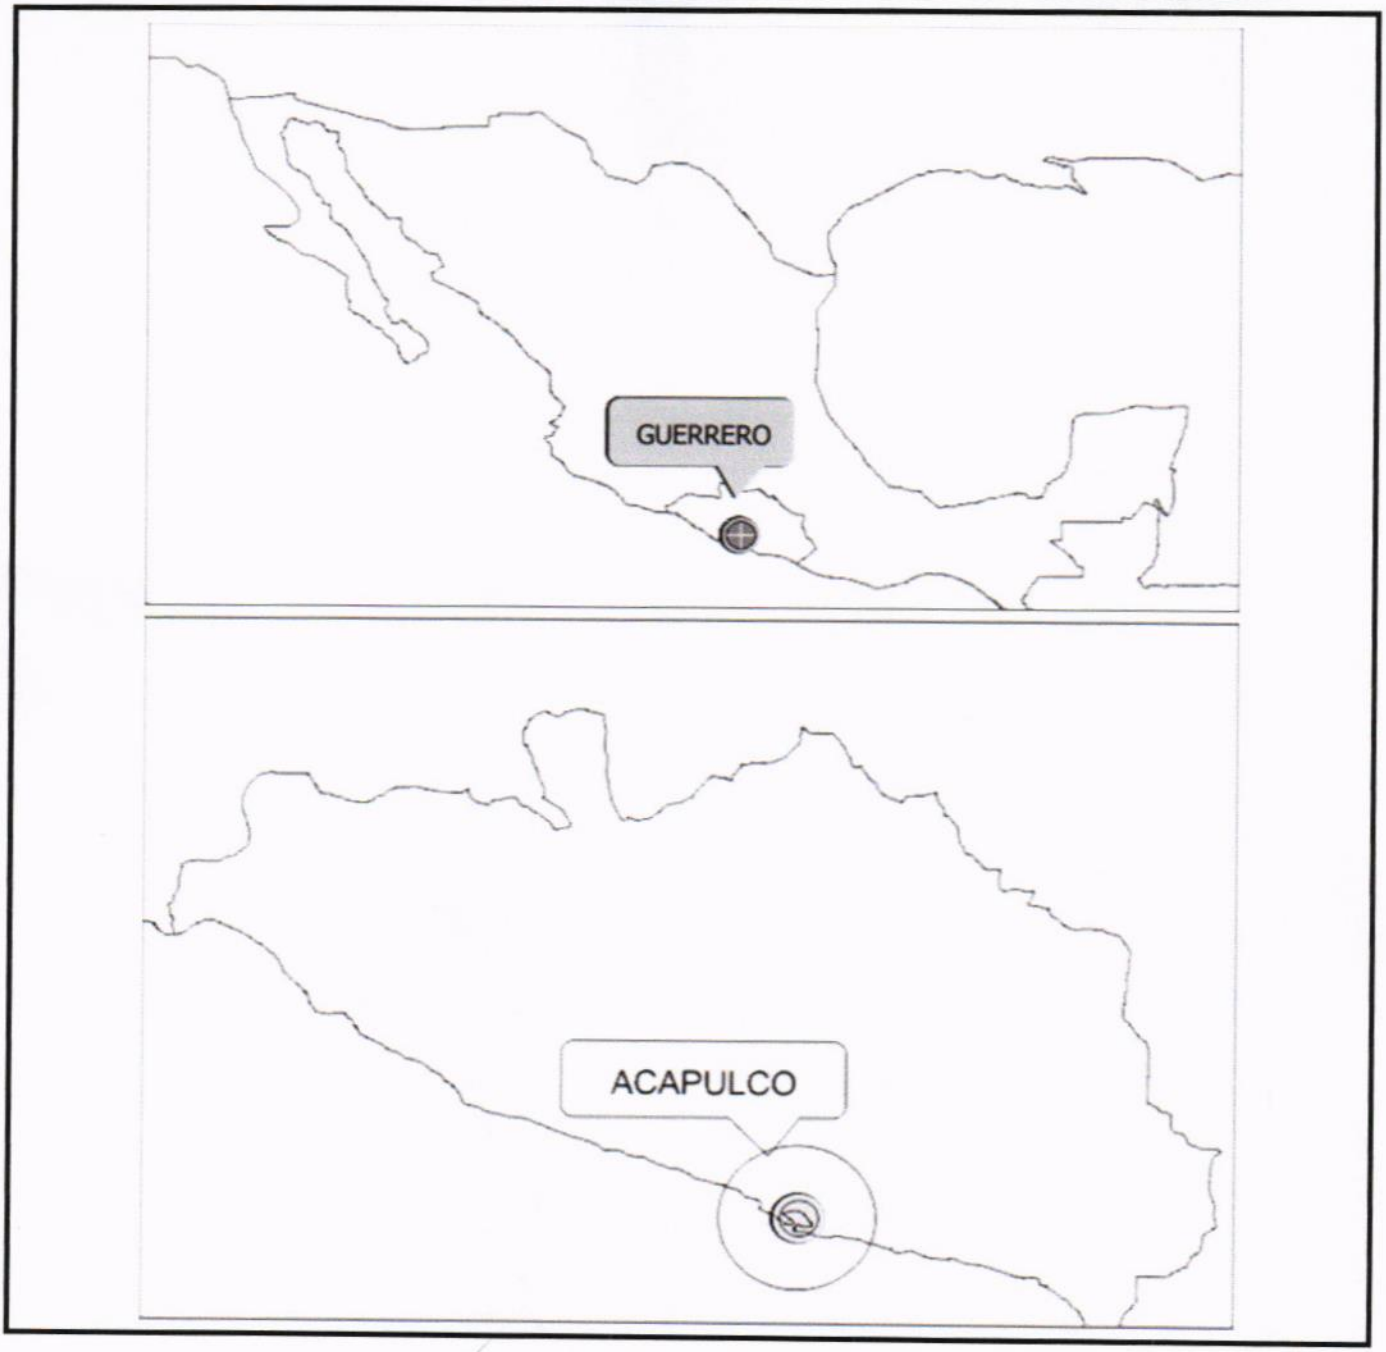

LATITUD: 16° 51' 52.658" N
LONGITUD 99° 52' 17.197" O

REPRESENTANTE LEGAL:
ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL (FONDO 3) 2023

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION-2


OBRA-. REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES

REGION: 07 ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 ACAPULCO DE JUAREZ

LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

MUNICIPAL:

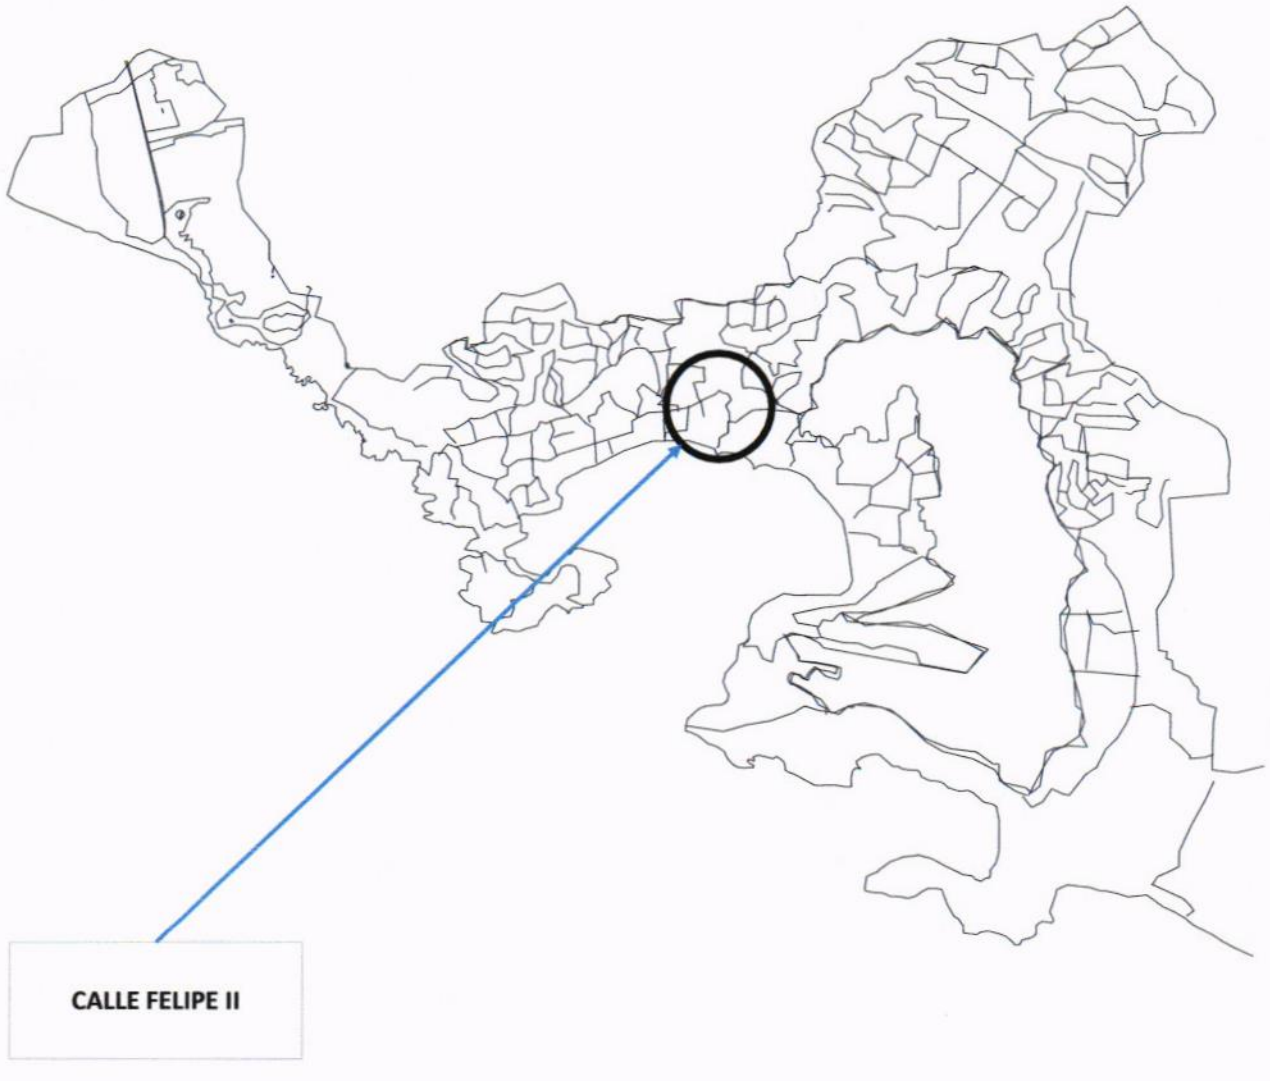

LATITUD: 16° 51' 52.658" N

LONGITUD 99° 52' 17.197" O

REPRESENTANTE LEGAL:

ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ


SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL (FONDO 3) 2023

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION-3

OBRA-. REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES
REGION: 07 ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

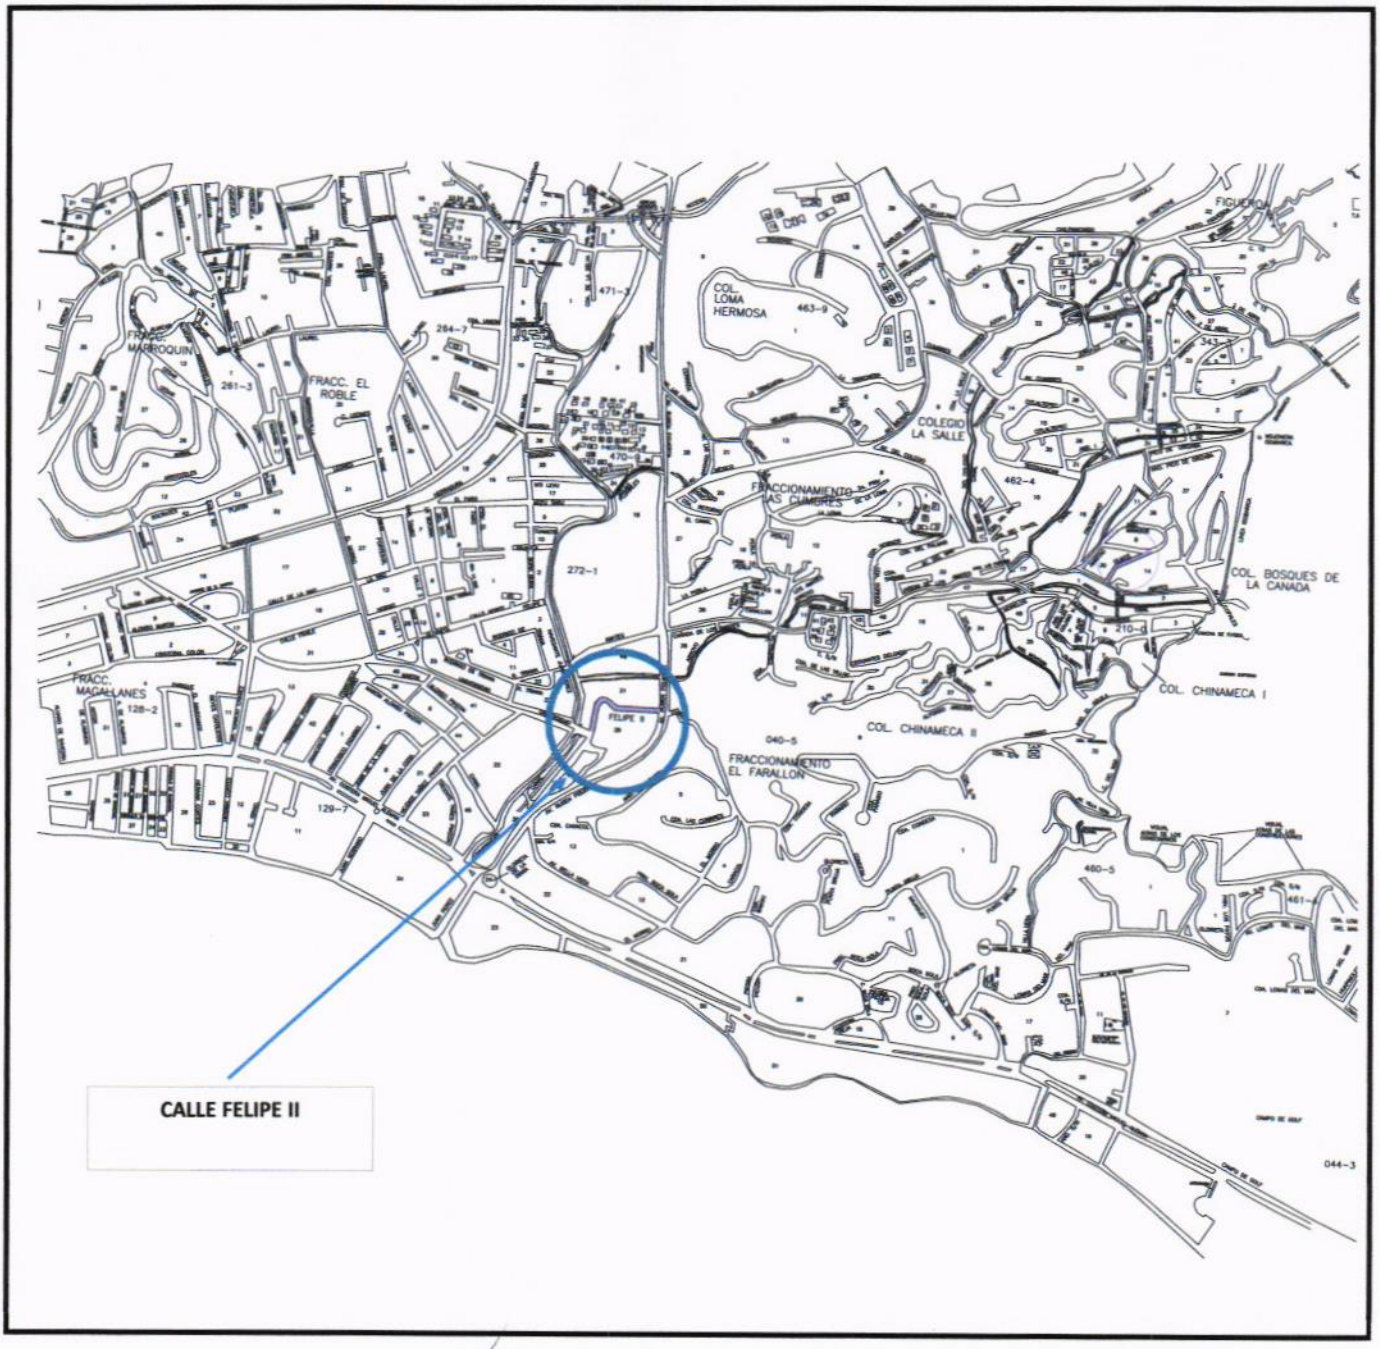

LATITUD: 16° 51' 52.658" N
LONGITUD 99° 52' 17.197" O

REPRESENTANTE LEGAL:
ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ


SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL (FONDO 3) 2023

CROQUIS DE MICROLOCALIZACION-4

OBRA-. REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES
REGION: 07 ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

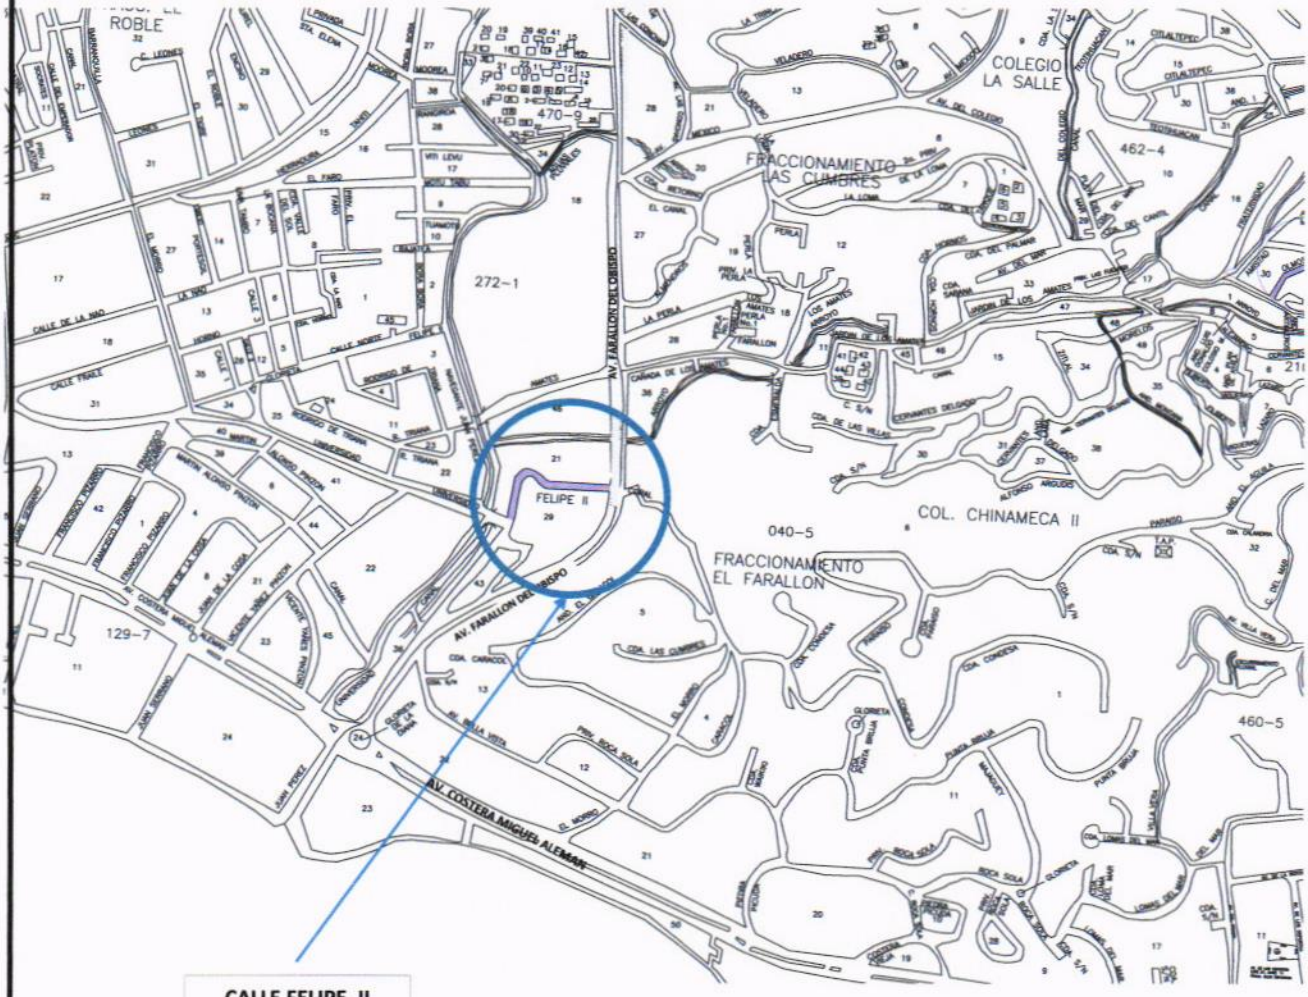

LATITUD: 16° 51' 52.658" N
LONGITUD 99° 52' 17.197" O

REPRESENTANTE LEGAL:
ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL (FONDO 3) 2023


CROQUIS DE MICROLOCALIZACION-5

OBRA-. REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES

REGION: 07 ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 ACAPULCO DE JUAREZ

LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

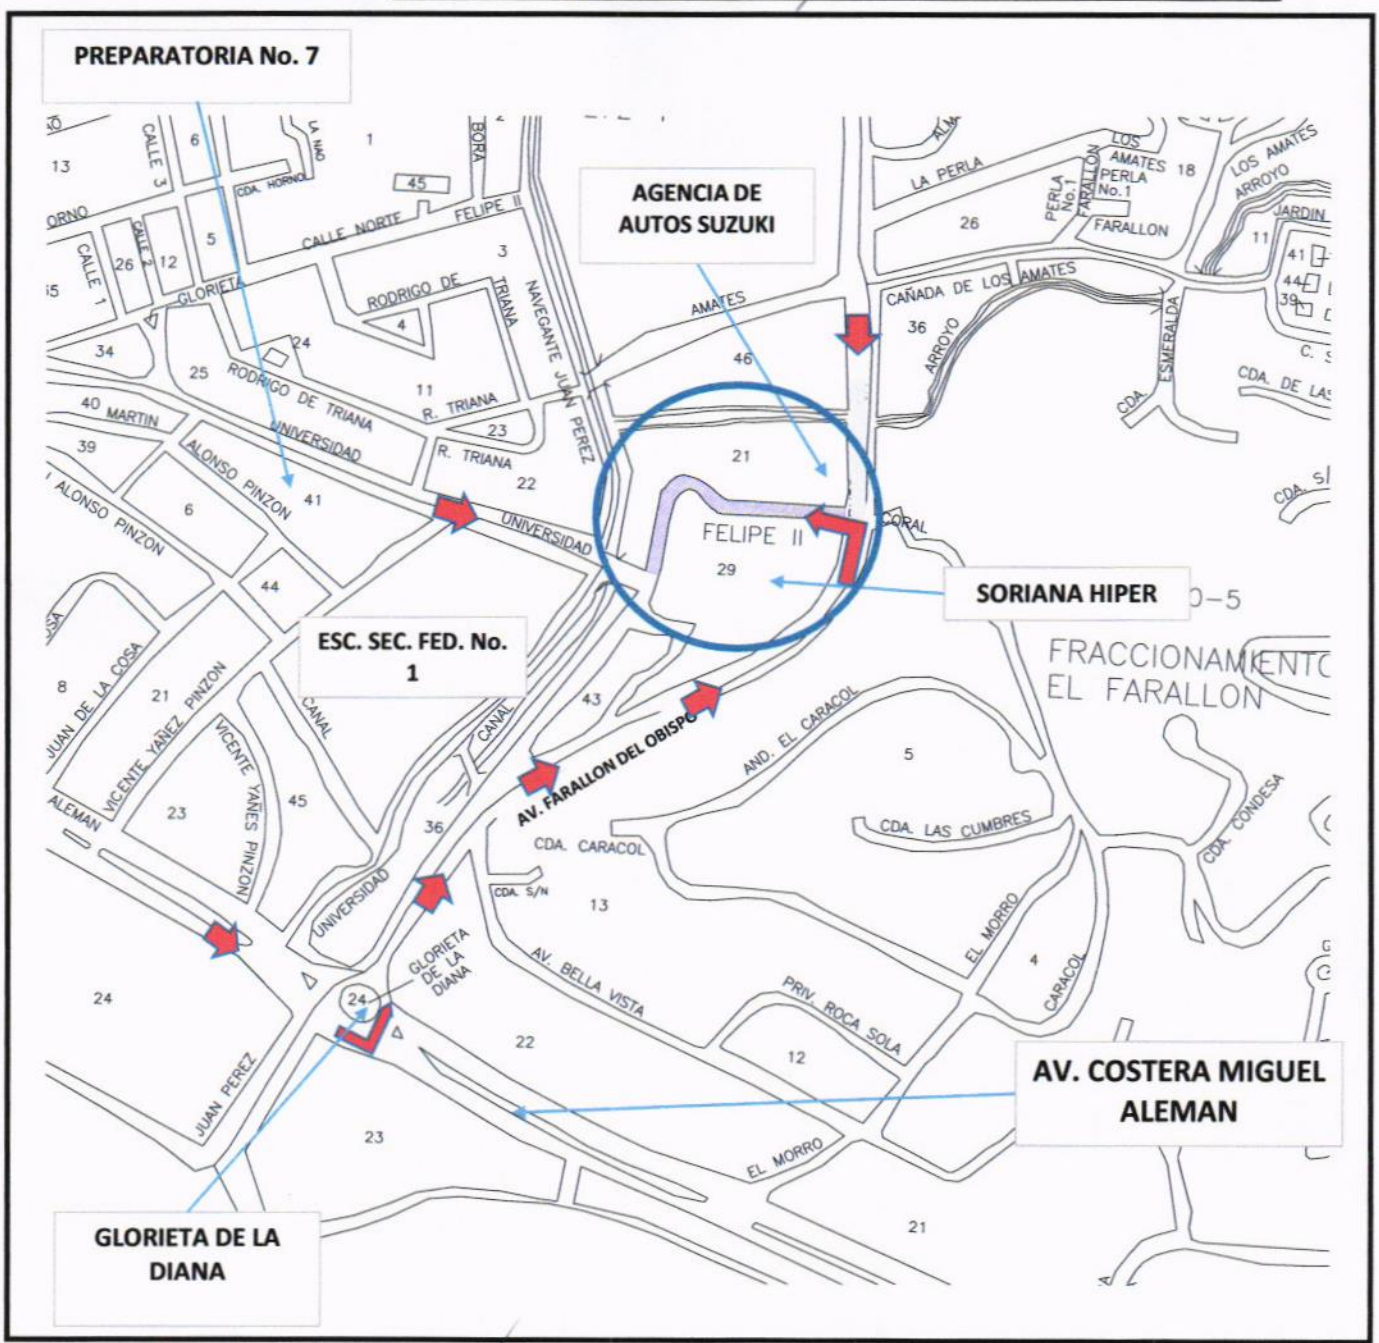

LATITUD: 16° 51' 52.658" N

LONGITUD 99° 52' 17.197" O

REPRESENTANTE LEGAL:
ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ

gob mx

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
23NC7391675	ICO091216UUA

Nombre, Denominación o Razón social

IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 21 de agosto de 2023, a las 22:15 horas

Notas

1.-Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.28. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023.

2.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

3.-La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

4.-Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

Cadena Original

||ICO091216UUA|23NC7391675|21-08-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital

jvLpa5MMepwrV1rfWOwccqXPgd6dWQRCmTb20xh43AsqxIF7nJmk0qVKTrv5lqnGyr1kl18oPYYzHJuLvLw9rnC91
Su/moFQmpeXt+Qc4YS5Wm0m26CTIPkhjzxUgnZ6SdcKNAFcLmNCfmlHtG57FPSOgTKhNZTUXZ/AmpyViMNWVSpdkj
pDmMdP2aNRqFChrzM91fpuSpZKoVE1yVvcvvY5p3pkw7limUA8MFsvzAOPZ/hO7SghmWwmR16zJSYNazjk8gYoAqh
FQW1jxzTnTUtb1MvdivliLgePGfudi7wPHZh4b4ivCvF1cml7n3fgEY7NLR4Ov5V+FYeH4tw==

GOBIERNO DE MÉXICO | HACIENDA | SAT

Contacto:
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México. Atención telefónica 01 55 627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá 01 877 44 88 728.

Notas

5.-La opinión que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública

6.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Cadena Original

||ICO091216UUA|23NC7391675|21-08-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital

jvLpa5MMepwrV1rfWOwccqXPgd6dWQRCmTb20xh43AsqxIF7nJmk0qVKTrv5lqnGyr1kl18oPYYzHJuLvLw9rnC91
Su/moFQmpeXt+Qc4YS5Wm0m26CTIPkhjzxUgnZ6SdcKNAFcLmNCfmlHtG57FPSOgTKhNZTUXZ/AmpyViMNWVSpdkj
pDmMdP2aNRqFChrzM91fpuSpZKoVE1yVvcvvY5p3pkw7limUA8MFsvzAOPZ/hO7SghmWwmR16zJSYNazjk8gYoAqh
FQW1jxzTnTUtb1MvdivliLgePGfudi7wPHZh4b4ivCvF1cml7n3fgEY7NLR4Ov5V+FYeH4tw==

ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO., A 15 DE AGOSTO DE 2023

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E

OFICIO DE ASIGNACIÓN DEL SUPERINTENDENTE

En relación con el **Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número: MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**, que comprende la Obra: **" REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES"** ubicada en: **ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO,** Municipio de ACAPULCO DE JUAREZ, Gro. por un monto de $ 5,000,427.46 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 46/100 m.n.) I.V.A incluido, celebrado entre esa Secretaría y la Empresa que legalmente represento, el 15 de agosto del 2023; en particular al Artículo 24, Fracción III del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que se aplica de manera supletoria al de la "Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas.

Por este conducto le comunico que el **Superintendente de Construcción** por parte de esta empresa será el ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO con los siguientes datos:

1.- NOMBRE COMPLETO:	VICENTE ALARCON SEVERIANO
2.- RFC CON HOMOCLAVE:	AASV-6812211Z7
3.-CORREO ELECTRONICO:	viasev@hotmail.com
4.-DIRECCION CON CODIGO POSTAL:	AV. REFORMA NUM. 2060 COL. MORELOS C.P. 39530 CD. ACAPULCO DE JUAREZ
5.-No. DE CEDULA PROFESIONAL:	2220846
6.-TEL. CEL.:	7442 354717

Lo anterior lo informo a usted a efecto de que se me sirva dar el inicio correspondiente de la obra; así mismo para cumplir con la utilización de "Bitácora de la obra "


A T E N T A M E N T E

C. ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01
CEL. 744 4490912 / 744 2354717 E-MAIL: imexa@telmexmail.com, gno_0301@hotmail.com


MÉXICO
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
ALARCON
SEVERIANO
VICENTE
SEXO H
DOMICILIO
AV REFORMA 2060
COL MORELOS 39530
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
CLAVE DE ELECTOR ALSVVC68122112H400
CURP
AASV681221HGRLVC00
AÑO DE REGISTRO
1991 04
FECHA DE NACIMIENTO
21/12/1968
SECCIÓN
0026
VIGENCIA
2023 - 2033


INE
IDMEX2414903999<<0026047494258
6812218H3312315MEX<04<<00374<3
ALARCON<SEVERIANO<<VICENTE<<<<

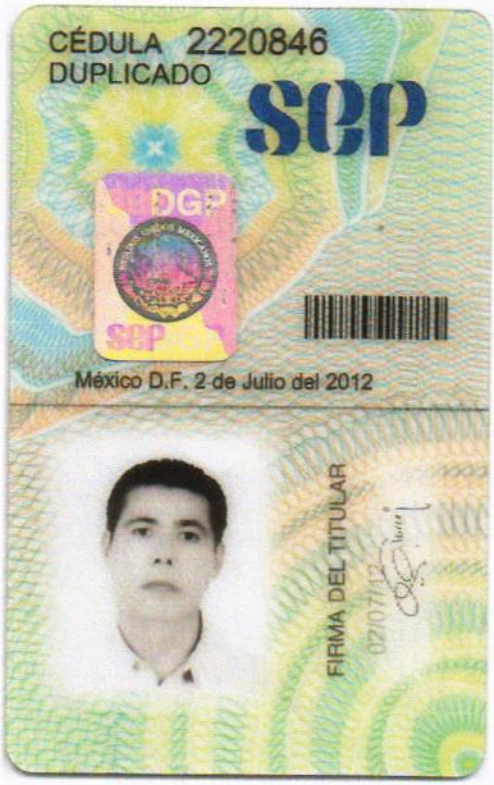
CÉDULA 2220846
DUPLICADO
SEP
DGP
SEP
México D.F. 2 de Julio del 2012
FIRMA DEL TITULAR
02/07/12


SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES
CÉDULA 2220846
EN VIRTUD DE QUE
VICENTE
ALARCÓN
SEVERIANO
CURP: AASV681221HGRLVC00
CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL Y SU REGLAMENTO SE LE EXPIDE
EN EDUCACIÓN DE TIPO SUPERIOR LA
CÉDULA
PERSONAL CON EFECTOS DE PATENTE PARA EJERCER PROFESIONALMENTE EN EL NIVEL DE
LICENCIATURA EN
ARQUITECTURA
VÍCTOR EVERARDO BELTRÁN CORONA
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
RAMO: ADMINISTRATIVO
OFICIO No. DOP/1633/2023
ASUNTO: **Asignación de Residente**

Acapulco, Gro., a 15 de Agosto del 2023

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
IRINA SALGADO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
P R E S E N T E.

Por este medio informo a usted que el Residente asignado a la obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ubicada en ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, con número de contrato MAJ-FAISMUN/426-2023/LP, estará a cargo del ING. / ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ, así mismo le solicito, por medio de oficio, el nombre del **Representante Técnico (con su no. de cédula) y del Superintendente de construcción.**

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, quedando de usted para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E

M.I. VLADIMIR HERNÁNDEZ ALEMÁN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES
JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA URBANA Y SUBURBANA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2021-2024

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

C.C.P. - ARCHIVO
CARR/epm.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

2023 AÑO DE Francisco VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

Sección: Despacho de Secretaría
Oficio: **DCL/027/2023**
Asunto: **Invitación.**

Acapulco de Juárez, Gro., 27 de julio del 2023.

LIC. LUIS ALBERTO APOLONIO TAPIA
JEFE DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.

Hago referencia a la Licitación pública (estatal)

Nº	ACCIÓN / OBRA	LICITACION PUBLICA (ESTATAL)
1	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	**41066004-016-2023**

Al respecto solicito a usted, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que comisione personal a su cargo para participar en la **presentación y apertura de proposiciones el día 03 del Agosto a las 12:00 hrs**. Anexo en forma digital (CD) información general de las fechas, horas de los eventos y contenido de las bases concursales.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

ARQ. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES.

H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez 2021-2024
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
RECIBIDO
27 JUL 2023
ASESORÍA JURÍDICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
Hora 13:55 hrs

C.c.p.- Archivo / Minutario.
JACZ

ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO., 25 DE JULIO DEL 2023.

ACTA DE VISITA

Nº	ACCIÓN / OBRA	LICITACION PUBLICA (ESTATAL)
1	Rehabilitación de Calle Felipe II, Tramo Farallón Av. Universidad, Fracc. Magallanes, Acapulco De Juárez, Guerrero.	41066004-016-2023

Nº	NOMBRE DE LA EMPRESA	REPRESENTANTE	FIRMA	HORA
1	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE C.V.	VICENTE ALARCON SEVERIANO		9:35
2	SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRAS A Y A S.A DE C.V.	LUIS ANTONIO AGUICERA BARRIENTOS		9:37
3	ALEXANDER CASTILLO LOPEZ	ARQ. BENJAMIN SOLIS HERRERA		9:40

ARQ. OPIEL SALMERON J.
RESIDENTE

REGISTRO DE EMPRESAS JUNTA DE ACLARACIONES

Nº	ACCIÓN / OBRA	LICITACION PUBLICA (ESTATAL)
1	REHABILITACIÓN DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.	41066004-016-2023

No.	Nombre	Fecha y hora
1	Desarrollos Toan SA de CV Arq. Juan David Salmeron Gavilan	10.03 AM 26/07/2023
2	ALEXANDER CASTILLO LOPEZ	10:05 26/07/2023
3	IMEXA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. VICENTE DUEÑAS SEVERIANO.	10:11 26/07/23
4	LUIS ANTONIO AGUILERA BARRIENTOS | Supervision y Construccion de Obras A y A	10:17 26/07/23

REGISTRO DE FUNCIONARIOS JUNTA DE ACLARACIONES

Nº	ACCIÓN / OBRA	LICITACION PUBLICA (ESTATAL)
1	REHABILITACIÓN DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.	41066004-016-2023

No.	Nombre	Fecha y hora
1	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	26/07/23 10:00 A.M.
2	JOSE ANTONIO CABRERA ZAMORA	

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

MODALIDAD	LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL	
Nº	**ACCIÓN / OBRA**	**LICITACION PUBLICA ESTATAL**
1	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.	41066004-016-2023

LUGAR Y FECHA: **Acapulco de Juárez, Guerrero a 26 de julio del 2023.**

Acta que se formula, siendo las **10:00** horas en el lugar y fecha citados, correspondiente a la junta convocada por el H. Ayuntamiento de Acapulco, en relación con la invitación y obra cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en **las Bases de Licitación, cláusula Decima Octava, visita al sitio de los trabajos de la obra pública y junta(s) de aclaraciones**, con el objeto de que los licitantes soliciten aclaraciones o modificaciones a las bases, sus anexos y a las cláusulas del modelo de contrato, a las cuales dará respuesta por parte de la convocante, y así mismo, se determinen los datos relevantes de la visita al sitio de realización de los trabajos.

Se reunieron en la sala de juntas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Acapulco los licitantes o sus representantes legales, invitados y servidores públicos de la convocante, cuya asistencia se enlistan y firman al finalizar la junta, una vez de hacer las aclaraciones necesarias.

PREGUNTAS:

SIN PREGUNTAS

NOTAS ACLARATORIAS:

LA INTEGRACION DE SU PROPUESTA SE DEBERA APEGAR AL CATALOGO DE CONCEPTOS PROPORCIONADO.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA INCISO I) DICE:

LOS LICITANTES DEBERÁN ESTAR REGISTRADOS EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL ESTADO DE GUERRERO; DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS NÚMERO 31 Y 34 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266., DEBERÁN PRESENTAR LA CONSTANCIA DEL REGISTRO O REFRENDO ACTUALIZADA.

PARA EFECTOS DE ESTA LICITACION, POR MOTIVOS DE DESFASAMIENTO DE ENTREGAS DE REGISTRO O REFRENDOS ACTUALIZADOS DEL PADRON DE CONTRATISTAS DEL ESTADO DE GUERRERO, **SE ACEPTARÁ TAMBIEN EL PADRON ANTERIOR, MAS EL ACUSE DE QUE REALIZO EL TRAMITE EN TIEMPO Y FORMA PARA SU REGISTRO DEL PRESENTE AÑO Y EN SU CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACION OFICIO DE QUE ESTA EN TREMITE DICHO REGISTRO.**

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

MODALIDAD	LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL	
Nº	**ACCIÓN / OBRA**	**LICITACION PUBLICA ESTATAL**
1	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.	41066004-016-2023

LUGAR Y FECHA: **Acapulco de Juárez, Guerrero a 26 de julio del 2023.**

POR LOS LICITANTES, FUNCIONARIOS E INVITADOS REPRESENTANTES.

No.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIO, RAZÓN SOCIAL O ÁREA RESPONSABLE A LA QUE PERTENECE	FIRMAS
1	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ SUPERVISOR DE OBRA DEL AREA URBANA	
2	ARQ. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES	

No.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE Y RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA	FIRMAS
1	DESARROLLOS TOAN, S.A. DE C.V. ARQ. JUAN DAVID SALMERON GAVILAN	
2	C. ALEXANDER CASTILLO LOPEZ	
3	IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. C. VICENTE ALARCON SEVERIANO	
4	SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRAS A Y A, S.A. DE C.V. C.LUIS ANTONIO AGUILERA BARRIENTOS	

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2021-2024

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

REGISTRO DE EMPRESAS ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES TECNICA – ECONOMICA--

Nº	ACCIÓN / OBRA	LICITACION PUBLICA (ESTATAL)
1	REHABILITACIÓN DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.	41066004-016-2023

No.	Nombre	Fecha y hora
1	ALEXANDER CASTILLO LOPEZ	03-AGOSTO-2023
2	GRUPO CONSTRUCTOR FERNANDEZ ARGUELLO SA de CV. Manuel Reyes	03-Agosto/2023 11:47 hrs BETANCOURT
3	Desarrollos Toan SA DE C.V. C.P. JUAN DAVID SALMERON GAVILAN	03/agosto 20/23 11.52 AM
4	CARLOS SALINAS DE LA TORRE ARQ. CARLOS SALINAS DE LA TORRE	03/AGOSTO/2023 11:53 AM
5	LUIS ANTONIO AGUILERA B SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRAS A Y A SA de CV	03/AGOSTO/2023 11:54 AM.

REGISTRO DE EMPRESAS ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES TECNICA – ECONOMICA--

Nº	ACCIÓN / OBRA	LICITACION PUBLICA (ESTATAL)
1	REHABILITACIÓN DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.	41066004-016-2023

No.	Nombre	Fecha y hora
6	Imexa Constructores SA de C.V. Arq. Genoveva Morales Roman	03/Agosto/2023 11:55.

REGISTRO DE FUNCIONARIOS ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES TECNICA – ECONOMICA--

Nº	ACCIÓN / OBRA	LICITACION PUBLICA (ESTATAL)
1	REHABILITACIÓN DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.	41066004-016-2023

No.	Nombre	Fecha y hora
1	Jose Antonio Camilla Zamora	03/08/2023 12:00 PM
2	Felipe Chavez Ojeda	03/08/2023 12:00 PM.
3	Teodoro Hernández Otero	03/08/2023. 12:00 hrs.

REGISTRO DE EMPRESAS CON PAGO

41066004-016-2023

No.	Nombre de la empresa	Fecha de entrega de bases
1	MEGA CONSTRUCTORES SA DE CV	02:01 PM 20/07/23
2	SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRAS S.A. DE C.V	02:05 PM 20/07/23
3	ALEXANDER CASTILLO LOPEZ	09:33 AM 21/07/23 BENJAMIN SOLIS HERRERA
4	Desarrollos Toan, S.A. de C.V.	1:25 P.M. 25/07/23 ARQ JUAN DAVID SALMERON CHAVEZ
5	GRUPO CONSTRUCTOR FERNANDEZ ARGUELLO SA DE CV	09:51 AM 26/07/23 Sandi Rebeca Tejada Perez
6	CARLOS SALINAS DE LA TORRE	12:45 AM 26/07/2023 ING. ANGEL SALINAS BORJAS.
7	CABSON CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. MOISES CASTAÑEDA RODRIGUEZ	13:19 26/07/23 MOISES CASTAÑEDA RODRIGUEZ

Acapulco de Juárez, Gro. A 20 de Julio de 2023

C. Ing. Luz María Meraza Raadilla
Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
del Municipio de Acapulco.
P r e s e n t e

OFICIO DE INTERÉS

Como representante legal de **IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.** extiendo la presente para expresar el **INTERÉS** de participar en la **Licitación Pública No. 41066004-016-2023**, relativa a: **Rehabilitación de Calle Felipe II, Tramo Farallón Av. Universidad,** Fracc. Magallanes, Acapulco de Juárez, Gro.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente

Ing. Irina Salgado Hernández
Representante Legal

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01
CEL. 744 4490912 / 744 2354717 E-MAIL: imexa@telmexmail.com, gno_0301@hotmail.com



19 DE JULIO 2023
SUC. CUAUHTEMOC ACAPULCO 0241
PLAZA: ACAPULCO, GRO

DEPOSITO REFERENCIADO EFVO
65-50938655-2
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.
REF: IMEXACONSTRUCTORESSADECV4106600401 62023

MN

DOCUMENTOS.

BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE

TOTAL DE DOCUMENTOS: $ 0.00
EFECTIVO: $ 3,000.00
CARGO CUENTA:
TOTAL: $ 3,000.00

SEC. 9717232 FOLIO: 2418916
N409915 14:34:07 6PP6

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ.

ESTE COMPROBANTE ES DIGITAL, LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCIÓN TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA CAMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA

SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS A Y A SA DE CV

ACAPULCO DE JUAREZ, GRO., 20 DE JULIO DEL 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
P R E S E N T E

PARA MANIFESTAR POR MEDIO DE LA PRESENTE EL **INTERES** DE PARTICIPAR EN LA **LICITACION PUBLICA No. 41066004-016-2023**, RELATIVA A: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD**, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

02:05 PM
20/07/23

ATENTAMENTE
SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRAS A Y A, S.A. DE C.V.

ING. LUIS ANTONIO AGUILERA BARRIENTOS

Calle Pichilingue Lote 7-B 1 Int. 102-B Col. Cañada de los Amates C.P. 39690 Acapulco de Juárez, Guerreo, México:
correo: ocat.ing@gmail.com Tel. Cel. (744) 3497234



19 DE JULIO 2023
SUC. COAUHTEMOC ACAPULCO 0241 CAJA 03
PLAZA: ACAPULCO, GRO.

DEPOSITO REFERENCIADO EFVO
65-50938655-2
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.
REF: SUPERVISIONYCONSTRUCCIONDEOBRASAYASADECV

MN

DOCUMENTOS:

BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			$ 0.00
EFECTIVO:			$ 3,000.00
CARGO CUENTA:			
TOTAL:			$ 3,000.00

SEC. 9717239 FOLIO: 2418920
N409915 14.36.28 6PP6

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ.

ESTE COMPROBANTE ES DIGITAL, LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCIÓN TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA CAMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA

CONSTRUCCION, SUPERVISION Y PROYECTOS DE INGENIERIA EN GENERAL

ALEXANDER CASTILLO LOPEZ
R.F.C. CALA810406RM6 CURP. CALA810406HGRSPL07
Cerrada de Tepic #9 Col. Progreso
C.P. 39350 Acapulco de Juárez, Gro.
Telefono: (744) 216 37 39
www.cassloconstrucciones.com.mx

ACAPULCO, GRO. A 21 DE JULIO DEL 2023

M.I. VLADÌMIR HERNÀNDEZ ALEMÀN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE.

CARTA DE INTERES A PARTICIPAR A LA LICITACION

EN ATENCION A LA LICITACION PUBLICADA Nº. 41066004-016-2023 LE INFORMO QUE ES DE MI INTERES PARTICIPAR Y PRESENTAR DICHA PROPUESTA PARA LOS TRABAJOS DE: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO,** UBICADO EN LA: **FRACC. MAGALLES**, DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, LA CUAL ACEPTO RESPETANDO LOS REGLAMENTOS INTERNOS DE ESTA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO NO SIN ANTES MANIFESTARLE QUEDAR A SUS ORDENES PARA CUALQUIER ACLARACION.

ATENTAMENTE

ALEXANDER CASTILLO LOPEZ
ING. ALEXANDER CASTILLO LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

09:37 AM
21/07/23



19 DE JULIO 2023
SUC. CUAUHTEMOC ACAPULCO
PLAZA: ACAPULCO, GRO

DEPOSITO REFERENCIADO EFVO
65-50938655-2
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.
REF: ALEXANDERCASTILLOLOPEZ4106600401620 23

MN

DOCUMENTOS:

BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE

TOTAL DE DOCUMENTOS: $ 0.00
EFECTIVO: $ 3,000.00
CARGO CUENTA:
TOTAL: $ 3,000.00

SEC. 9717233 FOLIO: 2418918
N409915 14:34:47 6PP6

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ.

ESTE COMPROBANTE ES DIGITAL. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCIÓN TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA

DESARROLLOS TOAN S.A. DE C.V.
R.F.C. DTO131031QW7

ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO., A 25 DE JULIO DEL 2023
ASUNTO: **CARTA DE INTENCIÓN**

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E:

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE INFORMO DE MI INTENCIÓN DE PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PUBLICA N° **41066004-016-2023** PARA LA OBRA **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**, CON LA EMPRESA QUE LEGALMENTE REPRESENTO **DESARROLLOS TOAN S.A. DE C.V.**, LA CUAL TENGO EMPADRONADA EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO.

SIN MAS POR EL MOMENTO LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO.

Recibi
25/07/23
1:25 P.M

ATENTAMENTE

LUIS MIGUEL MIRANDA PANTOJA
REPRESENTANTE LEGAL
DESARROLLOS TOAN S.A. DE C.V.

Calle Niños Heroes No. Ext. 53 No. Int. 2-B Colonia Progreso Ampliación, C.P. 39358 Acapulco de Juárez Guerrero
Correo Electrónico: toan_desa@live.com.mx

RECIBIMOS
POR CONDUCTO DE
CAJE DE COMP. LOCAL
14
25 JUL 2023
SANTANDER (MÉXICO). 0242 CAJA 03

25 DE JULIO 2023
SUC. MERCADO 0242
PLAZA: ACAPULCO, GRO.

DEPOSITO REFERENCIADO EFEVO
65-50938655-2
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
REF: DESARROLLOSTOANO162023

MN

DOCUMENTOS:

BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE

TOTAL DE DOCUMENTOS:	$ 0.00
EFECTIVO:	$ 3,000.00
CARGO CUENTA:	
TOTAL:	$ 3,000.00

SEC. 8567606 FOLIO: 2421603
N979100 12:07:34 6QP6

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ.

ESTE COMPROBANTE ES DIGITAL, LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR, CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCIÓN TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA CAMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA.

(4)

Recibí

25/07/23
1:25 p.m.

GRUPO CONSTRUCTOR FERNANDEZ ARGUELLO SA DE CV

ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO., A 25 DE JULIO DEL 2023
ASUNTO: **CARTA DE INTENCIÓN**

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y
OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E:

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE INFORMO DE MI INTENCIÓN DE PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PUBLICA N° **41066004-016-2023** PARA LA OBRA DENOMINADA **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**, CON LA EMPRESA QUE LEGALMENTE REPRESENTO **GRUPO CONSTRUCTOR FERNANDEZ ARGUELLO S.A. DE C.V.,** LA CUAL TENGO EMPADRONADA EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO.

SIN MAS POR EL MOMENTO LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

SANDRA ISABEL ESTRADA BELLO
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO CONSTRUCTOR FERNANDEZ ARGUELLO S.A. DE C.V.

JABEN CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.
R.F.C. JCE-070621-G33

ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO A 26 DE JULIO DEL 2023.

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS.

SOBRE EL PARTICULAR, COMO REPRESENTANTE LEGAL DE: **JABEN CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.** MANIFIESTO A USTED LO SIGUIENTE:

ME REFIERO A LA CONVOCATORIA NO. **41066004-0116-2023**, MEDIANTE LA CUAL SE INVITA A PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NO. **41066004-016-2023,** RELATIVA A LOS TRABAJOS: **REHABILITACIÓN DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**

SIN MÁS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER ACLARACIÓN.

7)
13:19
26/07/2023

ATENTAMENTE

ARQ. HECTOR BENITEZ DOMINGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Calle: Dragos Ext. No. 21 Mza. 16 B Col. Farallón del Obispo C.P. 39690, Acapulco de Juárez, Gro.
Tel. Oficina (744) 487 6233 / Cel. (744) 136 4080
E-Mail. hbenitez7@yahoo.com.mx
E-Mail. Jaben.compras@hotmail.com

26 DE JULIO 2023
SUC. MERCADO 0242
PLAZA: ACAPULCO, GRO.

DEPOSITO REFERENCIADO EFVO
65-50938655-2
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.
REF: 00000410660040162023

MN

DOCUMENTOS:

BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			$ 0.00
EFECTIVO:			$ 3,000.00
CARGO CUENTA:			
TOTAL:			$ 3,000.00

SEC. 8568404 FOLIO: 2422153
N883709 12:48:00 6QP5

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ.

ESTE COMPROBANTE ES DIGITAL, LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCIÓN TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA CAMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA.

Santander

13:19
24/07/2023

CARLOS SALINAS DE LA TORRE
ARQUITECTO

ACAPULCO, GRO., A 26 DE JULIO DEL 2023

M.I. VLADIMIR HERNÁNDEZ ALEMÁN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE

CARTA DE INTENCIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE INFORMO MI INTERES EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN **No. 41066004-016-2023** CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: **Rehabilitación de Calle Felipe II, Tramo Farallón Av. Universidad, Fracc. Magallanes, Acapulco de Juárez, Gro.** NOMBRE DE LA EMPRESA: **CARLOS SALINAS DE LA TORRE.**

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, LE REITERO UN CORDIAL SALUDO.

12:45 hrs
26/07/2023

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS SALINAS DE LA TORRE
REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCIÓN: CALLE 4, MZ. 13, LT. 4, COL. CUMBRES LLANO LARGO, C.P. 39820, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
CEL 744-175-32-13 CORREO: c.salinas85@outlook.com



26 DE JULIO 2023
SUC. CUAUHTEMOC ACAPULCO
PLAZA: ACAPULCO, GRO

DEPOSITO REFERENCIADO EFVO
65-50938655-2
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
REF: ARQUITECTOCARLOSSALINAS41066004016 2023

MN

DOCUMENTOS:

BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE

TOTAL DE DOCUMENTOS:	$ 0.00
EFECTIVO:	$ 3,000.00
CARGO CUENTA:	
TOTAL:	$ 3,000.00

SEC. 9721849 FOLIO: 2412635
N409915 11:32:20 6PP6

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ.

ESTE COMPROBANTE ES DIGITAL, LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCIÓN TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRONICA



25 DE JULIO 2023
SUC. MERCADO 0242
PLAZA: ACAPULCO, GRO

DEPOSITO REFERENCIADO EFVO
65-50938655-2
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.
REF: OFERNANDEZARG0162023

MN

DOCUMENTOS: BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			$ 0.00
EFECTIVO:			$ 3,000.00
CARGO CUENTA:			
TOTAL:			$ 3,000.00

SEC. 8567600 FOLIO: 2421602
N979100 12:06:18 6QP6

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ.

ESTE COMPROBANTE ES DIGITAL, LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCIÓN TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA CAMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA



26 DE JULIO 2023
SUC. COAUHTEMOC ACAPULCO
PLAZA: ACAPULCO, GRO

DEPOSITO REFERENCIADO EFVO
65-50938655-2
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.
REF: ARQUITECTOCARLOSSALINAS4106600401 62023

M.N.

DOCUMENTOS:

BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE

TOTAL DE DOCUMENTOS:	$ 0.00
EFECTIVO:	$ 3,000.00
CARGO CUENTA:	
TOTAL:	$ 3,000.00

SEC. 9721849 FOLIO: 2412635
N409915 11:32:20 6PP6

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ.

ESTE COMPROBANTE ES DIGITAL, LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCIÓN TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA CAMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA

ACTA DE APERTURA

LICITACIÓN NO.	41066004-016-2023
MODALIDAD	LICITACION PUBLICA **(ESTATAL)**
OBRA:	REHABILITACIÓN DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLÓN AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO.

LUGAR Y FECHA: **Acapulco de Juárez, Guerrero a 3 de agosto del 2023.**

ACTA QUE SE LEVANTA CON FUNDAMENTO EN EL **ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266,** CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, EN RELACIÓN A LA LICITACIÓN QUE SE SEÑALA AL PRINCIPIO.

EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO, GUERRERO. SIENDO LAS **12:00 HORAS DEL DÍA 3 DE AGOSTO**, SE REUNIERON EN LA SALA DE **JUNTAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS**, LOS LICITANTES O SUS REPRESENTANTES LEGALES, INVITADOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DEL ORGANISMO OPERADOR CONVOCANTE, QUE SUSCRIBE EL PRESENTE CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, CORRESPONDIENTE AL CONCURSO ARRIBA INDICADO.

LA ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA, SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, DESIGNA AL **C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA**, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES PARA PRESIDIR ESTE ACTO Y ACEPTAR LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 60 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE DIO INICIO AL ACTO, TOMANDO ASISTENCIA A LOS LICITANTES, ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LOS SIGUIENTES:

1	**ALEXANDER CASTILLO LOPEZ**
2	**GRUPO CONSTRUCTOR FERNANDEZ ARGUELLO, S. A. DE C. V.**
3	**DESARROLLOS TOAN, S. A. DE C. V.**
4	**CARLOS SALINAS DE LA TORRE**
5	**SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRAS A Y A, S. A. DE C. V.**
6	**IMEXA CONSTRUCTORES, S. A. DE C. V.**

ACTA DE APERTURA

LICITACIÓN NO.	41066004-016-2023
MODALIDAD	LICITACION PUBLICA **(ESTATAL)**
OBRA:	REHABILITACIÓN DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLÓN AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO.

LUGAR Y FECHA: **Acapulco de Juárez, Guerrero a 3 de agosto del 2023.**

INMEDIATAMENTE DESPUES DE HABER SIDO NOMBRADOS, LOS LICITANTES ENTREGARON SU PROPOSICION EN SOBRES DEBIDAMENTE CERRADOS, MANIFESTANDO QUE CONTIENEN LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA LOS DOCUMENTOS LEGALES Y FINANCIEROS, ASI COMO LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.

ACTO SEGUIDO, SE PROCEDIO A LA APERTURA DE LOS DOCUMENTOS LEGALES Y FINANCIEROS, DESPUES LAS PROPOSICIONES TECNICAS, EN EL ORDEN EN QUE ESTAS FUERON PRESENTADAS, Y POSTERIORMENTE SE ABRIERON LAS PROPROSICIONES ECONOMICAS DE CADA UNO DE LOS LICITANTES, DE ACUERDO AL ARTICULO 48 EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE LLEVARÁ A CABO EN UNA ETAPA, CONFORME A LO SIGUIENTE:

I. UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES EN SOBRES CERRADOS, SE PROCEDERA A LA APERTURA DE LA PROPUESTA, Y SE DESECHARAN LAS QUE HUBIEREN OMITIDO ALGUNO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS. ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.

LA EMPRESA **ALEXANDER CASTILLO LOPEZ**, NO PRESENTO LA DECLARACION PARCIAL 2023 EN ORIGINAL, ASI COMO, TODA LA DOCUMENTACION ESCANEADA EN FORMATO PDF, POR LO TANTO, SE DESECHA LA PROPUESTA, DE ACUERDO AL ARTICULO 48 NUMERAL 1 LA CUAL A SU LETRA DICE (SE DESECHARAN LAS QUE HUBIERAN OMITIDO ALGUNO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS) DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266.

LA EMPRESA **SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRAS A Y A, S. A. DE C. V.**, NO PRESENTO LA DOCUMENTACION ESCANEADA EN FORMATO PDF, POR LO TANTO, SE DESECHA LA PROPUESTA, DE ACUERDO AL ARTICULO 48 NUMERAL 1 LA CUAL A SU LETRA DICE (SE DESECHARAN LAS QUE HUBIERAN OMITIDO ALGUNO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS) DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266.

EN CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 60 PARRAFO SEXTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY EN MATERIA.

ACTO SEGUIDO, UNA VEZ ABIERTAS LAS PROPOSICIONES PREVIA REVISIÓN CUANTITATIVA DE LOS DOCUMENTOS SE DIO LECTURA EN VOZ ALTA AL IMPORTE DE LAS PROPOSICIONES QUE CONTIENEN LOS DOCUMENTOS Y CUBREN LOS REQUISITOS EXIGIDOS, OBTENIÉNDOSE LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

ACTA DE APERTURA

LICITACIÓN NO. 41066004-016-2023

MODALIDAD LICITACION PUBLICA **(ESTATAL)**

OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLÓN AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO.

LUGAR Y FECHA: **Acapulco de Juárez, Guerrero a 3 de agosto del 2023.**

No.	LICITANTE	MONTO TOTAL DE LAS PROPOSICIONES		
		IMPORTE $	IVA $	TOTAL $
1	GRUPO CONSTRUCTOR FERNANDEZ ARGUELLO, S. A. DE C. V.	$ 3,133,311.13	$ 501,329.78	$ 3,634,640.91
2	DESARROLLOS TOAN, S. A. DE C. V.	$ 3,340,653.99	$ 534,504.64	$ 3,875,158.63
3	CARLOS SALINAS DE LA TORRE	$ 4,263,793.10	$ 682,206.90	$ 4,946,000.00
4	IMEXA CONSTRUCTORES, S. A. DE C. V.	$ 4,310,713.33	$ 689,714.13	$ 5,000,427.46

A CONTINUACIÓN, LOS CATÁLOGOS DE CONCEPTOS DE LAS PROPOSICIONES ACEPTADAS, EN EL CUAL SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS, FUERON RUBRICADOS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LOS LICITANTES.

FINALMENTE SE CITO A LOS PARTICIPANTES PARA QUE ASISTIERAN AL ACTO EN QUE SE DARA A CONOCER EL FALLO DEL PRESENTE CONCURSO, QUE TENDRÁ LUGAR EL PRÓXIMO **11 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO**, A LAS **12:00** HORAS, EN ESTE MISMO LUGAR, QUEDANDO NOTIFICADO DE ELLO LOS LICITANTES.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO PARA SU DEBIDA CONSTANCIA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y DE LA CUAL SE ENTREGARA COPIA A CADA UNO DE ELLOS.

ACTA DE APERTURA

LICITACIÓN NO.	41066004-016-2023
MODALIDAD	LICITACION PUBLICA **(ESTATAL)**
OBRA:	REHABILITACIÓN DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLÓN AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO.

LUGAR Y FECHA: **Acapulco de Juárez, Guerrero a 3 de agosto del 2023.**

POR LA CONVOCANTE
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 2021 - 2024

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

M. I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

LIC. TEODORO HERNANDEZ OTERO
ASESOR JURIDICO

LIC. FELIPE CHAVEZ OJEDA
ASESOR JURIDICO

ACTA DE APERTURA

LICITACIÓN NO. 41066004-016-2023

MODALIDAD LICITACION PUBLICA **(ESTATAL)**

OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLÓN AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO.

LUGAR Y FECHA: **Acapulco de Juárez, Guerrero a 3 de agosto del 2023.**

POR LOS LICITANTES

EMPRESA	REPRESENTANTE	FIRMA
ALEXANDER CASTILLO LOPEZ	ARQ. ALEXANDER CASTILLO LOPEZ	
GRUPO CONSTRUCTOR FERNANDEZ ARGUELLO, S. A. DE C. V.	MANUEL REYES BETANCOURT	
DESARROLLOS TOAN, S. A. DE C. V.	ARQ. JUAN DAVID SALMERON GAVILAN	
CARLOS SALINAS DE LA TORRE	ARQ. CARLOS SALINAS DE LA TORRE	
SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRAS A Y A, S. A. DE C. V.	LUIS ANTONIO AGUILERA B.	
IMEXA CONSTRUCTORES, S. A. DE C. V.	ARQ. GENOVEVA MORALES ROMAN	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Departamento de Costos y Licitaciones

Acapulco de Juárez, Gro; a 11 de agosto del 2023

TARJETA INFORMATIVA

A LOS LICITANTES
P r e s e n t e

Por medio de este medio se les informa que el fallo de la licitación **41066004-016-2023** referente a la obra **Rehabilitación de Calle Felipe II, Tramo Farallón Av. Universidad, Fracc. Magallanes, Acapulco de Juárez, Gro., programada** para el día de hoy **11 de agosto** a las **13:30 horas**, tendrá nueva fecha el día **14 de agosto** del presente a las **13:30 horas**.

Sin más por el momento, quedo de ustedes para cualquier aclaración.

A t e n t a m e n t e

Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2021-2024

Arq. José Antonio Carrillo Zamora
Jefe del Departamento de Costos y Licitaciones

c.c.p. Archivo.
JACZ/fmm.

Recibí oficio.
11/Agosto/2023
Genoveva Morales Román.

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN NO. 41066004-016-2023

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA **(ESTATAL)**

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.

ACTA ADMINISTRATIVA DE COMUNICACIÓN DE FALLO Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE OBRA MEDIANTE EL PROCESO DE **LICITACION PUBLICA (ESTATAL) 41066004-016-2023,** DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULOS 39 FRACCIÓN I, 40, 41, 42 Y 49 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266; Y DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA DE FECHA **18 DE JULIO DE 2023.**

EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO, GUERRERO. SIENDO LAS **12:30 HRS** DEL DÍA **14 DE AGOSTO DE 2023**, SE REUNIERON EN LA SALA JUNTAS DE LA **SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS**, LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LOS LICITANTES, INVITADOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONVOCANTE QUE SUSCRIBEN ESTA ACTA, CON EL OBJETO DE COMUNICAR EL FALLO DE LA PRESENTE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA DE **LICITACION PUBLICA (ESTATAL) 41066004-016-2023,** PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.**

RESULTADO DEL ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES. – UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPUESTAS POR LA CONVOCANTE SE LLEVO A CABO LA REVISION CUALITATIVA DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS POR PARTE DE LA COMISIÒN REVISORA, SE DETERMINÒ LO SIGUIENTE:

1) SE **DESECHA** LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA EMPRESA: **GRUPO CONSTRUCTOR FERNANDEZ ARGUELLO, S.A. DE C.V.**

   POR NO HABER REUNIDO LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS, PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, POR LOS **MOTIVOS** QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÒN:

   EN LA DOCUMENTACION TÈCNICA **AE-8** NO PRESENTA **EL ANALISIS DE BASICOS UTILIZADOS EN SU PROPUESTA.** DE ACUERDO A LA CLÀUSULA **DECIMA OCTAVA APARTADO 10, ANEXOS ECONOMICOS.**

   EN LA DOCUMENTACION TÈCNICA **AE-12** NO **CONSIDERA EN SU PRESUPUESTO PROPUESTA UN CONCEPTO QUE SE EXIGE EN LA LICITACION.** DE ACUERDO A LA CLÀUSULA **DECIMA OCTAVA APARTADO 10, ANEXOS ECONOMICOS.**

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN NO. 41066004-016-2023

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA **(ESTATAL)**

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR LA PROPUESTA POR EL LICITANTE NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÀUSULA **VIGESIMA TERCERA**, **APARTADO I** QUE A SU LETRA DICE: LA PRESENTACION IMCOMPLETA O LA OMISIÒN DE CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDAS EN ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÒN, DETECTADA DURANTE LA REVISIÒN Y AUN DESPUÈS DEL COTEJO REALIZADO DURANTE EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, QUE AFECTEN DIRECTAMENTE LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES; EN EL **APARTADO II** QUE DICE LA FALTA DE INFORMACIÒN O DOCUMENTOS QUE IMPOSIBILITEN DETERMINAR SU SOLVENCIA EN CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÒN, QUE AFECTEN DIRECTAMENTE A LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES; EN EL **APARTADO IV** QUE DICE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÈCNICAS Y ECONÒMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, QUE AFECTEN DIRECTAMENTE LAS SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES.

2) SE **DESECHA** LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA EMPRESA: **DESARROLLOS TOAN, S.A. DE C.V.**

POR NO HABER REUNIDO LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS, PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, POR LOS **MOTIVOS** QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÒN:

EN LA DOCUMENTACION TÈCNICA **AE-8** NO PRESENTA **EL ANALISIS DE BASICOS UTILIZADOS EN SU PROPUESTA.** DE ACUERDO A LA CLÀUSULA **DECIMA OCTAVA APARTADO 10, ANEXOS ECONOMICOS.**

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR LA PROPUESTA POR EL LICITANTE NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÀUSULA **VIGESIMA TERCERA**, **APARTADO I** QUE A SU LETRA DICE: LA PRESENTACION IMCOMPLETA O LA OMISIÒN DE CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDAS EN ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÒN, DETECTADA DURANTE LA REVISIÒN Y AUN DESPUÈS DEL COTEJO REALIZADO DURANTE EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, QUE AFECTEN DIRECTAMENTE LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES; EN EL **APARTADO II** QUE DICE LA FALTA DE INFORMACIÒN O DOCUMENTOS QUE IMPOSIBILITEN

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN NO. 41066004-016-2023

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA **(ESTATAL)**

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.

DETERMINAR SU SOLVENCIA EN CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÒN, QUE AFECTEN DIRECTAMENTE A LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES; EN EL **APARTADO IV** QUE DICE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÈCNICAS Y ECONÒMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, QUE AFECTEN DIRECTAMENTE LAS SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES.

SE DECLARA QUE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LA EMPRESAS:

1	**IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.**
2	**CARLOS SALINAS DE LA TORRE**

A CONTINUACION, SE INDICA EL LUGAR QUE CORRESPONDE A LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS PARTICIPANTES:

No.	LICITANTE	MONTO TOTAL DE LAS PROPOSICIONES		
		IMPORTE $	IVA $	TOTAL $
1	CARLOS SALINAS DE LA TORRE	$ 4,263,793.10	$ 682,206.90	$ 4,946,000.00
2	IMEXA CONSTRUCTORES, S. A. DE C. V.	$ 4,310,713.33	$ 689,714.13	$ 5,000,427.46

SON SOLVENTES, POR REUNIR, CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 49 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266 CLAUSULA OCTAVA, PUNTO A **CRITERIOS DE ADJUDICACION**, DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN.

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN NO. 41066004-016-2023

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA **(ESTATAL)**

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.

LA **ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA**, SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DESIGNA PARA PRESIDIR ESTE ACTO AL **C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES,** INICIÁNDOSE DICHO EVENTO CON EL PASE DE LISTA DE ASISTENCIA DE LOS LICITANTES Y LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS E INVITADOS PRESENTES. A CONTINUACIÓN, EXPRESO QUE DE CONFORMIDAD CON EL DICTAMEN DE **FECHA 14 DE AGOSTO DE 2023,** FORMULADO POR LA COMISIÓN REVISORA, SE RESOLVIÓ LO SIGUIENTE: COMO RESULTADO DE LOS ASPECTOS PREPARATORIOS PARA EL ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES, SE DETERMINO ACEPTAR LAS PROPUESTAS QUE REUNIERON TODAS LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR ESTA CONVOCANTE Y ADEMÁS GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, RESULTANDO COMO SOLVENTES LAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

No.	LICITANTE	MONTO TOTAL DE LAS PROPOSICIONES		
		IMPORTE $	IVA $	TOTAL $
1	CARLOS SALINAS DE LA TORRE	$ 4,263,793.10	$ 682,206.90	$ 4,946,000.00
2	IMEXA CONSTRUCTORES, S. A. DE C. V.	$ 4,310,713.33	$ 689,714.13	$ 5,000,427.46

NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN.

DE CONFORMIDAD CON EL DICTAMEN ANTES REFERIDO, LA PROPOSICIÓN QUE RESULTÓ SOLVENTE PORQUE REÚNE, CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, Y POR TANTO GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, Y ES LA PROPOSICIÓN ECONÓMICAMENTE MÁS CONVENIENTE PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, ES LA PRESENTADA POR EL LICITANTE: **IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.** Y, EN CONSECUENCIA, SE LE ADJUDICA EL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO,** POR CONSIDERAR SU PROPUESTA CON UN MONTO TOTAL DE **$ 4,310,713.33,** SIN IVA.

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN NO. 41066004-016-2023

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA **(ESTATAL)**

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.

INCLUIDO, I.V.A. POR UN IMPORTE DE **$689,714.13** DANDO UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. INCLUIDO DE **$5,000,427.46 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 46/100).**

EL LICITANTE GANADOR SE COMPROMETE Y OBLIGA A ENTREGAR LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DEL ANTICIPO A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DE ESTE FALLO, CONFORME A LO INDICADO EN EL **39 FRACCIÓN I, 40, 41, 42 Y 49 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266, EN LAS OFICINAS DE LA CONVOCANTE UBICADAS EN CALLE ROBERTO POSADA Y COMONFORT S/N, COL. CENTRO, DE ESTA CIUDAD Y PUERTO**.

LA PRESENTE ACTA DE NOTIFICACIÓN SURTE EFECTO PARA LA EMPRESA **IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.** EN FORMA Y POR ELLO SE COMPROMETE Y OBLIGA A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO Y SUS ANEXOS A LAS **14:30 HORAS, DEL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2023**, **EN LA SALA DE JUNTA DE ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS,** UBICADAS EN CALLE ROBERTO POSADA Y COMONFORT S/N, COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO.

EL CONTRATISTA DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EL **DÍA 15 DE AGOSTO DEL AÑO 2023**, LOS CUALES TENDRÁN UNA DURACIÓN DE **120 DÍAS NATURALES.**

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA SUS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, A CONTINUACIÓN, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO, AL MARGEN Y AL CALCE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LOS LICITANTES:

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN NO. 41066004-016-2023

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA **(ESTATAL)**

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.

POR LA CONVOCANTE

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
2021 - 2024

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES
DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN NO. 41066004-016-2023

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA **(ESTATAL)**

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.

POR LOS LICITANTES

EMPRESA	REPRESENTANTE	FIRMA
Desarrollos Toan S.A de C.V.	Ing. Juan Daniel Salmeron Garcia	
CARLOS SALINAS DE LA TORRE	ARQ. CARLOS SALINAS DE LA TORRE	
Grupo Constructor Ingeniería Integral S.A de C.V.	General Gpo B.	
Amexa Constructoras S.A de C.V. Arq. Genoveva M.R.	Genoveva Morales Roman	Genoveva M.R.

DICTAMEN QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 49, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266, SIRVE COMO BASE PARA EL FALLO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL NÚMERO **41066004-016-2023** RELATIVA A LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.**

EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO DE JUAREZ, ESTADO DE GUERRERO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023, NOS REFERIMOS AL CONCURSO DE OBRA No. 41066004-016-2023, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO EL ACTA DE FALLO DEL CONCURSO DE LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, CON RECURSOS PARA LA CONTRATACION DE ESTOS SERVICIOS PROVIENEN DEL RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023. AUTORIZADO MEDIANTE EL OFICIO SEPLADE/321/2023, DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2023. ACTO SEGUIDO SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

I.-RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO LICITACION PÚBLICA ESTATAL.

1.-LA CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA ESTATAL SE PUBLICO. – CON **FECHA 18 DE JULIO 2023** LO ANTERIOR, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 43 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266.

2.-BASES DE LA LICITACIÓN. - A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, SE PUSO A DISPOSICION DE LOS INTERESADOS, LAS BASES DE LA LICITACION PARA CONSULTA PREVIA, Y HASTA EL DIA **25 DE JULIO DE 2023**, QUE CORRESPONDE AL SEPTIMO DIA NATURAL PREVIO AL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, TAL Y COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 44 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266 PUDIENDOLAS ADQUIRIR EN LAS OFICINAS DE LA CONVOCANTES.

3.- VISITA AL LUGAR DE LA OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES. – CON EL OBJETO QUE LOS LICITANTES CONOZCAN LAS CONDICIONES AMBIENTALES, ASI COMO LAS CARACTERISTICAS REFERENTES, GRADO DE DIFICULTAS DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR Y SUS IMPLICACIONES DE CARÁCTER TECNICO. REALIZADO A LAS **10:00 HORAS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023**, CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

1	**ALEXANDER CASTILLO LOPEZ**
2	**IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.**
3	**SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRAS A Y A, S.A. DE C.V.**

4.- CELEBRANDOSE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LAS **10:00 HORAS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023**, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA CONVOCANTE, UBICADA EN ROBERTO POSADA Y COMONFORT SN. COL. CENTRO EN ACAPULCO, GUERRERO, SEGÚN SE DESPRENDE DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, QUE DEBIDAMENTE FIRMADA POR LAS PERSONAS ASISTENTES OBRA EN EXPEDIENTE. A DICHOS ACTOS SE PRESENTARON LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

1	**ALEXANDER CASTILLO LOPEZ**
2	**IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.**
3	**SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRAS A Y A, S.A. DE C.V.**
4	**DESARROLLOS TOAN, S.A. DE C.V.**

RESPECTIVAMENTE, DONDE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

PREGUNTAS:

SIN PREGUNTAS

NOTAS ACLARATORIAS:

LA INTEGRACION DE SU PROPUESTA SE DEBERA APEGAR AL CATALOGO DE CONCEPTOS PROPORCIONADO.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA INCISO l) DICE:

LOS LICITANTES DEBERÁN ESTAR REGISTRADOS EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL ESTADO DE GUERRERO; DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS NÚMERO 31 Y 34 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266., DEBERÁN PRESENTAR LA CONSTANCIA DEL REGISTRO O REFRENDO ACTUALIZADA.

PARA EFECTOS DE ESTA LICITACION, POR MOTIVOS DE DESFASAMIENTO DE ENTREGAS DE REGISTRO O REFRENDOS ACTUALIZADOS DEL PADRON DE CONTRATISTAS DEL ESTADO DE GUERRERO, **SE ACEPTARÁ TAMBIEN EL PADRON ANTERIOR, MAS EL ACUSE DE QUE REALIZO EL TRAMITE EN TIEMPO Y FORMA PARA SU REGISTRO DEL PRESENTE AÑO Y EN SU CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACION OFICIO DE QUE ESTA EN TREMITE DICHO REGISTRO.**

5.- ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. – ESTE ACTO SE REALIZO A LAS **12:00 HORAS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023**, MISMO QUE FUE PRESIDIDO POR EL **C. JOSÈ ANTONIO CARRILLO ZAMORA**; SE INICIO CON EL PASE DE LISTA DE LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS ASISTENTES SIENDO ESTÒS LOS SIGUIENTES:

1	**ALEXANDER CASTILLO LOPEZ**
2	**GRUPO CONSTRUCTOR FERNANDEZ ARGUELLO, S. A. DE C. V.**
3	**DESARROLLOS TOAN, S. A. DE C. V.**
4	**CARLOS SALINAS DE LA TORRE**
5	**SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRAS A Y A, S. A. DE C. V.**
6	**IMEXA CONSTRUCTORES, S. A. DE C. V.**

INMEDIATAMENTE DESPUES DE HABER SIDO NOMBRADOS, LOS LICITANTES ENTREGARON SU PROPOSICION EN SOBRES DEBIDAMENTE CERRADOS, MANIFESTANDO QUE CONTIENEN LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA LOS DOCUMENTOS LEGALES Y FINANCIEROS, ASI COMO LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.

ACTO SEGUIDO, SE PROCEDIO A LA APERTURA DE LOS DOCUMENTOS LEGALES Y FINANCIEROS, DESPUES LAS PROPOSICIONES TECNICAS, EN EL ORDEN EN QUE ESTAS FUERON PRESENTADAS, Y POSTERIORMENTE SE ABRIERON LAS PROPROSICIONES ECONOMICAS DE CADA UNO DE LOS LICITANTES,
DE ACUERDO AL ARTICULO 48 EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE LLEVARÁ A CABO EN UNA ETAPA, CONFORME A LO SIGUIENTE:

I. UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES EN SOBRES CERRADOS, SE PROCEDERA A LA APERTURA DE LA PROPUESTA, Y SE DESECHARAN LAS QUE HUBIEREN OMITIDO ALGUNO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS. ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.

LA EMPRESA **ALEXANDER CASTILLO LOPEZ**, NO PRESENTO LA DECLARACION PARCIAL 2023 EN ORIGINAL, ASI COMO, TODA LA DOCUMENTACION ESCANEADA EN FORMATO PDF, POR LO TANTO, SE DESECHA LA PROPUESTA, DE ACUERDO AL ARTICULO 48 NUMERAL 1 LA CUAL A SU LETRA DICE (SE DESECHARÁN LAS QUE HUBIERAN OMITIDO ALGUNO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS) DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266.

LA EMPRESA **SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRAS A Y A, S. A. DE C. V.**, NO PRESENTO LA DOCUMENTACION ESCANEADA EN FORMATO PDF, POR LO TANTO, SE DESECHA LA PROPUESTA, DE ACUERDO AL ARTICULO 48 NUMERAL 1 LA CUAL A SU LETRA DICE (SE DESECHARÁN LAS QUE HUBIERAN OMITIDO ALGUNO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS) DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266.

EN CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 60 PARRAFO SEXTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY EN MATERIA.

ACTO SEGUIDO, UNA VEZ ABIERTAS LAS PROPOSICIONES PREVIA REVISIÓN CUANTITATIVA DE LOS DOCUMENTOS SE DIO LECTURA EN VOZ ALTA AL IMPORTE DE LAS PROPOSICIONES QUE CONTIENEN LOS DOCUMENTOS Y CUBREN LOS REQUISITOS EXIGIDOS, OBTENIÉNDOSE LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

No.	LICITANTE	MONTO TOTAL DE LAS PROPOSICIONES		
		IMPORTE $	IVA $	TOTAL $
1	GRUPO CONSTRUCTOR FERNANDEZ ARGUELLO, S. A. DE C. V.	$ 3,133,311.13	$ 501,329.78	$ 3,634,640.91
2	DESARROLLOS TOAN, S. A. DE C. V.	$ 3,340,653.99	$ 534,504.64	$ 3,875,158.63
3	CARLOS SALINAS DE LA TORRE	$ 4,263,793.10	$ 682,206.90	$ 4,946,000.00
4	IMEXA CONSTRUCTORES, S. A. DE C. V.	$ 4,310,713.33	$ 689,714.13	$ 5,000,427.46

SE MANIFIESTA A LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS QUE SUS OFERTAS SE RECEPCIÒNARON PARA SU EVALUACIÒN Y ANALISIS DETALLADO POR EL ORGANISMO, EL QUE PROCEDERÀ A LA EMISION DEL DICTAMEN CORRESPONDIENTE; A CONTINUACIÒN, SE RUBIRCARON LOS CATÀLOGOS DE CONCEPTOS DE LOS LICITANTES, QUEDANDO LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN CADA UNA DE

LAS PROPUESTAS EN CUSTODIA DE LA CONVOCANTE, PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES. FINALMENTE, SE INFORMÒ A LOS PARTICIPANTES QUE EL DÌA **14 DE AGOSTO DE 2023, A LAS 12:30 HORAS** Y EN EL MISMO LUGAR, SE DARÀ LECTURA AL FALLO, NOTIFICÀNDOSE DE ELLO A LAS EMPRESAS LICITANTES; FINALMENTE SE LEVANTÒ EL ACTA DE APERTURA Y PRESENTACIÒN DE PROPOSICIONES, LA CUAL FUE FIRMADA POR DICHAS EMPRESAS, INVITADOS Y SERVIDORES PÙBLICOS ASISTENTES AL EVENTO Y SE ENTREGO COPIA DE LAS MISMA A TODOS ELLOS.

6.-RESULTADO DEL ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES. – UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPUESTAS POR LA CONVOCANTE SE LLEVO A CABO LA REVISION CUALITATIVA DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS POR PARTE DE LA COMISIÒN REVISORA, SE DETERMINÒ LO SIGUIENTE:

1)SE **DESECHA** LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA EMPRESA: **GRUPO CONSTRUCTOR FERNANDEZ ARGUELLO, S.A. DE C.V.**

POR NO HABER REUNIDO LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS, PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, POR LOS **MOTIVOS** QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÒN:

EN LA DOCUMENTACION TÈCNICA **AE-8** NO PRESENTA **EL ANALISIS DE BASICOS UTILIZADOS EN SU PROPUESTA.** DE ACUERDO A LA CLÀUSULA **DECIMA OCTAVA APARTADO 10, ANEXOS ECONOMICOS.**

EN LA DOCUMENTACION TÈCNICA **AE-12** NO **CONSIDERA EN SU PRESUPUESTO PROPUESTA UN CONCEPTO QUE SE EXIGE EN LA LICITACION.** DE ACUERDO A LA CLÀUSULA **DECIMA OCTAVA APARTADO 10, ANEXOS ECONOMICOS.**

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR LA PROPUESTA POR EL LICITANTE NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÀUSULA **VIGESIMA TERCERA, APARTADO I** QUE A SU LETRA DICE: LA PRESENTACION IMCOMPLETA O LA OMISIÒN DE CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDAS EN ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÒN, DETECTADA DURANTE LA REVISIÒN Y AUN DESPUÈS DEL COTEJO REALIZADO DURANTE EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, QUE AFECTEN DIRECTAMENTE LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES; EN EL **APARTADO II** QUE DICE LA FALTA DE INFORMACIÒN O DOCUMENTOS QUE IMPOSIBILITEN DETERMINAR SU SOLVENCIA EN CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÒN, QUE AFECTEN DIRECTAMENTE A LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES; EN EL **APARTADO IV** QUE DICE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÈCNICAS Y ECONÒMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, QUE AFECTEN DIRECTAMENTE LAS SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES.

2)SE **DESECHA** LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA EMPRESA: **DESARROLLOS TOAN, S.A. DE C.V.**

POR NO HABER REUNIDO LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS, PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, POR LOS **MOTIVOS** QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÒN:

EN LA DOCUMENTACION TÈCNICA **AE-8** NO PRESENTA **EL ANALISIS DE BASICOS UTILIZADOS EN SU PROPUESTA.** DE ACUERDO A LA CLÀUSULA **DECIMA OCTAVA APARTADO 10, ANEXOS ECONOMICOS.**

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR LA PROPUESTA POR EL LICITANTE NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÀUSULA **VIGESIMA TERCERA**, **APARTADO I** QUE A SU LETRA DICE: LA PRESENTACION IMCOMPLETA O LA OMISIÒN DE CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDAS EN ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÒN, DETECTADA DURANTE LA REVISIÒN Y AUN DESPUÈS DEL COTEJO REALIZADO DURANTE EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, QUE AFECTEN DIRECTAMENTE LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES; EN EL **APARTADO II** QUE DICE LA FALTA DE INFORMACIÒN O DOCUMENTOS QUE IMPOSIBILITEN DETERMINAR SU SOLVENCIA EN CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÒN, QUE AFECTEN DIRECTAMENTE A LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES; EN EL **APARTADO IV** QUE DICE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÈCNICAS Y ECONÒMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, QUE AFECTEN DIRECTAMENTE LAS SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES.

SE DECLARA QUE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LA EMPRESAS:

1	**IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.**
2	**CARLOS SALINAS DE LA TORRE**

SON SOLVENTES, POR REUNIR, CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 49 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266 CLAUSULA OCTAVA, PUNTO A **CRITERIOS DE ADJUDICACION**, DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN.

A CONTINUACION, SE INDICA EL LUGAR QUE CORRESPONDE A LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS PARTICIPANTES:

No.	LICITANTE	MONTO TOTAL DE LAS PROPOSICIONES		
		IMPORTE $	IVA $	TOTAL $
1	CARLOS SALINAS DE LA TORRE	$ 4,263,793.10	$ 682,206.90	$ 4,946,000.00
2	IMEXA CONSTRUCTORES, S. A. DE C. V.	$ 4,310,713.33	$ 689,714.13	$ 5,000,427.46

ASÍ MISMO EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 50 DE LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266, SE PROPORCIONARÁ POR ESCRITO A LOS DEMAS LICITANTES, LA INFORMACION ACERCA DE LAS RAZONES POR LAS CUALES SUS PROPUESTAS NO RESULTARON GANADORAS.

UNA VEZ QUE SE ANALIZARON LAS PROPUESTAS PRESENTADAS, SE EMITE EL SE EMITE EL SIGUIENTE:

DICTAMEN

PRIMERO.- EN RAZÓN DE LO ANTERIOR Y EN CUMPLIMIENTO CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266, SE DICTAMINA ADJUDICAR EL CONTRATO, A LA EMPRESA : IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. QUIEN PRESENTA SU PROPUESTA POR UN MONTO DE $4,310,713.33 MAS IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR $ 689,714.13 RESULTANDO UN MONTO TOTAL DE $ 5,000,427,46, AL REUNIR LAS CONDICIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS Y CUENTA CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LLEVAR A CABO LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ.

SEGUNDO. – DESPUÉS DE COMUNICAR EL FALLO A LOS LICITANTES, SE PROPORCIONARÁ POR ESCRITO LA INFORMACION ACERCA DE LAS RAZONEZ POR LAS CUALES SUS PROPUESTAS NO RESULTARON GANADORAS, EN TERMINOS DEL ARTICULO 50, TERCER PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SU SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266.

ACAPULCO, GRO. A 14 DE AGOSTO DE 2023.

A T E N T A M E N T E
AUTORIZO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 2021 - 2024

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. IGNACIO FERNANDEZ VERDIZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA RURAL

C. RAFAEL FEERMAN MOLINA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA DE LA DIRECCION DE OBRAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ 2021-2024

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

EJERCICIO 2023

LICITACION 41066004-016-2023

SUBMODALIDAD: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III) RAMO XXXIII.**

CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/426-2023/LP**

OBRA/PROYECTO/ACCIÓN: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.**

UBICACIÓN: **ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO**

CONTRATISTA: **IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.**

ORIGINAL

Acapulco de Juárez, Gro., a 03 de agosto de 2023.

Ing. Luz María Meraza Radilla.
Secretaría De Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
del Municipio De Acapulco De Juárez, Guerrero
Presente

Folder:

DOCUMENTACIÓN LEGAL ADICIONAL QUE DEBE PRESENTARSE CONJUNTAMENTE CON LAS PROPOSICIONES

Licitación Pública Estatal, número ***41066004-016-2023.***

Relativo a la contratación de la obra: ***: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.***

No abrirse antes de las 12:00 hrs. del 03 de agosto de 2023.

ATENTAMENTE
IMEXA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

ING. IRINA SALGADO HERNÁNDEZ.
ADMINISTRADOR ÚNICO.

000001

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01
CEL. 744 2354717 / 744 4490912 E-MAIL: imexa@telmexmail.com, gno_0301@hotmail.com

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. **41066004-016-2023.**
REFERENTE A LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**

a). - ORIGINAL Y COPIA DEL TESTIMONIO DEL ACTA CONSTITUTIVA Y MODIFICACIONES EN SU CASO SEGÚN SU NATURALEZA JURÍDICA,
COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA DE LA PERSONA QUE FIRME LA PROPOSICIÓN, SI SE TRATA DE PERSONA MORAL

000002

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01 CEL. 744 2354717 / 744 4490912 E-MAIL: imexa@telmexmail.com, gno_0301@hotmail.com

Corredor Público Número 5
Plaza Estado de Guerrero

PÓLIZA NÚMERO UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO----------

Libro Primero de Registro de Sociedades Mercantiles ----------

En Acapulco, Guerrero, a los dieciséis días del mes de diciembre del año dos mil nueve. Ante mí, Licenciada SHUNASHI JAZMÍN ALTAMIRANO PINEDA, CORREDOR PÚBLICO NÚMERO CINCO EN EL ESTADO DE GUERRERO, debidamente habilitada para el ejercicio de mis funciones por la Secretaría de Economía y actuando con el carácter de Fedatario Público que la Ley me otorga, con fundamento en los ARTÍCULOS SEXTO, FRACCION SEXTA DE LA LEY FEDERAL DE CORREDURIA PÚBLICA, ARTÍCULOS SEXTO, CINCUENTA Y TRES FRACCION QUINTA Y CINCUENTA Y CUATRO DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE CORREDURÍA PÚBLICA, ARTICULOS SEGUNDO, TRESCIENTOS DIEZ DEL CODIGO DE COMERCIO, ARTÍCULOS SEXTO, DECIMO, OCHENTA Y NUEVE, NOVENTA, NOVENTA Y UNO, CIENTO CUARENTA Y CINCO, CIENTO CUARENTA Y SEIS Y CIENTO CUARENTA Y SIETE DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, hago constar: **LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA: "IMEXA CONSTRUCTORES", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.** Que otorgan las siguientes personas: ----------

A. IRINA SALGADO HERNANDEZ.----------

B. MARCIAL MIGUEL VELASCO MARTINEZ. ----------

De conformidad con las siguientes ANTECEDENTES, CLÁUSULAS Y ESTATUTOS: ----------

A N T E C E D E N T E S----------

ÚNICO.- PERMISO DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES.- Para la celebración del presente contrato de sociedad mercantil, se solicitó y obtuvo el Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores número 1202934 (uno, dos, cero, dos, nueve, tres, cuatro) de fecha catorce de diciembre del dos mil nueve, expediente 20091202775 (dos, cero, cero, nueve, uno, dos, cero dos, siete, siete, cinco), folio 091211121002 (cero, nueve, uno, dos, uno, uno, uno, dos, uno, cero, cero, dos) de cuyo original se agrega una copia cotejada al presente instrumento, fielmente reproducida de su original, cuyo texto se tiene aquí por reproducido como si literalmente se transcribiera para todos los efectos legales, contractuales y estatutarios a que haya lugar. El original del permiso antes señalado se conserva en el Archivo oficial de la correduría a mi cargo, correspondiente a la presente póliza, bajo la letra **"A"**. ----------

C L Á U S U L A S ----------

PRIMERA.- TIPO DE SOCIEDAD: Las personas mencionadas al principio de esta póliza, constituyen una Sociedad Anónima de Capital Variable, mexicana, cuyo régimen jurídico aplicable será la Ley General de Sociedades Mercantiles y los siguientes: ----------

COTEJADO COPIA COTEJADA

000003

E S T A T U T O S----------

CAPÍTULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO, DURACIÓN Y NACIONALIDAD ----------

ARTÍCULO PRIMERO.- REGULACIÓN: La sociedad se regirá por los presentes estatutos, y en lo que no esté previsto en ellos, por las disposiciones aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ----------

ARTÍCULO SEGUNDO.- DENOMINACIÓN: La denominación de la sociedad es: ----------
"IMEXA CONSTRUCTORES", e irá siempre seguida de las palabras **"SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE"** o de su abreviatura **"S.A. DE C.V."**----------

ARTÍCULO TERCERO.- DOMICILIO: El domicilio de la sociedad es la Ciudad y Puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero, sin perjuicio de establecer agencias, sucursales o representaciones en cualesquiera otros lugares de la Republica Mexicana o del Extranjero y someterse a domicilios convencionales, sin que por ello se entienda modificado su domicilio. ----

ARTÍCULO CUARTO.- OBJETO SOCIAL: El objeto de la sociedad será:----------
La sociedad tiene por objeto: a) Operar como inmobiliaria, pudiendo adquirir, enajenar, explotar o tomar en arrendamiento o subarrendamiento, toda clase de bienes muebles e inmuebles, urbanos y suburbanos, y toda clase de derechos reales sobre los mismos.- b) Arrendar, subarrendar, tomar y dar en comodato, usar, poseer adquirir, comprar, vender, construir, reparar, enajenar y operar por cualquier título legal toda clase de equipos, bodegas, almacenes, plantas, oficinas, salones, locales y demás establecimientos necesarios o convenientes para la realización de los objetos de la Sociedad, incluyendo la adquisición y enajenación de muebles, inmuebles y derechos reales que se consideren indispensables y que las leyes permitan.- c) El fraccionamiento, construcción, urbanización, subdivisión y fusión a cualquier títulos, de toda clase de bienes inmuebles por cuenta propia o de terceros y la realización de toda clase de obras públicas o privadas.- d) La explotación de la ingeniería y la arquitectura en sus aspectos de investigación pura y aplicada a proyecto, construcción, supervisión, coordinación y la valuación de obras públicas y privadas.- e) Comercializar con toda clase de artículos, productos y materiales de construcción, incluyendo su fabricación, importación, exportación adquisición, negociación y enajenación por cualquier título de los bienes inmuebles y muebles necesarios o convenientes para su objeto, así como la obtención de comisiones, consignaciones y representaciones relacionadas con dichas actividades.- f) Girar en el ramo de comisiones, mediaciones y aceptar el desempeño de representaciones de negociaciones de toda especie, prestar servicios de asesoría legal, fiscal, publicitaria y promocional, en relación con compra-venta, construcción, arrendamiento, arrendamiento, subarrendamiento y cualquier otro tipo de negociaciones permitidas por la ley, con bienes inmuebles, incluyendo enunciativa mas no limitativamente casas, edificios, condominios, fraccionamientos, parques industriales y

000004

CURP CUEIVDA

Corredor Público Número 5
Plazo Estado de Guerrero

desarrollos turísticos, elaborar, diseñar y prestar servicios de asesoría en proyectos de construcción de casas, edificios, oficinas, condominios, clubes, en general, fraccionamientos, parques industriales y desarrollos turísticos, prestar servicios de asesoría, administración, cobranzas y tramitación respecto de cualquier aspecto que comprenda la construcción y desarrollo de condominios, oficinas, fraccionamientos, clubes, parques industriales y desarrollos turísticos.- g) Realizar, supervisar, coordinar o contratar por cuenta propia o de terceros, toda clase de construcciones, edificaciones, urbanizaciones, diseño arquitectónico, gráfico, industrial, estructural, de instalaciones, exposiciones y stands, así como fabricar, comprar y enajenar por cualquier título, toda clase de materiales de construcción.- h) La prestación o contratación de servicios técnicos, consultivos y de asesoría, así como la celebración de los contratos o convenios para la realización de estos fines, especialmente lo relacionado con la arquitectura y la construcción.- i) Dar y recibir en arrendamiento y por compra-venta o por cualquier medio permitido por la ley, maquinaria, equipo y transportación para la construcción.- j) Análisis de precios relacionados con la construcción, diseños y obras de arquitectura que la sociedad realice.- k) Dar y tomar dinero en préstamo, así como otorgar garantías de naturaleza hipotecaria, prendaria, fiduciaria, cambiaria o de cualquier otra clase.- l) Promover, construir, organizar, explotar y tomar participación en el capital y patrimonio de todo género de sociedades mercantiles, civiles, asociaciones o empresas industriales, comerciales, de servicio o de cualquier otra índole, tanto nacionales como extranjeras, así como participar en su administración o liquidación.- m) La adquisición, enajenación y en general la negociación de todo tipo de acciones, partes sociales y de cualquier título, valores permitidos por la ley.- n) La emisión, suscripción, aceptación, endoso, aval o cualesquier títulos o valores mobiliarios que la ley permita.- ñ) Obtener o conceder préstamos otorgando y recibiendo garantías específicas; emitir obligaciones, aceptar, girar, endosar o avalar toda clase de títulos de crédito y otorgar fianzas o garantías de cualquier clase respecto de las obligaciones propias o de terceros o de los títulos emitidos o aceptados por la sociedad o por terceros.- o) Adquirir, enajenar, tomar y otorgar el uso y goce por cualquier título permitido por la ley de bienes muebles e inmuebles.- p) Obtener y otorgar por cualquier título patentes, marcas, nombres comerciales, opciones y preferencias, derechos de autor y concesiones para todo tipo de actividades.- q) En general, la celebración de toda clase de actos jurídicos, que sean necesarios o convenientes para la realización de los objetos indicados. ----------

ARTÍCULO QUINTO.- DURACIÓN: La duración de la sociedad será de 99 (noventa y nueve) años, contados a partir de la fecha de firma de esta póliza. ----------

ARTÍCULO SEXTO.- EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS: Ninguna persona extranjera, física o moral, podrá tener participación social alguna o ser propietaria de acciones de la sociedad. Si

COTEJADO
COPIA COTEJADA

000005

lo establecido en el párrafo que antecede, se conviene desde ahora en que dicha adquisición será nula y por tanto cancelada y sin ningún valor la participación social de que se trate y los títulos que la representen, teniéndose por reducido el capital social en una cantidad igual al valor de la participación cancelada. ----------

CAPÍTULO SEGUNDO. DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ASOCIACIONES------

ARTÍCULO SÉPTIMO.- CAPITAL: El capital social se integra con una porción fija y otra variable y será representado por dos series de acciones. La serie A será representativa del capital fijo, en tanto que la serie B será representativa del capital variable. El capital mínimo o fijo sin derecho a retiro importa la cantidad de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL), representado por CINCUENTA acciones ordinarias, nominativas de la serie A, con valor nominal de $1,000.00 (UN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL) y podrán estar representadas por títulos nominativos que servirán para acreditar los derechos de los accionistas y que podrán comprender una o más acciones. El capital variable será ilimitado, estará representado por acciones nominativas de la Serie "B", con valor nominal de $1,000.00 (UN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL) cada una y podrán estar representadas por títulos nominativos que servirán para acreditar los derechos de los accionistas y que podrán comprender una o más acciones. Las acciones de la Serie "A" y de la Serie "B" confieren iguales derechos y obligaciones a sus tenedores. ----------

ARTÍCULO OCTAVO.- TÍTULOS DE ACCIONES: Los títulos que representen las acciones de la sociedad deberán contener en su texto los requisitos establecidos por el artículo 125 (ciento veinticinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, podrán amparar una o varias Acciones y serán firmados por dos miembros del Consejo de Administración o por el Administrador Único, según sea el caso. Así mismo los títulos deberán llevar impreso el texto del artículo 6 (sexto) de los estatutos. ----------

ARTÍCULO NOVENO.- REGISTRO DE ACCIONES: La sociedad llevará un Libro de Registro de Acciones que contendrá el nombre, nacionalidad y domicilio de los accionistas, indicando las acciones que les pertenezcan, con todas sus particularidades. Así mismo en dicho libro se harán constar las exhibiciones que los Accionistas efectúen y las transmisiones que hicieren. ----------

ARTÍCULO DÉCIMO.- AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE CAPITAL: El Capital Social podrá ser aumentado o disminuido, el fijo por resolución de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas y el variable por resolución de Asamblea General Ordinaria de Accionistas, sujeto a lo previsto por la Ley General de Sociedades Mercantiles. En caso de aumento de capital, los Accionistas tendrán derecho de preferencia para suscribir el aumento, en proporción al número de acciones de que sean propietarios, debiendo ejercer su derecho, dentro de un plazo de 15 (quince) días hábiles, siguientes a la fecha de notificación que se realice de acuerdo con el artículo 132 (ciento treinta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles; sin embargo, si en la

COTEJADO

Corredor Público Número 5
Plaza Estado de Guerrero

asamblea al momento de la votación está representada la totalidad del capital social, dicho plazo de 15 (quince) días hábiles empezará a correr a partir de la fecha de la asamblea y los accionistas se considerarán notificados del acuerdo respectivo en ese momento. ----------

CAPÍTULO TERCERO. ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ----------

ARTÍCULO UNDÉCIMO.- ADMINISTRACIÓN: La administración de la Sociedad estará a cargo de un Administrador Único o de un Consejo de Administración compuesto de dos o más miembros, según lo determine la Asamblea Ordinaria de Accionistas. Si la Asamblea lo estima necesario podrá nombrar, según sea el caso, Administrador Único Suplente o Consejeros Suplentes. Los administradores según sea el caso, Administrador Único Suplente o Consejeros Suplentes. Los administradores ya sean Propietarios o Suplentes podrán ser o no Accionistas de la Sociedad y continuarán en funciones hasta que las personas designadas para sustituirlos tomen posesión de sus cargos, podrán ser reelectos y recibirán las remuneraciones que determine la Asamblea Ordinaria de Accionistas. El Administrador Único o los Consejeros podrán ser removidos en cualquier tiempo por la Asamblea Ordinaria de Accionistas. ----------

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- SESIONES DE CONSEJO: El Consejo de Administración celebrará sus sesiones en el domicilio social o en cualquier otro lugar de la República Mexicana o en el Extranjero. Para que las sesiones sean declaradas legalmente instaladas se requerirán de la comparecencia de cuando menos la mitad de sus miembros y sus resoluciones serán validas cuando se adopten por mayoría de los consejeros presentes. En caso de empate el Presidente del Consejo decidirá con voto de calidad. De cada sesión se levantará un Acta que será firmada por el Presidente y el Secretario y será asentada en el Libro que al efecto se lleve. Si el Presidente no asiste a la sesión, ésta será presidida por el Consejero que siga en orden jerárquico y en su defecto, por el Consejero que designe por mayoría de votos. ----------

En los términos del Artículo 143 (ciento cuarenta y tres) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las resoluciones tomadas por el Consejo de Administración fuera de sesión de Consejo, para todos los efectos legales, tendrán la misma validez que si se hubieren adoptado en sesión de Consejo, siempre y cuando las mismas se tomen por unanimidad de votos de los miembros del Consejo y éstas se confirmen por escrito. ----------

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- DERECHO DE MINORIAS: Cuando la sociedad sea administrada por un Consejo de Administración, cualquier accionista o grupo de accionistas que representen cuando menos el 25% (veinticinco por ciento) del capital social tendrá derecho a designar: Un Consejero y un Comisario.----------

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- FACULTADES DE LOS ADMINISTRADORES: El Administrador Único, o en su caso, el Consejo de Administración, tendrán la representación de la Sociedad, pudiendo realizar todas las operaciones inherentes al objeto social; en forma enunciativa y no limitativa, gozará (n) de las siguientes facultades: ----------

COTEJADO
COPIA COTEJADA

A. Representar a la sociedad con facultades para **Pleitos y cobranzas**, con todas las facultades generales y las especiales que requieran poder o Cláusula Especial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) primer párrafo y 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil Federal, estando facultado especialmente pero sin hacer limitación alguna para: ----------

UNO. Representar a la sociedad ante personas físicas, morales y ante toda clase de Autoridades Administrativas o Judiciales de cualquier fuero, sean éstas Civiles, Penales, Administrativas o Autoridades del Trabajo, tanto en el orden Federal como Local, en toda la extensión de la Republica Mexicana o en el Extranjero, en Juicio o fuera de él.- DOS. Promover toda clase de Juicios, incluyendo los de amparo, seguirlos en todos sus tramites y desistirse de ellos; TRES. Interponer toda clase de recursos, en las instancias y ante las autoridades que procedan; CUATRO. Contestar las demandas que se interpongan en contra de la Sociedad y seguir los Juicios por sus demandas trámites legales; CINCO. Reconocer firmas, documentos y redargüir de falsos los que se presenten por la contraria; SEIS.- Presentar testigos, ver protestar a los de la contraria, tacharlos y repreguntarlos; SIETE. Articular y absolver posiciones; OCHO. Transigir y comprometer en árbitros; NUEVE. Recusar Funcionarios Judiciales, sin causa, con causa o bajo protesta de Ley; DIEZ. Solicitar el remate de bienes y nombrar peritos; ONCE. Recibir valores, otorgar recibos y cartas de pago; DOCE. Formular y presentar denuncias, querellas o acusaciones, coadyuvar con el Ministerio Público en Procesos Penales, y otorgar perdones cuando a su juicio lo amerite y legalmente proceda; TRECE. Representar a la sociedad e los juicios o procedimientos laborales con la calidad jurídica y las facultades prescritas en los artículos 11 (once), 692 (seiscientos noventa y dos), fracciones II (segunda) y III (tercera), 694 (seiscientos noventa y cuatro), 695 (seiscientos noventa y cinco), 786 (setecientos ochenta y seis), y 899 (ochocientos noventa y nueve), en relación a lo aplicable con las normas de los capítulos XII (Duodécimo) y XVII (Décimo Séptimo), así como el artículo 14 (catorce) y demás disposiciones relativas de la Ley Federal del Trabajo vigente en el País; ------

B. Administrar los bienes y los negocios de la Sociedad con facultades para **Actos de Administración**, en términos del párrafo Segundo del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y en consecuencia todas las operaciones administrativas, de dirección, operación y corporativas de la empresa inherentes al objeto de la sociedad y autorizando por lo tanto, pero sin que constituya limitación alguna al mandato a que se refiere el presente punto, para: UNO. Nombrar y remover a director (es), gerente (s) secundario (s); subgerente(s), apoderado(s), agente(s), empleado(s), de la sociedad determinando sus atribuciones, condiciones de Trabajo y remuneraciones, dejando a salvo el derecho que corresponda a la asamblea General para la designación de Administradores Generales o Especiales con las facultades y el otorgamiento de sus atribuciones; DOS. Celebrar

COTEJADO

Corredor Público Número 5
Plaza Estado de Guerrero

ordinarias, especiales o extraordinarias de socios, ejercitar sus acuerdos y en general llevar a cabo todos los actos y operaciones que fueren necesarias o convenientes para los fines y derechos de la Sociedad, con excepción de los expresamente reservados por la Ley o por estos Estatutos a la Asamblea General de Accionistas. ----------

C. Facultades para celebrar y ejecutar Actos de Dominio respecto de los bienes y derechos de la sociedad, sin limitación alguna, en los términos del párrafo tercero del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal. ----------

D. Facultades cambiarias, en los términos de los artículos 9 (noveno) y 85 (ochenta y cinco) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pudiendo en consecuencia otorgar, suscribir, acepta, avalar, endosar y negociar toda clase de Títulos de Crédito a nombre de la sociedad y realizar en, o con los propios títulos las operaciones de crédito que regula la ley de la Materia, abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de la sociedad, autorizar personas que giren a cargo de las mismas, revocar dichas autorizaciones y adquirir participaciones en el capital de otras sociedades; celebrar todo tipo de contratos y convenios de crédito ya sea con particulares o con instituciones bancarias tanto en la Republica Mexicana como en el Extranjero, estando facultado para comprometer los bienes de la sociedad como garantía de pago de dichos créditos. Las enumeraciones anteriores son de carácter enunciativo y por lo tanto no limitativo. El órgano de Administración para delegar sus facultades en una o varias personas, señalándoseles sus atribuciones para que las ejerciten en los términos correspondientes. ----------

E. Facultades Generales para **Delegar Total o Parcialmente las Facultades** anteriores por lo cual expresamente se le autoriza desde el otorgamiento de la presente póliza para llevar a cabo dichos actos, nombramientos y delegaciones en los términos más amplios que en derecho corresponda. ----------

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA: De conformidad con el artículo 158 (ciento cincuenta y ocho) de la Ley General de Sociedades Mercantiles los administradores son solidariamente responsables para con la sociedad: a) De la realidad de las aportaciones hechas por los socios; b) Del cumplimiento de los requisitos legales y estatuarios establecidos con respecto a los dividendos que se paguen a los accionistas; c) De la existencia y mantenimiento de los sistemas de contabilidad, control, registro, archivo o información que previene de la Ley; d) Del exacto cumplimiento de los acuerdos de las Asambleas de Accionistas. ----------

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- FACULTADES DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACCIÓN: Cuando la Sociedad sea administrada por un Consejo de Administración, su Presidente será el representante legal del propio Consejo y el ejecutor de sus resoluciones sin necesidad de acuerdo especial por el cual se le instruya sobre la ejecución de tales resoluciones. Por el sólo hecho de su nombramiento, el Presidente del Consejo de

COTEJADO COPIA COTEJADA

000009

para pleitos y cobranzas, ya sean generales o especiales, aún las que conforme a la Ley requerirán cláusula especial en los términos de los primeros párrafos del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal, inclusive las necesarias para suscribir Títulos de Crédito, para otorgar poderes generales o especiales dentro de sus facultades y para desistirse aun del Juicio de Amparo. ----------

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- GERENTES: La Asamblea Ordinaria de Accionistas, el Consejo de Administración o el Administrador Único podrán nombrar uno o varios Gerentes Generales o Especiales, los que podrán ser o no Accionistas, y que tendrán las facultades y obligaciones que el propio Administrador Único, el Consejo de Administración o la Asamblea les señalen al hacer sus nombramientos y otorgarles los poderes necesarios. Dichos funcionarios durarán en su cargo hasta que se les revoquen sus nombramientos. ----------

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- GARANTÍAS: En los términos de los artículos 152 (ciento cincuenta y dos) y 153 (ciento cincuenta y tres) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Administrador Único o el Consejo de Administración en su caso, los Gerentes y demás funcionarios de la Sociedad, al entrar en funciones no tendrán la obligación de prestar garantía alguna para asegurar las responsabilidades que pudieran contraer en el desempeño de sus cargos, a menos que la Asamblea General de Accionistas determine lo contrario. En este último supuesto los Consejeros y Comisarios podrán garantizar el desempeño de sus funciones con una fianza o depósito, en caso de que así lo determinen expresamente los Accionistas, debiendo depositarse la garantía correspondiente en la Tesorería de la Sociedad y no podrá ser cancelada hasta que la Asamblea de Accionistas haya aprobado el desempeño de sus funciones durante su cargo. ----------

CAPÍTULO CUARTO. DE LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD ----------

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. VIGILANCIA: La vigilancia de la Sociedad estará a cargo de uno o más Comisarios designados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.----------

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- COMISARIOS: Los Comisarios podrán ser o no Accionistas de la Sociedad, estarán en funciones hasta que sean removidos por la Asamblea Ordinaria de Accionistas y podrán ser reelectos, continuando en ejercicio de sus cargos hasta que tomen posesión las personas designadas para substituirlos. ----------

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- IMPEDIMENTOS PARA SER COMISARIO: No podrán ser comisarios: a) Los que conforme a la Ley estén inhabilitados para ejercer el comercio, los empleados de la sociedad, los empleados de aquellas sociedades que sean accionistas de esta sociedad por más de un 25 % (veinticinco por ciento) del capital social ni los empleados de aquellas sociedades de las que ésta sea accionista en más de un 50 % (cincuenta por ciento). b) Los parientes consanguíneos de los Administradores en línea recta sin limitación de grado, los colaterales dentro del cuarto grado y los afines dentro del segundo. ----------

COTEJADO

000010

Corredor Público Número 5
Plaza Estado de Guerrero

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- FACULTADES Y OBLIGACIONES: Son facultades y obligaciones de los comisarios: ----------

A. Cerciorarse de la Constitución y subsistencia de la garantía a que se refiere el artículo Décimo Octavo de estos estatutos. ----------

B. Realizar un examen de las operaciones, documentación, registros y demás evidencias comprobatorias en el grado y extensión que sean necesarias para efectuar la vigilancia de las operaciones que la Ley les impone y para rendir el dictamen que se menciona en el siguiente apartado. ----------

C. Rendir anualmente a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas un informe respecto a la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la documentación presentada por los Administradores a la propia As. a de Accionistas. Este informe deberá contener por lo menos:----------

UNO. La opinión del comisario sobre si las políticas y criterios contables y de información seguidos por la sociedad son adecuados y suficientes tomando en cuenta las circunstancias particulares de la sociedad. ----------

DOS. La opinión del comisario respecto a la información presentada por los Administradores, en cuanto a la aplicación de criterios previamente establecidos. ----------

TRES. La opinión del comisario sobre si, como consecuencia de lo anterior, la información presentada por los Administradores refleja en forma veraz y suficiente la situación financiera y los resultados de la sociedad.----------

D. Deberá cerciorarse de la constitución y subsistencia de las garantías, en su caso, que pudiera decretar la Asamblea de Accionistas al Administrador Único, a los miembros del Consejo de Administración en su caso, o a los Gerentes y demás funcionarios de la sociedad, para asegurar sus responsabilidades en el desempeño de sus cargos. ----------

E. Las demás a que se refieren los párrafos quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno del artículo 166 (ciento sesenta y seis) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ----------

CAPÍTULO QUINTO. DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS----------

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS: La Asamblea General de Accionistas legalmente instalada es el órgano supremo de la sociedad y sus decisiones obligan aun a los ausentes y disidentes, salvo el derecho de oposición a que se refiere el artículo 201 (doscientos uno) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ----------

Para que los Accionistas tengan derecho de asistir a las Asambleas, deberán presentar en ellas los títulos de sus acciones. También podrán depositarlos en la Secretaría de la Sociedad; en una Institución de Crédito de la República o del Extranjero o ante Corredor Público en términos del artículo 205 (doscientos cinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En estos casos, en lugar de los títulos de las acciones presentarán en la asamblea el certificado expedido

COTEJADO
COPIA COTEJADA

000011

por la Secretaría de la Sociedad; por la Institución de Crédito o por el Corredor Público que compruebe el depósito, documento en el cual deberán constar los números de las acciones. ——

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- CLASES DE ASAMBLEAS: La Sociedad podrá celebrar asambleas generales, especiales o totalitarias. Las Asambleas Generales de Accionistas serán ordinarias y extraordinarias. Todas serán ordinarias salvo las que se reúnan para tratar cualquier asunto de los comprendidos en el artículo 182 (ciento ochenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las cuales serán extraordinarias. ——————————

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- ASAMBLEAS ORDINARIAS: Las Asambleas Ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año dentro de los 4 (cuatro) meses siguientes a la clausura del ejercicio social y se ocuparán, además de los asuntos incluidos en la orden del día, de lo siguiente: ——————————

A. Discutir, aprobar o modificar el Informe de los Administradores a que se refiere el artículo Trigésimo Cuarto de los Estatutos, tomando en cuenta el informe de los Comisarios y tomar las medidas que juzguen oportunas. ——————————

B. En su caso nombrar y/o remover al Administrador único o Consejo de Administración y a los Comisarios. ——————————

C. Determinar los emolumentos correspondientes a los Administradores y Comisarios. ——————

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- CONVOCATORIA: La convocatoria para los Asambleístas Generales de Accionistas deberá hacerse por el Administrador Único, por el Consejo de Administración o por los Comisarios, sin embargo, los accionistas que representen por lo menos el 33 % (treinta y tres por ciento) del Capital Social, podrán pedir por escrito en cualquier tiempo al Consejo de Administración, al Administrador Único o a los Comisarios, que convoquen a una Asamblea General de Accionistas para tratar los asuntos que indiquen en su petición. El mismo derecho tendrá el titular de una acción en los casos a que se refiere el artículo 185 (ciento ochenta y cinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Si el Administrador Único, el Consejo de Administración o los Comisarios no hacen la convocatoria dentro de los 15 (quince) días siguientes a la fecha de la solicitud, la hará el juez de lo civil o del Distrito del domicilio de la Sociedad, a pedimento de los interesados, quienes al efecto deberán acreditar su calidad de Accionistas. ——————————

La convocatoria para las Asambleas deberá hacerse mediante una publicación en el periódico oficial o alguno de los de mayor circulación, del domicilio de la sociedad, por lo menos con una anticipación de 15 (quince) días a la fecha de la Asamblea. ——————————

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- ASAMBLEAS TOTALITARIAS: Podrá celebrarse una Asamblea sin el requisito de la publicación de la convocatoria y serán validas las resoluciones que en ella se adopten, en los siguientes casos: ——————————

A. Cuando al momento de levantar la lista de asistencia de la Asamblea esté representada la

COTEJADO CON EL ORIGINAL

Corredor Público Número 5
Plaza Estado de Guerrero

B. Cuando se reúna una Asamblea como continuación de otra anterior y en ella se hayan señalado día y hora para continuarla, siempre y cuando no se traten más asuntos que los indicados en la primera convocatoria. ----------

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- REPRESENTACIÓN: Los Accionistas tendrán derecho a hacerse representar en las Asambleas por la persona o personas que designen mediante simple carta poder firmada por el interesado y dos testigos. ----------

Los accionistas no podrán ser representados por ninguno de los Administradores o Comisarios.

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- ACTAS DE ASAMBLEA: Las actas de las Asambleas se asentarán en el Libro respectivo y serán firmadas por el Presidente y el Secretario de la Asamblea así como por los Comisarios que asistan. Deberán de cumplir con los requisitos a que se refiere el articulo 41 (cuarenta y uno) del Código de Comercio en vigor. ----------

ARTÍCULO TRIGESIMO.- PRESIDENTE Y SECRETARIO DE ASAMBLEAS: Las Asambleas serán presididas por el Administrador Único o por el Presidente del Consejo de Administración, según sea el caso, y a falta de él, por la persona que designen los asistentes por mayoría de votos. Fungirá como Secretario el del propio Consejo y en su defecto, la persona que elijan los asistentes por mayoría de votos. ----------

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- QUÓRUM: Para que una Asamblea Ordinaria de Accionistas que se celebre en virtud de primera Convocatoria sea válida, será necesario que en ella este representado por lo menos el 51 % (cincuenta y uno por ciento) del capital social y las resoluciones serán validas cuando se tomen por el voto favorable de la mayoría de las acciones representadas. ----------

Para que las Asambleas Extraordinarias reunidas en virtud de primera convocatoria sean validas, será necesario que éste representado por lo menos el setenta y cinco por ciento del capital social y que las resoluciones se tomen por el voto favorable de las acciones que representen por lo menos el cincuenta y uno por ciento del capital social. ----------

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- RESOLUCIONES TOMADAS FUERA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS: En los términos del segundo párrafo del artículo 178 (ciento setenta y ocho) de la Ley Ge[illegible] de Sociedades Mercantiles, las resoluciones tomadas por los Accionistas fuera de Asamblea de Accionistas, tendrán para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas reunidos en Asamblea General, Especial o Totalitaria, respectivamente, siempre y cuando las mismas sean tomadas por unanimidad de votos de los accionistas que representen la totalidad de las acciones con derecho a voto o de la categoría especial de las acciones de que se trate, y que dichas resoluciones se confirmen por escrito. ----

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.- ASAMBLEAS EN SEGUNDA CONVOCATORIA: Si las

COTEJADO COPIA COTEJADA

000013

convocatoria y las Asambleas decidirán sobre los puntos contenidos en el orden del día, cualquiera que sea el número de acciones representadas, excepto en el caso de las Asambleas Extraordinarias, en las que siempre se requerirá el voto favorable de las Acciones que representen por lo menos el **51% (cincuenta y uno por ciento)** del capital social. ----------

CAPÍTULO SEXTO. INFORMACIÓN FINANCIERA----------

ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.- REQUISITOS DEL INFORME: La Sociedad por conducto y bajo la responsabilidad de sus Administradores presentará a la Asamblea de Accionistas anualmente un informe que incluirá por lo menos: ----------

A. Información sobre la marcha de la sociedad en el ejercicio, así como sobre las políticas seguidas por los Administradores y, en su caso sobre los principales proyectos existentes; ----

B. Información sobre las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de los estados financieros; ----------

C. Un estado que muestre la situación financiera de la sociedad a la fecha de cierre del ejercicio; ----------

D. Un estado que muestre debidamente explicados y clasificados los estados de la sociedad durante el ejercicio; ----------

E. Un estado que muestre los cambios en la situación financiera durante el ejercicio; ----------

F. Un estado que muestre los cambios en las partidas que integran el patrimonio social;----------

Las notas y comentarios que sean necesarias para completar o aclarar la información que suministren los estados anteriores. ----------

A la información anterior se agregará el informe de los Comisarios a que se refiere el párrafo tercero del artículo vigésimo segundo de estos estatutos. ----------

El informe a que se refiere este Artículo, incluido el informe de los Comisarios deberá quedar terminado y ponerse a disposición de los accionistas por lo menos 15 (quince) días antes de la fecha de la Asamblea que haya de discutirlo. ----------

Los accionistas tendrán derecho a que se les entregue una copia del informe correspondiente. —

ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO.- UTILIDADES: Las utilidades que resulten se distribuirán en la siguiente forma. ----------

A. Se separará un 5% (cinco por ciento) cuando menos, para constituir y reconstruir el fondo de reserva legal, hasta que éste alcance el 20% (veinte por ciento) del capital social. ----------

B. Se separarán las cantidades que determine la Asamblea para crear fondos especiales de reserva, de previsión o de reinversión. ----------

C. Se separará la cantidad que corresponda a los empleados y trabajadores por reparto de utilidades en los términos de la Ley Federal del Trabajo. ----------

COTEJADO

000014

Corredor Público Número 5
Plaza Estado de Guerrero

D. El remanente se distribuirá entre todos los accionistas en proporción al monto de sus aportaciones o de acuerdo a lo que determine la asamblea. ———

La distribución de utilidades sólo podrá hacerse después de que hayan sido debidamente aprobados por la Asamblea General de Accionistas, los estados financieros que arrojen. ———

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO.- PÉRDIDAS: Las pérdidas si las hubiere, serán soportadas por las reservas y a falta de ellas por todas las acciones por partes iguales hasta la concurrencia de su valor nominal. ———

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES: No podrá hacerse distribución de utilidades mientras no hayan sido restituidas o absorbidas, mediante aplicación de otras partidas del patrimonio, las pérdidas sufridas en uno o varios ejercicios anteriores o haya sido reducido el capital social. ———

ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO.- FUNDADORES: Los socios fundadores no se reservan ninguna participación especial en la sociedad por su carácter de fundadores. ———

CAPÍTULO SÉPTIMO. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD———

ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN: La sociedad se disolverá en cualquiera de los casos establecidos en el artículo 229 (doscientos veintinueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ———

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO.- LIQUIDADORES: Disuelta la sociedad, se pondrá en liquidación, la cual estará a cargo de uno o más Liquidadores, nombrados por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas. Si la Asamblea no hace la designación de Liquidadores la hará un Juez de lo Civil o de Distrito del Domicilio de la Sociedad a pedimento de cualquier accionista. –

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO.- BASES DE LIQUIDACIÓN: Salvo las instrucciones expresas que la Asamblea que decrete la disolución dé a los Liquidadores, la liquidación se practicará de conformidad con las siguientes bases generales: ———

A. Conclusión de los negocios pendientes en la forma menos perjudicial para los acreedores y los accionistas. ———

B. Formulación del balance e inventarios generales. ———

C. Cobro de créditos y pago de deudas. ———

D. Enajenación de los bienes de la sociedad y aplicación del producto a los fines de la liquidación. ———

E. Distribución del remanente, si lo hubiere, entre los accionistas en proporción a sus acciones.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS———

COPIA COTEJADA

000015

PRIMERO: Los ejercicios sociales correrán de primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año, sin embargo el primer ejercicio será irregular y correrá de la fecha de firma de este instrumento al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve. ----------

SEGUNDO: El capital social mínimo fijo queda íntegramente suscrito y pagado de la siguiente forma: CINCUENTA ACCIONES CON VALOR DE UN MIL PESOS CADA UNA, QUE INTEGRAN EL CAPITAL SOCIAL MÍNIMO EN CANTIDAD DE CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL. Los suscritos comparecientes manifiestan que han pagado en efectivo la totalidad de sus respectivas suscripciones y que dicho pago se encuentra en poder de la Tesorería de la sociedad, en cumplimiento a los artículos ochenta y nueve y noventa y uno fracción primera de la Ley General de Sociedades Mercantiles, quedando distribuido el capital social mínimo antes referido, de la siguiente manera: **CAPITAL SOCIAL FIJO.- ACCIONISTA.- IRINA SALGADO HERNANDEZ.-** ACCIONES.- VEINTICINCO ACCIONES DE LA SERIE A, CON VALOR DE UN MIL PESOS POR CADA ACCIÓN.- VALOR TOTAL DE LAS ACCIONES.- $25,000.00 (VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).- **ACCIONISTA.- MARCIAL MIGUEL VELASCO MARTINEZ.-** ACCIONES.- VEINTICINCO ACCIONES DE LA SERIE A, CON VALOR DE UN MIL PESOS POR CADA ACCIÓN.- VALOR TOTAL DE LAS ACCIONES.- $25,000.00 (VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).- **TOTAL DE CAPITAL SOCIAL FIJO.-** CINCUENTA ACCIONES DE LA SERIE A, CON VALOR DE UN MIL PESOS MONEDA NACIONAL CADA UNA Y UN VALOR TOTAL DE $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL). ----------

TERCERO: Los comparecientes constituidos en asamblea general constitutiva de accionistas acuerdan lo siguiente:----------

I. Que la Sociedad sea dirigida por un ADMINISTRADOR ÚNICO que será la señora **IRINA SALGADO HERNANDEZ,** quien gozará de las facultades enumeradas en los artículos décimo cuarto y décimo sexto de los Estatutos de la Sociedad, las cuales se tienen por reproducidas aquí como si se insertasen a la letra. El ADMINISTRADOR ÚNICO designado se encuentra presente en este acto y acepta su nombramiento y las atribuciones inherentes a su cargo. ------

II. Se designa Comisario de la Sociedad al señor **MARTÍN LÓPEZ PEÑA.** Los comparecientes manifiestan bajo protesta de decir verdad que el **COMISARIO** designado, ha aceptado el cargo que le fue conferido.----------

III. La asamblea exonera a los funcionarios designados, de garantizar el fiel desempeño de su cargo, en términos de lo dispuesto por el artículo décimo octavo de los estatutos sociales. ------

CUARTO: Los accionistas se someten a las Leyes y Tribunales del Estado de Guerrero, para la interpretación y cumplimiento del contenido del presente instrumento y aceptan las restricciones que se contienen en el permiso a que se refieren los antecedentes del presente instrumento

COTEJADO

Corredor Público Número 5
Plaza Estado de Guerrero

QUINTO: Los gastos, honorarios, impuestos y derechos que se causen con motivo del otorgamiento, firma e inscripción en el Registro Público de Comercio de este instrumento, serán por cuenta de la Sociedad Mercantil, cuya constitución que en él se consigna. En virtud de lo anterior, se releva a la suscrita Corredor Público de la realización de trámites, gestiones y demás obligaciones relacionadas con la inscripción del presente instrumento en el Registro Público de Comercio y/o cualesquier otra dependencia gubernamental que corresponda al domicilio de la sociedad mercantil que en el presente instrumento se constituye.----------

ADVERTENCIAS----------

La suscrita Corredor Público advertí a los comparecientes:----------

PRIMERA: Que de acuerdo con el artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación, en el plazo de treinta días contados a partir de la firma del presente instrumento, deberá ser inscrita esta sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes y justificarlo así a la suscrita Corredor Público, de otra forma, se dará el aviso a que se refiere dicho precepto. ----------

SEGUNDA: De la obligación de dar aviso del uso de permiso de denominación a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los seis meses siguientes a la expedición del mismo, de conformidad con lo que establece el artículo 18 (dieciocho) del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. ----------

TERCERA: Que solicité a los comparecientes su cédula de identificación fiscal, quienes no la presentaron y les advertí a que deberán acreditarme haber presentado la solicitud como socios o accionistas de la sociedad ante el Registro Federal de Contribuyente, la clave de cada uno de ellos, dentro de los siguientes treinta días naturales a la fecha de firma del presente instrumento y que en caso de no exhibirme dicha solicitud, procederé a dar aviso correspondiente a las autoridades fiscales competentes.----------

CUARTA: Que deberá ser inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Guerrero el primer original que se levante de la presente póliza, para los efectos del artículo segundo de la Ley General de Sociedades Mercantiles, previo pago de los derechos correspondientes.----------

Enterados los comparecientes de las anteriores advertencias y estando de acuerdo en firmar el presente instrumento, en términos del artículo seis fracción sexta (romano) de la Ley Federal de Correduría Pública, artículos sexto, cincuenta y tres fracción quinta (romano) y cincuenta y cuatro del Reglamento de la Ley Federal de Correduría Pública ,de los artículos diez, ciento cuarenta y cinco, ciento cuarenta y seis y ciento cuarenta y siete de la Ley General de Sociedades Mercantiles. del artículo dos del Código de Comercio y de los artículos primero,

COTEJADO
COPIA COTEJADA

000017

veintisiete, veintiocho y dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, por sus instrucciones expresas, copio en su parte conducente lo que es del tenor literal siguiente: ------

INSERCIÓN----------

LEY FEDERAL DE CORREDURIA PÚBLICA.----------

"ARTICULO SEXTO. Al corredor público corresponde: ... VI. Actuar como fedatario en la constitución y en los demás actos previstos por la Ley General de Sociedades Mercantiles incluso aquellos en los que se haga constar la representación orgánica;... VIII. Las demás funciones que le señalen ésta y otras leyes o reglamentos"----------

REGLAMENTO DE LA CORREDURIA PÚBLICA. ----------

"ARTICULO SEXTO. Para efectos de las fracciones quinta (romano), sexta (romano) y séptima (romano) del artículo sexto de la Ley, cuando en las leyes y reglamentos se haga referencia a "notario o fedatario público" "escritura", "protocolo" y "protocolización", se entenderá que se refiere a "corredor público", a la "póliza expedida por corredor", a cualquier "libro de registro del corredor", y al hecho de "asentar algún acto en los libros de registro del corredor", respectivamente".- "ARTICULO CINCUENTA Y TRES. El corredor en el ejercicio de sus funciones como fedatario público, podrá intervenir:..V (QUINTA ROMANO). En la Constitución, modificación, transformación, fusión, escisión, disolución, liquidación y extinción de sociedades mercantiles, así como en la designación de sus representantes legales y facultades de que estén investidos...".- "ARTICULO CINCUENTA Y CUATRO. Las pólizas y actas expedidas por el corredor en el ejercicio de sus funciones, inclusive aquéllas en que se haga constar la designación y facultades de presentación en las sociedades mercantiles de conformidad con la ley de la materia, se deberán admitir para su inscripción en el Registro de la Propiedad y del Comercio, siempre que dichos instrumentos cumplan con los requisitos legales. ..." ----------

LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. ----------

"ARTICULO DÉCIMO. La representación de toda sociedad mercantil corresponderá a su administrador o administradores, quienes podrán realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, salvo lo que lo que expresamente establezca la ley el contrato social. Para que surtan efectos los poderes que otorgue la sociedad mediante acuerdo de la asamblea o del órgano colegiado de administración, en su caso, bastará con la protocolización ante notario de la parte del acta en que conste el acuerdo relativo a su otorgamiento, debidamente firmada por quienes actuaron como presidente o secretario de la asamblea o del órgano de administración según corresponda, quienes deberán firmar el instrumento notarial, o en su defecto lo podrán firmar el delegado especialmente designado para ello en sustitución de los anteriores. El notario, hará constar en el instrumento correspondiente, mediante la relación, inserción o el agregado al apéndice de las certificaciones, en lo conducente, de los documentos que al efecto se le exhiban, la denominación o razón social de la sociedad, su domicilio, duración, importe del capital social y objeto de la misma, así como las facultades que conforme a sus estatutos le correspondan al órgano que acordó el otorgamiento del poder y, en su caso, la designación de los miembros del órgano de administración. Si la sociedad otorgare el poder por conducto de una persona distinta a los órganos mencionados, en adición a la relación o inserción indicadas en el párrafo anterior, se deberá dejar acreditado que dicha persona tiene las facultades para ello. ARTICULO CIENTO

COTEJADO

Corredor Público Número 5
Plaza Estado de Guerrero

CUARENTA Y CINCO.- La Asamblea General de Accionistas, el Consejo de Administración o el Administrador, podrá nombrar uno o varios Gerentes Generales o Especiales, sean o no accionistas. Los nombramientos de los Gerentes serán revocables en cualquier tiempo por el Administrador o Consejo de Administración o por la Asamblea General de Accionistas.- ARTICULO CIENTO CUARENTA Y SEIS.- Los Gerentes tendrán las facultades que expresamente se les confieran; no necesitarán de autorización especial del Administrador o Consejo de Administración para los actos que ejecuten y gozarán, dentro de la órbita de las atribuciones que se les hayan asignado, de las más amplias facultades de representación y ejecución.- ARTICULO CIENTO CUARENTA Y SIETE.- Los cargos de Administrador o Consejero y de Gerente, son personales y no podrán desempeñarse por medio de representante. ...".- ----------

CODIGO DE COMERCIO----------

"ARTICULO SEGUNDO. A falta de disposiciones de este ordenamiento y las demás Leyes Mercantiles, serán aplicables a los actos de comercio las del derecho común contenidas en el Código Civil aplicable en materia federal. ..." ----------

CODIGO CIVIL FEDERAL.----------

ARTICULO PRIMERO. Las disposiciones de este Código regirán en toda la República en asuntos del orden federal". ----------

ARTÍCULO 27: Las personas morales obran y se obligan por medio de los órganos que las representan, sea por disposición de la ley o conforme a las disposiciones relativas a sus escrituras constitutivas y de sus estatutos.- ARTÍCULO 28: Las personas morales se regirán por las leyes correspondientes, por su escritura constitutiva y por sus estatutos.- ARTÍCULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO. En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo en los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales.- Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen. ----------

G E N E R A L E S----------

Los comparecientes manifestaron de manera expresa, bajo protesta de decir verdad y advertidos por el Corredor actuante de las responsabilidades, sanciones y penas de carácter civil y penal en que incurren quienes declaran en falsedad y/o atentan contra la fe pública, en términos del artículo ciento treinta de la Constitución Política, por sus generales manifestaron ser: ----------

La señora **IRINA SALGADO HERNANDEZ,** de nacionalidad mexicana, originaria de Acapulco, Guerrero, donde nació el día veintitrés de agosto de mil novecientos sesenta y siete, soltera,

COTEJADO COPIA COTEJADA

000019

Colonia Progreso, Código postal treinta y nueve mil trescientos cincuenta, en Acapulco, Guerrero, y con clave del Registro Federal de Contribuyentes SAHI670823SN0 (S, A, H, I, seis, siete, cero, ocho, dos, tres, S, N, cero), se manifiesta al corriente en el pago del impuesto sobre la renta sin acreditarlo, quien se identifica con su credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral con clave de elector SLHRIR67082312M900 (S, L, H, R, I, R, seis, siete, cero, ocho, dos, tres, uno, dos, M, nueve, cero, cero), que, previa verificación en la lista nominal del sitio www.ife.org.mx, se agrega en copia autorizada a la relación de identidad del archivo oficial a mi cargo correspondiente al presente instrumento.----------

El señor **MARCIAL MIGUEL VELASCO MARTINEZ,** de nacionalidad mexicana, originario de Acapulco, Guerrero, donde nació el día seis de abril del año mil novecientos sesenta y seis, soltero, Arquitecto, con domicilio en Calle Quebrada, número sesenta y siete "A", Colonia Centro, Código Postal treinta y nueve mil trescientos, en Acapulco, Guerrero, y con clave del Registro Federal de Contribuyentes VEMM660406119 (V, E, M, M, seis, seis, cero, cuatro, cero, seis, uno, uno, nueve), se manifiesta al corriente en el pago del impuesto sobre la renta sin acreditarlo, quien se identifica con su credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral con clave de elector VLMRMR66040612H301 (V, L, M, R, M, seis, seis, cero, cuatro, cero, seis, uno, dos, H, tres, cero, uno) que, previa verificación en la lista nominal del sitio www.ife.org.mx, se agrega en copia autorizada a la relación de identidad del archivo oficial a mi cargo correspondiente al presente instrumento.----------

YO EL CORREDOR PÚBLICO, CERTIFICO----------

PRIMERO: Que se solicitó y obtuvo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el permiso que agrego al archivo correspondiente y que se relaciona en los antecedentes del presente instrumento. ----------

SEGUNDO: Que lo relacionado y agregado en copia cotejada al archivo a mi cargo concuerda fielmente con los originales que tuve a la vista y a los cuales me remito en términos de la fracción cuarta del artículo diecinueve de la Ley Federal de Correduría Pública. ----------

TERCERO: Que me cercioré de la identidad de los comparecientes y señalé el medio a través del cual se identificaron, quienes sin que me conste nada en contrario, tienen a mi juicio capacidad legal para contratar y obligarse toda vez que no encuentro en ellos manifestaciones evidentes de incapacidad natural y no tengo noticias de que estén sujetos a interdicción, en términos de la fracción cuarta del artículo quince y fracción sexta y segundo párrafo de la fracción novena del artículo treinta y dos del Reglamento de la Ley Federal de Correduría Pública.----------

CUARTO: Que habiéndoles leído íntegro el presente instrumento y explicado el valor y efectos jurídicos de su contenido a los comparecientes, manifestando su conformidad con el mismo y

COTEJADO

Corredor Público Número 5
Plaza Estado de Guerrero

firman en mi presencia, el día que se indica después de sus respectivos nombres, ante la suscrita Corredor Público, quien **AUTORIZA Y DA FE.** ----------

FIRMAS----------

IRINA SALGADO HERNANDEZ, por su propio derecho. Firma el día dieciséis de diciembre del dos mil nueve.- Rubrica. ----------

MARCIAL MIGUEL VELASCO MARTINEZ, por su propio derecho. Firma el día dieciséis de diciembre del dos mil nueve.- Rubrica.----------

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES, CONTRACTUALES Y ESTATUTARIOS CORRESPONDIENTES, AUTORIZO Y EXPIDO LA PRESENTE PÓLIZA CONSTANTE DE DIEZ FOJAS ÚTILES, NUEVE DE ELLAS ESCRITAS POR AMBOS LADOS Y LA ÚLTIMA ESCRITA POR UN SOLO LADO. EN EL LUGAR Y FECHA DE SU OTORGAMIENTO. ACAPULCO, GUERRERO A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE. DOY FE.- SHUNASHI JAZMÍN ALTAMIRANO PINEDA.- CORREDOR PÚBLICO NÚMERO CINCO DE LA PLAZA DEL ESTADO DE GUERRERO.- FIRMA Y SELLO DE AUTORIZAR.----------

LA SUSCRITA, LICENCIADA SHUNASHI JAZMÍN ALTAMIRANO PINEDA, TITULAR DE LA CORREDURÍA PÚBLICA NÚMERO CINCO DE LA PLAZA DEL ESTADO DE GUERRERO, **CERTIFICA Y HACE CONSTAR:** ----------

QUE LA PRESENTE CORRESPONDE Y PROVIENE DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO OFICIAL A MI CARGO Y SE EXPIDE COMO PRIMERA PÓLIZA ORIGINAL PRIMERA EN SU ORDEN, PARA LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA **IMEXA CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,** A FIN DE QUE LE SIRVA PARA TODOS LOS USOS Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. VA EN DIEZ FOJAS ÚTILES, NUEVE DE ELLAS ESCRITAS POR AMBOS LADOS Y LA ÚLTIMA ESCRITA POR UN SOLO LADO. ACAPULCO, GUERRERO DIECISÉIS DE DICIEMBRE DEL DOS MIL NUEVE. ----------

SHUNASHI JAZMÍN ALTAMIRANO PINEDA
CORREDOR PÚBLICO NÚMERO CINCO DE LA PLAZA DEL ESTADO DE GUERRERO.

COTEJADO
COPIA COTEJADA

000021

SIN TEXTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
DIRECCIÓN DE PERMISOS ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL
DELEGACIÓN DE LA S.R.E.

PERMISO 1202934
EXPEDIENTE 20091202775
FOLIO 091211121002

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 27, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28, fracción V de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 13, 14 y 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, y en atención a la solicitud presentada por el (la) Sr(a). **SHUNASHI JAZMIN ALTAMIRANO PINEDA**, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46 fracción I inciso a) del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores en vigor, se concede el permiso para constituir una **SA DE CV** bajo la siguiente denominación:

IMEXA CONSTRUCTORES

Este permiso, quedará condicionado a que en los estatutos de la sociedad que se constituya, se inserte la cláusula de exclusión de extranjeros o el convenio previsto en la fracción I del Articulo 27 Constitucional, de conformidad con lo que establecen los artículos 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 14 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Cabe señalar que el presente permiso se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Este permiso quedará sin efectos si dentro de los noventa días hábiles siguientes a la fecha de otorgamiento del mismo, los interesados no acuden a otorgar ante fedatario público el instrumento correspondiente a la Constitución de que se trata, de conformidad con lo establecido por el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

Asimismo, el interesado deberá dar aviso del uso de la denominación que se autoriza mediante el presente permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los seis meses siguientes a la expedición del mismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 del Reglamento de la Ley de inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

Acapulco, Gro. a 14 de diciembre de 2009

000023

EL DELEGADO

EMBAJADOR EDMUNDO PONT

COPIA FIEL DE LA

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ACAPULCO, GRO.

COPIA COLECTIVO

SIN TEXTO

Sirr1801

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ACAPULCO, GUERRERO

Guerrero

BOLETA DE INSCRIPCION

EL ACTO DESCRITO EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDO INSCRITO EN EL:

FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No. 10160 * 17

Control Interno	Fecha de Prelación
5 * 27	/ ENERO / 2010

Antecedentes Registrales:
IMERA INSCRIPCION

Denominación

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Afectaciones al:

Folio	ID	Acto	Descripción	Fecha Registro	Registro
10160	17	M4	*Constitución de sociedad*	17-02-2010	1

Caracteres de Autenticidad de Inscripción: cd9bab4afefbdfc66cb1585ca092c01bd44b3247

Derechos de Inscripción

Fecha 16 DICIEMBRE 2009

Importe $320.00 Boleta de Pago No.: A 0768050

EL C. REGISTRADOR PUBLICO DE COMERCIO

LIC. JULIO ALEJANDRO GONZALEZ DE LA VEGA OTERO

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD, DEL COMERCIO Y CREDITO AGRICOLA
DEPARTAMENTO DE INSCRIPCION
2005-2011

COPIA COTEJADA

000025

------ EL SUSCRITO, TITULAR EN EJERCICIO DE LA CORREDURIA PUBLICA NUMERO UNO DE LA PLAZA DEL ESTADO DE GUERRERO, ----------

---------- **CERTIFICA Y HACE CONSTAR** ----------

------ QUE A SOLICITUD DEL INTERESADO Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS SEXTO Y DIECIOCHO DE LA LEY FEDERAL DE CORREDURIA PUBLICA Y TREINTA Y OCHO Y TREINTA Y NUEVE DE SU REGLAMENTO, EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE DOCE HOJAS UTILES TAMAÑO OFICIO, EXCEPTO LAS DOS ULTIMAS, ESCRITAS POR AMBOS LADOS SALVO LAS TRES ULTIMAS, CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE CON SU POLIZA ORIGINAL, MISMA QUE TENGO A LA VISTA, ENTREGÁNDOLE AL SOLICITANTE UN EJEMPLAR DEBIDAMENTE COTEJADO Y CERTIFICADO DE DICHO DOCUMENTO, SEGÚN CONSTA EN EL ACTA NUMERO SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS, PASADA ANTE MI FE Y QUE OBRA EN ARCHIVO OFICIAL DE LA OFICINA A MI CARGO.- ACAPULCO, ESTADO DE GUERRERO A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE ENERO DE DOS MIL ONCE.----------

---------- **FE** ----------

LIC. LUIS ARÉVALO CONTRERAS
CORREDOR PUBLICO NUMERO UNO DE
LA PLAZA DEL ESTADO DE GUERRERO

000026


MÉXICO
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
SALGADO
HERNANDEZ
IRINA
SEXO M
DOMICILIO
C NUEVO LEON 23
COL PROGRESO 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
CLAVE DE ELECTOR SLHRIR67082312M900
CURP
SAHI670823MGRLRR09
AÑO DE REGISTRO
1993 06
FECHA DE NACIMIENTO
23/08/1967
SECCIÓN
0057
VIGENCIA
2023 - 2033


INE
IDMEX2412998667<<0057054805632
6708238M3312315MEX<06<<00253<9
SALGADO<HERNANDEZ<<IRINA<<<<<<

000027

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. **41066004-016-2023.**
REFERENTE A LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**

b). - DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE EL CAPITAL CONTABLE REQUERIDO, POR UN IMPORTE DE: $1,500,000.00 QUE ACREDITARÁ CON BASE EN LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL ANUAL DEL 2022,
DECLARACIONES PROVISIONALES DEL 2023,
Y LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS (AT6)

000028

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01 CEL. 744 2354717 / 744 4490912 E-MAIL: imexa@telmexmail.com, gno_0301@hotmail.com

gob.mx

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
23NC4660441	ICO091216UUA

Nombre, Denominación o Razón social

IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 01 de agosto de 2023, a las 11:11 horas

Notas

1.-Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.28. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023.

2.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

3.-La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

4.-Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

000029

Cadena Original

||ICO091216UUA|23NC4660441|01-08-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital

k4H+0kHZ64raqgtxra3lmMZsZHqMG1c/atjtLrKld/7ARGA7J+L4ndTO2XhsX3xI7qA6U32p9UIA8W8p9m1e6gXLS
Xi997f2bqCwBtR8m0I0u8TQ5YHe5mNqquFErsrVyfBWM9Uuu3VwgmYbIVJJmxbfShYas+07Y1wExRTZn03x3kBnyf
9esZaiGgUwGLHEvhq+urOcSzlWas8J26KVoSXTM0WWlvr0orY8yiUD9+TrlR5GYbmd1VhbQWhmtd9PZVwknP1MzCk
kPtU+A3s2I9La3oHK33rTFRutlRQz+6ZrWbXv0EHauOXMECH7MdRSLTpQidZpWhgv/9BuKYA==

GOBIERNO DE MÉXICO | HACIENDA | SAT

Contacto:
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México. Atención telefónica 01 55 627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá 01 877 44 88 728.

gob.mx

Servicio de Administración Tributaria

Notas

5.-La opinión que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública

6.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

000030

Cadena Original
||ICO091216UUA|23NC4660441|01-08-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital
k4H+0kHZ64raqgtxra3lmMZsZHqMG1c/atjtLrKld/7ARGA7J+L4ndTO2XhsX3xI7qA6U32p9UIA8W8p9m1e6gXLS
Xi997f2bqCwBtR8m0l0u8TQ5YHe5mNqquFErsrVyfBWM9Uuu3VwgmYbIVJJmxbfShYas+07Y1wExRTZn03x3kBnyf
9esZaiGgUwGLHEvhq+urOcSzIWas8J26KVoSXTM0WWlvr0orY8yiUD9+TrlR5GYbmd1VhbQWhmtd9PZVwknP1MzCk
kPtU+A3s2I9La3oHK33rTFRutlRQz+6ZrWbXv0EHauOXMECH7MdRSLTpQidZpWhgv/9BuKYA==

GOBIERNO DE MÉXICO | HACIENDA | SAT

Contacto:
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México. Atención telefónica 01 55 627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá 01 877 44 88 728.

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
Declaración Anual de Personas Morales

SAT

RFC:	ICO091216UUA	Hoja 1 de 1
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV	

Tipo de declaración:	Normal		
Período de la declaración:	Del Ejercicio	**Ejercicio:**	2021
Fecha y hora de presentación:	12/04/2022 01:16	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	220050162882	**Vencimiento obligación:**	31/03/2022

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR PERSONAS MORALES
Impuesto a cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

000031

Sello digital :

QZBTAVLIZa6JXbtPZ6LhTwxcPo+tL4qAiTsWxD+/s7VKjzIyHxZq6R+St8yupCqULRzG4K5kL6lcmyAsgQ5mptLMYfA6g5UUoITi
kZe61FKAzMEyR3iwVt3qDyrGlgKm3NzM4uSu0HvreD/Sh7ZV3JP/rPJPvevUU0NgUCeEeLAjWyk/dSQnJ1M/fe+NP/JElIUeTXSk
8gSHCEGOJO5Gy8nLZkpIFpR2l4cB6x4+AZvHfiWvBt9LPJSL5iJ8GjdNoAC9Sbn6uhgml89UBTdtot0dXoADPu5fckEhP0Rde3Dr
KyGWOPy6VV0wAOUicq3apgIJeOlOeiD2pZyLf/RXGg==

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodo de la declaración:	Del Ejercicio	**Ejercicio:**	2021
Número de operación:	220050162882	**Fecha y hora de presentación:**	12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación:	31/03/2022		

DATOS ADICIONALES

INDICA SI OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS	No

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES	9,129,660
IMPORTE POR DETALLAR	0
IMPORTE DETALLADO	9,129,660

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	9,129,660

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
FEBRERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MARZO	4,579,625	PRESENTADA CON PAGO
ABRIL	5,007,776	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MAYO	5,007,776	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JUNIO	5,007,776	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JULIO	5,007,776	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
AGOSTO	5,007,776	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
SEPTIEMBRE	7,137,517	PRESENTADA CON PAGO
OCTUBRE	7,137,517	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
NOVIEMBRE	7,137,517	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
DICIEMBRE	9,129,660	PRESENTADA CON PAGO
Total	**9,129,660**	

000032

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220050162882 **Fecha y hora de presentación:** 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

INGRESOS

IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS		9,129,660
¿TIENES INGRESOS A DISMINUIR?	NO	
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN		0

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES?	NO	
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS		0
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS		0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS		0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS		0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL		0.0735
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE		0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE		0
¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL?	NO	
¿OBTUVISTE INGRESOS EN EL EXTRANJERO?	NO	
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES		9,129,660

000033

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	306,588

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	315,810	9

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220050162882
Fecha y hora de presentación: 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	315,810	0	0	0	9
ASIMILADOS A SALARIOS	0	0	0	0	0

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

SUELDOS Y SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA	17,400
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA	298,410
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL	315,810

TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	17,960	0	0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	4

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	16,240	0	0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	4

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220050162882 **Fecha y hora de presentación:** 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	21,025	0	0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	5

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	21,750	0	0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	5

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220050162882
Fecha y hora de presentación: 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO	22,475	0	0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	5

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	23,925	0	0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	6

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220050162882 **Fecha y hora de presentación:** 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO	26,970	0	0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	6

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO	26,970	0	0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	6

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
SEPTIEMBRE	25,230	0	0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	6

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodo de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220050162882 **Fecha y hora de presentación:** 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	26,100	0	0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	7

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	33,785	0	0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	8

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220050162882
Fecha y hora de presentación: 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	53,360	17,400	0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	8

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	**315,810**	**17,400**	**0**	**0**	**0**		**9**

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	315,810
IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	17,400
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA	9,222
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA	0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220050162882 **Fecha y hora de presentación:** 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL	9,222

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

	Exenta	Gravada	Total
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0	0	0
VIÁTICOS	0	0	0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0	0	0
SELECCIONA EL PORCENTAJE A APLICAR EN LA NÓMINA EXENTA	MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)		
NÓMINA EXENTA NO DEDUCIBLE	9,222		9,222
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE	9,222	0	9,222

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. EXENTA	8,178
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. GRAVADA	298,410
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL	306,588

ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS	0

TOTAL DE NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	0			0	NO PRESENTADA	0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	0			0	NO PRESENTADA	0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220050162882 **Fecha y hora de presentación:** 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	0			0	NO PRESENTADA	0
ABRIL	0			0	NO PRESENTADA	0
MAYO	0			0	NO PRESENTADA	0
JUNIO	0			0	NO PRESENTADA	0
JULIO	0			0	NO PRESENTADA	0
AGOSTO	0			0	NO PRESENTADA	0
SEPTIEMBRE	0			0	NO PRESENTADA	0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220050162882 **Fecha y hora de presentación:** 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	0			0	NO PRESENTADA	0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	0			0	NO PRESENTADA	0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	0			0	NO PRESENTADA	0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

IMPORTE DE LA NÓMINA POR ASIMILADOS CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE	0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

VIÁTICOS	0
ANTICIPOS DE RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES	0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE	0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodo de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220050162882 **Fecha y hora de presentación:** 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE	0

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL	306,588
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE	0
NÓMINA DEDUCIBLE	306,588
MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO	0

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO

NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	0
NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO	0

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR	306,588
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES	9,222

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL EJERCICIO	9,095

SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA

PERIODO	MONTO
ENERO	527
FEBRERO	476
MARZO	764
ABRIL	638
MAYO	659
JUNIO	701

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220050162882 **Fecha y hora de presentación:** 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO
JULIO	791
AGOSTO	791
SEPTIEMBRE	833
OCTUBRE	765
NOVIEMBRE	1,097
DICIEMBRE	1,054
Total	**9,096**

SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR	8,338
SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES	0
SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	0
SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES	0

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES

CONCEPTO	MONTO
ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	0
ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0
Total	**0**

SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN	17,433
GASTOS	9,067,303

GASTOS

Concepto	Importe	Importe Total
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	59,003	59,003
OTROS GASTOS	9,008,300	9,008,300

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodo de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220050162882
Fecha y hora de presentación: 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS 0

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS

Mes	Importe de los honorarios pagados	ISR retenciones por servicios profesionales	Estatus
ENERO	0		NO PRESENTADA
FEBRERO	0		NO PRESENTADA
MARZO	0		NO PRESENTADA
ABRIL	0		NO PRESENTADA
MAYO	0		NO PRESENTADA
JUNIO	0		NO PRESENTADA
JULIO	0		NO PRESENTADA
AGOSTO	0		NO PRESENTADA
SEPTIEMBRE	0		NO PRESENTADA
OCTUBRE	0		NO PRESENTADA
NOVIEMBRE	0		NO PRESENTADA
DICIEMBRE	0		NO PRESENTADA
TOTAL	0	0	

TOTAL DE HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS, SOLO PERIODOS PAGADOS 0

TOTAL DE ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SOLO PERIODOS PAGADOS 0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodo de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220050162882
Fecha y hora de presentación: 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS 0

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

Mes	Importe del uso o goce temporal de bienes pagados	ISR retenciones por arrendamiento de inmuebles	Estatus
ENERO	0		NO PRESENTADA
FEBRERO	0		NO PRESENTADA
MARZO	0		NO PRESENTADA
ABRIL	0		NO PRESENTADA
MAYO	0		NO PRESENTADA
JUNIO	0		NO PRESENTADA
JULIO	0		NO PRESENTADA
AGOSTO	0		NO PRESENTADA
SEPTIEMBRE	0		NO PRESENTADA
OCTUBRE	0		NO PRESENTADA
NOVIEMBRE	0		NO PRESENTADA
DICIEMBRE	0		NO PRESENTADA
TOTAL	0	0	

TOTAL DE LOS IMPORTES POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS, SOLO PERIODOS PAGADOS 0

TOTAL DE ISR RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS 0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220050162882
Fecha y hora de presentación: 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	IMPORTE
DEDUCCIONES AUTORIZADAS	0

TOTAL DE GASTOS 9,067,303

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA 0

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO	IMPORTE
SIN GASTOS RELACIONADOS A LA NÓMINA	0

TOTAL DE DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA 0

GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA 0

DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA 0

INVERSIONES 0

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

CONCEPTO	IMPORTE
SIN INVERSIONES	0

TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES 0

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO 0

DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES 0

COSTO DE LO VENDIDO

COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO NO APLICA

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220050162882 **Fecha y hora de presentación:** 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	0
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA	0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0735
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0

¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? NO

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	9,067,303

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	9,129,660
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	9,067,303
UTILIDAD FISCAL ANTES DEL PTU	62,357
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
PTU TIMBRADA Y PAGADA EN EL MES DE MAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	62,357

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220050162882
Fecha y hora de presentación: 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO	0
RESULTADO FISCAL	0
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	0
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
ESTÍMULOS POR APLICAR AL IMPUESTO CAUSADO	0
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	0
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

LÍMITE DEL IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0
MONTO REMANENTE POR APLICAR	0

Ejercicio al que corresponde el dividendo o la utilidad distribuida	Total de dividendos pagado	ISR remanente o ISR por dividendos pagado	ISR por dividendos a acreditar	Remanente
TOTAL		0		0

DETALLE DE PAGO IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
ENERO	0	NO PRESENTADA

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
FEBRERO	0	NO PRESENTADA

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220050162882 **Fecha y hora de presentación:** 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
MARZO	0	NO PRESENTADA

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
ABRIL	0	NO PRESENTADA

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
MAYO	0	NO PRESENTADA

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
JUNIO	0	NO PRESENTADA

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
JULIO	0	NO PRESENTADA

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
AGOSTO	0	NO PRESENTADA

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
SEPTIEMBRE	0	NO PRESENTADA

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220050162882
Fecha y hora de presentación: 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
OCTUBRE	0	NO PRESENTADA

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
NOVIEMBRE	0	NO PRESENTADA

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
DICIEMBRE	0	NO PRESENTADA

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO 0

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

LÍMITE DE IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO A APLICAR 0

MONTO REMANENTE POR APLICAR 0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS 0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	0	NO PRESENTADA

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	0	NO PRESENTADA

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220050162882
Fecha y hora de presentación: 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	0	NO PRESENTADA
ABRIL	0	NO PRESENTADA
MAYO	0	NO PRESENTADA
JUNIO	0	NO PRESENTADA
JULIO	0	NO PRESENTADA
AGOSTO	0	NO PRESENTADA
SEPTIEMBRE	0	NO PRESENTADA

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodo de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220050162882
Fecha y hora de presentación: 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
OCTUBRE	0	NO PRESENTADA

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
NOVIEMBRE	0	NO PRESENTADA

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
DICIEMBRE	0	NO PRESENTADA

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
Total	**0**	

IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS	0
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES	67,529
ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	0

IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO	MONTO	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
FEBRERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MARZO	46,299	PRESENTADA CON PAGO
ABRIL	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MAYO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodo de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220050162882
Fecha y hora de presentación: 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

PERIODO	MONTO	ESTATUS
JUNIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JULIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
AGOSTO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
SEPTIEMBRE	2,523	PRESENTADA CON PAGO
OCTUBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
NOVIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
DICIEMBRE	18,707	PRESENTADA CON PAGO

ACUMULADO	0
ISR RETENIDO DE INGRESOS POR INICIO DE OPERACIONES	0
TOTAL DE RETENCIONES	0
ISR A CARGO DEL EJERCICIO	0

PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A CARGO	0

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.0000
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	9,129,660
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	9,067,303
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	62,357
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220050162882
Fecha y hora de presentación: 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DATOS ADICIONALES

INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	0
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	62,357
¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?	NO
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	0
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	0
¿CUENTA CON EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA REPORTABLE?	NO

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ESTADOS FINANCIEROS

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220050162882
Fecha y hora de presentación: 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	9,129,660	0	9,129,660
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS	0	0	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES	0	0	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO	0	0	0
INGRESOS NETOS	9,129,660	0	9,129,660
INVENTARIO INICIAL			
COMPRAS NETAS NACIONALES	0	0	0
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN	0	0	0
INVENTARIO FINAL			
COSTO DE LAS MERCANCÍAS			0
MANO DE OBRA	0	0	0
MAQUILAS	0	0	0
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	0	0	0
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS			0
UTILIDAD BRUTA			0
PÉRDIDA BRUTA			
GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	0
UTILIDAD DE OPERACIÓN			0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ESTADOS FINANCIEROS

SAT

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodo de la declaración:	Del Ejercicio	**Ejercicio:**	2021
Número de operación:	220050162882	**Fecha y hora de presentación:**	12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación:	31/03/2022		

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

PÉRDIDA DE OPERACIÓN			
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES	0	0	0
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO	0	0	0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES	0	0	0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO	0	0	0
GANANCIA CAMBIARIA	0	0	0
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES	0	0	0
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO	0	0	0
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES	0	0	0
INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO	0	0	0
PÉRDIDA CAMBIARIA	0	0	0
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE			
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE	0	0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES	0	0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS	0	0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS			0
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			0
GASTOS NACIONALES			9,067,303
GASTOS EXTRANJEROS			0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ESTADOS FINANCIEROS

SAT

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodo de la declaración:	Del Ejercicio	**Ejercicio:**	2021
Número de operación:	220050162882	**Fecha y hora de presentación:**	12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación:	31/03/2022		

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

OTROS GASTOS	0
OTROS PRODUCTOS NACIONALES	0
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS	0
OTROS PRODUCTOS	0
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	0
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	62,357
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	0
ISR	0
PTU	0
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	0
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	0
EFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0
EFECTOS DE REEXPRESIÓN DESFAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0
UTILIDAD NETA	62,357
PÉRDIDA NETA	0

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ESTADOS FINANCIEROS

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220050162882
Fecha y hora de presentación: 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO

EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	55,000
EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO	0
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)	0
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS (EXCEPTO ACCIONES)	0
CLIENTES	703,708
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CONTRIBUCIONES A FAVOR	0
INVENTARIOS	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	0
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO	0
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	0
TERRENOS	0
CONSTRUCCIONES	0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ESTADOS FINANCIEROS

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodo de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220050162882
Fecha y hora de presentación: 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO

MAQUINARIA Y EQUIPO	2,820,283
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0
EQUIPO DE CÓMPUTO	11,033
EQUIPO DE TRANSPORTE	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-239,721
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	0
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
SUMA ACTIVO	3,350,303

PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	35,261
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	35,261
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	0
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ESTADOS FINANCIEROS

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220050162882
Fecha y hora de presentación: 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

PASIVO

ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)	0
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	0
OTROS PASIVOS	0
SUMA PASIVO	35,261

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL SOCIAL	50,000
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	0
RESERVAS	0
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	0
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	0
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,202,685
UTILIDAD DEL EJERCICIO	62,357
PÉRDIDAS ACUMULADAS	0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	
SUMA CAPITAL CONTABLE	3,315,042
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	3,350,303

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ESTADOS FINANCIEROS

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodo de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220050162882
Fecha y hora de presentación: 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	0
EFECTOS DE REEXPRESIÓN	0
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	0
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	
ANTICIPOS DE CLIENTES	0
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES O POR REEMBOLSO DE CAPITAL	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	
INVENTARIO ACUMULABLE DEL EJERCICIO	0
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	0
COSTO DE VENTAS CONTABLE	0
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES	
ISR, IETU, IMPAC Y PTU	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ESTADOS FINANCIEROS

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220050162882
Fecha y hora de presentación: 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	0
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO	0
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	0
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	0
ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	
ESTÍMULO FISCAL POR CONTRATAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	
DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	0
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS	
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	0
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO	
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN	
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ESTADOS FINANCIEROS

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodo de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220050162882
Fecha y hora de presentación: 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	0
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	0
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	0
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	0
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA	0

000065

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
Declaración Anual de Personas Morales

SAT

RFC: ICO091216UUA

Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2022

Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07

Medio de presentación: Internet

Número de operación: 230080156925

Vencimiento obligación: 03/04/2023

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR PERSONAS MORALES

Impuesto a cargo: 0

Cantidad a cargo: 0

Cantidad a pagar: 0

Concepto presentado 2: ESTADOS FINANCIEROS

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

Sello digital :

qAeYCFYTkfA5RFxMEhLzn3xErqEoNWVkcL5EQEa3RmVT4I1+wLP8WesNz+HiSCd4nfEwSjzKACz705RcjbdQwjRFqYMg6kefUrLY
IR11FgBDVW/NhGQV5MEwtmac8oWCrFSMdyGGq5jEWoPaNd4XKY2PFg9opYqcDyNhhFjMY/xISsncHtPbOPEO3FsGiVwvyztMxvUC
dPq+T0B812pEw9g9QtgOjHiXoAPJrZS+VkuulqnXfc1kq6PBZkkD2dm0BUyeYbwzMY6QJhngPIAm5E4579b7YlquA/dqBGv8UnGt
UomOPLcYYe60x41Zojx4GVVF30GbkEPG6g3FkOQoWg==

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DATOS ADICIONALES

¿ESTÁS OBLIGADO A DICTAMINAR ESTADOS FINANCIEROS EN TÉRMINOS DEL 32-A DEL CFF?	No
¿ESTÁS OBLIGADO A PRESENTAR LA INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN FISCAL, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 32-H DEL CFF?	No

INGRESOS

INGRESOS EXENTOS O NO ACUMULABLES	0

INGRESOS EXENTOS

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
SIN INGRESOS EXENTOS	0
Total	**0**

INGRESOS NO ACUMULABLES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
SIN INGRESOS NO ACUMULABLES.	0
Total	**0**

TOTAL DE INGRESOS EXENTOS O NO ACUMULABLES	0
INGRESOS NOMINALES	10,807,721
IMPORTE POR DETALLAR	0
IMPORTE DETALLADO	10,807,721

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
OTROS INGRESOS O PRODUCTOS	10,807,721

IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	10,807,721
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN	0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

INGRESOS

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES?	NO
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	0
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0781
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0
¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL?	NO
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	10,807,721

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220900034949	01/03/2022
FEBRERO	1,703,874	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220980004889	01/03/2022
MARZO	1,956,250	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220290281815	21/04/2022
ABRIL	3,982,724	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220720317153	04/05/2022
MAYO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220240520963	24/06/2022
JUNIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220460115599	21/07/2022
JULIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN	220820119130	18/08/2022

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
		CERO		
AGOSTO	517,241	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220810816723	14/09/2022
SEPTIEMBRE	385,354	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220170276887	19/10/2022
OCTUBRE	359,029	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220861015895	03/11/2022
NOVIEMBRE	1,148,026	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220381141764	03/12/2022
DICIEMBRE	755,223	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230790000499	03/01/2023
Total	**3,807,721**			

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	580,859

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	595,755	24

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	595,755	0	0	0	24
ASIMILADOS A SALARIOS	0	0	0	0	0

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

SUELDOS Y SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA	31,694

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodo de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA	564,061
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL	595,755

TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	47,799	0	0	0	0	10	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220000323699	14/02/2022

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	41,535	0	0	0	0	10	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220980004889	01/03/2022

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	36,819	0	0	0	0	7	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220290281815	21/04/2022

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	32,670	0	0	0	0	6	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220720317153	04/05/2022

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	33,332	0	0	0	0	8	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220240520963	24/06/2022

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JUNIO	28,128	0	0	0	0	6	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220460115599	21/07/2022

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO	31,088	0	0	0	0	6	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220820119130	18/08/2022

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AGOSTO	54,827	0	0	0	0	12	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220810816723	14/09/2022

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
SEPTIEMBRE	70,909	0	0	0	0	14	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220170276887	19/10/2022

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
OCTUBRE	76,102	0	0	0	0	15	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220861015896	03/11/2022

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
NOVIEMBRE	47,102	0	0	0	0	9	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220381141764	03/12/2022

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
DICIEMBRE	95,445	31,694	1,051	1,051	0	11	PRESENTADA PAGADA	230790000499	03/01/2023

ISR A CARGO	1,051
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,051
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	1,051
CANTIDAD PAGADA	1,051

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodo de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Total	595,755	31,694	2,203	1,051	1,152	24			

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	595,755
IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	31,694
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA	14,896
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA	0
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL	14,896

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

	Exenta	Gravada	Total
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0	0	0
VIÁTICOS	0	0	0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0	0	0
SELECCIONA EL PORCENTAJE A APLICAR EN LA NÓMINA EXENTA	MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR		
NÓMINA EXENTA NO DEDUCIBLE	14,896		14,896
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE	14,896	0	14,896

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. EXENTA	16,798
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. GRAVADA	564,061

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL	580,859

ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS	0

TOTAL DE NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0			0	0	NO PRESENTADA		

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	0			0	0	NO PRESENTADA		

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	0			0	0	NO PRESENTADA		

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	0			0	0	NO PRESENTADA		

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	0			0	0	NO PRESENTADA		

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JUNIO	0			0	0	NO PRESENTADA		

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO	0			0	0	NO PRESENTADA		

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AGOSTO	0			0	0	NO PRESENTADA		

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
SEPTIEMBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodo de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
OCTUBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
NOVIEMBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
DICIEMBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			

IMPORTE DE LA NÓMINA POR ASIMILADOS CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS: 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE: 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

VIÁTICOS: 0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES Y COOPERATIVAS	0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE	0
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE	0

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL	580,859
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE	0
NÓMINA DEDUCIBLE	580,859
MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO	0

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO

NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	0
NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO	0
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR	580,859
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES	14,896

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL EJERCICIO	2,581

SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA

PERIODO	MONTO
ENERO	274
FEBRERO	0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO
MARZO	206
ABRIL	0
MAYO	749
JUNIO	150
JULIO	204
AGOSTO	107
SEPTIEMBRE	157
OCTUBRE	396
NOVIEMBRE	120
DICIEMBRE	217
Total	**2,580**

SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR	
SUBSIDIO PAGADO DEVUELTO POR LA AUTORIDAD	
TOTAL DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DISPONIBLE	2,581
SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES	0
SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	0

DETALLE DE SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220000323699	14/02/2022
FEBRERO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220980004889	01/03/2022
MARZO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220290281815	21/04/2022
ABRIL		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220720317153	04/05/2022

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodo de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220240520963	24/06/2022
JUNIO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220460115599	21/07/2022
JULIO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220820119130	18/08/2022
AGOSTO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220810816723	14/09/2022
SEPTIEMBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220170276887	19/10/2022
OCTUBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220861015895	03/11/2022
NOVIEMBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220381141764	03/12/2022
DICIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	230790000499	03/01/2023
Total	0			

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES: 0

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES

CONCEPTO	MONTO
ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	0
ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0
Total	0

SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN: 2,581

GASTOS: 7,379,889

GASTOS

Concepto	Nómina	Importe
ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES Y COOPERATIVAS	0	0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 0

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS / RESICO 0

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

Mes	Importe de honorarios pagados a personas físicas o RESICO	ISR retenciones por pago de honorarios o RESICO	Estatus	N° de operación de declaración	Fecha de presentación de la declaración
ENERO			NO PRESENTADA		
FEBRERO			NO PRESENTADA		
MARZO			NO PRESENTADA		
ABRIL			NO PRESENTADA		
MAYO			NO PRESENTADA		
JUNIO			NO PRESENTADA		
JULIO			NO PRESENTADA		
AGOSTO			NO PRESENTADA		
SEPTIEMBRE			NO PRESENTADA		
OCTUBRE			NO PRESENTADA		
NOVIEMBRE			NO PRESENTADA		
DICIEMBRE			NO PRESENTADA		
TOTAL	0	0			

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS O RESICO, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
TOTAL DE ISR RETENCIONESPOR PAGO DE HONORARIOS O RESICO, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	0

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

Mes	Importe del pago por el uso o goce temporal de bienes inmuebles	ISR retenciones por arrendamiento de inmuebles	Estatus	Nº de operación de declaración	Fecha de presentación de la declaración
ENERO			NO PRESENTADA		
FEBRERO			NO PRESENTADA		
MARZO			NO PRESENTADA		
ABRIL			NO PRESENTADA		
MAYO			NO PRESENTADA		
JUNIO			NO PRESENTADA		
JULIO			NO PRESENTADA		
AGOSTO			NO PRESENTADA		
SEPTIEMBRE			NO PRESENTADA		
OCTUBRE			NO PRESENTADA		
NOVIEMBRE			NO PRESENTADA		
DICIEMBRE			NO PRESENTADA		
TOTAL	0	0			

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE LOS IMPORTES DEL PAGO POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, SOLO PAGADOS	0
TOTAL DE ISR RETENCIONES POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
INTERESES NETOS	0

CONCEPTO	IMPORTE
GASTOS EN GENERAL	7,379,889

GASTOS	7,379,889
DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	0

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO	IMPORTE
SIN GASTOS RELACIONADOS A LA NÓMINA	0

TOTAL DE DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	0
GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA	0
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	0

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

DEPRECIACIÓN APLICADA	TIPO DE INVERSIÓN	SUBTIPO DE INVERSIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN	GASTOS RELACIONADOS	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN	DEDUCCIÓN ACTUALIZADA
SIN DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	SIN INVERSIONES	SIN INVERSIONES	0	0	0	0
Total					0	0

TOTALES DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES	0
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES	0
COSTO DE LO VENDIDO	

COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO	NO APLICA
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	0
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA	0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0781
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0
¿TIENES FACILIDADES ADMINISTRATIVAS O ESTÍMULOS DEDUCIBLES?	NO
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	7,379,889

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	10,807,721
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	7,379,889

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

UTILIDAD FISCAL ANTES DEL PTU	2,907,973
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
PTU TIMBRADA Y PAGADA A MAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
UTILIDAD FISCAL ANTES DEL PTU	2,907,973
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

LÍMITE DE PÉRDIDAS A APLICAR	0
MONTO POR APLICAR	

ORIGEN DE LA PÉRDIDA	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE GENERÓ LA PÉRDIDA	PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR	PÉRDIDA FISCAL ACTUALIZADA	POR APLICAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
PROPIA			0	0		0

AÑO EN QUE SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ	
MES EN QUE SE GENERÓ O SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ LA PÉRDIDA	
INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA LA PÉRDIDA/MES	
INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA LA PÉRDIDA/INPC	
INPC DEL MES EN QUE SE GENERÓ O SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ LA PÉRDIDA/MES	
INPC DEL MES EN QUE SE GENERÓ O SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ LA PÉRDIDA/INPC	
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN DEL PERIODO	

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR	0
PÉRDIDA ACTUALIZADA	0

ORIGEN DE LA PÉRDIDA	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE GENERÓ LA PÉRDIDA	PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR	PÉRDIDA FISCAL ACTUALIZADA	POR APLICAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
Total			**0**	**0**	**0**	0

RESULTADO FISCAL	0
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	0
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	0
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

LÍMITE DEL IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0
MONTO POR APLICAR	0

Ejercicio al que corresponde el dividendo o la utilidad distribuida	Total de dividendos pagado	ISR remanente o ISR por dividendos pagado	ISR por dividendos a acreditar	Remanente
TOTAL		0	0	0

DETALLE DE PAGO IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
ENERO		NO PRESENTADA

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
FEBRERO		NO PRESENTADA
MARZO		NO PRESENTADA
ABRIL		NO PRESENTADA
MAYO		NO PRESENTADA
JUNIO		NO PRESENTADA
JULIO		NO PRESENTADA
AGOSTO		NO PRESENTADA

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
SEPTIEMBRE		NO PRESENTADA
OCTUBRE		NO PRESENTADA
NOVIEMBRE		NO PRESENTADA
DICIEMBRE		NO PRESENTADA

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO: 0

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

LÍMITE DE IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO A APLICAR: 0

MONTO POR APLICAR:

ORIGEN DEL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
PROPIA		2022	0	0		0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	0
AÑO EN QUE SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ	
MES EN QUE SE GENERÓ O SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ EL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	
INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA EL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO/MES	JUNIO/2022
INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA EL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO/INPC	122.044

ORIGEN DEL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
Total			0	0	0	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS 0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220900034949	01/03/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodo de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220980004889	01/03/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220290281815	21/04/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220720317153	04/05/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

CANTIDAD PAGADA 0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220240520963	24/06/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0
TOTAL DE APLICACIONES 0
CANTIDAD A CARGO 0
CANTIDAD PAGADA 0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JUNIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220460115599	21/07/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0
TOTAL DE APLICACIONES 0
CANTIDAD A CARGO 0
CANTIDAD PAGADA 0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220820119130	18/08/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AGOSTO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220810816723	14/09/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
SEPTIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220170276887	19/10/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
OCTUBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220861015895	03/11/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
NOVIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220381141764	03/12/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
DICIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230790000499	03/01/2023

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Total	0			

IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS	0
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES	0
ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	0

IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO	MONTO	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220900034949	01/03/2022
FEBRERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220980004889	01/03/2022
MARZO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220290281815	21/04/2022
ABRIL	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220720317153	04/05/2022
MAYO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220240520963	24/06/2022
JUNIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220460115599	21/07/2022
JULIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220820119130	18/08/2022
AGOSTO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220810816723	14/09/2022
SEPTIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220170276887	19/10/2022

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
OCTUBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220861015895	03/11/2022
NOVIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220381141764	03/12/2022
DICIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230790000499	03/01/2023

TOTAL DE ISR RETENIDO, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO DE INGRESOS POR INICIO DE OPERACIONES	0
TOTAL DE RETENCIONES	0
ISR A CARGO DEL EJERCICIO	0
¿TE AUTORIZARON APLICAR UN COEFICIENTE DE UTILIDAD MENOR EN PAGOS PROVISIONALES AL DETERMINADO EN EL EJERCICIO?	NO

PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A CARGO	0

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.0000
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	10,807,721
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	7,899,748
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	2,907,973
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DATOS ADICIONALES

INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	0
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	0
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	2,907,973
¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?	NO
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	0

CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)

SALDO INICIAL DE LA CUCA	0
APORTACIONES DE CAPITAL	0
PRIMAS NETAS POR SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES EFECTUADAS POR LOS SOCIOS O ACCIONISTAS	0
REDUCCIONES DE CAPITAL	0
RESULTADO	0
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	0.0000
SALDO DE LA CUCA AL 31 DE DICIEMBRE	0
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	0

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)

UTILIDAD FISCAL NETA (UFIN)

RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO	0
ISR DEL EJERCICIO PAGADO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9 LISR	0
IMPORTE DE LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES	0
MONTO A RESTAR DE LA UTILIDAD FISCAL NETA	0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DISMINUCIÓN POR ACREDITAMIENTO DEL ISR PAGADO POR DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO	0
UFIN	0
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DE EJERCICIOS ANTERIORES ACTUALIZADO	0
UFIN DEL EJERCICIO	0
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DEL EJERCICIO	

DETERMINACIÓN DE LA CUFIN

SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA ACTUALIZADO	0
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO (UFIN)	0
DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS DE OTRAS PERSONAS MORALES	0
INGRESOS, DIVIDENDOS O UTILIDADES SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES (REFIPRES).	0
DIVIDENDOS O UTILIDADES PAGADOS CON LAS UTILIDADES DISTRIBUIDAS (UFIN)	0
UTILIDADES DISTRIBUIDAS POR REDUCCIÓN DE CAPITAL	0
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA	0
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DEL EJERCICIO	
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA AL TÉRMINO DEL EJERCICIO	0

¿CUENTA CON EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA REPORTABLE? NO

000099

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Enero	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	15/02/2023 00:45	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	515477815		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto a favor:	15,378

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

Sello Digital :

o8CBopX+uihaAN3EBY9SCDGy4x7Nls66eB0zLJwu+4LoB3riBQtCav10euRMEr8RJI4FbponfSJ4cCxI+Y/N7bAXhsy4gbt4WNt
LO1FCm0B6seONKL8ZOUqD+uoDSwQMznRu3ZMyUlrOVEeIp/5xIzRq0ndBxi1dVCDuW4Sfns=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

000100

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	08/02/2023 20:52
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/02/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230770155063

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	1,332
Cantidad a cargo:	1,332
Cantidad a pagar:	1,332

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0423 0PC1 2900 3773 3488**

Importe total a pagar: **$1,332**

Vigente hasta: **23/02/2023**

Obligado a pagar por internet

04230PC1290037733488 1332

Sello digital :

bNTa14hCSYpX/8boXkFMi1kOyJKoJAxPerAzvtAYNx+OTChI63YCx06BCPhvD9xnYT7i3dP9BXOrG22DKW/QwAYnMqQMXGh7n4+Y
R2+bS0g2KVJCcfcrg0gEou1cxPQEJwzsZZgDQHxKD93H+aXyPYhdWlFuhe9nFaFLp2SDkE3lDYmdGQs3PZN0y0kMKzZVVuGGAtFq
v9SKRoUX91n1HZ9myremIjWrcQzU7rqvOTe1lekI+RiZB6KkIYbJavByrrrakq7fRNd7/1xueL0rmOkvxRG362sfURcIrle7ySVV
LnonBuclWnNCZpOz5skA7LhoRGxGNzFhlPTUHGxyFA==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	08/02/2023 20:52
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/02/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230770155063

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME El Banco de Hoy · Banco Azteca · BanBajio · BBVA
Bancrea · Banjercito · Banorte · banregio · Bansi
Banco Base · CIBanco · citibanamex · HSBC · Inbursa
Intercam Banco · Mi Banco · Banca Mifel · monex Banco · MUFG Bank México, S.A.
Banco Multiva · Santander · Scotiabank · Bx+

Sello digital :

bNTa14hCSYpX/8boXkFMi1kOyJKoJAxPerAzvtAYNx+OTChI63YCx06BCPhvD9xnYT7i3dP9BXOrG22DKW/QwAYnMqQMXGh7n4+Y
R2+bS0g2KVJCcfcrg0gEou1cxPQEJwzsZZgDQHxKD93H+aXyPYhdWlFuhe9nFaFLp2SDkE3lDYmdGQs3PZN0y0kMKzZVuGGAtFq
v9SKRoUX91n1HZ9myremIjWrcQzU7rqvOTe1lekI+RiZB6KkIYbJavByrrrakq7fRNd7/1xueL0rmOkvxRG362sfURcIrle7ySVV
LnonBuclWnNCZpOz5skA7LhoRGxGNzFhlPTUHGxyFA==

RECIBO DE OPERACIÓN

Título:	Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales - Depósito Referenciado
Medio de Presentación:	Internet (BEP)
Fecha de Pago:	15/02/2023
Hora de Pago:	17:58 hrs
Cuenta Origen:	ENLACE NEGOCIOS BASICA - 0248008101
Línea de Captura:	04230PC1290037733488
Importe Pagado:	$1,332
Comisión:	$0.00 MN
IVA Comisión:	$0.00 MN
Número de Operación:	594527504623
Llave de Pago:	8465046225
Canal de Pago:	IN Internet
Forma de Pago :	03 Transferencia Electrónica de Fondos

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante. Comuníquese con nosotros al 5140 5640 desde la Cd. De México y 01 800 DIRECTA (347 3282) en el Interior de la República, de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs. y sábados de 8:00 a 14:00 hrs.

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

000102

HACIENDA

000103

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	15/02/2023 01:08
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/02/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230530026609

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	0
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO
INGRESOS NOMINALES	0
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	0
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	0

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	0
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0000

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2022			
2021	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	12/04/2022
2020	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	25/03/2021
2019	0.0000	CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL	
2018	0.0000	CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL	

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	0

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	15/02/2023 01:08
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/02/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230530026609

DETERMINACIÓN

BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	0
IMPUESTO CAUSADO	0
IMPUESTO DEL PERIODO	0
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	0
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO	0
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	15/02/2023 01:08
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/02/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230530026609

DETERMINACIÓN

IMPUESTO A CARGO	0

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

000106

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	ICO091216UUA
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal		
EJERCICIO	2023	PERIODO	Enero
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	15/02/2023 00:45	NÚMERO DE OPERACIÓN	515477815

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	0	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF	0	TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	0	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	0

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	0	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RF		IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0	IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)	0	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	0	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA	
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0	IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0	IVA ACREDITABLE	0
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0	MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS	0	TOTAL DE IVA ACREDITABLE	0

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

000107

EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	0	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	15,378
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO	0	CANTIDAD A CARGO	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN		SALDO A FAVOR	15,378
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS		DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0	IMPUESTO A FAVOR	15,378
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)		ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	0	DIFERENCIA A CARGO	0
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE		IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
IVA RETENIDO		IMPUESTO A CARGO	0
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	0	REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE			

DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A CARGO		CERTIFICADOS TESOFE	
A FAVOR	15,378	DIÉSEL MARINO	
PARTE ACTUALIZADA		TOTAL DE APLICACIONES	0
RECARGOS		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	0
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	0

000108

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Febrero	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	26/03/2023 01:17	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	521364380		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto a favor:	4,859

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

Sello Digital :

SGOOTaKghTXQKKKFhy7SBCnovY92fvhiSNh0XeWearhLk+NAR0q5AxNKCULi/7I1hMZQhmtle1vO0bxvdkGy2NwPWESHdJJcw2N
n1hPoN12/vBqYUwGLTre1BuoZvr3sB9vV9aZBo0/nD4DTIL1Goi7R8SeRnc2H4zlBqknU/Q=

000109

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	10/03/2023 17:38
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/03/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230450043607

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	1,203
Cantidad a cargo:	1,203
Cantidad a pagar:	1,203

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0423 1F1W 4100 3808 0405**

Importe total a pagar: **$1,203**

Vigente hasta: **27/03/2023**

Obligado a pagar por internet

04231F1W410038080405 1203

Sello digital :

ZGIUq6V5FAwEqe12LSJkY4sTAeQhrbXXRkYP2fiKvs1obZJvABWoKKvDBnfmzCjh2cIjcaanWPXXK0RLDDWEoguferw7m/xt3P38
F9qf5PwgxexnlIupwGLvrezh4Eu4Qsa4833i0Mqqu1JoHMaNAghOjNdIqnGc5blxmZymTS1a4dWRRkbfSP9W6y/b+xUjpwXesKnk
jglAyyA6A9AA7gZChy+gYs5ip3eKswqiptMCh4An7ObrJi+nhAFvoNGeHmPsAvL+tSPdcIGj3a38mKIA5c6Nc7600qpDtf6rgC9z
KWvGNSmHXL8URQzXrs/gImZbOnq1pW9xx18xzHr7zg==

000110

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	10/03/2023 17:38
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/03/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230450043607

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME El Banco de Hoy · Banco Azteca · BanBajio · BBVA
Bancrea · Banjercito · Banorte · banregio · Bansi
Banco Base · CIBanco · citibanamex · HSBC · Inbursa
Intercam Banco · Mi Banco · Banca Mifel · monex Banco · MUFG Bank México, S.A.
Multiva · Santander · Scotiabank · BX+

Sello digital :

ZGIUq6V5FAwEqe12LSJkY4sTAeQhrbXXRkYP2fiKvs1obZJvABWoKKvDBnfmzCjh2cIjcaanWPXXK0RLDDWEoguferw7m/xt3P38
F9qf5PwgxexnlIupwGLvrezh4Eu4Qsa4833i0Mqqu1JoHMaNAghOjNdIqnGc5blxmZymTS1a4dWRRkbfSP9W6y/b+xUjpwXesKnk
jglAyyA6A9AA7gZChy+gYs5ip3eKswqiptMCh4An7ObrJi+nhAFvoNGeHmPsAvL+tSPdcIGj3a38mKIA5c6Nc7600qpDtf6rgC9z
KWvGNSmHXL8URQzXrs/gImZbOnq1pW9xx18xzHr7zg==

RECIBO DE OPERACIÓN

Título:	Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales - Depósito Referenciado
Medio de Presentación:	Internet (BEP)
Fecha de Pago:	16/03/2023
Hora de Pago:	18:23 hrs
Cuenta Origen:	ENLACE NEGOCIOS BASICA - 0248008101
Línea de Captura:	04231F1W410038080405
Importe Pagado:	$1,203
Comisión:	$0.00 MN
IVA Comisión:	$0.00 MN
Número de Operación:	535372807523
Llave de Pago:	912EA06A34
Canal de Pago:	IN Internet
Forma de Pago :	03 Transferencia Electrónica de Fondos

a el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante. Comuníquese con nosotros al 5140 5640 desde la Cd. De México y 01 800 DIRECTA (347 3282) en el Interior de la República, de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs. y sábados de 8:00 a 14:00 hrs.

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

000111

HACIENDA

000112

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	26/03/2023 01:27
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/03/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230810414796

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	25,300
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO
¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	NO
INGRESOS NOMINALES	25,300
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	0

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
Total	**0**	

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	25,300

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	25,300
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0000

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	26/03/2023 01:27
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/03/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230810414796

DETERMINACIÓN

2022			
2021	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	12/04/2022
2020	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	25/03/2021
2019	0.0000	CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL	15/02/2023
2018	0.0000	CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL	15/02/2023

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	0
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	0
IMPUESTO CAUSADO	0
IMPUESTO DEL PERIODO	0
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	0
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	26/03/2023 01:27
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/03/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230810414796

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0
Total	**0**
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
Total	**0**	

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO	0
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

000115

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	26/03/2023 01:27
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/03/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230810414796

DETERMINACIÓN

IMPUESTO A CARGO	0

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

000116

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	ICO091216UUA
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal		
EJERCICIO	2023	PERIODO	Febrero
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	26/03/2023 01:17	NÚMERO DE OPERACIÓN	521364380

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	25,300	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF	0	TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	0

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	0	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	25,300
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0	TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	25,300

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	4,048	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RF	0	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0	IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	4,048
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)	0	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	4,048	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA	
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0	IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR	0	IVA ACREDITABLE	0

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

000117

ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0	MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0	TOTAL DE IVA ACREDITABLE	0
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0		

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	25,300	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	8,907
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO		CANTIDAD A CARGO	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN		SALDO A FAVOR	4,859
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS		DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	25,300	IMPUESTO A FAVOR	4,859
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)		ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	4,048	DIFERENCIA A CARGO	0
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE		IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
IVA RETENIDO		IMPUESTO A CARGO	0
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	0	REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE			

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%	0	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	25,300
REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	25,300

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

000118

DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A CARGO		CERTIFICADOS TESOFE	
A FAVOR	4,859	DIÉSEL MARINO	
PARTE ACTUALIZADA		TOTAL DE APLICACIONES	0
RECARGOS		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	0
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	0

000119

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Marzo	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	20/04/2023 20:37	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	525129211		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto a cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

Sello Digital :

ZvFNo1/fUU0vX2YPYj6Ni3sOka6PALYz67e54f2z3XS/itMkk1lumGDeNWjLz3xulHgbyw6BcE8AbFJx/C5s0Y3murWstnPYZG+Gg+WqabXsQiXoXgBa92+XhNfyv3cxN6qSndr4xH9reXp+f6LXIDq2SPK9oFsR+4woAeQMTc=

000120

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	12/04/2023 19:10
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/04/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230360075080

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	1,331
Cantidad a cargo:	1,331
Cantidad a pagar:	1,331

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0423 238H 7900 3832 6476**

Importe total a pagar: **$1,331**

Vigente hasta: **20/04/2023**

Obligado a pagar por internet

0423238H790038326476 1331

Sello digital :

hHwWzHEYOQovz4DgMiP7MpRoYz+MmKVh4cycAZOs4lvhL106BJoTP7tA9RMUIxPR/MfhTt/2dKyPdJe0ktq5gWVetUioEcUf0Nm=
jSnp6TSqRmN145tEwFAaWEfMFJ/kGeAQvElMOYwShmhlTOxYgjbyXfNEirmYHKGPwzcniCFeyVMTxvDWVwqR7OAilK0q6xCiXZz.
8Rlmlo03wd2F+HCc4r0d5u6NwhRSUUPG1gzOF15DdyJk718JAeWAz4EflWyuQHANTpAG9QYQb6uKczfWiE0PnSEh7VZSgzfeXf1/
w9fQ9yshpo9ODLA0fldnDSqaOZ3OPXKRcQkASdPR3A==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

000121

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	12/04/2023 19:10
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/04/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230360075080

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME El Banco de Hoy · Banco Azteca · BanBajio · BBVA · Bancrea · Banjercito · Banorte · banregio · Bansi · Banco Base · CIBanco · citibanamex · HSBC · Inbursa · Intercam Banco · Mi Banco · Banca Mifel · monex Banco · MUFG Bank México, S.A. · Banco Multiva · Santander · Scotiabank · Bx+

Sello digital :

hHwWzHEYOQovz4DgMiP7MpRoYz+MmKVh4cycAZOs4lvhL106BJoTP7tA9RMUIxPR/MfhTt/2dKyPdJe0ktq5gWVetUioEcUf0NmF
jSnp6TSqRmN145tEwFAaWEfMFJ/kGeAQvElMOYwShmhlTOxYgjbyXfNEirmYHKGPwzcniCFeyVMTxvDWVwqR7OAilK0q6xCiXZz/
8Rlmlo03wd2F+HCc4r0d5u6NwhRSUUPG1gzOF15DdyJk718JAeWAz4EflWyuQHANTpAG9QYQb6uKczfWiE0PnSEh7VZSgzfeXf1/
w9fQ9yshpo9ODLA0fldnDSqaOZ3OPXKRcQkASdPR3A==

RECIBO DE OPERACIÓN

Título:	Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales - Depósito Referenciado
Medio de Presentación:	Internet (BEP)
Fecha de Pago:	14/04/2023
Hora de Pago:	14:07 hrs
Cuenta Origen:	ENLACE NEGOCIOS BASICA - 0248008101
Línea de Captura:	0423238H790038326476
Importe Pagado:	$1,331
Comisión:	$0.00 MN
IVA Comisión:	$0.00 MN
Número de Operación:	574753610423
Llave de Pago:	2C7C7A1340
Canal de Pago:	IN Internet
Forma de Pago :	03 Transferencia Electrónica de Fondos

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante. Comuníquese con nosotros al 5140 5640 desde la Cd. De México y 01 800 DIRECTA (347 3282) en el Interior de la República, de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs. y sábados de 8:00 a 14:00 hrs.

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

000122

000123

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	20/04/2023 20:42
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/04/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230480089128

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	76,293
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO
¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	NO
INGRESOS NOMINALES	76,293
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	25,300

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
FEBRERO	25,300	PRESENTADA-PAGO EN CERO
Total	**25,300**	

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	25,300
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	101,593

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	101,593
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0000

COEFICIENTE DE UTILIDAD

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	20/04/2023 20:42
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/04/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230480089128

DETERMINACIÓN

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2022	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	07/04/2023
2021	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	12/04/2022
2020	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	25/03/2021
2019	0.0000	CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL	15/02/2023
2018	0.0000	CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL	15/02/2023

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	0
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	0
IMPUESTO CAUSADO	0
IMPUESTO DEL PERIODO	0
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	0
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	0

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	20/04/2023 20:42
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/04/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230480089128

DETERMINACIÓN

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

Total	**0**
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	20/04/2023 20:42
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/04/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230480089128

DETERMINACIÓN

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
Total	**0**	

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO	0
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

IMPUESTO A CARGO	0

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

000127

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	ICO091216UUA
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal		
EJERCICIO	2023	PERIODO	Marzo
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	20/04/2023 20:37	NÚMERO DE OPERACIÓN	525129211

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	76,293	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF	0	TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	0

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	0	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	76,293
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0	TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	76,293

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	12,207	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RF	0	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0	IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	6,026
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)	0	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	12,207	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA	
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	6,181	IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR	0	IVA ACREDITABLE	6,181

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

000128

ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		TOTAL DE IVA ACREDITABLE	6,181
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	6,181		

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	76,293	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	6,026
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO	0	CANTIDAD A CARGO	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN	0	SALDO A FAVOR	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS		DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	76,293	IMPUESTO A FAVOR	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)	0	ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	12,207	DIFERENCIA A CARGO	0
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE	0	IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
IVA RETENIDO	0	IMPUESTO A CARGO	0
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	6,181	REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	0		

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%	0	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	76,293
REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	76,293

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

000129

DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A CARGO	0	CERTIFICADOS TESOFE	
A FAVOR		DIÉSEL MARINO	
PARTE ACTUALIZADA		TOTAL DE APLICACIONES	0
RECARGOS		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	0
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	0

000130

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Abril	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	05/05/2023 19:05	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	527537507		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto a favor:	5,663

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

Sello Digital :

eZbCgSGJjnZzmaaF/9XRivJrsaBuykgs7o1RvG1KUDRzBPzPf4XNAkVrBEvCaARsZtMjulwCovkMtoB39EG5yXUfndU2ZtwQ3OA
jPjrDBtw3UCP4fO4PX2a6UP5OUyWnS7KMsEEfwevgHB/xtk5BTy1OHxzYYzX02ypSp0pYXU=

000131

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	04/05/2023 19:44
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/05/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230720629232

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	622
Subsidio para el empleo:	(1)
Cantidad a cargo:	621
Cantidad a pagar:	621

Sello digital :

fd78oahyI7F8ncz6dWEkUrdxHiYJUV4CeBp2C5jTNrZk/ut7bmZi/ac3Vjyn8+G0uP7KDbb6yXeTZWpL+pG+7tf3f3o+oQn5/d/i
bsFbNka4Pea3WP7JAMDucGyd+zYiU08VpoM0YVWh6eC+bFHm6PQBsZ0GG1L8LfG9m59r5kVbI/H1j5Gim5z/dQq/wK3nf7Q+vOtH
uJ9WKKvZrUm78HpnfT5QGyOENDigfwqgZ/KCDK9AiGlKTjPBBzS7JepFj+MKhitufVzNEhLQSweT2aqRR0JgirJRuKJaS6K0lP5s
NOeCF1dZMMQpy0kqLODULaHbc5RosaTyRBIzmO/xpw==

000132

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	04/05/2023 19:44
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/05/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230720629232

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0423 2N3T 8000 3865 9490**

Importe total a pagar: **$621**

Vigente hasta: **22/05/2023**

Obligado a pagar por internet

04232N3T800038659490 621

Sello digital :

fd78oahyI7F8ncz6dWEkUrdxHiYJUV4CeBp2C5jTNrZk/ut7bmZi/ac3Vjyn8+G0uP7KDbb6yXeTZWpL+pG+7tf3f3o+oQn5/d/i
bsFbNka4Pea3WP7JAMDucGyd+zYiU08VpoM0YVWh6eC+bFHm6PQBsZ0GG1L8LfG9m59r5kVbI/H1j5Gim5z/dQq/wK3nf7Q+vOtH
uJ9WKKvZrUm78HpnfT5QGyOENDigfwqgZ/KCDK9AiGlKTjPBBzS7JepFj+MKhitufVzNEhLQSweT2aqRR0JgirJRuKJaS6K0lP5s
NOeCF1dZMMQpy0kqLODULaHbc5RosaTyRBIzmO/xpw==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	04/05/2023 19:44
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/05/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230720629232

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME El Banco de Hoy · Banco Azteca · BanBajio · BBVA
Bancrea · Banjercito · Banorte · banregio · Bansi
Banco Base · CIBanco · citibanamex · HSBC · Inbursa
Intercam Banco · Mi Banco · Banca Mifel · monex Banco · MUFG Bank México, S.A.
Banco Multiva · Santander · Scotiabank · Bx+

Sello digital :

fd78oahyI7F8ncz6dWEkUrdxHiYJUV4CeBp2C5jTNrZk/ut7bmZi/ac3Vjyn8+G0uP7KDbb6yXeTZWpL+pG+7tf3f3o+oQn5/d/i
bsFbNka4Pea3WP7JAMDucGyd+zYiU08VpoM0YVWh6eC+bFHm6PQBsZ0GG1L8LfG9m59r5kVbI/H1j5Gim5z/dQq/wK3nf7Q+vOtH
uJ9WKKvZrUm78HpnfT5QGyOENDigfwqgZ/KCDK9AiGlKTjPBBzS7JepFj+MKhitufVzNEhLQSweT2aqRR0JgirJRuKJaS6K0lP5s
NOeCF1dZMMQpy0kqLODULaHbc5RosaTyRBIzmO/xpw==


¡OPERACIÓN EXITOSA!
Servicio o impuesto
Cantidad
$ 621 MN
Desde
Para
Mujer Banorte
Línea de captura
Cuenta ****2627
04232N3T800038659490
22/05/2023 - 13:05:21
Ver más detalles
Compartir
Finalizar
Otro pago

0001134

000135

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	05/05/2023 18:54
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/05/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230810631975

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	0
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO
INGRESOS NOMINALES	0
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	101,593

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
FEBRERO	25,300	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MARZO	76,293	PRESENTADA-PAGO EN CERO
Total	**101,593**	

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	101,593
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	101,593

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	101,593
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0000

COEFICIENTE DE UTILIDAD

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	05/05/2023 18:54
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/05/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230810631975

DETERMINACIÓN

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2022	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	07/04/2023
2021	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	12/04/2022
2020	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	25/03/2021
2019	0.0000	CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL	15/02/2023
2018	0.0000	CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL	15/02/2023

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	0
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	0
IMPUESTO CAUSADO	0
IMPUESTO DEL PERIODO	0
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	0
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	0

000137

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	05/05/2023 18:54
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/05/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230810631975

DETERMINACIÓN

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	05/05/2023 18:54
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/05/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230810631975

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0
Total	**0**
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MARZO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
Total	**0**	

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO	0
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

IMPUESTO A CARGO	0

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	05/05/2023 18:54
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/05/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230810631975

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

000140

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	ICO091216UUA
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal		
EJERCICIO	2023	PERIODO	Abril
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	05/05/2023 19:05	NÚMERO DE OPERACIÓN	527537507

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	0	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF		TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	0

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	0	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RF	0	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0	IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)	0	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	0	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA	
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0	IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		IVA ACREDITABLE	0
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS		TOTAL DE IVA ACREDITABLE	0

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

000141

EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%		OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	5,663
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO		CANTIDAD A CARGO	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN		SALDO A FAVOR	5,663
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS		DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0	IMPUESTO A FAVOR	5,663
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)		ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	0	DIFERENCIA A CARGO	0
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE		IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
IVA RETENIDO		IMPUESTO A CARGO	0
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	0	REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE			

DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A CARGO		CERTIFICADOS TESOFE	
A FAVOR	5,663	DIÉSEL MARINO	
PARTE ACTUALIZADA		TOTAL DE APLICACIONES	0
RECARGOS		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	0
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	0

000142

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Mayo	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	17/06/2023 07:49	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	533775455		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto a favor:	11,507

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

Sello Digital :

pZlKxDABWpFKynPITDsxfBPvnSGctbQZEyL+sHxcwrkFUXZdAjTCKCAH4yq5R7h989mT3+HY7+kkflu0k/vJls4GzI4BwpADx7+
B8XpKCcFLG8Q052twf/Y7gg7D9nWJ8y8esxvFM1GIWwkRl0Se+4RcNfsTSIexBQxj0ao/ik=

000143

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	15/06/2023 12:12
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/06/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230560177580

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	643
Cantidad a cargo:	643
Cantidad a pagar:	643

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0423 3IFF 5100 3896 9405**

Importe total a pagar: **$643**

Vigente hasta: **22/06/2023**

Obligado a pagar por internet

04233IFF510038969405 643

Sello digital :

CUPCGPSfFqSsk8bwKj6zFtSGXLsTM7D8diX8vR9LJmqY/ZtqQcBRtDm+kULeBbky1xR7sqzSdbhAVQEifRW05zyqVzBV5rIPW5oP
ElruVrJOwKw3p7/Ii8oLHyFQ20SAUFO+0PnaREACYIikduntr8+6lrGJWKZhRi9gGNQ9YF1TnA4GE53xkW+ZyCDhVTBonCRSmdRG
OqstgtL3CC3myiBXKBEUvRJJpcOaw1p4DPW5b8LITmVUjBJWIdcvOMlAgZc8ftmeX1rZeSkxlHa1+krpwXUuRyFCSCEW2y/mPdxc
vOve1YD+L2GYeatyzoOxh7FRnAp6Slo7i/AgNzbEww==

000144

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	15/06/2023 12:12
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/06/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230560177580

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME El Banco de Hoy · BanBajío · BBVA · Banco Bancrea · Banjercito · Banorte · banregio · Bansi · Banco Base · CIBanco · citibanamex · HSBC · Inburba · Intercam Banco · Mi Banco · Banca Mifel · monex Banco · MUFG Bank México, S.A. · Banco Multiva · Santander · Scotiabank · BX+

Sello digital :

CUPCGPSfFqSsk8bwKj6zFtSGXLsTM7D8diX8vR9LJmqY/ZtqQcBRtDm+kULeBbky1xR7sqzSdbhAVQEifRW05zyqVzBV5rIPW5oP
ElruVrJOwKw3p7/Ii8oLHyFQ20SAUFO+0PnaREACYIikduntr8+6lrGJWKZhRi9gGNQ9YF1TnA4GE53xkW+ZyCDhVTBonCRSmdRG
OqstgtL3CC3myiBXKBEUvRJJpcOaw1p4DPW5b8LITmVUjBJWIdcvOMlAgZc8ftmeX1rZeSkxlHa1+krpwXUuRyFCSCEW2y/mPdxc
vOve1YD+L2GYeatyzoOxh7FRnAp6Slo7i/AgNzbEww==

BANORTE

Autorizado

Pago referenciado SAT

Cantidad

$ 643 MN

Clave de rastreo:	591448017223
Cuenta origen:	Mujer Banorte ****2627
Medio de presentación:	Móvil
Línea de captura:	04233IFF510038969405
Comisión:	$ 0 MN
IVA de comisión:	$ 0 MN

000146

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	17/06/2023 07:55
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/06/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230140226064

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	299,999
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO
INGRESOS NOMINALES	299,999
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	101,593

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
FEBRERO	25,300	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MARZO	76,293	PRESENTADA-PAGO EN CERO
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
Total	**101,593**	

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	101,593
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	401,592

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	401,592
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0000

COEFICIENTE DE UTILIDAD

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2023
Medio de presentación: Internet
Versión: 11
Período de la declaración: Mayo
Fecha y hora de presentación: 17/06/2023 07:55
Vencimiento Obligación: 22/06/2023
Número de operación: 230140226064

DETERMINACIÓN

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2022	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	07/04/2023
2021	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	12/04/2022
2020	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	25/03/2021
2019	0.0000	CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL	15/02/2023
2018	0.0000	CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL	15/02/2023

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	0
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU DETERMINADA EN DECLARACIÓN ANUAL	0
MONTO LÍMITE DE PTU A APLICAR	0
PTU PAGADA AL MES DE MAYO	0
LÍMITE DE PTU A DISTRIBUIR EN EL PERIODO	0
PTU ACUMULADA A APLICAR EN EL PERIODO	0

BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	0
IMPUESTO CAUSADO	0
IMPUESTO DEL PERIODO	0

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	17/06/2023 07:55
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/06/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230140226064

DETERMINACIÓN

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	0
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO

A CARGO	0

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	17/06/2023 07:55
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/06/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230140226064

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

Total **0**

000150

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	17/06/2023 07:55
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/06/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230140226064

DETERMINACIÓN

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MARZO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
Total	**0**	

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO	0
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0
IMPUESTO A CARGO	0

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	17/06/2023 07:55
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/06/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230140226064

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

000152

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	ICO091216UUA
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal		
EJERCICIO	2023	PERIODO	Mayo
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	17/06/2023 07:49	NÚMERO DE OPERACIÓN	533775455

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	299,999	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF		TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	0

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	299,999	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RF	0	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0	IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)	0	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	0	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA	0
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0	IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0	IVA ACREDITABLE	0
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0	MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	0
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS	0	TOTAL DE IVA ACREDITABLE	0

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

000153

EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	299,999	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	30,405
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO	0	CANTIDAD A CARGO	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN	0	SALDO A FAVOR	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS		DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	299,999	IMPUESTO A FAVOR	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)		ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	48,000	DIFERENCIA A CARGO	0
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE	0	IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
IVA RETENIDO	0	IMPUESTO A CARGO	0
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	17,595	REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	0		

DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A CARGO		CERTIFICADOS TESOFE	
A FAVOR	0	DIÉSEL MARINO	
PARTE ACTUALIZADA		TOTAL DE APLICACIONES	0
RECARGOS		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	0
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	0

000154

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Junio	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	07/07/2023 06:11	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	536622050		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto a favor:	3,187

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

Sello Digital :

ZvuMQH4nUvGdup8wAn4hg4VMiNO4oQbTvBrUcDYEgfstQ1VhZZm4Fuvse7j82zXqNliWGlwkdcOiGCmNjSJJTQ4JiMUcFk8H9eq
Wc5pElj9/ahPOQsrpCzC/pJ/ABZ91W+683ifxTeqemtZnGaoJL60gUIpP9ZTw+QWEWKNMLg=

000155

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	06/07/2023 18:22
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/07/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230720932651

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	622
Cantidad a cargo:	622
Cantidad a pagar:	622

Sello digital :

B5ee6HZn5UC/Dh+w566gxJLe/4iz83If/5w5M1b+RiZ0txN6TqZzop0VStcI1iE/Agz0rA1sQpDyJ18c2TRlEqqZ3X4u4qahYA9T
GouiSBHADiiVVlqAZJ1M3hFhd7dznxZo1u9FeUXHbELeRudlf5nHVd5h7XoK92Bsm51/hQRn3QXLJQZzVaGngnIGE8NymAGgGKRL
47XEw4SVSOgkDii7XdMH2gOHtaMVceoXVfqdxTWZHUD0/U+N9ocE31riaSYjRsNSo7u8bC55Xs3Xofy5b9PkL9RK3CSo2GWTFlyH
zoVL/tP0uGKX+4xtj/oxAa5bMl0Mp8ryl83N//m3jA==

000156

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	06/07/2023 18:22
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/07/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230720932651

responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de alizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0423 3ZCC 9800 3925 6404**

Importe total a pagar: **$622**

Vigente hasta: **20/07/2023**

Obligado a pagar por internet

04233ZCC980039256404 622

Sello digital :

B5ee6HZn5UC/Dh+w566gxJLe/4iz83If/5w5M1b+RiZ0txN6TqZzop0VStcI1iE/Agz0rA1sQpDyJ18c2TRlEqqZ3X4u4qahYA9T
GouiSBHADiiVVlqAZJ1M3hFhd7dznxZo1u9FeUXHbELeRudlf5nHVd5h7XoK92Bsm51/hQRn3QXLJQZzVaGngnIGE8NymAGgGKRL
47XEw4SVSOgkDii7XdMH2gOHtaMVceoXVfqdxTWZHUD0/U+N9ocE31riaSYjRsNSo7u8bC55Xs3Xofy5b9PkL9RK3CSo2GWTFlyH
zoVL/tP0uGKX+4xtj/oxAa5bMl0Mp8ryl83N//m3jA==

000157

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	06/07/2023 18:22
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/07/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230720932651

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME El Banco de Hoy · BanBajío · BBVA · Banco Bancrea · Banjercito · Grupo Financiero Banorte · banregio · Bansi Banca Múltiple · Banco Base · CIBanco · citibanamex · HSBC · Inbursa Banco · Intercam Banco · Mi Banco · Banca Mifel · Grupo Financiero monex Banco · MUFG Bank México, S.A. Institución de Banca Múltiple Filial · Banco Multiva · Santander · Scotiabank · BX+

Sello digital :

B5ee6HZn5UC/Dh+w566gxJLe/4iz83If/5w5M1b+RiZ0txN6TqZzop0VStcI1iE/Agz0rA1sQpDyJ18c2TRlEqqZ3X4u4qahYA9T
GouiSBHADiiVVlqAZJ1M3hFhd7dznxZo1u9FeUXHbELeRudlf5nHVd5h7XoK92Bsm51/hQRn3QXLJQZzVaGngnIGE8NymAGgGKRL
47XEw4SVSOgkDii7XdMH2gOHtaMVceoXVfqdxTWZHUD0/U+N9ocE31riaSYjRsNSo7u8bC55Xs3Xofy5b9PkL9RK3CSo2GWTFlyH
zoVL/tP0uGKX+4xtj/oxAa5bMl0Mp8ryl83N//m3jA==

RECIBO DE OPERACIÓN

Título:	Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales - Depósito Referenciado
Medio de Presentación:	Internet (BEP)
Fecha de Pago:	14/07/2023
Hora de Pago:	11:51 hrs
Cuenta Origen:	ENLACE NEGOCIOS BASICA - 0248008101
Línea de Captura:	04233ZCC980039256404
Importe Pagado:	$622
Comisión:	$0.00 MN
IVA Comisión:	$0.00 MN
Número de Operación:	519391619523
Llave de Pago:	B469C5D171
Canal de Pago:	IN Internet
Forma de Pago :	03 Transferencia Electrónica de Fondos

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante. Comuníquese con nosotros al 5140 5640 desde la Cd. De México y 01 800 DIRECTA (347 3282) en el Interior de la República, de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs. y sábados de 8:00 a 14:00 hrs.

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

000158

000159

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	06/07/2023 18:22
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/07/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230720932651

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	67,629
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO
¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	NO
INGRESOS NOMINALES	67,629
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	401,592

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
FEBRERO	25,300	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MARZO	76,293	PRESENTADA-PAGO EN CERO
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MAYO	299,999	PRESENTADA-PAGO EN CERO
Total	**101,593**	

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	401,592

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	469,221

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	469,221
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0000

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	06/07/2023 18:22
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/07/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230720932651

DETERMINACIÓN

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2022	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	07/04/2023
2021	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	12/04/2022
2020	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	25/03/2021
2019	0.0000	CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL	15/02/2023
2018	0.0000	CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL	15/02/2023

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	0
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU DETERMINADA EN DECLARACIÓN ANUAL	0
MONTO LÍMITE DE PTU A APLICAR	0
PTU PAGADA AL MES DE MAYO	0
LÍMITE DE PTU A DISTRIBUIR EN EL PERIODO	0
PTU ACUMULADA A APLICAR EN EL PERIODO	0

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	06/07/2023 18:22
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/07/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230720932651

DETERMINACIÓN

BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	0
IMPUESTO CAUSADO	0
IMPUESTO DEL PERIODO	0
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	0
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	06/07/2023 18:22
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/07/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230720932651

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	06/07/2023 18:22
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/07/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230720932651

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MAYO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0
Total	**0**
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MARZO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MAYO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
Total	**0**	

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	06/07/2023 18:22
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/07/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230720932651

DETERMINACIÓN

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO	0
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

IMPUESTO A CARGO	0

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

000165

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	06/07/2023 18:22
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/07/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230720932651

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	10
PAGOS DE SUELDOS	63,556
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	0
ISR RETENIDO POR SUELDOS	622
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	622
IMPUESTO A CARGO	622

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	622
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	622
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	622
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	622
CANTIDAD A PAGAR	622

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

000166

SAT

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	ICO091216UUA
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal		
EJERCICIO	2023	PERIODO	Junio
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	07/07/2023 06:11	NÚMERO DE OPERACIÓN	536622050

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	67,629	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF	0	TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	0

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	0	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	67,629
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0	TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	67,629

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	10,821	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RF		IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0	IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	10,821
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)	0	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	10,821	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA	
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR	0	IVA ACREDITABLE	0

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

000167

ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		TOTAL DE IVA ACREDITABLE	0
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0		

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	67,629	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	14,008
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO		CANTIDAD A CARGO	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN		SALDO A FAVOR	3,187
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS		DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	67,629	IMPUESTO A FAVOR	3,187
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)		ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	10,821	DIFERENCIA A CARGO	0
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE		IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
IVA RETENIDO		IMPUESTO A CARGO	0
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	0	REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE			

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%	0	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	67,629
REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	67,629

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

000168

DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A CARGO		CERTIFICADOS TESOFE	
A FAVOR	3,187	DIÉSEL MARINO	
PARTE ACTUALIZADA		TOTAL DE APLICACIONES	0
RECARGOS		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	0
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	0

IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV
R.F.C. ICO091216UUA
CALLE CORREGIDORA N. 4 COLONIA MORELOS C.P. 39530
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

ESTADO DE POSICION FINANCIERA, BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2021.

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		**A CORTO PLAZO**	
CAJA	$ 20,000.00	IMPUESTOS POR PAGAR	$ 35,261.36
BANCOS	$ 35,000.00		
CLIENTES	$ 703,708.59		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	**$ 758,708.59**	TOTAL A CORTO PLAZO	**$ 35,261.36**
FIJO		**CAPITAL CONTABLE**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 2,820,282.62	CAPITAL SOCIAL	$ 50,000.00
DEP ACUM DE MAQ. Y EQUIPO	$ 234,782.61	UTIL. DE EJERCICIOS ANTERIORES	$ 3,202,685.00
EQUIPO DE COMPUTO	$ 11,032.76	UTIL. DEL EJERCICIO	$ 62,357.00
DEP ACUM. DE EQ DE COMPUTO	$ 4,938.00		
TOTAL ACTIVO FIJO	**$ 2,591,594.77**	SUMA DE CAPITAL	**$ 3,315,042.00**
TOTAL DE ACTIVO	**$ 3,350,303.36**	**TOTAL DEL PASIVO Y CAPITAL**	**$ 3,350,303.36**

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LA MISMA, ASUMIENDO ASÍ MISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

C.P.C. ARTURO ZARAGOZA LOPEZ
CED. PROF. N° 760829
N° REGISTRO A.G.A.F.F. 4881

IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV
R.F.C. ICO091216UUA
CALLE CORREGIDORA N. 4 COLONIA MORELOS C.P. 39530
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021.

		%
INGRESOS	$ 9,129,660.00	100
TOTAL INGRESOS	$ 9,129,660.00	100
EGRESOS		
GASTOS GENERALES	$ 9,067,303.00	100
TOTAL CTAS DE RESULTADO DEUDORAS	$ 9,067,303.00	
TOTAL EGRESOS	$ 9,067,303.00	
UTILIDAD O PERDIDA	$ 62,357.00	100

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LA MISMA, ASUMIENDO ASÍ MISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

C.P.C. ARTURO ZARAGOZA LOPEZ
CED. PROF. Nº 760829
Nº REGISTRO A.G.A.F.F. 4881

IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV
R.F.C. ICO091216UUA
CALLE CORREGIDORA N. 4 COLONIA MORELOS C.P. 39530
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

RELACION ANALITICA DE CLIENTES AL 31 DE DICIEMBRE 2021.

SOCRATES AVELINO FIGUEROA	$	350,000.00
JOSE ANTONIO CORDOVA SOLCHAGA	$	353,708.59
TOTAL	**$**	**703,708.59**

RELACION ANALITICA DE BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021.

BANORTE	$	35,000.00
TOTAL	**$**	**35,000.00**

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LA MISMA, ASUMIENDO ASÍ MISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

C.P.C. ARTURO ZARAGOZA LOPEZ
CED. PROF. Nº 760829
Nº REGISTRO A.G.A.F.F. 4881

IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV
R.F.C. ICO091216UUA
CALLE CORREGIDORA N. 4 COLONIA MORELOS C.P. 39530
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

RELACION ANALITICA DE ACTIVOS FIJOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021.

MAQUINARIA Y EQUIPO

EVOLVEDORA DE CONCRETO MCA. CIPSA	$ 13,000.00
RODILLO VIBRO COMPACTADOR AR-18	$ 80,000.00
VIBRADOR A GASOLINA MCA CIPSA, MOTOR HONDA 5.5 HP	$ 7,000.00
RETRO EXCAVADORA MARCA JHON DEERE MOD. 2011	$ 278,260.87
RETRO EXCAVADORA MARCA CATERPILLAR MOD. 416 D	$ 208,695.66
RETRO EXCAVADORA MARCA CATERPILLAR MOD. 416 E	$ 347,826.09
CAMIÓN DE VOLTEO TORTON INTER	$ 775,000.00
CAMIÓN VOLTEO RABON M2	$ 610,500.00
AUTOMOVIL MARCA VERSA MODELO 19	$ 200,000.00
CAMIONETA NISSAN 19	$ 300,000.00
SUMA	**$ 2,820,282.62**

EQUIPO DE COMPUTO

COMPUTADORA HP	$ 11,032.76
SUMA	**$ 11,032.76**

SUMA DE TOTAL DE ACTIVO FIJO **$ 2,831,315.38**

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LA MISMA, ASUMIENDO ASÍ MISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

C.P.C. ARTURO ZARAGOZA LOPEZ
CED. PROF. Nº 760829
Nº REGISTRO A.G.A.F.F. 4881

IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

R.F.C. ICO091216UUA
CALLE CORREGIDORA N. 4 COLONIA MORELOS C.P. 39530
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO


BALANCE COMPARATIVO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL AL 31 DE DICIEMBRE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE 2022.


CUENTAS	31 DE DICIEMBRE 2022	31 DE DICIEMBRE 2021	DIFERENCIAS	SIGNO
ACTIVO				
A CORTO PLAZO				
CAJA	25,000.00	20,000.00	5,000.00	+
BANCOS	40,000.00	35,000.00	5,000.00	+
CLIENTES	392,488.23	703,708.59	311,220.36	-
SUMA DE ACTIVO A CORTO PLAZO	**457,488.23**	**758,708.59**	**301,220.36**	-
A LARGO PLAZO				
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,820,282.62	2,820,282.62	0.00	=
EQUIPO DE COMPUTO	11,032.76	11,032.76	0.00	=
DEP ACUM DE MAQ. Y EQUIPO	234,782.61	234,782.61	0.00	=
DEP ACUM. DE EQ DE COMPUTO	4,938.00	4,938.00	0.00	=
SUMA DE ACTIVO A LARGO PLAZO	**3,071,035.99**	**3,071,035.99**	**0.00**	=
TOTAL ACTIVO	**3,528,524.22**	**3,829,744.58**	**301,220.36**	-
PASIVO				
CIRCULANTE				
IMPUESTOS POR PAGAR	28,753.00	35,261.36	6,508.36	-
PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	=
SUMA DE PASIVO CIRCULANTE	**28,753.00**	**35,261.36**	**6,508.36**	-
TOTAL DE PASIVO	**28,753.00**	**35,261.36**	**6,508.36**	-
CAPITAL CONTABLE				
CAPITAL SOCIAL	50,000.00	50,000.00	0.00	=
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	2,907,973.00	62,357.00	2,845,616.00	+
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	62,357.00	3,202,685.00	3,140,328.00	-
TOTAL CAPITAL CONTABLE	**3,020,330.00**	**3,315,042.00**	**294,712.00**	-
ACTIVO	3,528,524.22	3,829,744.58	301,220.36	-
PASIVO	28,753.00	35,261.36	6,508.36	+
CAPITAL CONTABLE	3,020,330.00	3,315,042.00	294,712.00	-

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LA MISMA, ASUMIENDO ASÍ MISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

C.P.C. ARTURO ZARAGOZA LOPEZ
CED. PROF. N° 760829
N° REGISTRO A.G.A.F.F. 4881

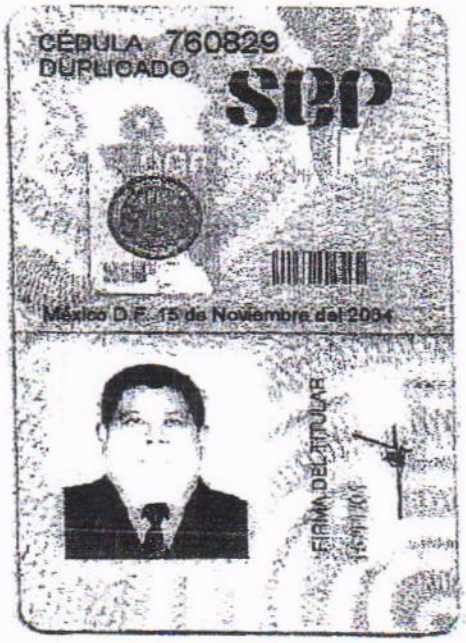
CÉDULA 760829
DUPLICADO
SEP
México D.F. 15 de Noviembre del 2004
FIRMA DEL TITULAR

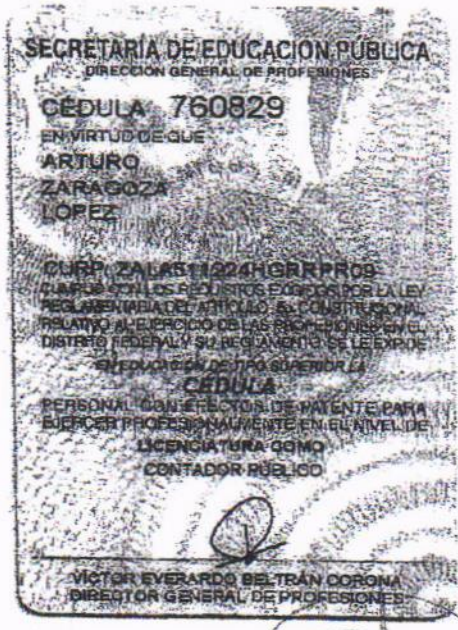
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES
CÉDULA 760829
EN VIRTUD DE QUE
ARTURO
ZARAGOZA
LOPEZ
CURP ZALA611224HGRRPR09
CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY
REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL
RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL
DISTRITO FEDERAL Y SU REGLAMENTO SE LE EXPIDE
EN EDUCACIÓN DE TIPO SUPERIOR LA
CÉDULA
PERSONAL CON EFECTOS DE PATENTE PARA
EJERCER PROFESIONALMENTE EN EL NIVEL DE
LICENCIATURA COMO
CONTADOR PÚBLICO
VÍCTOR EVERARDO BELTRÁN CORONA
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES


MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
ZARAGOZA
LOPEZ
ARTURO

FECHA DE NACIMIENTO
24/12/1951

SEXO H


DOMICILIO
C 14 DE SEPTIEMBRE 67
COL LA MIRA 39480
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE DE ELECTOR ZRLPAR51122412H900

CURP ZALA511224HGRRPR09 AÑO DE REGISTRO 1992 03

ESTADO 12 MUNICIPIO 001 SECCIÓN 0070

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2015 VIGENCIA 2025

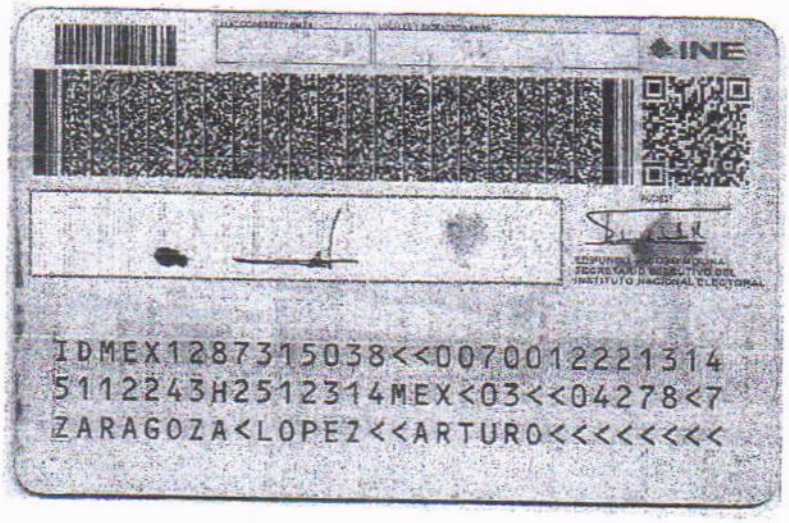
INE

IDMEX1287315038<<0070012221314
5112243H2512314MEX<03<<04278<7
ZARAGOZA<LOPEZ<<ARTURO<<<<<<<<

Instituto Mexicano de
Contadores Públicos
Estado de Guerrero

Oficio No. CCPEG/084/2019

Acapulco, Gro., 25 de Marzo del 2019

A QUIEN CORRESPONDA:

P R E S E N T E

Nos permitimos hacer constar que el **C.P.C. ARTURO ZARAGOZA LOPEZ**, es Asociado Activo del **COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO, A.C.**, y del **INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PÚBLICOS, A.C.**, desde el quince de Febrero de mil novecientos ochenta y tres, con número de asociado 128.

A solicitud del interesado, se extiende la presente Constancia el veinticinco de Marzo del dos mil diecinueve, en la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero.

A T E N T A M E N T E

Instituto Mexicano de Contadores Públicos Estado de Guerrero

C.P. y P.C.C.A. Luis Enrique Schott Gaspar
PRESIDENTE

L.C. Graciela Pérez Benitez
SECRETARIO

Av. Lic. Manuel Gómez Morín Lote 12 y 19-A, Fracc. Magallanes C.P. 39670 Acapulco, Gro.
Tels. 01(744) 4868532 y 01(744) 4869144 www.ccpgro.org.mx

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

ENTREGA PERSONAL

Dependencia:- DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION.
SUBDIRECCION DE PROGRAMACION.
COORDINACION DE CONTROL DE EMPRESAS DICTAMINADAS.

Núm.-
Exp.-

360-III- 10383
110/ 10383

ASUNTO.- Se expide constancia de inscripción en el Registro de Contadores Públicos de acuerdo a su solicitud, de fecha 11 del presente mes.

México, D. F., a 16 de marzo de 1983.

Contador Público
ARTURO ZARAGOZA LOPEZ
Costera M. Alemán 276-201
Centro
Acapulco, Gro.

En atención a su solicitud arriba mencionada, y en virtud de haber acreditado lo dispuesto en el Artículo 52 del Código Fiscal de la Federación vigente y Artículo 21 del Reglamento del Artículo 85 del derogado Código Fiscal de la Federación de fecha 30 de diciembre de 1966, aplicable por disposición del párrafo segundo del Artículo Segundo transitorio del Código Fiscal de la Federación vigente, me complace hacer de su conocimiento que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio de la Dirección General de Fiscalización a mi cargo, con fundamento en el Artículo 39, fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha tenido a bien registrarlo en el LIBRO I DEL REGISTRO DE CONTADORES PUBLICOS, con fecha 16 de marzo de 1983, correspondiéndole el número 4 8 8 1.

Aprovecho la ocasión para exhortarlo al buen uso y cumplimiento de los lineamientos que establecen la Ley y el Código de Etica Profesional.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
El Director General.

MANUEL RODRIGUEZ ROCHA
Contador Público.

MRR*CHV*cupd.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL
ADMINISTRACION CENTRAL DE OPERACION DE LA FISCALIZACION
324-A-IV-
110/ 23891
133530

ENTREGA PERSONAL

ASUNTO : SE EXPIDE CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE DESPACHOS CONTABLES Y FISCALES DE ACUERDO A SU SOLICITUD

MEXICO, D.F., 17 DE JUNIO DE 1993.

ZARAGOZA LOPEZ ARTURO
CONTADOR PUBLICO REGISTRADO INDEPENDIENTE
COST. MIGUEL ALEMAN 276-303
COL. FRACC. HORNOS
ACAPULCO, GRO. C.P. 39300
P R E S E N T E

COPIA COTEJADA

EN ATENCION A SU SOLICITUD ARRIBA MENCIONADA Y EN VIRTUD DE HABER ACREDITADO LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 52 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE Y 45-A DEL REGLAMENTO DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION EN VIGOR; ME COMPLACE HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, POR MEDIO DE ESTA ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL, HA TENIDO A BIEN REGISTRARLE EN EL LIBRO I DE REGISTRO DE DESPACHOS CONTABLES FISCALES, CON FECHA 15 DE JUNIO DE 1993 CORRESPONDIENDOLE EL NUMERO 08356.

A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
LA ADMINISTRADORA CENTRAL

C.P. JOSEFINA DEL ONSE VALDIVIESO.

Profesión:
Nombre:
ZARAGOZA LOPEZ ARTURO
R.F.C.:
ZALA511224NW3
Medio de Presentación:
Internet

Esta Coordinación de Operación de la Fiscalización Nacional, de la Administración Central de Operación de la Fiscalización Nacional, dependiente de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, del Servicio de Administración Tributaria, en atención a su solicitud y en virtud de haber dado cumplimiento a los requisitos establecidos en los artículos 52, primer párrafo, fracción I, primero y segundo párrafo del inciso a), del Código Fiscal de la Federación, reformado mediante Decreto por el que se reforman, adicionan, y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, 60 de su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XVIII y 8, fracción III, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; artículos 2, primer párrafo, apartado B, fracción III, inciso a) y tercer párrafo; 10, primer párrafo, fracción I, en relación con el artículo 9, penúltimo párrafo; 18, primer párrafo, Apartado A, fracción II, en relación con el artículo 17, primer párrafo, fracción XIII, y penúltimo párrafo, numeral 1, inciso a),del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2007 y reformado mediante Decretos publicados el 29 de abril de 2010 y 13 de julio de 2012, en el mismo órgano oficial; de conformidad con el artículo Segundo transitorio, fracción VIII del Decreto por el que se reforman, adicionan, y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013; se le comunica que su registro número **4881** como Contador Público para formular dictámenes, quedó renovado en el Sistema de Contadores Públicos Registrados, con fecha **04/01/2014** y hora **11:58:16.**

Aprovecho la ocasión, para invitarle a que haga un buen uso de esta renovación y al cumplimiento de las normas de auditoría, a las disposiciones fiscales y al código de ética profesional del colegio al que pertenece.

Cadena Original:
|MEEO4507076R0|00001000000200783457|MEDINA ESTRADA OCTAVIO|ZALA511224NW3|4881|04/01/2014 11:58:16|

Sello Digital:
EEotaCLtr/IB/GGVs5cp25wPiL5GRDzGe8nqhxgN6s3pCc68Hf5Lx68w6rig
nMkN6r5iTg7SJhSC0HrVgjMqkHDLcEKUpTobISSJgqSaXg22aeL1mAGsWJPe
LayW0SNOPKUZ44ek3xBX8e97IW/CAWVOMu0EDC1ZwiKoJk7IUX0

Avenida Hidalgo Núm. 77 Mod. II 2° Piso, col. Guerrero, deleg. Cuauhtémoc, c.p. 06300, México, D.F. Tel. (55) 5802 0505, sat.gob.mx

From: registro.cprs@sat.gob.mx
To: arturo_zaragoza888@hotmail.com
Subject: Notificación Renovación de CP
Date: Sat, 4 Jan 2014 11:58:17 -0600FO-OF-CPRS-NOTCPRINT V 1.1

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Auditoría Fiscal Federal.
Administración Central de Operación de la Fiscalización Nacional.
Coordinación de Operación de la Fiscalización Nacional.

Notificación
Constancia de Renovación en el Sistema de Contadores Públicos Registrados

Instituto Mexicano de Contadores Públicos

CERTIFICADO No. 5052

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos

Extiende el presente Certificado con Reconocimiento de Idoneidad de la Secretaría de Educación Pública:

SEP/DGP/CP075/16, emitido el 20 de agosto de 2016

a

C.P.C.

Arturo Zaragoza López

En virtud de haber demostrado capacidad profesional para ejercer la Contaduría Pública, conforme lo señala el Reglamento para la Certificación Profesional de los Contadores Públicos.

Vigencia

1 de mayo de 2019 al 30 de abril de 2023

La certificación de la Contaduría Pública al servicio de la sociedad.

Verificación QR:

Cadena Original De Certificación Digital DPC:

I3HNpK2xlIGVl1KVsMyajaPX5pXi3pJMztaSw9DU6IGBmsAoJpDJ30zD2suS2NPFj
5mmsEypkaeWkXmIlJOkjWOntUCm1enlxdGF1oWQtueF5ueF1NiRmISUo8yZn1GUnl
k

Verificación Web Aquí. Si no puede abrir el link copie la siguiente ruta sin las comillas:
"https://dpc.imcp.org.mx/system/portal/?idx=444&xdme=5842&ecrmxhg=mXyrkJaglIKRlICV&pExk=mHankJ
OpmleRl1OV&bmgds=m33ZxMegx1OcylWXyKuclJKb1Veho9aDqK5QxKLGplQ"

IMCP 2019 D R

Principal▸Servicios▸Servicios Prestados por Terceros▸Consulta CPRS

Búsqueda de Contadores Públicos Registrados

Menú Principal Nueva búsqueda

Datos Generales del CPR

NÚM. REGISTRO CPR: 4881
FECHA DE ALTA: 15/07/1983
NOMBRE CPR: ZARAGOZA LOPEZ ARTURO
ENTIDAD FEDERATIVA: GUERRERO
MUNICIPIO O DELEGACIÓN: ACAPULCO
ALAF: ADM. DESCONCENTRADA DE GUERRERO 1

Despacho del CPR

NÚM. REGISTRO DESPACHO: 2356
NOMBRE DESPACHO: ZARAGOZA LOPEZ ARTURO
ENTIDAD FEDERATIVA: GUERRERO
SITUACIÓN DESPACHO: ALTA

Colegio del CPR

AGRUPACIÓN: INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PÚBLICOS A.C.
NOMBRE COLEGIO: COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO AC
ENTIDAD FEDERATIVA: GUERRERO
SITUACIÓN COLEGIO: ALTA

Dictámenes presentados del CPR

EJERCICIO	NUMERO
2001	12
2002	17
2003	13
2004	12
2005	13
2006	11
2007	16
2008	15
2009	13
2010	11
2011	12

2012	12
2013	10

Situaciones del CPR

SITUACION	FECHA
PRESENTÓ NEC 2006	30/03/2007
PRESENTO CONSTANCIA SOCIO ACT. 2007	30/03/2007
PRESENTO CONSTANCIA SOCIO ACT. 2008	14/04/2008
PRESENTÓ NEC 2007	14/04/2008
PRESENTÓ NEC 2008	31/03/2009
PRESENTÓ CONSTANCIA SOCIO ACT. 2009	31/03/2009
PRESENTÓ NEC 2009	30/03/2010
PRESENTÓ CONSTANCIA SOCIO ACT. 2010	30/03/2010
PRESENTÓ NEC 2010	31/03/2011
PRESENTÓ CONSTANCIA SOCIO ACT. 2011	31/03/2011
PRESENTÓ NEC 2011	29/03/2012
PRESENTÓ CONSTANCIA SOCIO ACT. 2012	29/03/2012
PRESENTÓ NEC 2012	25/03/2013
PRESENTÓ CONSTANCIA SOCIO ACT. 2013	25/03/2013
RENOVADO	04/01/2014
PRESENTÓ NEC 2013	14/03/2014
PRESENTÓ CONSTANCIA SOCIO ACT. 2014	14/03/2014
PRESENTÓ NEC 2014	02/03/2015
PRESENTÓ CONSTANCIA SOCIO ACT. 2015	02/03/2015
PRESENTÓ NEC 2015	29/02/2016
PRESENTÓ CONSTANCIA SOCIO ACT. 2016	29/02/2016
PRESENTÓ NEC 2016	07/03/2017

PRESENTÓ CONSTANCIA SOCIO ACT. 2017	07/03/2017
PRESENTÓ NEC 2017	07/03/2018
PRESENTÓ CONSTANCIA SOCIO ACT. 2018	07/03/2018
PRESENTÓ NEC 2018	04/03/2019
PRESENTÓ CONSTANCIA SOCIO ACT. 2019	04/03/2019
PRESENTO CERTIFICACIÓN	30/05/2019

Antecedentes de Sanción del CPR

SANCIÓN	FECHA DE INICIO Y TERMINO	MEDIO DE DEFENSA

IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV
R.F.C. ICO091216UUA
CALLE CORREGIDORA N. 4 COLONIA MORELOS C.P. 39530
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

ESTADO DE POSICION FINANCIERA, BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2022.

ACTIVO		**PASIVO**	
CIRCULANTE		**A CORTO PLAZO**	
CAJA	$ 25,000.00	IMPUESTOS POR PAGAR	$ 28,753.00
BANCOS	$ 40,000.00		
CLIENTES	$ 392,488.23		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	**$ 457,488.23**	TOTAL A CORTO PLAZO	**$ 28,753.00**
FIJO		**CAPITAL CONTABLE**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 2,820,282.62	CAPITAL SOCIAL	$ 50,000.00
DEP ACUM DE MAQ. Y EQUIPO	$ 234,782.61	UTIL. DE EJERCICIOS ANTERIORES	$ 62,357.00
EQUIPO DE COMPUTO	$ 11,032.76	UTIL. DEL EJERCICIO	$ 2,907,973.00
DEP ACUM. DE EQ DE COMPUTO	$ 4,938.00		
TOTAL ACTIVO FIJO	**$ 2,591,594.77**	SUMA DE CAPITAL	**$ 3,020,330.00**
TOTAL DE ACTIVO	**$ 3,049,083.00**	**TOTAL DEL PASIVO Y CAPITAL**	**$ 3,049,083.00**

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LA MISMA, ASUMIENDO ASÍ MISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

C.P.C. ARTURO ZARAGOZA LOPEZ
CED. PROF. Nº 760829
Nº REGISTRO A.G.A.F.F. 4881

IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV
R.F.C. ICO091216UUA
CALLE CORREGIDORA N. 4 COLONIA MORELOS C.P. 39530
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022.

		%
INGRESOS	$ 10,807,721.00	100
TOTAL INGRESOS	**$ 10,807,721.00**	100
EGRESOS		
GASTOS GENERALES	$ 7,899,748.00	100
TOTAL CTAS DE RESULTADO DEUDORAS	**$ 7,899,748.00**	
TOTAL EGRESOS	**$ 7,899,748.00**	
UTILIDAD O PERDIDA	**$ 2,907,973.00**	100

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LA MISMA, ASUMIENDO ASÍ MISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

C.P.C. ARTURO ZARAGOZA LOPEZ
CED. PROF. Nº 760829
Nº REGISTRO A.G.A.F.F. 4881

IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV
R.F.C. ICO091216UUA
CALLE CORREGIDORA N. 4 COLONIA MORELOS C.P. 39530
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

RELACION ANALITICA DE CLIENTES AL 31 DE DICIEMBRE 2022.

	SOCRATES AVELINO FIGUEROA	$	392,488.23
TOTAL		**$**	**392,488.23**

RELACION ANALITICA DE BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022.

	BANORTE	$	40,000.00
TOTAL		**$**	**40,000.00**

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LA MISMA, ASUMIENDO ASÍ MISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

C.P.C. ARTURO ZARAGOZA LOPEZ
CED. PROF. Nº 760829
Nº REGISTRO A.G.A.F.F. 4881

IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

R.F.C. ICO091216UUA

CALLE CORREGIDORA N. 4 COLONIA MORELOS C.P. 39530

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

RELACION ANALITICA DE ACTIVOS FIJOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022.

MAQUINARIA Y EQUIPO

REVOLVEDORA DE CONCRETO MCA. CIPSA	$	13,000.00
RODILLO VIBRO COMPACTADOR AR-18	$	80,000.00
VIBRADOR A GASOLINA MCA CIPSA, MOTOR HONDA 5.5 HP	$	7,000.00
RETRO EXCAVADORA MARCA JHON DEERE MOD. 2011	$	278,260.87
RETRO EXCAVADORA MARCA CATERPILLAR MOD. 416 D	$	208,695.66
RETRO EXCAVADORA MARCA CATERPILLAR MOD. 416 E	$	347,826.09
CAMIÓN DE VOLTEO TORTON INTER	$	775,000.00
CAMIÓN VOLTEO RABON M2	$	610,500.00
AUTOMOVIL MARCA VERSA MODELO 19	$	200,000.00
CAMIONETA NISSAN 19	$	300,000.00
SUMA	**$**	**2,820,282.62**

EQUIPO DE COMPUTO

COMPUTADORA HP	$	11,032.76
SUMA	**$**	**11,032.76**
SUMA DE TOTAL DE ACTIVO FIJO	**$**	**2,831,315.38**

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LA MISMA, ASUMIENDO ASÍ MISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

C.P.C. ARTURO ZARAGOZA LOPEZ
CED. PROF. Nº 760829
Nº REGISTRO A.G.A.F.F. 4881

IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

R.F.C. ICO091216UUA
CALLE CORREGIDORA N. 4 COLONIA MORELOS C.P. 39530
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO


BALANCE COMPARATIVO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL AL 31 DE DICIEMBRE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE 2022.


CUENTAS	31 DE DICIEMBRE 2022	31 DE DICIEMBRE 2021	DIFERENCIAS	SIGNO
ACTIVO				
A CORTO PLAZO				
CAJA	25,000.00	20,000.00	5,000.00	+
BANCOS	40,000.00	35,000.00	5,000.00	+
CLIENTES	392,488.23	703,708.59	311,220.36	-
SUMA DE ACTIVO A CORTO PLAZO	**457,488.23**	**758,708.59**	**301,220.36**	-
A LARGO PLAZO				
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,820,282.62	2,820,282.62	0.00	=
EQUIPO DE COMPUTO	11,032.76	11,032.76	0.00	=
DEP ACUM DE MAQ. Y EQUIPO	234,782.61	234,782.61	0.00	=
DEP ACUM. DE EQ DE COMPUTO	4,938.00	4,938.00	0.00	=
SUMA DE ACTIVO A LARGO PLAZO	**3,071,035.99**	**3,071,035.99**	**0.00**	=
TOTAL ACTIVO	**3,528,524.22**	**3,829,744.58**	**301,220.36**	-
PASIVO				
CIRCULANTE				
IMPUESTOS POR PAGAR	28,753.00	35,261.36	6,508.36	-
PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	=
SUMA DE PASIVO CIRCULANTE	**28,753.00**	**35,261.36**	**6,508.36**	-
TOTAL DE PASIVO	**28,753.00**	**35,261.36**	**6,508.36**	-
CAPITAL CONTABLE				
CAPITAL SOCIAL	50,000.00	50,000.00	0.00	=
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	2,907,973.00	62,357.00	2,845,616.00	+
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	62,357.00	3,202,685.00	3,140,328.00	-
TOTAL CAPITAL CONTABLE	**3,020,330.00**	**3,315,042.00**	**294,712.00**	-
ACTIVO	3,528,524.22	3,829,744.58	301,220.36	-
PASIVO	28,753.00	35,261.36	6,508.36	+
CAPITAL CONTABLE	3,020,330.00	3,315,042.00	294,712.00	-


"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LA MISMA, ASUMIENDO ASÍ MISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

C.P.C. ARTURO ZARAGOZA LOPEZ
CED. PROF. N° 760829
N° REGISTRO A.G.A.F.F. 4881

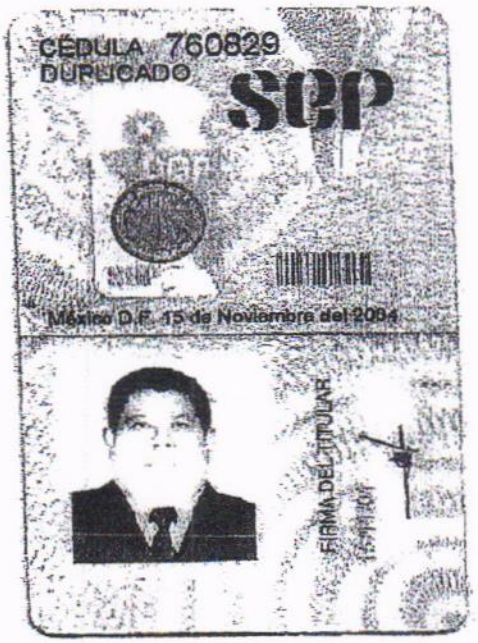
CÉDULA 760829
DUPLICADO
SEP
México D.F. 15 de Noviembre del 2004
FIRMA DEL TITULAR

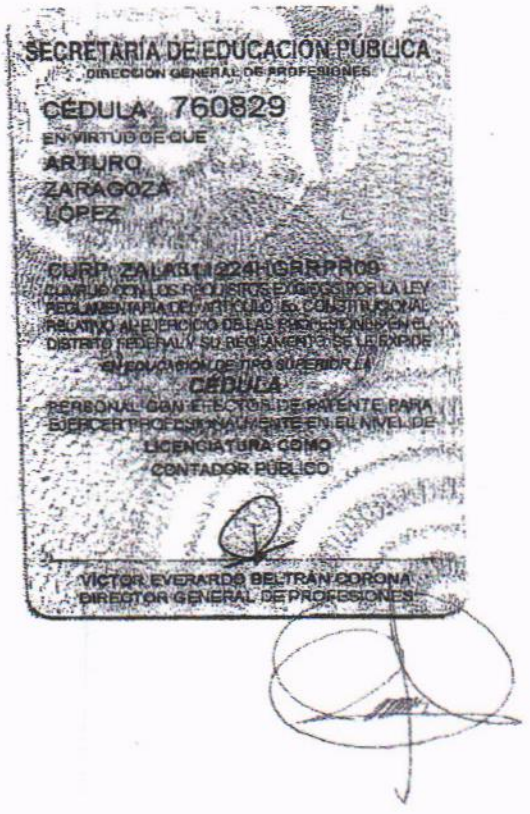
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES
CÉDULA 760829
EN VIRTUD DE QUE
ARTURO
ZARAGOZA
LÓPEZ
CURP ZALA811224HGRRPR09
CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY
REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL
RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL
DISTRITO FEDERAL Y SU REGLAMENTO, SE LE EXPIDE
EN EDUCACIÓN DE TIPO SUPERIOR LA
CÉDULA
PERSONAL CON EFECTOS DE PATENTE PARA
EJERCER PROFESIONALMENTE EN EL NIVEL DE
LICENCIATURA COMO
CONTADOR PÚBLICO
VÍCTOR EVERARDO BELTRÁN CORONA
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

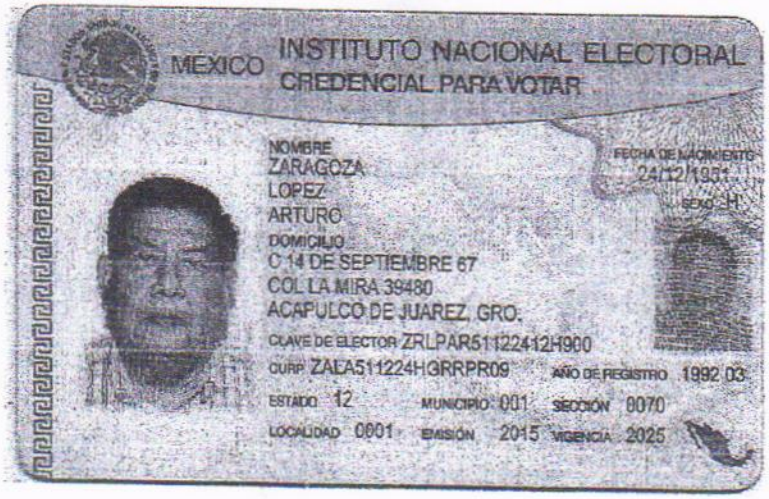

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
ZARAGOZA
LOPEZ
ARTURO

FECHA DE NACIMIENTO
24/12/1951

SEXO H


DOMICILIO
C 14 DE SEPTIEMBRE 67
COL LA MIRA 39480
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE DE ELECTOR ZRLPAR51122412H900

CURP ZALA511224HGRRPR09 AÑO DE REGISTRO 1992 03

ESTADO 12 MUNICIPIO 001 SECCIÓN 0070

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2015 VIGENCIA 2025

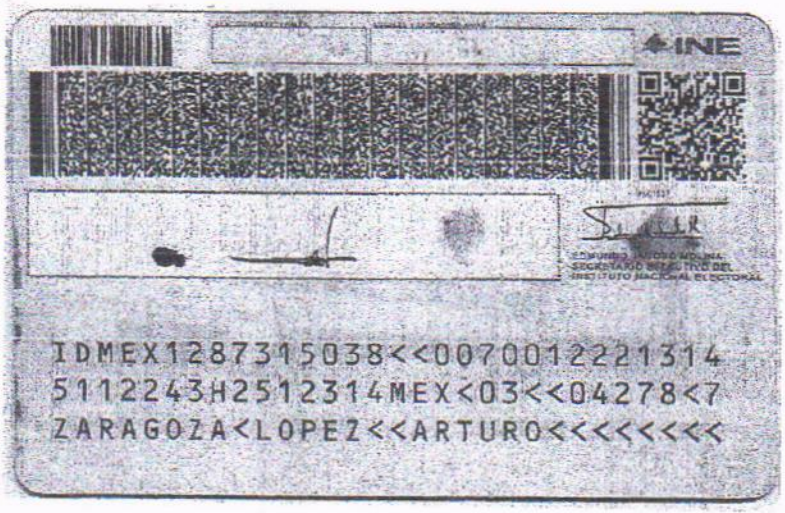

INE

IDMEX1287315038<<0070012221314
5112243H2512314MEX<03<<04278<7
ZARAGOZA<LOPEZ<<ARTURO<<<<<<<<

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

ENTREGA PERSONAL

Dependencia: DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION.
SUBDIRECCION DE PROGRAMACION.
COORDINACION DE CONTROL DE EMPRESAS DICTAMINADAS.

Núm. Exp.: 360-III- 10383
119/ 10383

ASUNTO: Se expide constancia de inscripción en el Registro de Contadores Públicos de acuerdo a su solicitud, de fecha 11 del presente mes.

México, D. F., a 16 de marzo de 1983.

Contador Público
ARTURO ZARAGOZA LOPEZ
Costera M. Alemán 276-201
Centro
Acapulco, Gro.

En atención a su solicitud arriba mencionada, y en virtud de haber acreditado lo dispuesto en el Artículo 52 del Código Fiscal de la Federación vigente y Artículo 2º del Reglamento del Artículo 85 del derogado Código Fiscal de la Federación de fecha 30 de diciembre de 1966, aplicable por disposición del párrafo segundo del Artículo Segundo transitorio del Código Fiscal de la Federación vigente, me complace hacer de su conocimiento que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio de la Dirección General de Fiscalización a mi cargo, con fundamento en el Artículo 59, fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha tenido a bien registrarlo en el LIBRO I DEL REGISTRO DE CONTADORES PUBLICOS, con fecha 16 de marzo de 1983, correspondiéndole el número 4 8 8 1.

Aprovecho la ocasión para exhortarlo al buen uso y cumplimiento de los lineamientos que establecen la Ley y el Código de Etica Profesional.

Atentamente.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
El Director General.

MANUEL RODRIGUEZ ROCHA
Contador Público.

MRR*CHV*cccpd.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL
ADMINISTRACION CENTRAL DE OPERACION DE LA FISCALIZACION
324-A-IV-
110/ 23891
133530

ENTREGA PERSONAL

ASUNTO : SE EXPIDE CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE DESPACHOS CONTABLES Y FISCALES DE ACUERDO A SU SOLICITUD

MEXICO, D.F., 17 DE JUNIO DE 1993.

ZARAGOZA LOPEZ ARTURO
CONTADOR PUBLICO REGISTRADO INDEPENDIENTE
COST. MIGUEL ALEMAN 276-303
COL. FRACC. HORNOS
ACAPULCO, GRO. C.P. 39300
P R E S E N T E

COPIA COTEJADA

EN ATENCION A SU SOLICITUD ARRIBA MENCIONADA Y EN VIRTUD DE HABER ACREDITADO LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 52 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE Y 45-A DEL REGLAMENTO DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION EN VIGOR; ME COMPLACE HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, POR MEDIO DE ESTA ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL, HA TENIDO A BIEN REGISTRARLE EN EL LIBRO I DE REGISTRO DE DESPACHOS CONTABLES FISCALES, CON FECHA 15 DE JUNIO DE 1993 CORRESPONDIENDOLE EL NUMERO 08356.

A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
LA ADMINISTRADORA CENTRAL

C.P. JOSEFINA DEL ORBE VALDIVIESO.

Profesión:
Nombre:
ZARAGOZA LOPEZ ARTURO
R.F.C.:
ZALA511224NW3
Medio de Presentación:
Internet

Esta Coordinación de Operación de la Fiscalización Nacional, de la Administración Central de Operación de la Fiscalización Nacional, dependiente de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, del Servicio de Administración Tributaria, en atención a su solicitud y en virtud de haber dado cumplimiento a los requisitos establecidos en los artículos 52, primer párrafo, fracción I, primero y segundo párrafo del inciso a), del Código Fiscal de la Federación, reformado mediante Decreto por el que se reforman, adicionan, y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, 60 de su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XVIII y 8, fracción III, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; artículos 2, primer párrafo, apartado B, fracción III, inciso a) y tercer párrafo; 10, primer párrafo, fracción I, en relación con el artículo 9, penúltimo párrafo; 18, primer párrafo, Apartado A, fracción II, en relación con el artículo 17, primer párrafo, fracción XIII, y penúltimo párrafo, numeral 1, inciso a),del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2007 y reformado mediante Decretos publicados el 29 de abril de 2010 y 13 de julio de 2012, en el mismo órgano oficial; de conformidad con el artículo Segundo transitorio, fracción VIII del Decreto por el que se reforman, adicionan, y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013; se le comunica que su registro número **4881** como Contador Público para formular dictámenes, quedó renovado en el Sistema de Contadores Públicos Registrados, con fecha **04/01/2014** y hora **11:58:16.**

Aprovecho la ocasión, para invitarle a que haga un buen uso de esta renovación y al cumplimiento de las normas de auditoría, a las disposiciones fiscales y al código de ética profesional del colegio al que pertenece.

Cadena Original:
|MEEO4507076R0|00001000000200783457|MEDINA ESTRADA OCTAVIO|ZALA511224NW3|4881|04/01/2014 11:58:16|

Sello Digital:
EEotaCLtr/IB/GGVs5cp25wPiL5GRDzGe8nqhxgN6s3pCc68Hf5Lx68w6rig
nMkN6r5iTg7SJhSC0HrVgjMqkHDLcEKUpTobISSJgqSaXg22aeL1mAGsWJPe
LayW0SNOPKUZ44ek3xBX8e97IW/CAWVOMu0EDClZwiKoJk7IlX0

Avenida Hidalgo Núm. 77 Mod. II 2° Piso, col. Guerrero, deleg. Cuauhtémoc, c.p. 06300, México, D.F. Tel. (55) 5802 0505, sat.gob.mx

From: registro.cprs@sat.gob.mx
To: arturo_zaragoza888@hotmail.com
Subject: Notificación Renovación de CP
Date: Sat, 4 Jan 2014 11:58:17 -0600FO-OF-CPRS-NOTCPRINT V 1.1

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Auditoría Fiscal Federal.
Administración Central de Operación de la Fiscalización Nacional.
Coordinación de Operación de la Fiscalización Nacional.

Notificación
Constancia de Renovación en el Sistema de Contadores Públicos Registrados

000196

Instituto Mexicano de Contadores Públicos

CERTIFICADO No. 5052

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos

Extiende el presente Certificado con Reconocimiento de Idoneidad de la Secretaría de Educación Pública:

SEP/DGP/CP075/16, emitido el 20 de agosto de 2016

a

C.P.C.

Arturo Zaragoza López

En virtud de haber demostrado capacidad profesional para ejercer la Contaduría Pública, conforme lo señala el Reglamento para la Certificación Profesional de los Contadores Públicos.

Vigencia

1 de mayo de 2019 al 30 de abril de 2023

La certificación de la Contaduría Pública al servicio de la sociedad.

Verificación QR:

Cadena Original De Certificación Digital DPC:

I3HNpK2xlIGVl1KVsMyajaPX5pXi3pJMztaSw9DU6lGBmsAoJpDJ30zD2suS2NPFj
5mmsEypkaeWkXmllJOkjWOntUCm1enlxdGF1oWQtueF5ueF1NiRmlSUo6yZn1GUnl
k

Verificación Web Aquí. Si no puede abrir el link copie la siguiente ruta sin las comillas:

"https://dpc.imcp.org.mx/system/portal/?idx=444&xdme=5842&ecrmxhg=mXyrkJaglIKRllCV&pExk=mHankJ
OpmleRl1OV&bmgds=m33ZxMegx1OcyfWXyKucIJKb1Veho9aDqK5QxKLGplQ"

IMCP 2019 D R

Principal▸Servicios▸Servicios Prestados por Terceros▸Consulta CPRS

Búsqueda de Contadores Públicos Registrados

Menú Principal Nueva búsqueda

Datos Generales del CPR

NÚM. REGISTRO CPR: 4881
FECHA DE ALTA: 15/07/1983
NOMBRE CPR: ZARAGOZA LOPEZ ARTURO
ENTIDAD FEDERATIVA: GUERRERO
MUNICIPIO O DELEGACIÓN: ACAPULCO
ALAF: ADM. DESCONCENTRADA DE GUERRERO 1

Despacho del CPR

NÚM. REGISTRO DESPACHO: 2356
NOMBRE DESPACHO: ZARAGOZA LOPEZ ARTURO
ENTIDAD FEDERATIVA: GUERRERO
SITUACIÓN DESPACHO: ALTA

Colegio del CPR

AGRUPACIÓN: INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PÚBLICOS A.C.
NOMBRE COLEGIO: COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO AC
ENTIDAD FEDERATIVA: GUERRERO
SITUACIÓN COLEGIO: ALTA

Dictámenes presentados del CPR

EJERCICIO	NUMERO
2001	12
2002	17
2003	13
2004	12
2005	13
2006	11
2007	16
2008	15
2009	13
2010	11
2011	12

2012	12
2013	10

Situaciones del CPR

SITUACION	FECHA
PRESENTÓ NEC 2006	30/03/2007
PRESENTO CONSTANCIA SOCIO ACT. 2007	30/03/2007
PRESENTO CONSTANCIA SOCIO ACT. 2008	14/04/2008
PRESENTÓ NEC 2007	14/04/2008
PRESENTÓ NEC 2008	31/03/2009
PRESENTÓ CONSTANCIA SOCIO ACT. 2009	31/03/2009
PRESENTÓ NEC 2009	30/03/2010
PRESENTÓ CONSTANCIA SOCIO ACT. 2010	30/03/2010
PRESENTÓ NEC 2010	31/03/2011
PRESENTÓ CONSTANCIA SOCIO ACT. 2011	31/03/2011
PRESENTÓ NEC 2011	29/03/2012
PRESENTÓ CONSTANCIA SOCIO ACT. 2012	29/03/2012
PRESENTÓ NEC 2012	25/03/2013
PRESENTÓ CONSTANCIA SOCIO ACT. 2013	25/03/2013
RENOVADO	04/01/2014
PRESENTÓ NEC 2013	14/03/2014
PRESENTÓ CONSTANCIA SOCIO ACT. 2014	14/03/2014
PRESENTÓ NEC 2014	02/03/2015
PRESENTÓ CONSTANCIA SOCIO ACT. 2015	02/03/2015
PRESENTÓ NEC 2015	29/02/2016
PRESENTÓ CONSTANCIA SOCIO ACT. 2016	29/02/2016
PRESENTÓ NEC 2016	07/03/2017

PRESENTÓ CONSTANCIA SOCIO ACT. 2017	07/03/2017
PRESENTÓ NEC 2017	07/03/2018
PRESENTÓ CONSTANCIA SOCIO ACT. 2018	07/03/2018
PRESENTÓ NEC 2018	04/03/2019
PRESENTÓ CONSTANCIA SOCIO ACT. 2019	04/03/2019
PRESENTO CERTIFICACIÓN	30/05/2019

Antecedentes de Sanción del CPR

SANCIÓN	FECHA DE INICIO Y TERMINO	MEDIO DE DEFENSA

Instituto Mexicano de
Contadores Públicos
Estado de Guerrero

Oficio No. CCPEG/084/2019

Acapulco, Gro., 25 de Marzo del 2019

A QUIEN CORRESPONDA:

P R E S E N T E

Nos permitimos hacer constar que el **C.P.C. ARTURO ZARAGOZA LOPEZ**, es Asociado Activo del COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO, A.C., y del INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PÚBLICOS, A.C., desde el quince de Febrero de mil novecientos ochenta y tres, con número de asociado 128.

A solicitud del interesado, se extiende la presente Constancia el veinticinco de Marzo del dos mil diecinueve, en la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero.

A T E N T A M E N T E

Instituto Mexicano de Contadores Públicos Estado de Guerrero

C.P. y P.C.C.A. Luis Enrique Schott Gaspar
PRESIDENTE

L.C. Graciela Pérez Benitez
SECRETARIO

Av. Lic. Manuel Gómez Morín Lote 12 y 19-A. Fracc. Magallanes C.P. 39670 Acapulco, Gro.
Tels. 01(744) 4868532 y 01(744) 4869144 www.ccpgro.org.mx

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. **41066004-016-2023.**
REFERENTE A LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**

c). - DECLARACIÓN POR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN QUE EL LICITANTE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA. ANEXAR PARTE DEL ACTA CONTITUTIVA DONDE SE VE QUE EXCLUSION DE EXTRANJEROS

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01 CEL. 744 2354717 / 744 4490912 E-MAIL: imexa@telmexmail.com, gno_0301@hotmail.com

c). - DECLARACIÓN POR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN QUE EL LICITANTE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA.

Acapulco de Juárez, Gro., a 03 de agosto de 2023.

Ing. Luz María Meraza Radilla.
Secretaría De Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
del Municipio De Acapulco De Juárez, Guerrero
Presente

Que en mi carácter de **Administrador Único**, de la empresa **IMEXA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.**, lo que se acredita en los términos del testimonio de la póliza número **1585**, de fecha **16 de diciembre de 2009**, otorgada ante la fe del Licenciado **SHUNASHI JAZMÍN ALTAMIRANO PINEDA** Corredor Público número 5, de la Ciudad de Acapulco, Gro., inscrita en el Registro Público de la Ciudad de Acapulco, Guerrero, en el folio número **10160*17**, con fecha **17 de febrero de 2010**, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal, número **41066004-016-2023**, de fecha **18 de julio de 2023**, relativa a los trabajos consistentes en **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Declaro bajo protesta de decir verdad, que EL LICITANTE es de nacionalidad mexicana. que se encuentra constituida conforme a las leyes mexicanas sin que exista modificación alguna de sus estatutos respecto a la nacionalidad de la misma.

ATENTAMENTE

ING. IRINA SALGADO HERNÁNDEZ.
ADMINISTRADOR ÚNICO.

Corredor Público Número 5
Plaza Estado de Guerrero

desarrollos turísticos, elaborar, diseñar y prestar servicios de asesoría en proyectos de construcción de casas, edificios, oficinas, condominios, clubes, en general, fraccionamientos, parques industriales y desarrollos turísticos, prestar servicios de asesoría, administración, cobranzas y tramitación respecto de cualquier aspecto que comprenda la construcción y desarrollo de condominios, oficinas, fraccionamientos, clubes, parques industriales y desarrollos turísticos.- g) Realizar, supervisar, coordinar o contratar por cuenta propia o de terceros, toda clase de construcciones, edificaciones, urbanizaciones, diseño arquitectónico, gráfico, industrial, estructural, de instalaciones, exposiciones y stands, así como fabricar, comprar y enajenar por cualquier título, toda clase de materiales de construcción.- h) La prestación o contratación de servicios técnicos, consultivos y de asesoría, así como la celebración de los contratos o convenios para la realización de estos fines, especialmente lo relacionado con la arquitectura y la construcción.- i) Dar y recibir en arrendamiento y por compra-venta o por cualquier medio permitido por la ley, maquinaria, equipo y transportación para la construcción.- j) Análisis de precios relacionados con la construcción, diseños y obras de arquitectura que la sociedad realice.- k) Dar y tomar dinero en préstamo, así como otorgar garantías de naturaleza hipotecaria, prendaria, fiduciaria, cambiaria o de cualquier otra clase.- l) Promover, construir, organizar, explotar y tomar participación en el capital y patrimonio de todo género de sociedades mercantiles, civiles, asociaciones o empresas industriales, comerciales, de servicio o de cualquier otra índole, tanto nacionales como extranjeras, así como participar en su administración o liquidación.- m) La adquisición, enajenación y en general la negociación de todo tipo de acciones, partes sociales y de cualquier título, valores permitidos por la ley.- n) La emisión, suscripción, aceptación, endoso, aval o cualesquier títulos o valores mobiliarios que la ley permita.- ñ) Obtener o conceder préstamos otorgando y recibiendo garantías específicas; emitir obligaciones, aceptar, girar, endosar o avalar toda clase de títulos de crédito y otorgar fianzas o garantías de cualquier clase respecto de las obligaciones propias o de terceros o de los títulos emitidos o aceptados por la sociedad o por terceros.- o) Adquirir, enajenar, tomar y otorgar el uso y goce por cualquier título permitido por la ley de bienes muebles e inmuebles.- p) Obtener y otorgar por cualquier título patentes, marcas, nombres comerciales, opciones y preferencias, derechos de autor y concesiones para todo tipo de actividades.- q) En general, la celebración de toda clase de actos jurídicos, que sean necesarios o convenientes para la realización de los objetos indicados.----------

ARTÍCULO QUINTO.- DURACIÓN: La duración de la sociedad será de 99 (noventa y nueve) años, contados a partir de la fecha de firma de esta póliza. ----------

ARTÍCULO SEXTO.- EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS: Ninguna persona extranjera, física o moral, podrá tener participación social alguna o ser propietaria de acciones de la sociedad. Si por algún motivo alguna de las personas mencionadas anteriormente, por cualquier evento llegaré a adquirir una participación o ser propietaria de una o más acciones, contraviniendo así

COTEJADO
COPIA COTEJADA

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. **41066004-016-2023.**
REFERENTE A LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**

d). - ORIGINAL Y COPIA DE LOS REGISTROS ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), Y DEL INFONAVIT.**OJO PUEDE EXISTIR TAMBIEN EL REGISTRO AL INFONAVIT**

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01
CEL. 744 2354717 / 744 4490912 E-MAIL: imexa@telmexmail.com, gno_0301@hotmail.com

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

Aviso de Registro Patronal
Personas Morales en el Régimen Obligatorio

Fecha de presentación de este aviso	DD	MM	AAAA
	24	03	2010

Fecha a partir de la cual surte efectos este movimiento	DD	MM	AAAA
	23	03	2010

Datos generales del patrón o sujeto obligado

Denominación o razón social **IMEXA CONSTRUCTORES**

Nombre Comercial **IMEXA CONSTRUCTORES**

Tipo de sociedad **SA DE CV** RFC **ICO091216UUA**

Domicilio fiscal

Calle **CORREGIDORA** Número y/o letra exterior **4** Número y/o letra interior ---

Entre la calle de **ISAURO POLANCO** y la calle de **BENITO JUAREZ**

Colonia **MORELOS** Localidad **ACAPULCO DE JUAREZ**

Municipio o Delegación **ACAPULCO DE JUAREZ** Entidad Federativa **GUERRERO** Código Postal **39530**

Teléfono fijo **7444859501** Teléfono fijo ---

Dirección de correo electrónico **gno_0301@hotmail.com**

Socios (hasta 4)

Socio 1

Persona Física, Ape.Paterno: SALGADO, Ape.Materno: HERNANDEZ, Nombre: IRINA, RFC: SAHI670823SN0, CURP: SAHI670823MGRLRR09, Tel.Movil: ---

Calle **NUEVO LEON** Número y/o letra exterior **23** Número y/o letra interior ---

Colonia **PROGRESO** Localidad **ACAPULCO**

Municipio o Delegación **ACAPULCO DE JUAREZ** Entidad Federativa **GUERRERO** Código Postal **39350**

Teléfono Fijo --- Dirección de correo electrónico ---

Socio 2

Persona Física, Ape.Paterno: SALGADO, Ape.Materno: HERNANDEZ, Nombre: IRINA, RFC: SAHI670823SN0, CURP: SAHI670823MGRLRR09, Tel.Movil: ---

Calle **CORREGIDORA** Número y/o letra exterior **4** Número y/o letra interior ---

Colonia **MORELOS** Localidad **ACAPULCO DE JUAREZ**

Municipio o Delegación **ACAPULCO DE JUAREZ** Entidad Federativa **GUERRERO** Código Postal **39530**

Teléfono Fijo --- Dirección de correo electrónico ---

Socio 3

Calle --- Número y/o letra exterior --- Número y/o letra interior ---

Colonia --- Localidad ---

Municipio o Delegación --- Entidad Federativa --- Código Postal ---

Teléfono Fijo --- Dirección de correo electrónico ---

Socio 4

Calle --- Número y/o letra exterior --- Número y/o letra interior ---

Colonia --- Localidad ---

Municipio o Delegación --- Entidad Federativa --- Código Postal ---

Teléfono Fijo --- Dirección de correo electrónico ---

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

Escritura constitutiva

Número de Escritura	No. de Notaría o Correduría	Lugar y fecha de expedición	DD	MM	AAAA	Folio Mercantil
1585	CINCO	GUERRERO, ACAPULCO DE JUAREZ	16	12	2009	10160*17

Registro de sindicato

Número de referencia del documento de registro	Fecha del documento de registro	DD	MM	AAAA	Autoridad laboral que otorgó el registro
———					———

Representante legal

Poder para — Actos de administración [X]

Apellido paterno	Apellido materno	Nombre (s)
MORALES	ROMAN	GENOVEVA

RFC MORG670103SY3 — CURP MORG670103MGRRMN05

Teléfono fijo 7444862173 — Ext. ——— — Teléfono móvil ———

Dirección de correo electrónico gno_0301@hotmail.com

Datos del centro de trabajo por el que solicita el registro patronal

Domicilio

Calle CORREGIDORA — Número y/o letra exterior 4 — Número y/o letra interior ———

Entre la calle de ISAURO POLANCO — y la calle de BENITO JUAREZ

Colonia MORELOS — Localidad ACAPULCO DE JUAREZ

Municipio o Delegación ACAPULCO DE JUAREZ — Entidad Federativa GUERRERO — Código Postal 39530

Teléfono fijo con clave de larga distancia 7444859501 — Ext. ——— — Teléfono fijo con clave de larga distancia ——— — Ext. ———

Dirección de correo electrónico gno_0301@hotmail.com

Datos de las personas autorizadas para presentar avisos de afiliación (hasta 3)

Persona autorizada 1

Apellido paterno	Apellido materno	Nombre (s)
MORALES	ROMAN	GENOVEVA

RFC MORG670103SY3 — CURP MORG670103MGRRMN05

Teléfono fijo ——— — Ext. ——— — Teléfono móvil ———

Dirección de correo electrónico ———

Persona autorizada 2

Apellido paterno	Apellido materno	Nombre (s)
ALARCON	SEVERIANO	VICENTE

RFC ——— — CURP AASV681221HGRLVC00

Teléfono fijo 7444859501 — Ext. ——— — Teléfono móvil ———

Dirección de correo electrónico viasev@hotmail.com

Persona autorizada 3

Apellido paterno	Apellido materno	Nombre (s)
MORALES	ROMAN	GENOVEVA

RFC MORG670103SY3 — CURP MORG670103MGRRMN05

Teléfono fijo 744862173 — Ext. ——— — Teléfono móvil ———

Dirección de correo electrónico ———

IMSS — *INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL*
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

INFONAVIT — *INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES*

Clasificación de la actividad económica para el registro en el Seguro de Riesgos de Trabajo, manifestada por el patrón

Giro del registro patronal **LA CONSTRUCCION EN GENERAL**

Presta servicios de personal SI [ ] No [X] Indique el número de centros de trabajo Solicita Registro Patronal por Clase [ ]

Clasificación conforme al Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización

De conformidad con la información que se declara y con fundamento en los artículos 72, 73 y 75 de la Ley del Seguro Social y los artículos 1 fracción IV, 3, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 29, 30 y 196 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, manifiesto que este registro patronal tiene la siguiente clasificación:

Clasificación	Clave	Descripción
División Económica	4	**INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN**
Grupo	41	**CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES Y DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL**
Fracción	4102	**CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES EN OBRA PÚBLICA.**

Clase de riesgo **V** Prima media **7.58875**

Datos de la actividad económica que declaró

Principales productos elaborados o servicios prestados (máximo diez)

CONSTRUCCION DE CASAS, DEPTOS	**REMODELACION Y REPARACION DE INMUEBLES**
SUPERVISION DE OBRAS EN GENERAL	----------
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	----------
URBANIZACION, EDIFICACIONES	----------
PROYECTOS ARQUITECTONICOS	----------

Principales materias primas y materiales utilizados (máximo diez)

MADERA	**CEMENTO**
ARENA	**GRAVA**
TABICON DE CEMENTO	----------
VARILLA	----------
CONCRETO PREMEZCLADO	----------

Maquinaria y equipo utilizado [excepto equipo de transporte] (máximo cinco)

Número de Unidades	Nombre	Uso	No motorizados/Motorizados no automatizados/Automatizados	Capacidad o Potencia
1	**RETROEXCAVADORA**	**URBANIZACION**	**MAQUINAS Y EQUIPOS**	**80 HP**
	RETROEXCAVADORA	**REMOVER ESCOMBRO**	**MAQUINAS Y EQUIPOS**	**DISEL**
----------	----------	----------	----------	----------
----------	----------	----------	----------	----------
----------	----------	----------	----------	----------
----------	----------	----------	----------	----------

Equipo de transporte utilizado

Número de Unidades	Nombre	Uso	Combustible o energía	Capacidad o Potencia
1	**CAMIONETA**	**TRANSPORTE DE**	**GAS**	**1 TON**
----------	----------	----------	----------	----------
----------	----------	----------	----------	----------
----------	----------	----------	----------	----------
----------	----------	----------	----------	----------

Procesos de trabajo de la actividad del patrón o sujeto obligado

Procesos Iniciales (Descripción)

PREPARACION DE LA SUPERFICIE A URBANIZAR O EDIFICAR, MEDIANTE UN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, Y LA LIMPIEZA DE LA MISMA.

IMSS — *INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL*
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

INFONAVIT — *INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES*

Procesos Intermedios (Descripción)

UTILIZANDO UNA MAQ. RETROEXCAVADORA SE REALIZAN LOS CORTES NECESARIOS EN EL AREA A URBANIZAR O EDIFICAR, MEJORANDO EL TERRENO, SE CONTINUA CON LA CIMENTACION, DEL PROYECTO A REALIZAR.

Procesos Finales (Descripción)

SE CONTINUA CON LA ESTRUCTURA Y ACABADOS SEGUN EL PROYECTO A EJECUTARSE, PROCEDIENDO POR ULTIMO A LA LIMPIEZA DEL MISMO

Personal

No. de Trabajadores	Oficio u ocupación	No. de Trabajadores	Oficio u ocupación
1	**AUXILIAR ADMINISTRATIVO**	———	———
1	**AUXILIAR ADMINISTRATIVO**	———	———
———	———	———	———
———	———	———	———
———	———	———	———
———	———	———	———

Actividades complementarias a la principal

Distribución o entrega de mercancías

[X] Con transporte propio
[ ] Sin transporte propio
[ ] No distribuye, ni entrega

[X] Servicios de instalación, reparación o mantenimiento para otras personas.

Firma del patrón y acuse de recibo

Firma del patrón o de su representante legal

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos en este formato son ciertos

GENOVEVA MORALES ROMAN

Nombre y firma del patrón o de su representante legal
En su caso, firma electrónica conforme a lo establecido por el Instituto Mexicano del Seguro Social

Acuse de recibo
(Para uso exclusivo del Instituto Mexicano del Seguro Social)

Registro patronal: **B6159781107**

12:00 Hrs.

Delegación:
GUERRERO

Subdelegación:
ACAPULCO

Matrícula del empleado que recibe:
99999999 6432977

Conforme a lo establecido en el artículo 16 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, es obligación del patrón comunicar al Instituto, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, cualquier circunstancia que modifique los datos proporcionados al Instituto incluyendo aquellos que modifiquen la actividad.

000209

FECHA: 01 de agosto de 2023

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social

Folio: 169090978983793322268 3

Clave de R.F.C.: ICO091216UUA

Nombre, Denominación o Razón Social: IMEXA CONSTRUCTORES

Estimado Patrón:

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente con las obligaciones de pago de aportaciones Seguridad Social, toda vez que no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior se emite opinión Positiva.

La presente opinión se realiza únicamente verificando que no existan créditos fiscales firmes a su cargo, sin que sea una constancia del correcto entero de las aportaciones de Seguridad Social, para lo cual el IMSS se reserva sus facultades de verificación previstas en la Ley del Seguro Social y el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 01 de agosto de 2023, a las 11:09 horas.

Esta carta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales tiene una vigencia hasta el 01 de agosto de 2023, 23:59:59.

Usted tiene registrado(s) 10 trabajador(es) activo(s) ante el IMSS.

NOTAS:

1. En caso de estar inconforme y usted sea el particular que esté inscrito ante el IMSS o sea el representante legal, podrá usted promover una aclaración ante la Subdelegación que controla el (los) crédito(s) fiscales y adjuntar este documento, así como los documentos que soporten su aclaración.
2. La presente opinión se emite considerando lo establecido en los incisos a) y b), del Acuerdo de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.
3. Tiene una vigencia del mismo día que fue consultada, de conformidad con el Acuerdo de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.
4. La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del patrón en los siguientes sentidos: POSITIVA.- Cuando el particular esté inscrito ante el IMSS y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla cuarta, de conformidad con el Acuerdo de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social; NEGATIVA.- Cuando el particular no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social que se consideran en los incisos a) y b) de la regla cuarta del acuerdo antes citado; SIN OPINIÓN.- Cuando no se localice en los controles electrónicos del IMSS la información suficiente para determinar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social de los particulares.
5. Se incluyen datos informativos, en su caso tales como: si el particular cuenta con algún acto de fiscalización en proceso o si cuenta con medios de defensa interpuestos en contra de acto administrativos o resoluciones emitidas por el IMSS o si cuenta con algún convenio de pago a plazos, los cuales no inciden en el sentido que se emita la opinión.
6. La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y del Acuerdo ACDO.SA2.HCT.270422/107.P.DIR de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Este servicio es gratuito.
El IMSS es el instrumento básico de seguridad social para todos los trabajadores y sus familias.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del IMSS, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Subdelegación competente.

Cadena Original: ||Invocante:portalimssdigital|Tramite:Carta de No Adeudo Art. 32D|Fecha:01 de agosto 2023, 11:09:48|Folio:169090978983793322268 3|RFC:ICO091216UUA|Nombre o Razon Social:IMEXA CONSTRUCTORES|CURP:|Opinion:POSITIVA|FechaInicioVigencia:01 de agosto 2023, 11:09:48|FechaFinVigencia:01 de agosto de 2023, 23:59:59||

Sello digital: OjHTM7tF1RdwQ5jZLfdolQ9uTE9V6wKe/7ZS0+k0F6i1w3/NZhPqlUmemMfjN1sThmPOHsqhGyy3z+7VZvX5h1XzzrRsq3V56KDon83Gma/J0yTBFGgFK41GmxFi5Lz14CnxvFUN7HydfG4uHDP9f6E5+XlzuxaSdTPGUBS98sm5wQA7ielfEJsW57Ajp5vSuBV7ciydiqlQOaOVuCt5cjq2lvcAwioGD3nJJYy0VvW8ZKUS3XnlOmLjz5yNlh54eeVMUdtWPJi9VodVwkuyOgyS+7bkDT1pp46W3j3EoGWg94LZBr57MjfA065uyOh7T/sDQ1R71NetcQSPqK1jg==

Secuencia Notarial: be685312-446a-4fbb-aea5-408751c171e2

Número de Serie: 00000000000000000001

000210

INFONAVIT

Coordinación General de Recaudación Fiscal
Gerencia Senior de Recaudación y Cobranza Fiscal
Gerencia de Cobro Persuasivo, Coactivo y Garantías

Oficio: CGRF/GSRyCF/GCPCyG/0001748406/2023

Asunto: Constancia de Situación Fiscal.

Ciudad de México, a 01 de Agosto de 2023.

RAZON SOCIAL: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV
NRP: B6159781107
P r e s e n t e .

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en su carácter de organismo fiscal autónomo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 30, segundo párrafo, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a través de la Gerencia de Cobro Persuasivo, Coactivo y Garantías perteneciente a la Gerencia Senior de Recaudación y Cobranza Fiscal, y de conformidad con lo establecido en los artículos 4 fracción VII, 5 y 11 del Reglamento Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de Facultades como Organismo Fiscal Autónomo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio de 2008, modificado mediante Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de dicho Ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de julio de 2017, emite la presente constancia de situación fiscal en materia de aportaciones y amortizaciones patronales frente al Infonavit, de conformidad con lo estipulado en el artículo 3 fracción IV, del referido Reglamento Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de Facultades como Organismo Fiscal Autónomo, conforme a lo siguiente:

Del análisis practicado en los sistemas de este Instituto se advierte que **IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV**, con Número de Registro Patronal **B6159781107**, **NO se identificaron adeudos ante el Infonavit**, mismo que se encuentra al corriente en sus obligaciones que señala el artículo 29 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de aportar el cinco por ciento de los salarios cubiertos a sus trabajadores y de retener y enterar los descuentos para amortizaciones de crédito, hasta el 02 bimestre 2023.

Lo anterior, sin perjuicio de que este Instituto como Organismo Fiscal Autónomo, se reserva el ejercicio de sus facultades en su carácter de Autoridad Fiscal, previstas en el Código Fiscal de la Federación y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en caso de que surgiera información complementaria y/o ajustes que modificaran la cuenta de los periodos revisados, al emitir la presente constancia.

Cabe mencionar, que el presente documento es de carácter meramente informativo, por lo que no constituye acto o resolución de carácter fiscal, no determina cantidad alguna a pagar, ni genera derechos.

Atentamente

Lic. Eduardo Jolly Zarazua
Gerente de Cobro Persuasivo, Coactivo y Garantias

01-B6159781107202300017484O6

imexa
constructores
sa de cv

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. **41066004-016-2023.**
REFERENTE A LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**

e). - ESCRITO EN EL QUE SE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, LAS QUE SURTIRÁN TODOS SUS EFECTOS LEGALES, MIENTRAS NO SEÑALE OTRO DISTINTO. **ANEXAR COPIA DE COMPROBANTE DE DOMICILIO A NOMBRE DEL LICITANTE**

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01
CEL. 744 2354717 / 744 4490912 E-MAIL: imexa@telmexmail.com, gno_0301@hotmail.com

e) ESCRITO EN EL QUE SE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, LAS QUE SURTIRÁN TODOS SUS EFECTOS LEGALES, MIENTRAS NO SEÑALE OTRO DISTINTO.

Acapulco de Juárez, Gro., a 03 de agosto de 2023.

Ing. Luz María Meraza Radilla.
Secretaría De Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
del Municipio De Acapulco De Juárez, Guerrero
Presente

Que en mi carácter de **Administrador Único**, de la empresa **IMEXA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.**, lo que se acredita en los términos del testimonio de la póliza número **1585**, de fecha **16 de diciembre de 2009**, otorgada ante la fe del Licenciado **SHUNASHI JAZMÍN ALTAMIRANO PINEDA** Corredor Público número 5, de la Ciudad de Acapulco, Gro., inscrita en el Registro Público de la Ciudad de Acapulco, Guerrero, en el folio número **10160*17**, con fecha **17 de febrero de 2010**, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal, número **41066004-016-2023**, de fecha **18 de julio de 2023**, relativa a los trabajos consistentes en **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 42, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios del Estado de Guerrero No. 266 a nombre de mi representada, me permito señalar como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven del procedimiento de licitación, el ubicado en **CALLE CORREGIDORA No. 4, COL. MORELOS, C.P. 39530, ACAPULCO, GRO.TELS. (744) 485 95 01, CEL. 744 2354717/744 4490912**, y dirección de correo electrónico **imexa@telmexmail.com**, para todos los efectos legales a que haya lugar.

ATENTAMENTE

ING. IRINA SALGADO HERNÁNDEZ.
ADMINISTRADOR ÚNICO.

telcel

Factura

000213

Lugar de Expedición
Blvd. Norte No.1833,
Col. Villas San Alejandro,
C.P. 72090, Puebla, Puebla

Fecha de Expedición: 2023-07-06T14:34:53

Folio Fiscal
7636CD22-ACF8-4550-8E09-C521E05EF5CC
Folio Telcel LC-0022767988
Total a pagar **$504.00**
Fecha de Corte 06 Jul 2023
No. de cuenta 070959993
Teléfono 7444490912
T MAX SL 6500 -$200
Fecha límite de pago 25 Jul 2023

IMEXA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.
CLLE CORREGIDORA(FDA BCA A 50M DE-) 4
MORELOS(LA FEDERAL 2)
ACAPULCO DE JUA GRO 39530 MEX

070959993

RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
RDI841003QJ4

Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 5525813700

Estado de Cuenta	Importe
Saldo anterior	$503.77
Pagos	-$503.77
Ajustes	$0.00
Total cargos anteriores	**$0.00**

Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod. Servicio	Valor Unitario	Objeto Impuesto	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48 SERV	83111603	434.29	02		434.29
Cargo de equipo 15 de 24	1	H87 PZA	43191501	263.45	01	263.45	263.45

Descripción	Base Impuesto	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe IVA
Servicios de Telecomunicaciones	434.29	002 IVA	Tasa	0.16	69.48

Equivalencia catálogo SAT

Clave Prod.	Descripción
83111603	Servicios de telefonía celular
43191501	Teléfonos móviles

Clave Unidad	Descripción
E48	Unidad de Servicio
H87	Pieza

Subtotal	**697.74**
Bonificación cargo equipo(Descuento)	263.45
Subtotal antes de IVA	**434.29**
Total Base IVA Tasa 16%	434.29
Total de IVA Tasa 16%	69.48
Cargos del mes	**$503.77**
(quinientos tres pesos 77/100 M.N.)	
Total nuevos cargos del mes	**503.77**
Cargo por redondeo	0.23
Total a pagar	**$504.00**

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *111 o desde un teléfono fijo 8002277700 Visite www.telcel.com

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. **41066004-016-2023.**
REFERENTE A LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**

f). - ORIGINAL Y COPIA DEL REGISTRO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (RFC).

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01 CEL. 744 2354717 / 744 4490912 E-MAIL: imexa@telmexmail.com, gno_0301@hotmail.com

gob.mx

FOLIO: RF201020715566

000215

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT Servicio de Administración Tributaria

Registro Federal de Contribuyentes

Nombre, denominación o razón social

idCIF: 14071153613
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT Servicio de Administración Tributaria

ACUSE ÚNICO DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

Lugar y Fecha de Emisión
CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, a 12 de Marzo de 2010

Se ha procesado con éxito tu inscripción en el RFC
Tipo de movimiento: Inscripción de persona moral

Datos del Contribuyente:

Declaro bajo protesta de decir verdad y conocedor de las penas en que incurren las personas que declaran con falsedad en los términos de lo dispuesto por el artículo 247, fracción I del Código Penal Federal, en relación con el artículo 110 fracción II del Código Fiscal de la Federación, manifiesto que todos los datos asentados en esta forma oficial son verídicos y exactos.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección http://sat.gob.mx

Cadena Original Sello: ||07/06/2016|RF201020715566|Ventanilla|IPMD|ANONIMO|20000010000007000112188||

Sello Digital:
WghPTGaEelyup3DNsdZeDujTS0k8qCpEbrtVX6bdDWfBBdcY4B0xUtef+cmvy027JaqNVVwYP0pRCBlZrZlwuuDiVht1Ao90U9C9NHbdF40YpCeP1oEArA3lOhx4hsd+RIs8CatcsSNSleGJsipecfhR18YqQsHAr5vxJrXC/A0=

MÉXICO GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

COFEMER Comisión Federal de Mejora Regulatoria

Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, México, D.F.
Atención telefónica 01 800 46 36 728.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728.
denuncias@sat.gob.mx

Cédula de Identificación Fiscal

HACIENDA SAT

ICO091216UUA

Registro Federal de Contribuyentes

IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Nombre, denominación o razón social

idCIF:14071153613

VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

000210

[redacted]

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

ICO091216UUA
Registro Federal de Contribuyentes

IMEXA CONSTRUCTORES
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 14071153613
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

000217

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
ACAPULCO DE JUAREZ , GUERRERO A 01 DE AGOSTO DE 2023

ICO091216UUA

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:	ICO091216UUA
Denominación/Razón Social:	IMEXA CONSTRUCTORES
Régimen Capital:	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	
Fecha inicio de operaciones:	10 DE MARZO DE 2010
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	12 DE MARZO DE 2010

Datos del domicilio registrado

Código Postal:39530	**Tipo de Vialidad:** CALLE
Nombre de Vialidad: CORREGIDORA	**Número Exterior:** 4
Número Interior:	**Nombre de la Colonia:** MORELOS
Nombre de la Localidad:	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** ACAPULCO DE JUAREZ
Nombre de la Entidad Federativa: GUERRERO	**Entre Calle:** BENITO JUAREZ
Y Calle: ISAURO POLANCO	

Actividades Económicas:

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios	60	01/04/2010	
2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	40	01/06/2023	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	10/03/2010	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	10/03/2010	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	10/03/2010	
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.	10/03/2010	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	10/03/2010	
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	01/01/2022	
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/01/2022	

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección http://sat.gob.mx

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúnciala! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través de: www.sat.gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: (55) 8852 2222, desde el extranjero: + 55 8852 2222, SAT móvil o www.gob.mx/sfp".

Cadena Original Sello: ||2023/08/01|ICO091216UUA|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888880000031||

Sello Digital:
QxdC49H7Kpzw+VG0aZ35RA6QAUQPwQskp7IU8fhOrF1Wu4SNlgvffnWkYP1iS9YKuWAgnSwOIOO2ZmuB7W
dTs0ZVHApMKiJdyyfT9nWZwm14j4L1Gn86LNBGKjp3Fc4JiCmLbkYoHh350Hy2RS62Dz76vYI7a0FKy13gIFYS
w5c=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país:
(+52) 55 627 22 728

000218

[redacted]

000219

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

000220

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. **41066004-016-2023.**
REFERENTE A LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**

g). - DECLARACIÓN POR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 62 Y 89 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01
CEL. 744 2354717 / 744 4490912 E-MAIL: imexa@telmexmail.com, gno_0301@hotmail.com

g). -DECLARACIÓN POR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 62 Y 89 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266.

Acapulco de Juárez, Gro., a 03 de agosto de 2023.

Ing. Luz María Meraza Radilla.
Secretaría De Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
del Municipio De Acapulco De Juárez, Guerrero
Presente

Que en mi carácter de **Administrador Único**, de la empresa **IMEXA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.**, lo que se acredita en los términos del testimonio de la póliza número **1585**, de fecha **16 de diciembre de 2009**, otorgada ante la fe del Licenciado **SHUNASHI JAZMÍN ALTAMIRANO PINEDA** Corredor Público número 5, de la Ciudad de Acapulco, Gro., inscrita en el Registro Público de la Ciudad de Acapulco, Guerrero, en el folio número **10160*17**, con fecha **17 de febrero de 2010**, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal, número **41066004-016-2023**, de fecha **18 de julio de 2023**, relativa a los trabajos consistentes en **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 44, fracción XX de la Ley de Obras Públicas y Servicios Estado de Guerrero No. 266, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no me encuentro en alguno de los supuestos que establecen los artículos 62 y 89, penúltimo párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios del Estado de Guerrero No. 266 y que por mi conducto no participan en este procedimiento de licitación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública.

ATENTAMENTE

ING. IRINA SALGADO HERNÁNDEZ.
ADMINISTRADOR ÚNICO.

imexa constructores sa de cv

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. **41066004-016-2023.**
REFERENTE A LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**

h). - PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE, LA FIRMA Y ANTEFIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O DE LA PERSONA FÍSICA.

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01
CEL. 744 2354717 / 744 4490912 E-MAIL: imexa@telmexmail.com, gno_0301@hotmail.com

h). - PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE, LA FIRMA Y ANTEFIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O DE LA PERSONA FÍSICA.

Acapulco de Juárez, Gro., a 03 de agosto de 2023.

Ing. Luz María Meraza Radilla.
Secretaría De Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
del Municipio De Acapulco De Juárez, Guerrero
Presente

Que en mi carácter de **Administrador Único**, de la empresa **IMEXA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.**, lo que se acredita en los términos del testimonio de la póliza número **1585**, de fecha **16 de diciembre de 2009**, otorgada ante la fe del Licenciado **SHUNASHI JAZMÍN ALTAMIRANO PINEDA** Corredor Público número 5, de la Ciudad de Acapulco, Gro., inscrita en el Registro Público de la Ciudad de Acapulco, Guerrero, en el folio número **10160*17**, con fecha **17 de febrero de 2010**, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal, número **41066004-016-2023**, de fecha **18 de julio de 2023**, relativa a los trabajos consistentes en **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Bajo protesta de decir verdad que la firma y antefirma que aparecen al calce del presente documento corresponden a la C. IRINA SALGADO HERNANDEZ, administradora única de la empresa **IMEXA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.**

Firma **Antefirma**

Por la atención que sirva a la presente, le reitero mi más sincero agradecimiento.

ATENTAMENTE

ING. IRINA SALGADO HERNÁNDEZ.
ADMINISTRADOR ÚNICO.

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. **41066004-016-2023.**
REFERENTE A LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**

i). - SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN POR ESCRITO, INDICANDO EL NÚMERO Y DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN.

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01
CEL. 744 2354717 / 744 4490912 E-MAIL: imexa@telmexmail.com, gno_0301@hotmail.com

000225

i). - SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN POR ESCRITO, INDICANDO EL NÚMERO Y DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN.

Acapulco de Juárez, Gro., a 03 de agosto de 2023.

Ing. Luz María Meraza Radilla.
Secretaría De Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
del Municipio De Acapulco De Juárez, Guerrero
Presente

Que en mi carácter de **Administrador Único**, de la empresa **IMEXA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.**, lo que se acredita en los términos del testimonio de la póliza número **1585**, de fecha **16 de diciembre de 2009**, otorgada ante la fe del Licenciado **SHUNASHI JAZMÍN ALTAMIRANO PINEDA** Corredor Público número 5, de la Ciudad de Acapulco, Gro., inscrita en el Registro Público de la Ciudad de Acapulco, Guerrero, en el folio número **10160*17**, con fecha **17 de febrero de 2010**, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal, número **41066004-016-2023**, de fecha **18 de julio de 2023**, relativa a los trabajos consistentes en **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Asimismo, habiéndose enterado mi representada por conducto de su representante legal, del contenido de la convocatoria a la licitación, sus anexos, modelos de contrato y de garantías a otorgarse, así como de los requisitos establecidos, **manifiesto en su nombre, bajo protesta de decir verdad, su interés para participar en la licitación.**

ATENTAMENTE

ING. IRINA SALGADO HERNÁNDEZ.
ADMINISTRADOR ÚNICO.

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01
CEL. 744 2354717 / 744 4490912 E-MAIL: imexa@telmexmail.com, gno_0301@hotmail.com

000226

Acapulco de Juárez, Gro. A 20 de Julio de 2023

C. Ing. Luz María Meraza Raadilla
Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
del Municipio de Acapulco.
P r e s e n t e

OFICIO DE INTERÉS

Como representante legal de **IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.** extiendo la presente para expresar el **INTERÉS** de participar en la **Licitación Pública No. 41066004-016-2023**, relativa a: **Rehabilitación de Calle Felipe II, Tramo Farallón Av. Universidad,** Fracc. Magallanes, Acapulco de Juárez, Gro.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.


Recibí 02:01 PM
20/07/2023
Antonia Caballero Zarco

Atentamente

Ing. Irina Salgado Hernández
Representante Legal

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01
CEL. 744 4490912 / 744 2354717 E-MAIL: imexa@telmexmail.com, gno_0301@hotmail.com

000227



19 DE JULIO 2023
SUC. CUAUHTEMOC ACAPULCO 0241
PLAZA: ACAPULCO, GRO

DEPOSITO REFERENCIADO EFVO
65-50938655-2
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
REF: IMEXACONSTRUCTORESSADECV4106600401 62023

MN

DOCUMENTOS.

BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE

TOTAL DE DOCUMENTOS: $ 0.00
EFECTIVO: $ 3,000.00
CARGO CUENTA:
TOTAL: $ 3,000.00

SEC. 9717232 FOLIO: 2418916
N409915 14:34:07 6PP6

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ

ESTE COMPROBANTE ES DIGITAL, LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCIÓN TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA CAMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. **41066004-016-2023.**
REFERENTE A LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**

j). - DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL LOS LICITANTES MANIFIESTEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE POR SÍ MISMOS, O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONALES MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01
CEL. 744 2354717 / 744 4490912 E-MAIL: imexa@telmexmail.com. gno_0301@hotmail.com

000229

j). - DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.

Acapulco de Juárez, Gro., a 03 de agosto de 2023.

Ing. Luz María Meraza Radilla.
Secretaría De Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
del Municipio De Acapulco De Juárez, Guerrero
Presente

Que en mi carácter de **Administrador Único**, de la empresa **IMEXA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.**, lo que se acredita en los términos del testimonio de la póliza número **1585**, de fecha **16 de diciembre de 2009**, otorgada ante la fe del Licenciado **SHUNASHI JAZMÍN ALTAMIRANO PINEDA** Corredor Público número 5, de la Ciudad de Acapulco, Gro., inscrita en el Registro Público de la Ciudad de Acapulco, Guerrero, en el folio número **10160*17**, con fecha **17 de febrero de 2010**, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal, número **41066004-016-2023**, de fecha **18 de julio de 2023**, relativa a los trabajos consistentes en **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 42, fracción XII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios del Estado de Guerrero No. 266, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que por mi mismo o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación u otros aspectos que me otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE

ING. IRINA SALGADO HERNÁNDEZ.
ADMINISTRADOR ÚNICO.

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01
CEL. 744 2354717 / 744 4490912 E-MAIL: imexa@telmexmail.com, gno_0301@hotmail.com

imexa constructores sa de cv

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. **41066004-016-2023.**
REFERENTE A LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**

k). - IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA (CREDENCIAL DE ELECTOR)

000231


MÉXICO
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
SALGADO
HERNANDEZ
IRINA
SEXO M
DOMICILIO
C NUEVO LEON 23
COL PROGRESO 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
CLAVE DE ELECTOR SLHRIR67082312M900
CURP
SAHI670823MGRLRR09
AÑO DE REGISTRO
1993 06
FECHA DE NACIMIENTO
23/08/1967
SECCIÓN
0057
VIGENCIA
2023 - 2033


INE
IDMEX2412998667<<0057054805632
6708238M3312315MEX<06<<00253<9
SALGADO<HERNANDEZ<<IRINA<<<<<<

000232

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. **41066004-016-2023.**
REFERENTE A LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**

I). - LOS LICITANTES DEBERÁN ESTAR REGISTRADOS EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL ESTADO DE GUERRERO;
ASI COMO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, DEBERÁN PRESENTAR LA CONSTANCIA DEL REGISTRO O REFRENDO ACTUALIZADA.

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01 CEL. 744 2354717 / 744 4490912 E-MAIL: imexa@telmexmail.com. gno_0301@hotmail.com

000233

ACAPULCO, GRO. A 23 DE JUNIO DE 2023

C. ARQ. URB. IRENE JIMENEZ MONTIEL
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS
Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DEL ESTADO DE GUERRERO
P R E S E N T E

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE SOLICITO DE LA MANERA MAS ATENTA EL REFRENDO AL PADRON DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

PARA LO CUAL ANEXO COPIA DE LA INFORMACION REQUERIDA.

AGRADECIENDO SU ATENCION A LA PRESENTE QUEDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION.

"MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DOCUMENTOS E INFORMACION PROPORCIONADA SON FIDEDIGNOS Y VERACES".

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

RECIBIDO 23 JUN 2023

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCIÓN DE COSTOS, PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

ATENTAMENTE

ARQ. GENOVEVA MORALES ROMAN
Representante Legal - Imexa Constructores, S.A. de C.V.

IMEXA CONSTRUCTORES S.A. D
R.F.C. ICO-091216GUA
CALLE CORREGIDORA No. 4
COL. MORELOS C.P. 39530
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
imexa_prodigy.net.mx

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01
CEL. 744 4490912 / 744 2354717 / 741 4110317 E-MAIL: imexa@telmexmail.com, gno_0301@hotmail.com

000234

ACAPULCO

CÉDULA DE REGISTRO DEL PADRÓN MUNICIPAL DE CONTRATISTA

REGISTRO: 2848
FOLIO ANUAL: 192

ESPECIALIDADES:
* Edificación y Urbanización

REGISTRO: PERSONA MORAL

NOMBRE DE LA EMPRESA:	**IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.**
REPRESENTANTE LEGAL:	**IRINA SALGADO HERNANDEZ**
DOMICILIO:	CALLE CORREGIDORA NO. 4, COL. MORELOS, C.P. 39530, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
TELÉFONO:	744 485 9501, 744 449 0912, 744 235 4717
CORREO ELECTRÓNICO:	gno_0301@hotmail.com
RFC:	ICO091216UUA
IMSS:	B61-59781-10-7
INFONAVIT:	B61-59781-10-7
REPRESENTANTE TÉCNICO:	**ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO**
CÉDULA PROFESIONAL:	2220846
FECHA DE CÉDULA:	02 DE JULIO DEL 2012
RFC:	AASV6812211Z7
TELÉFONO:	744 235 4717
CORREO ELECTRONICO:	viasev@hotmail.com
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	**21 DE JUNIO DEL 2016**
AFILIACIÓN:	**NO APLICA**

ESCRITURA PÚBLICA

LICENCIADO:	LIC. SHUNASHI JAZMIN ALTAMIRANO PINEDA
NOTARÍA:	CORREDOR PUBLICO NO. 5 EN EL ESTADO DE GUERRERO.
CIUDAD:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
No. DE ACTA:	1585 FECHA: 16 DE DICIEMBRE DEL 2009
No. REG. PUB.:	10160 * 17 FECHA: 17 DE FEBRERO DEL 2010

VIGENCIA: 14 DE JUNIO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2024

	IRINA SALGADO HERNANDEZ REPRESENTANTE LEGAL	**M. I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMÁN** DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AOBR-01
REV. 02

000235

TRANSFORMANDO GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

SECRETARÍA DE
DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DEL ESTADO DE GUERRERO

SECCIÓN : DIRECCIÓN DE COSTOS, PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS.
OFICIO N° : SDUOPOT-J-DCPLC-2561-2022.
ASUNTO : CONSTANCIA DE REFRENDO

Chilpancingo de los Bravo, Gro., a 08 de noviembre de 2022
"2022, Año de Ricardo Flores Magón"

REFRENDO 2022 - 2023

Válido Hasta el 31 de Mayo de 2023.

MEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
RFC: **ICO091216UUA**
REPRESENTANTE LEGAL: **ARQ. GENOVEVA MORALES ROMAN**
CORREGIDORA NO. 4
COL. MORELOS, CP. 39530.
ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.

En atención a su Solicitud y en virtud de haber acreditado lo dispuesto en el artículo 31 de La Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero número 266, hace de su conocimiento que la *Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas Y Ordenamiento Territorial*, ha tenido a bien Refrendarlo en el Padrón Único de Contratistas del Gobierno del Estado de Guerrero, con el número **SDUOPOT-RUPC-0627-2022**, y de acuerdo al artículo 30 de la ley en mención, se le asignan la (s) especialidad (es) número(s):

- **115** Puentes
- **130** Edificación
- **154** Drenajes
- **182** De concreto hidráulico
- **121** Techumbres
- **151** Líneas de conducción y redes de distribución de agua
- **155** Guarniciones y banquetas

Así mismo, se le recuerda que con fundamento en el articulo 32 de la ley en comento, el registro en el Padrón Único de Contratistas del Estado de Guerrero tendrá *Vigencia Indefinida*, siempre y cuando se cumpla con la obligación de Refrendarlo anualmente.

A T E N T A M E N T E.
La Secretaria de Desarrollo Urbano,
Obras Públicas y Ordenamiento Territorial.

ARQ. URB. IRENE JIMÉNEZ MONTIEL

c.c.p. Ing. Oscar Omar Hernández Fuentes - Director de Costos, Presupuestos, Licitaciones y Contratos de la SDUOPOT – para su conocimiento- Presente.
c.c.p. archivo.
Elaboró: CGIB ***Revisó: COHF*** ***Vo. Bo: RGB***

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. **41066004-016-2023.**
REFERENTE A LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**

m). - EN EL CASO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, LOS REQUISITOS DEBERÁN SER PRESENTADOS POR CADA UNO DE LOS ASOCIADOS Y ASOCIANTES, ASÍ COMO EL CONVENIO PRIVADO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN; DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO NUMERO 47 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01 CEL. 744 2354717 / 744 4490912 E-MAIL: imexa@telmexmail.com, gno_0301@hotmail.com

000237

m). - ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN.

Acapulco de Juárez, Gro., a 03 de agosto de 2023.

Ing. Luz María Meraza Radilla.
Secretaría De Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
del Municipio De Acapulco De Juárez, Guerrero
Presente

Que en mi carácter de **Administrador Único**, de la empresa **IMEXA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.**, lo que se acredita en los términos del testimonio de la póliza número **1585**, de fecha **16 de diciembre de 2009**, otorgada ante la fe del Licenciado **SHUNASHI JAZMÍN ALTAMIRANO PINEDA** Corredor Público número 5, de la Ciudad de Acapulco, Gro., inscrita en el Registro Público de la Ciudad de Acapulco, Guerrero, en el folio número **10160*17**, con fecha **17 de febrero de 2010**, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal, número **41066004-016-2023**, de fecha **18 de julio de 2023**, relativa a los trabajos consistentes en **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que mi representada cuenta con la capacidad Técnica, Administrativa, Económica y Financiera para participar individualmente en el presente proceso de licitación.

Sin otro particular quedo de su atenta servidora.

ATENTAMENTE

ING. IRINA SALGADO HERNÁNDEZ.
ADMINISTRADOR ÚNICO.

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01
CEL. 744 2354717 / 744 4490912 E-MAIL: imexa@telmexmail.com, gno_0301@hotmail.com

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. **41066004-016-2023.**
REFERENTE A LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**

n). - LAS PERSONAS A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 62 DE ESTA LOPSEG, QUE PRETENDAN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, MANIFESTARÁN MEDIANTE UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO, INCLUYEN SUPUESTOS, ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN VERÍDICOS Y SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR, ASÍ COMO QUE, EN SU CASO, CONSIDERAN COSTOS ESTIMADOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DEL MERCADO.

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01 CEL. 744 2354717 / 744 4490912 E-MAIL: imexa@telmexmail.com, gno_0301@hotmail.com

n). - MANIFESTACION MEDIANTE UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO, INCLUYEN SUPUESTOS, ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN VERÍDICOS Y SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR, ASÍ COMO QUE, EN SU CASO, CONSIDERAN COSTOS ESTIMADOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DEL MERCADO.

Acapulco de Juárez, Gro., a 03 de agosto de 2023.

Ing. Luz María Meraza Radilla.
Secretaría De Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
del Municipio De Acapulco De Juárez, Guerrero
Presente

Que en mi carácter de **Administrador Único**, de la empresa **IMEXA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.**, lo que se acredita en los términos del testimonio de la póliza número **1585**, de fecha **16 de diciembre de 2009**, otorgada ante la fe del Licenciado **SHUNASHI JAZMÍN ALTAMIRANO PINEDA** Corredor Público número 5, de la Ciudad de Acapulco, Gro., inscrita en el Registro Público de la Ciudad de Acapulco, Guerrero, en el folio número **10160*17**, con fecha **17 de febrero de 2010**, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal, número **41066004-016-2023**, de fecha **18 de julio de 2023**, relativa a los trabajos consistentes en **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 42, fracción XII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios del Estado de Guerrero No. 266, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o programas que previamente he realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado.

ATENTAMENTE

ING. IRINA SALGADO HERNÁNDEZ.
ADMINISTRADOR ÚNICO.

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01
CEL. 744 2354717 / 744 4490912 E-MAIL: imexa@telmexmail.com, gno_0301@hotmail.com

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. **41066004-016-2023.**
REFERENTE A LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**

000001

AT-i MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO O SITIOS DE REALIZACIÓN DE LA OBRA Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES; DE HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN Y LAS BASES QUE LA S.D.U.O.P. DE ACAPULCO LES HUBIERE PROPORCIONADO, ASÍ COMO HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE, EN SU CASO ASI TAMBIEN LA INTEGRACION DEL ACTA DE VISITA DE OBRAS, QUE LE PROPORCIONE LA S.D.U.O.P. Y EL PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE.

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01 CEL. 744 2354717 / 744 4490912 E-MAIL: [illegible] gno_0301@hotmail.com

ANEXO AT-1 MANIFESTACIÓN PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO O SITIOS DE REALIZACIÓN DE LA OBRA Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES; DE HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, LES HUBIERE PROPORCIONADO, ASÍ COMO DE HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DELA PROPOSICIÓN, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE, EN SU CASO, LE PROPORCIONE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ..

Acapulco de Juárez, Gro., a 03 de agosto de 2023.

Ing. Luz María Meraza Radilla.
Secretaría De Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
del Municipio De Acapulco De Juárez, Guerrero
Presente

Que en mi carácter de **Administrador Único**, de la empresa **IMEXA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.**, lo que se acredita en los términos del testimonio de la póliza número **1585**, de fecha **16 de diciembre de 2009**, otorgada ante la fe del Licenciado **SHUNASHI JAZMÍN ALTAMIRANO PINEDA** Corredor Público número 5, de la Ciudad de Acapulco, Gro., inscrita en el Registro Público de la Ciudad de Acapulco, Guerrero, en el folio número **10160*17**, con fecha **17 de febrero de 2010**, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal, número **41066004-016-2023**, de fecha **18 de julio de 2023**, relativa a los trabajos consistentes en **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 44, fracción XX de la Ley de Obras Públicas y Servicios Estado de Guerrero No. 266 y a lo solicitado en el anexo AT-1 de la convocatoria a la licitación, a nombre de mi representada, manifiesto bajo protesta de decir verdad, conocer el sitio o sitios de realización de la obra y sus condiciones ambientales; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, proporcione la propia LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.
Finalmente, también manifiesto a nombre de mi representada, el haber considerado en la integración de la proposición, las aclaraciones y/o modificaciones a la convocatoria a la licitación que, mediante **junta de aclaraciones,** se hicieron del conocimiento de mi representada.

ATENTAMENTE

ING. IRINA SALGADO HERNÁNDEZ.
ADMINISTRADOR ÚNICO.

000003

BASES DE LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

De conformidad con la Convocatoria Pública Estatal de fecha **18 de JULIO de 2023**, para participar en LA LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL **No. 41066004-016-2023**, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 39 fracción I, 40, 41, 42 y 49 de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero, Numero 266; 1, 2 y 18 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la **Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Acapulco de Juárez, Gro. (S.D.U.O.P.)**, emite las presentes bases a las que se sujetarán los licitantes interesados en la formulación de las propuestas para la adjudicación del contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado consistente en:

REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

CONVOCATORIA

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta desde la publicación de la convocatoria y hasta inclusive el séptimo días (7) naturales previos al acto para la presentación y apertura de proposiciones en las oficinas del departamento de costos y licitaciones de la S.D.U.O.P., ubicada en Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col. Centro, Acapulco de Juárez, Guerrero, C.P. 39300, Tel (744)440-70-00 ext. 4228, (744) 440-71-30 (directo) en Acapulco, Gro., en días hábiles, en el horario de 9:00 a 14:00 horas, a un costo **de $ 3,000.00**, (tres mil pesos 00/100 M.N.) La forma de pago es: depósito Bancario a la Cuenta **Número 65-50938655-2, clabe: 014260655093865527 a Nombre del Municipio de Acapulco de Juárez, Banco Santander (MEXICO), S.A., concepto o referencia del pago anexar el número de la licitación a participar.**

- El contratista deberá traer consigo original y dos copias del pago, y su carta intención.

CLÁUSULAS

PRIMERA: GENERALIDADES DE LA OBRA:

La presente licitación se inicia con la publicación de esta convocatoria y concluye con la emisión del fallo y la firma del contrato, o en su caso con la cancelación del procedimiento.

A) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA Y UBICACIÓN.

REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

B) ORIGEN DE LOS RECURSOS.

Para cubrir las erogaciones que se deriven de la adjudicación del contrato, objeto de esta LICITACIÓN, el Municipio de Acapulco de Juárez por conducto de la Secretaria de Planeación y Desarrollo Económico (SEPLADE), autorizo recursos económicos con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) con Núm. de **Oficio SEPLADE/321/2023 de fecha 08 de mayo del 2023.**

SEGUNDA: TERMINOLOGÍA:

PARA EFECTO DE ESTAS BASES SE ENTENDERÁ POR:

1. **CONVOCANTE:** la **Secretaría de desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Acapulco (S.D.U.O.P.)**, responsable de llevar a cabo el procedimiento de contratación.
2. **LICITANTE:** La persona física o moral que adquiera las Bases, se registre y presente su propuesta en el marco y para los efectos de la licitación.
3. **LICITACIÓN:** La presente Licitación Pública.
4. **PROPUESTA:** La oferta que presente el Licitante.
5. **BASES:** Las presentes Bases de Licitación.
6. **LEY:** Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero Número 266. (LOPSEG)
7. **REGLAMENTO.** Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (RLOPSRM)
8. **CONTRATISTA:** La persona física o moral con quien la "**S.D.U.O.P**." formalice el contrato.
9. **CONTRATO:** El documento legal mediante el cual la "**S.D.U.O.P**." y el licitante ganador formalizan la ejecución de la obra.
10. **SHCP:** Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
11. **SFP:** Secretaría de la Función Pública.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

12. CONTRALORÍA INTERNA: Órgano de Control Interno Municipal (OCIM)

TERCERA: MODIFICACIONES Y ACLARACIONES:

La Convocante podrá modificar aspectos contenidos en la presente convocatoria a más tardar el séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de las proposiciones, debiendo difundir dichas modificaciones a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que se efectúen. Cualquier modificación a la información que contiene la convocatoria a la licitación incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formarán parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

CUARTA: PODERES Y DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ACREDITARSE:

El licitante podrá designar la persona que suscriba y firme la documentación de la proposición en la licitación quien deberá contar con los documentos notariales que lo acrediten como Apoderado o Administrador de la empresa con las facultades legales expresas para comprometerse y contratar en nombre y representación de la misma; la persona antes citada podrá otorgar poder simple, a quien designe para que en su nombre y representación asista a los diferentes actos de la Licitación, acompañando original y fotocopia de su identificación oficial con firma, e incluirlo, en el documento adjunto a la propuesta.

No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Sus Servicios del Estado de Guerrero Número 266.

REQUISITOS PARA PRESENTAR CONJUNTAMENTE PROPUESTA DOS O MAS PERSONAS.

La convocante establece que para la presente licitación, quien se registre a la licitación a la convocatoria podrá conjuntarse con una o más personas fisicas o morales, obligándose a suscribir convenio de participación conjunta con cada uno de ellos, para tales efectos, en la propuesta establecerán con precisión y a satisfacción de la **Secretaría de desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Acapulco (S.D.U.O.P.)**, las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, en la carta compromiso indicar que presenta la propuesta en forma conjunta, señalando a las empresas en participación y su representante común, por lo que se obliga a entregar dentro del sobre, copia simple del o los convenios que suscriba, a través del representante común. El convenio deberá cumplir con lo estipulado en el Artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Sus Servicios del Estado de Guerrero Número 266.

El o los asociantes deberán presentar la documentación descrita en las cláusulas cuarta y décima segunda de esta Convocatoria a la licitación Pública, y los documentos establecidos en el numeral 8 (documentación legal) de la cláusula décima octava.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

000006

QUINTA: EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA QUE SE REQUIERE:

Se requiere experiencia de la empresa en: construcción de obras de naturaleza y magnitud similares a las del objeto de la licitación, acreditada con currículum de la empresa y copias de los contratos celebrados con la Administración Pública durante los últimos tres años a partir de la fecha de la publicación de la Convocatoria, con lo que se constate que han ejecutado este tipo de obra, (no se aceptarán órdenes de trabajo o similares) así como las actas de entrega-recepción relativas a esos contratos. (Documento AT-4). Los contratos deberán contener nombre y firma de la persona que representa a la contratante.

Acreditar la experiencia de los técnicos, mediante la presentación de los currículos del personal que realizará los trabajos y acompañar el contrato de trabajo o servicios profesionales que este personal ha celebrado con la empresa licitante, debiendo considerar que el personal técnico deberá contar con experiencia en construcción de obras en naturaleza y magnitud similares a las del objeto de la licitación. Para comprobar el grado académico de los profesionales, deberán presentar, para su cotejo, original o copia certificada, con una antigüedad no mayor a tres meses, de su cedula profesional que lo acredite, (Documento AT-3).

SEXTA: SUBCONTRATACIÓN:

El contratista a quien se adjudique el contrato, no podrá hacerlo ejecutar por otro. Siendo el contratista el único responsable de la ejecución de los trabajos ante la convocante, como lo establece el art. 58 de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero 266.

SÉPTIMA: IDIOMA:
La proposición debe presentarse en idioma español.

OCTAVA: MONEDA:

La proposición debe presentarse en pesos mexicanos.

NOVENA: SEÑALAMIENTO DE QUE SERA CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA:

El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria a la licitación, así como la comprobación de que algún licitante haya acordado con otro elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes, además de las anotadas en la Cláusula Vigésima Tercera de esta Convocatoria

DECIMA: NORMAS, ESPECIFICACIONES, ASPECTOS LEGALES, PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA:

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

La integración de las proposiciones y la ejecución de obra se llevarán a cabo con sujeción a la LOPSEG, en forma supletoria el Reglamento de la LOPSRM y al contrato que se suscriba. Además, los trabajos se deberán ejecutar con apego a la Normativa vigente para la ejecución y supervisión de obra de la Secretaria De Desarrollo Urbano y Obras Públicas en sus normas de calidad de los materiales y de construcción establecidas en su Manual de Administración de aplicación general en materia de Obras Públicas y sus servicios relacionados con las mismas, así como el Proyecto Ejecutivo y a las Especificaciones Particulares y Complementarias que se integran como parte de esta convocatoria.

El Contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos consistentes en:

REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal y municipal, así como a las instrucciones que señale la S.D.U.O.P. Quedarán a su cargo las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por la inobservancia de lo anterior.

Los planos arquitectónicos y de ingeniería que serán utilizados para la elaboración de su propuesta, así como también normas de calidad de los materiales y especificaciones generales, particulares de construcción, y **USB** entregado por la convocante deberán ser firmados por el representante legal del licitante y anexados a su propuesta entregando los planos en tamaño carta.

Los planos serán entregados en el Depto. de Costos y Licitaciones de la S.D.U.O.P., cita en **ubicada en Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col. Centro, Acapulco de Juárez, Guerrero, C.P. 39300, Tel (744)440-70-00 ext. 4228, Acapulco, Gro.,**

DÉCIMA PRIMERA: INICIO DE LOS TRABAJOS:

El inicio de los trabajos se tiene programado para el día **14 de Agosto de 2023.**

DÉCIMA SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo máximo de ejecución de los trabajos será de **90 días naturales.**

DECIMA TERCERA: PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los licitantes elaborarán sus programas de ejecución con el plazo solicitado, dichos programas podrán ser presentados en los formatos que para tal efecto proporciona la Convocante. o podrán ser presentados en otros formatos, siempre que estos cumplan con cada uno de los elementos requeridos por la Convocante.

DÉCIMA CUARTA: ANTICIPOS:

000008

Para la presente Licitación la S.D.U.O.P. se otorgará el 30% de anticipo.

DÉCIMA QUINTA: CAPACIDAD FINANCIERA

Los licitantes acreditarán su capacidad financiera con la presentación de Declaraciones Fiscales y Estados Financieros, de los dos últimos años anteriores y declaraciones parciales del ejercicio actual 2023, En caso de inconsistencias entre los estados financieros y la declaración fiscal, para determinar la capacidad financiera se considerará la información contenida en ésta última.

Si el licitante o asociación, no acredita contar con el capital de trabajo suficiente para garantizar el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su programa calendarizado de ejecución, será causal de desechamiento.

Las dependencias y entidades, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos, determinarán en la convocatoria a la licitación pública, los aspectos que se verificarán en los estados financieros de los licitantes, entre otros:

a) Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado; b) Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y c) El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa, y VII. En su caso, el grado de cumplimiento de los contratos celebrados por el licitante con dependencias o entidades, conforme a los parámetros establecidos en la convocatoria a la licitación pública, para efectos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 36 de la Ley.

El licitante ganador, deberá presentar lo siguiente:

1. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, regulados en la LAASSP y la LOPSRM, el "acuse de recepción" con el que compruebe que realizó la solicitud de opinión prevista en la regla I.2.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2008, o aquella que en el futuro la sustituya.

2. Deberá realizar la consulta de opinión ante el SAT, preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del fallo o adjudicación correspondiente. En la solicitud de opinión al SAT deberá, incluir el correo electrónico del área de contratación que se les indique para que el SAT envíe el "acuse de respuesta" que emitirá en atención a su solicitud de opinión.

Correo electrónico de la S.D.U.O.P.: sduop.deptocostos@acapulco.gob.mx

DÉCIMA SEXTA: SUMINISTROS POR PARTE DE LA S.D.U.O.P.

La S.D.U.O.P no proporcionara los materiales y equipos de instalación permanente para la presente Licitación.

DÉCIMA SEPTIMA: GARANTÍAS

I. En observancia a la cláusula 59 de LOPSEG, para el cumplimiento del contrato se deberá garantizar el 10% del importe total del contrato, mediante fianza expedida por institución legalmente autorizada, a favor del Municipio de Acapulco de Juárez, incluido el impuesto al valor agregado (I.V.A.).

La fianza deberá presentarse dentro de los 10 días naturales contados a partir de que se reciba formalmente copia del acta de fallo, de la forma siguiente:

FORMATO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

$ (anotar con número y letra el 10% del importe total del contrato).

FIANZA OTORGADA ANTE EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ Y A FAVOR DE LA MISMA.

PARA GARANTIZAR POR EL CONTRATISTA: (razón o denominación social de la persona moral, o nombre de la persona física con la que se celebró el contrato)

EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NÚMERO _____, DE FECHA ___ DE _____ DE 20___, CON IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $_____, (_____ PESOS 00/100 M. N.), CUYO OBJETO ES (insertar completo el objeto del contrato, especificado en la cláusula ____ del mismo).

CELEBRADO CON EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, POR CONDUCTO DE: LA S.D.U.O.P, LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266 Y ESTARÁ VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS CUANDO ASÍ SE HAYA CONVENIDO, LA COMPAÑÍA

AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN MÁS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ÉSTA FIANZA SE SUBSTITUIRÁ POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE; D).- ÉSTA FIANZA PERMANECERÁ EN VIGOR AÚN EN LOS CASOS EN QUE LA S.D.U.O.P OTORGUE PRÓRROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACIÓN DE LA S.D.U.O.P; F).- ÉSTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O DE LA S.D.U.O.P, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; G).- LA FIANZA SE CANCELARÁ CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA S.D.U.O.P, SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERÁ LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ÉSTA CONTINUARÁ VIGENTE; Y, H).- LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE ÉSTA PÓLIZA DE FIANZA

II. Concluidos los trabajos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la LOPSEG el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato.

Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, los contratistas, deberán constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido, de la forma siguiente:

FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

$ (anotar con número y letra el 10% del importe total ejercido).

FIANZA OTORGADA ANTE EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y A FAVOR DEL MISMO

PARA GARANTIZAR POR EL CONTRATISTA: (razón o denominación social de la persona moral, o nombre de la persona física con la que se celebró el contrato)

LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO _____, DE FECHA ___ DE _____ DE 20___, CON IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS RECIBIDOS POR LA CANTIDAD DE $_____, (_____ PESOS 00/100 M. N.), CUYO OBJETO ES (insertar completo el objeto del contrato, especificado en la cláusula (_____) del mismo).

CELEBRADO CON EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, POR CONDUCTO DE LA S.D.U.O.P. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266.

LA COMPAÑÍA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA: A). - QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ÉSTA FIANZA ES DE 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ___ DE _____ DE 20___, CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE FECHA ___ DE _____ DE 200___, AL TÉRMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA S.D.U.O.P Y DE NO EXISTIR RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA PROCEDERÁ A SU CANCELACIÓN AUTOMÁTICA; C).- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA S.D.U.O.P LO COMUNICARÁ DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ÉSTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, TRANSCURRIDO ÉSTE TÉRMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA S.D.U.O.P PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA. SI LA REPARACIÓN REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA S.D.U.O.P, PODRÁN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE ESTA

PÓLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO CON LA AUTORIZACIÓN DE LA S.D.U.O.P; Y, E).- LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE ÉSTA PÓLIZA DE FIANZA.

En el caso de detectarse algún defecto o vicio oculto de los trabajos, durante el período antes citado, la garantía por la que hayan optado deberá permanecer vigente por un plazo de doce meses, a partir de la reparación de los defectos, en su caso, La Contratante deberá informar a la Afianzadora el estado de las obras o trabajos realizados

DÉCIMA OCTAVA: DOCUMENTACIÓN QUE SE REQUIERE PARA PREPARAR LA PROPOSICIÓN Y FORMA DE PRESENTACIÓN:

Para preparar la proposición, se acompañan a las presentes Bases, los anexos con los cuales se integrará la proposición **(AT1)**, la cual se presentará en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, mediante un sobre cerrado, el cual estará integrado de conformidad como se señala a continuación; La documentación legal que acredita la existencia y personalidad jurídica del licitante podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre.

Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante.

Se deberá presentar en forma digital (Escaneados en PDF) todos los documentos que integran el paquete de concurso de acuerdo a lo que estipula la constancia de recepción de documentos, con sus respectivos folios, firmas o rubricas; de todo lo anterior se presentara debidamente identificado(s) con número de concurso, nombre de la empresa y firmado(s) en USB.

Así mismo deberán entregar en formato de Excel los documentos que se generan en los programas opus, neodata o similares.

1. Las propuestas deberán presentarse en hojas con el membrete de la empresa, excepto aquellas que le fueron entregadas por la Convocante.

2. Cada documento presentado para la propuesta deberá ser integrado en **folders**, para su mejor recepción y revisión

3. La propuesta deberá presentarse en un sobre cerrado, en el orden que se establece en el punto 10 de ésta cláusula, incluyendo toda la documentación proporcionada por la Convocante; el cual deberá indicar en la parte superior izquierda el nombre del licitante y al centro el número de licitación y nombre de la obra.

4. Las propuestas deberán ser firmadas autógrafamente en la última hoja. Salvo tratándose del catálogo de conceptos o presupuesto y los programas solicitados deberán ser firmadas en cada hoja.

5. En el caso que el licitante participe como asociación, presentará las propuestas en papel membretado de la empresa designada como representante común, firmadas en todas sus hojas y anexos que la integran por el representante común designado por el grupo de personas.

6. La propuesta se presentará en forma presencial. Los licitantes deberán presentar sus proposiciones por escrito durante el acto de presentación y apertura de proposiciones. Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por los licitantes o sus apoderados.

7. Las proposiciones deberán presentarse foliada en cada una de sus hojas, con el propósito de aclarar cualquier situación que se presente o en el caso de una revisión por parte de las instancias correspondientes, constatar la documentación e información que presentó el licitante

8. Las proposiciones del licitante que presentan en forma presencial, se solicita entregar en USB y en archivo electrónico escaneados en formato PDF, los documentos de la propuesta debiendo integrarlos en el sobre correspondiente

9. Documentación distinta a la propuesta que no forma parte de la misma. (Documentación legal). **MISMOS QUE SERÁN ESCANEADOS E IDENTIFICADO COMO (Documentación legal). EN PDF.**

   a) ORIGINAL Y COPIA DEL TESTIMONIO DEL ACTA CONSTITUTIVA Y MODIFICACIONES EN SU CASO SEGÚN SU NATURALEZA JURÍDICA, COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA DE LA PERSONA QUE FIRME LA PROPOSICIÓN, SI SE TRATA DE PERSONA MORAL. EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, DE LA CURP Y DE LA CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL CON CURP, ASÍ COMO COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA. PROPORCIONAR DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SI LO TIENE.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

b) *DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE EL* ***CAPITAL CONTABLE*** *REQUERIDO, POR UN IMPORTE DE:* ***$1,500,000.00*** *QUE ACREDITARÁ CON BASE EN LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL ANUAL DEL 2022, DECLARACIONES PROVISIONALES DEL 2023,* ***Y LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS (AT6)***

c) DECLARACIÓN POR ESCRITO ***BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD*** *EN QUE EL LICITANTE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA.*

d) ORIGINAL Y COPIA DE LOS REGISTROS ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), Y DEL INFONAVIT.

e) ESCRITO EN EL QUE SE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, LAS QUE SURTIRÁN TODOS SUS EFECTOS LEGALES, MIENTRAS NO SEÑALE OTRO DISTINTO.

f) ORIGINAL Y COPIA DEL REGISTRO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (RFC).

g) DECLARACIÓN POR ***ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD*** *DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 62 Y 89 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266.*

h) PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE, LA FIRMA Y ANTEFIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O DE LA PERSONA FÍSICA.

i) SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN POR ESCRITO, INDICANDO EL NÚMERO Y DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN.

j) DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL LOS LICITANTES MANIFIESTEN ***BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD*** *QUE POR SÍ MISMOS, O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONALES MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.*

k) IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA (CREDENCIAL DE ELECTOR)

l) LOS LICITANTES DEBERÁN ESTAR REGISTRADOS EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL ESTADO DE GUERRERO; ASI COMO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, NO SERA MOTIVO DE DESACLIFICACION EL NO CONTAR CON EL MISMO AL MOMENTO DE LA CONVOCATORIA, SIN EMBARGO DEBERAN REGISTRARSE EN EL LAPSO DE LA LICITACION, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS NÚMERO 31 Y 34 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266., DEBERÁN PRESENTAR LA CONSTANCIA DEL REGISTRO O REFRENDO ACTUALIZADA.

m) EN EL CASO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, LOS REQUISITOS DEBERÁN SER PRESENTADOS POR CADA UNO DE LOS ASOCIADOS Y ASOCIANTES, ASÍ COMO EL CONVENIO PRIVADO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN; DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO NUMERO 47 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266

*n) LAS PERSONAS A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 62 DE ESTA LOPSEG, QUE PRETENDAN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE **ESTA** OBRA, **MANIFESTARÁN MEDIANTE UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO, INCLUYEN SUPUESTOS, ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN VERÍDICOS Y SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR, ASÍ COMO QUE, EN SU CASO, CONSIDERAN COSTOS ESTIMADOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DEL MERCADO.*

10. PROPOSICIÓN

El SOBRE deberá contener los siguientes anexos. Los documentos contenidos en el sobre serán identificados con el mismo título y ordenados en la misma secuencia que la indicada a continuación. **MISMOS QUE SERÁN ESCANEADOS Y ORDENADOS EN LA MISMA SECUENCIA, EN PDF.**

ANEXOS TÉCNICOS

AT-1 *MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO O SITIOS DE REALIZACIÓN DE LA OBRA Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES; DE HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE **CONSTRUCCIÓN Y LAS BASES QUE LA S.D.U.O.P.** DE ACAPULCO LES HUBIERE PROPORCIONADO, ASÍ COMO HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN*

PERMANENTE QUE, EN SU CASO ASI TAMBIEN LA INTEGRACION DEL ACTA DE VISITA DE OBRAS, QUE LE PROPORCIONE LA S.D.U.O.P. Y EL PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE. TRATÁNDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN

AT-2 *DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. QUE EL LICITANTE PROPONE LLEVAR A CABO, TOMANDO COMO BASE TODOS LOS CONCEPTOS DEL CATALOGO, Y EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DESCRIBIENDO LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA Y DE MAQUINARIA Y EQUIPO A UTILIZAR*

AT-3 *ESCRITO DE PROPOSICIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, ANEXANDO EL CURRÍCULO Y CEDULA PROFESIONAL DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA, LOS QUE DEBERÁN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES, MISMOS QUE DEBERÁN ESTAR FIRMADOS POR LOS PROFESIONALES, SE CONSIDERARÁ COMO MANO DE OBRA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESPECIALISTAS, TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS NACIONALES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA DE NATURALEZA SIMILAR QUE SE REQUIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADA POR PERSONAS DE NACIONALIDAD MEXICANA (SUS CURRICULAS DEBERÁN ANEXARSE CON FIRMA AUTÓGRAFA COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL DE NO SER A SI SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN).*

AT-4 *DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS DE LA* MISMA *COMPLEJIDAD, MAGNITUD Y CARACTERÍSTICAS QUE LOS QUE SE ESTÁN CONVOCANDO MÍNIMA DE TRES AÑOS EFECTIVO ANEXAR COPIA DE CONTRATOS, ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE CADA OBRA, CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN EL CASO.*

AT-5 *MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LA OBRA QUE SUBCONTRATARÁ, EN CASO DE HABERSE PREVISTO EN LA CONVOCATORIA ALA LICITACIÓN*

PÚBLICA. LA S. D. U. O. P. DEBERÁ SOLICITAR LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN. TRATÁNDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN

AT-6 *DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, LOS CUALES DEBERÁN INTEGRARSE POR COPIA SIMPLE DE LA DECLARACIÓN FISCAL DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS, DECLARACIONES PARCIALES DEL 2023 Y BALANCE GENERAL CON* ***ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS ANTERIORES Y EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS.***

AT-7 *RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD*

AT-8 *MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS, CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, EN MATERIA DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL. TRATÁNDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN*

ANEXOS ECONÓMICOS

AE-1 *LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN, AGRUPADO POR:*

A MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE;

B MANO DE OBRA; Y

C MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

AE- 2 *ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS:*

A ANÁLISIS DEL FACTOR Tp/TI;

B TABLA DE CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL; Y

C ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL SALARIO REAL

AE-3 *ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ÉSTOS PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS.*

AE-4 *ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.*

AE-5 *ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.*

AE-6 *UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE*

AE-7 *CARGOS ADICIONALES*

AE-8 *RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. CUANDO EXISTAN INSUMOS DE*

LOS SEÑALADOS EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE DEBERÁ SEÑALAR EL PRECIO OFERTADO POR EL LICITANTE.

AE-9 *ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRÁN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS*

AE-10 *PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDO A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA S.D.U.O.P., DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA Y EN SU CASO, CON FECHAS CRITICAS QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.*

AE-11 *PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA S.D.U.O.P., PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:*

A MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS;

B MANO DE OBRA;

C MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS; Y

D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

AE-12 *CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.* ***ANEXANDO RESUMEN DEL PRESUPUESTO*** *ESTE*

DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE

E13 *CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN*

DOCUMENTOS ADICIONALES

DA-1 *ORIGINAL DEL ESCRITO EN EL QUE SEÑALE DOMICILIO Y UNA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO, EN CASO DE CONTAR CON ELLA, PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y, EN SU CASO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, MISMO QUE SERVIRÁ PARA PRACTICAR LAS NOTIFICACIONES AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN TODOS SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE OTRO DISTINTO.*

DA-2 *ORIGINAL DEL ESCRITO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE QUIEN PRETENDA SOLICITAR ACLARACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA, EN EL QUE EXPRESE SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, POR SI O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, INDICANDO LOS DATOS Y REQUISITOS SIGUIENTES:*

DEL LICITANTE: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES; NOMBRE Y DOMICILIO, ASÍ COMO, EN SU CASO, LOS DE SU APODERADO O REPRESENTANTE. TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES, ADEMÁS SE SEÑALARÁ LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, IDENTIFICANDO LOS DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS Y, DE HABERLAS, SUS REFORMAS Y MODIFICACIONES, CON LAS QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS MORALES, ASÍ COMO EL NOMBRE DE LOS SOCIOS, Y

DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE: DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN LAS QUE LE FUERON OTORGADAS LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN Y SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL

DA-3 *ORIGINAL DEL ESCRITO MEDIANTE EL CUAL DECLARE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 62 Y 89, DE LA LOPSEG; Y QUE POR SU CONDUCTO NO PARTICIPAN EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SE ENCUENTREN INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN LOS TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 51 DE LA PROPIA LEY. TRATÁNDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, DEBERÁ*

PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN

DA-4 *ORIGINAL DEL ESCRITO MEDIANTE EL CUAL LOS LICITANTES O SUS REPRESENTANTES LEGALES DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTEN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA SIN QUE RESULTE NECESARIO ACREDITAR SU PERSONALIDAD JURÍDICA, MISMO QUE CONTENDRÁ LOS DATOS SIGUIENTES:*

A. *DEL LICITANTE: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES; NOMBRE Y DOMICILIO, ASÍ COMO, EN SU CASO, LOS DE SU APODERADO O REPRESENTANTE. TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES, ADEMÁS SE SEÑALARÁ LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, IDENTIFICANDO LOS DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS Y, DE HABERLAS, SUS REFORMAS Y MODIFICACIONES, CON LAS QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS MORALES, ASÍ COMO EL NOMBRE DE LOS SOCIOS; Y*

B. *DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE: DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN LAS QUE LE FUERON OTORGADAS LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN Y SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL*

DA-5 *ORIGINAL DEL ESCRITO QUE CONTENGA LA DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL LOS LICITANTES MANIFIESTEN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE POR SÍ MISMOS, O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA S.D.U.O.P, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES. TRATÁNDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN*

DA-6 *EN SU CASO, CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES, CELEBRADO ENTRE DOS O MÁS INTERESADOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL PUNTO 4.11 DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN,*

RATIFICADAS LAS FIRMAS ANTE NOTARIO, CORREDOR O FEDATARIO PÚBLICO.

DA-7 *EN SU CASO, ESCRITO EN EL QUE LOS LICITANTES MANIFIESTEN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO, INCLUYEN SUPUESTOS, ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN VERÍDICOS Y SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR, ASÍ COMO QUE, EN SU CASO, CONSIDERAN COSTOS ESTIMADOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DEL MERCADO. TRATÁNDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN*

DÉCIMA NOVENA: VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS:

La visita al sitio donde se realizarán los trabajos será optativa para los interesados, y tendrá como objeto que los licitantes conozcan las condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico. Los

licitantes deberán incluir en sus proposiciones un escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad que conocen las condiciones y características antes citadas, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

Se efectuará el día 25 de julio de 2023 a las 10:00 horas, el punto de reunión será, (SALA DE JUNTAS DE LA S.D.U.O.P.)

Atendidos por un representante de la S.D.U.O.P., quien extenderá la constancia correspondiente a cada Licitante, la cual deberá incluir en su propuesta.

VIGÉSIMA: JUNTA DE ACLARACIONES:

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria a la licitación Pública, deberán presentar un escrito libre, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante. El escrito de referencia contendrá los siguientes datos:

a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios, y

b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representación y su identificación oficial.

Cada solicitud de aclaración deberá indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la pregunta o aspecto que se solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaración que no se presenten en la forma señalada podrán ser desechadas por la convocante.

La Junta de aclaraciones se celebrará el día 26 de julio de 2023 a las 10:00 horas, en la sala de juntas de la S.D.U.O.P., ubicada en Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col. Centro, Acapulco de Juárez, Guerrero, C.P. 39300, Tel (744)440-70-00 ext. y 4228, Acapulco, Gro., en el día y hora indicada.

Las Solicitudes de aclaraciones que llegaren a solicitar con relación a la convocatoria a la licitación Pública y sus anexos, podrán entregarse personalmente en la Junta de Aclaraciones, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta.

Las preguntas deben presentarse por escrito y en (USB), en procesador de texto Word.

Las modificaciones que se deriven del resultado de la junta de aclaraciones serán consideradas como parte integrante de la Convocatoria a la licitación Pública.

La reunión tendrá por objeto aclarar y contestar las preguntas sobre cualquier aspecto que pueda plantearse en esa etapa.

La inasistencia de los licitantes a la junta de aclaraciones, será de su estricta responsabilidad: sin embargo, podrán acudir con la debida oportunidad en el domicilio indicado en la Convocatoria correspondiente para que les sea otorgada copia de Acta de la junta respectiva.

Se recibirán comentarios al Correo electrónico de la S.D.U.O.P.: **sduop.deptocostos@acapulco.gob.mx,** a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta.

VIGESIMO PRIMERA: ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES:

El acto de presentación y apertura será presidido por el servidor público que designe la convocante, quien será la única autoridad facultada para aceptar o desechar cualquier proposición de las que hubieren presentado en los términos de la Ley de Obras Públicas y

sus Servicios del Estado de Guerrero Numero 266 y de esta convocatoria a la licitación, y se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

En la junta que se celebrará el día **03 de agosto de 2023, las 12:00 Hrs. en la sala de juntas de la S.D.U.O.P., ubicada en Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col. Centro, Acapulco de Juárez, Guerrero, C.P. 39300, Tel (744)440-70-00 ext. 4228, Acapulco, Gro., en el día y hora indicada. Se llevará a cabo la presentación de proposiciones y apertura de las propuestas, levantándose el acta correspondiente. No se recibirán proposiciones que se presenten después de la fecha y hora arriba señalada.**

Se anexa formato para la verificación de la recepción de los documentos requeridos que el licitante entregue este acto.

La fecha del fallo se dará a conocer en el acta correspondiente.

Para participar en los actos de presentación y apertura de proposiciones, los representantes acreditados por los licitantes, deberán presentar identificación oficial vigente.

El catálogo de conceptos en el que se consignen los precios y el importe total de los trabajos objeto de la licitación serán rubricados por el servidor público facultado para presidir el acto y por lo menos un licitante.

Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitación pública hasta su conclusión.

VIGÉSIMA SEGUNDA: CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

Para la evaluación de las proposiciones se verificará:

I.1.- EVALUACIÓN TÉCNICA

1.- Aspectos generales:

1.1.- Que cada documento contenga toda la información solicitada.

1.2.- Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los mismos; conforme a lo establecido en esta CONVOCATORIA.

1.3.- Que EL LICITANTE acredite su experiencia y capacidad técnica en trabajos realizados de características, complejidad y magnitud similares a los que se licitan. Conforme a lo establecido en esta CONVOCATORIA.

1.4.- Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan.

1.5.- Que la planeación integral y el procedimiento constructivo propuestos por EL LICITANTE para el desarrollo y organización de los trabajos, sean congruentes con las características, complejidad y magnitud de los mismos.

1.6.- Que la planeación integral y el procedimiento constructivo descritos sean aceptables porque demuestra que EL LICITANTE conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición.

2.- Aspectos financieros:

2.1.- Que cumpla con los parámetros financieros establecidos en esta CONVOCATORIA.

3.- Aspectos programáticos

3.1.- De los programas:

3.1.1.- Que el programa de ejecución general de los trabajos corresponda al plazo establecido por LA CONVOCANTE, y que sea congruente con el procedimiento de ejecución de los mismos.

3.1.2.- Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización, sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos.

3.1.3.- Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por EL LICITANTE y con el procedimiento constructivo a realizar.

3.1.4.- Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecución general, en caso de que se requiera de equipo de instalación permanente. (SI NO SE REQUIERE INDICAR NO APLICA)

3.1.5.- Que los insumos propuestos por EL LICITANTE correspondan a los periodos presentados en los programas.

4.- Aspectos técnicos:

4.1.- De la maquinaria y equipo:

4.1.1.- Que la maquinaria y equipo de construcción considerados en su proposición sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitación, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por EL LICITANTE.

4.1.2.- Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por EL LICITANTE, sean las adecuadas, necesarias y suficientes para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por EL LICITANTE, o con las restricciones técnicas, cuando LA DEPENDENCIA fije un procedimiento.

4.1.3.- Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos. Los rendimientos propuestos no podrán ser mayores a los señalados en los manuales.

4.2.- De los materiales:

4.2.1.-Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por EL LICITANTE para el concepto de trabajo en que interviene, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate.

4.2.2.-Que las características, especificaciones y calidad de los materiales, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en esta CONVOCATORIA.

4.2.3.- Que la distancia de acarreo de los materiales al lugar de su utilización señalada en la relación de bancos propuestos por EL CONTRATISTA, sea congruente con la distancia considerada en los análisis de precios unitarios correspondientes y con la ubicación real del banco propuesto y que el volumen a extraer sea suficiente para formar la(s) capa(s) para el que fue propuesto (OPCIONAL INCLUIRLO O NO CONFORME A LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS)

4.3.- Del personal:

4.3.1.-Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos.

4.3.2.-Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por EL LICITANTE, tomando en cuenta los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos.

4.3.3.-Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos más significativos de los trabajos objeto de esta CONVOCATORIA.

4.3.4.- Que el curriculum del personal técnico contenga los datos de formación académica, y en su caso, registro de la cédula profesional ante la Dirección General de Profesiones, relación verificable de las actividades profesionales en que haya participado y demostrar que haya realizado trabajos relacionados con las actividades o conceptos motivo de esta CONVOCATORIA.

I.2.- EVALUACIÓN ECONÓMICA

5.- Aspectos económicos:

5.1.- Que cada documento contenga toda la información solicitada.

5.2.- Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por EL LICITANTE sean aceptables, es decir, que sean acordes con el presupuesto elaborado por LA CONVOCANTE. Dicho presupuesto deberá considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos o, en su caso, en el mercado internacional, considerando los precios de manera individual o como inciden en su totalidad en la propuesta económica.

5.3.- Del presupuesto de los trabajos (Catálogo de Conceptos Forma AE-12):

5.3.1.- Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario.

5.3.2.- Que los importes de los precios unitarios de cada uno de los conceptos sean anotados con número y con letra, los cuales deben ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el del análisis del precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis.

5.3.3.- Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes por parte de LA CONVOCANTE. El monto correcto será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones.

5.4.- Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se hayan realizado de acuerdo con lo establecido en la LEY y EL REGLAMENTO, así como en las demás disposiciones que emita LA SFP y en esta CONVOCATORIA, debiendo cumplir:

5.4.1.- Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales de acuerdo a lo indicado en LA LEY, EL REGLAMENTO y esta CONVOCATORIA.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

5.4.2.- Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, que se emplearán en la realización de los trabajos.

5.4.3.- Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado.

5.4.4.- Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en LA LEY, EL REGLAMENTO y en esta CONVOCATORIA.

5.4.5.- Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate.

5.4.6.- Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción requerido se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados.

5.5.- Que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en LA LEY, EL REGLAMENTO y esta CONVOCATORIA, debiendo además considerar:

5.5.1.- Que los costos de los materiales considerados por EL LICITANTE, sean congruentes con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en esta CONVOCATORIA.

5.5.2.- Que los costos de la mano de obra a utilizar considerados por EL LICITANTE, sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos.

5.5.3.- Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

5.6.- Que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en LA LEY, EL REGLAMENTO y en esta CONVOCATORIA, debiendo además considerar:

5.6.1.- Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

5.6.2.- Que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales de EL LICITANTE, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia de EL CONTRATISTA encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra, de acuerdo con los artículos 211 al 213 de EL REGLAMENTO.

5.6.3.- Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a esta CONVOCATORIA, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario específico.

5.7.- Que el análisis, cálculo e integración del costo financiero se haya estructurado y determinado considerando lo siguiente:

5.7.1.- Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos.

5.7.2.- Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico.

5.7.3.- Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos, conforme al periodo de estimaciones señalado en LA CONVOCATORIA.

5.7.4.- Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por EL LICITANTE sea mediante el método de flujo de caja, debiendo calcularse de acuerdo con los artículos 214, 216 y 217 de EL REGLAMENTO

5.8.- Que el cargo por utilidad fijado por EL LICITANTE se encuentre de acuerdo a lo previsto en el artículo 219 de EL REGLAMENTO.

5.9.- Que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran.

5.10.- Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos.

Para la evaluación de las proposiciones, en ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes.

LA CONVOCANTE en la aplicación de este Sistema Binario de Evaluación de Proposiciones, podrá por economía procesal, solo evaluar aquellas propuestas que no sean superiores al 10% en monto o precio respecto a la determinada ganadora, por haber cumplido satisfactoriamente con los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados en LA CONVOCATORIA y asegurar al Estado las mejores condiciones de contratación en cuanto

a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; situación que LA CONVOCANTE señalará en el fallo correspondiente. Lo anterior en base a la respuesta emitida por la SFP en el doceavo párrafo del oficio No. UNCP/309/NC/0.-1077/2010 de fecha 8 de diciembre de 2010.

EXPERIENCIA Y CAPACIDAD

QUINTA.- El LICITANTE deberá demostrar su experiencia, capacidad técnica y capacidad financiera mediante:

1.-Relación de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, identificados con los cargos que ocuparán, de los que presentará su currículum con firma autógrafa en el que se incluya, en su caso, copia simple de su cédula profesional, su domicilio y teléfono actual, así como la relación de las actividades profesionales en que haya participado. De los profesionales técnicos propuestos sólo se evaluará la preparación académica y la experiencia demostrada en trabajos de características técnicas, complejidad y magnitud similares a los que se licitan.

2.-Relación de los contratos de trabajos similares a los de LA CONVOCATORIA de esta licitación en los que sea comprobable su participación, que haya celebrado tanto con las Administraciones Públicas Federal, Estatal o Municipal, como con particulares, con los que acredite la experiencia y capacidad técnica de EL LICITANTE en este tipo de obras. Contendrá el nombre o denominación de la contratante; domicilio y teléfono de los responsables de los trabajos; descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según sea el caso.

En el caso de que EL LICITANTE presente Subcontratos para demostrar su Experiencia y capacidad técnica, los mismos deberán de cumplir todos los requisitos que correspondan de los solicitados para los contratos.

En caso de que en LA CONVOCATORIA se prevea la subcontratación de cualquier persona o de empresas estratificadas como MIPYMES y EL LICITANTE decida subcontratar los trabajos autorizados, deberá acreditar la experiencia de dichas personas o empresas en trabajos similares a los que se hará cargo, presentando la relación de contratos celebrados, con la información a que se refiere este numeral

EL LICITANTE deberá presentar únicamente el escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad de que no subcontratara ninguna de las partes de los trabajos que se licitan. FORMATO LIBRE.

3.- Declaraciones fiscales o estados financieros dictaminados o no, de los últimos dos ejercicios fiscales, y los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones, con el contenido y alcance siguiente:

Los parámetros financieros que EL LICITANTE deberá de cumplir, para demostrar su capacidad de recursos económicos, son los siguientes:

a).- Que el capital neto de trabajo (CNT) cubra el financiamiento de los trabajos a realizar. Se tendrá como suficiente dicho capital neto, cuando el importe del último ejercicio fiscal del activo circulante (AC) menos el pasivo circulante (PC) sea igual o mayor del 30% del valor del importe de su propuesta económica sin IVA.

Así mismo deberá cumplir cuando menos con uno de los parámetros financieros siguientes:

b).- Que EL LICITANTE demuestre una suficiente capacidad para pagar obligaciones. Se tendrá como suficiente dicha capacidad cuando el importe del último ejercicio fiscal del AC entre PC sea igual o mayor de 1.1 unidades y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT) sea igual o mayor a 2.0 unidades.

c).- Que EL LICITANTE demuestre un aceptable grado en que depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa es aceptable. Se tendrá como aceptable dicho grado de endeudamiento y rentabilidad de EL LICITANTE cuando el importe del último año fiscal del PT entre AT sea igual o menor 70%.

En el caso de proposiciones presentadas en forma conjuntas o en grupo, se sumarán los CNT, AC, PC, AT y PT, para cumplir con los parámetros señalados en los incisos anteriores.

4.-Relación detallada del equipo y personal, indicando cargos y categorías que pretende emplear para el control de calidad de la obra (Unidad de Control de Calidad), cumpliendo con la Norma N-CAL-1-01/05.-Ejecución del Control de Calidad Durante la Construcción o Conservación, del Libro Control y Aseguramiento de Calidad.

5.-Relación de maquinaria y equipo de construcción disponible y necesario para el desarrollo de los trabajos, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos, conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentar además carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad del mismo.

CORRECCIÓN DE ERRORES

La Convocante verificará la coincidencia en cifra y letra del precio total, con la suma del desglose del precio y con la suma del programa de erogaciones ofertadas.

Las ofertas que hayan sido determinadas como aceptables, serán verificadas por la Convocante para comprobar si existe cualquier error aritmético. Los errores pueden ser corregidos por La convocante. como sigue:

En los catálogos de conceptos, si existiera discrepancia entre el precio indicado con número y el expresado con letra, se tomará como válido el asentado con letra y se harán las correcciones correspondientes.

En caso de que el licitante no esté dispuesto a aceptar las correcciones hechas a su propuesta tomando los criterios anteriores, se desechará su propuesta.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará a la persona cuya propuesta solvente tanto técnica como económica, cumpla con todos y cada uno de los requisitos establecidos en estas Bases de Licitación y sus Anexos, reuniendo las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Convocante. y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y por tanto satisfacen la totalidad de los requerimientos de La convocante el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo.

LA convocante emitirá un dictamen que servirá como base para el fallo, en el que hará constar una reseña cronológica de los actos de procedimiento el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o rechazarlas

CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

ARTICULO 49. LOPSEG Las dependencias, entidades y ayuntamientos para hacer la evaluación de las proposiciones, deberán verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en las bases de licitación, para tal efecto, la convocante deberá establecer los procedimientos y los criterios claros y detallados para determinar la solvencia de las propuestas, dependiendo de las características, complejidad y magnitud de los trabajos por realizar.

Tratándose de obras públicas, deberá verificar, entre otros aspectos, el cumplimiento de las condiciones legales exigidas al licitante; que los recursos propuestos por el licitante sean los necesarios para ejecutar satisfactoriamente, conforme al programa de ejecución, las cantidades de trabajo establecidas; que el análisis, cálculo e integración de los precios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o región donde se ejecuten los trabajos. En ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos y porcentajes en su evaluación.

I. La proposición que hubiera ofertado el precio más bajo, en el supuesto de que la evaluación se haya realizado utilizando el mecanismo de evaluación binario, y

II. La proposición que haya obtenido el mayor puntaje o ponderación, cuando se aplique el mecanismo de puntos o porcentajes.

No serán objeto de evaluación las condiciones establecidas por las convocantes que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación; así como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por si mismo, no afecta la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos, no será motivo para desechar sus propuestas.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquel cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo respecto al mercado. La convocante emitirá un dictamen que servirá como base para el fallo, en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos.

Cuando exista desechamiento de alguna proposición la S.D.U.O.P. deberá entregar a cada licitante, a través de un escrito independiente, las razones y fundamentos para ello, con base en el Fallo de la Licitación.

Las proposiciones desechadas durante la licitación pública o invitación a cuando menos tres personas, podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las proposiciones deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la convocante podrá proceder a su devolución o destrucción.

VIGÉSIMA TERCERA: CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA:

Con fundamento en el artículo 48, fracción I, de la LOPSEG y 69 del Reglamento de la LOPSRM.

I. La presentación incompleta o la omisión de cualquiera de los documentos requeridos en esta convocatoria a la licitación, detectada durante la revisión y aún después del cotejo realizado durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, que afecten directamente la solvencia de las proposiciones.

II. La falta de información o documentos que imposibiliten determinar su solvencia en cualquiera de los documentos requeridos en esta convocatoria a la licitación, Que afecten directamente la solvencia de las proposiciones.

III. Cuando en los documentos solicitados se consignen datos e informes distintos a los requeridos en esta convocatoria a la licitación.

IV. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Convocante, que afecten directamente la solvencia de las proposiciones.

V. Se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o documentación proporcionada por los licitantes es falsa.

VI. La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en el artículo 62 y 89 de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero Numero 266.

VII. Cuando las cantidades de trabajo y/o precios unitarios del catálogo de conceptos, presenten alteraciones, raspaduras, tachaduras y/o enmendaduras.

VIII. Cuando las cantidades de trabajo y/o precios unitarios del catálogo de conceptos, presenten alteraciones, raspaduras, tachaduras y/o enmendaduras.

IX. Cuando el licitante no presente uno o varios análisis de precios unitarios o que éstos estén incompletos.

X. Cuando el licitante, en su catálogo de conceptos, omita alguno o algunos de los precios unitarios.

XI. Cuando el licitante, en su documentación no señale el indicador económico utilizado en el análisis del costo por financiamiento.

XII. Cuando el licitante, en su análisis del costo por financiamiento no incida la amortización del o los anticipos otorgados, si es el caso.

XIII. Cuando en la parte económica se incluyan los cargos por concepto de asociación a cámaras industriales o comerciales de la construcción.

XIV. Cuando el licitante en su documentación no señale el indicador económico especifico de la tasa de interés utilizada en el cálculo del costo por inversión integrante de los análisis de los costos horarios.

XV. La falta de presentación de los escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdad.;

XVI. Omitir firmar autógrafamente el catálogo de conceptos y el programa general de ejecución de los trabajos que deben ser firmados en cada una de sus hojas, conforme a lo indicado en esta convocatoria a licitación.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

XVII. No coincida el importe de la propuesta de la carta compromiso, con el catálogo de conceptos y programa de ejecución de los trabajos

XVIII. Que se ponga de acuerdo con uno u otros licitantes para cualquier objeto que pudiera desvirtuar la licitación, entre estos, elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

VIGÉSIMA CUARTA: PROHIBICIÓN DE LA NEGOCIACIÓN:

Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria a la licitación Pública, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.

Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecido en la presente convocatoria, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de la licitación pública hasta la conclusión de misma

VIGÉSIMA QUINTA: LICITACIÓN DESIERTA O CANCELACIÓN

La S.D.U.O.P. no adjudicará el contrato y declarará desierta la licitación cuando las proposiciones presentadas por los licitantes no reúnan los requisitos solicitados en la convocatoria o sus precios de insumos no fueren aceptables para la S.D.U.O.P. Así mismo, podrá cancelar la licitación por caso fortuito, fuerza mayor, existan circunstancias justificadas que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos, o de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia. La determinación de dar por cancelada la licitación, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes.

VIGÉSIMA SEXTA: COMUNICACIÓN DEL FALLO, TERMINACIÓN ANTICIPADA, SANCIONES E INCONFORMIDADES:

a) Comunicación del fallo

En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación, a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren presentado proposiciones, entregándoseles copia del mismo y levantándose el acta respectiva, que firmarán los asistentes, sin que la falta de firma de algún licitante le reste validez o efectos a la misma. A los licitantes que no hayan asistido a la junta pública, se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en las oficinas de la Convocante. Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el público, en el domicilio del área responsable del procedimiento de contratación, por un término no menor de cinco días hábiles. El titular de la citada área dejará constancia en el expediente de la licitación, de la fecha, hora y lugar en que se hayan fijado el acta o el aviso de referencia.

Si la S.D.U.O.P no firmare el contrato respectivo o cambia las condiciones de la convocatoria de licitación que motivaron el fallo correspondiente, el licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar los trabajos. En este supuesto, la S.D.U.O.P, a solicitud escrita del licitante, cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su proposición, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación de que se trate.

Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la inconformidad en términos del Título Octavo, Capítulo primero de la LOPSEG.

El lugar, fecha y hora para dar a conocer el fallo de la licitación, quedarán asentados en el acta de apertura de proposiciones.

b) Terminación anticipada.

La S.D.U.O.P podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 71 de la LOPSEG.

c) Sanciones.

La Secretaría de la Función Pública, además de las sanciones a que se refiere el artículo 88 de la LOPSEG, inhabilitará temporalmente para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por la misma Ley, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes:

I. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen el contrato adjudicado por la convocante;

II. Los contratistas a los que se les haya rescindido administrativamente un contrato en dos o más dependencias o entidades en un plazo de tres años.

III. Los contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la dependencia o entidad de que se trate; y

IV. Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una solicitud de conciliación o de una inconformidad.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

VIGÉSIMA SÉPTIMA: DEL CONTRATO:

A) MODELO DE CONTRATO (ANEXO N° 4)
Se anexa el modelo de contrato.

B) FIRMA DEL CONTRATO

El licitante a quien se adjudique el contrato, se compromete a firmarlo en la fecha que la S.D.U.O.P. manifiesta en el acta de fallo, debiendo otorgar previamente la garantía de cumplimiento del contrato.

Una vez notificado el fallo, la S.D.U.O.P y la(s) persona(s) a quien se haya adjudicado el contrato quedarán obligados a firmarlo en la fecha, hora y lugar previstos en esta Convocatoria o en el fallo, bajo el entendido de que no podrá formalizarse el contrato, si no se encuentra debidamente garantizado el mismo conforme a la fracción II del artículo 59 de la LOPSEG, o bien, no presente la documentación que a continuación se enlista:

El Contratista deberá presentar en el área que se señale en el propio fallo, la siguiente documentación que se menciona en este apartado:

a) Original o copia certificada, para su cotejo, y copia simple de los siguientes documentos, con los que acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente.

Personas morales: testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional, así como sus reformas; testimonio de la escritura pública en la que acredite las facultades de su representante para suscribir el contrato.

Personas físicas: copia certificada del acta de nacimiento o carta de naturalización respectiva, expedida por autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.

b) Documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, tanto del contratista como en su caso de las personas con quienes subcontraten, de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y la Resolución Miscelánea Fiscal vigente a la suscripción del contrato. La consulta de opinión ante el SAT, deberá ser realizada por el licitante ganador y en su caso, por los subcontratistas dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha del fallo, debiendo incluir en la solicitud que realicen el correo electrónico sduop.deptocostos@acapulco.gob.mx, con objeto de que el SAT envíe la respuesta que emitirá en atención a la solicitud de opinión.

c) Documento vigente expedido por el IMSS, en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social en sentido positivo, tanto del contratista como en su caso de las personas con quienes subcontraten,

vigente a la suscripción del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y el Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su modificación. La consulta de opinión ante el IMSS, deberá ser realizada por el licitante ganador y en su caso, por los subcontratistas dentro de los días hábiles posteriores a la fecha del fallo, debiendo incluir en la solicitud que realicen el correo electrónico licitacionesobra@acapulco.gob.mx con objeto de que el IMSS envíe la respuesta que emitirá en atención a la solicitud de opinión.

d) Escrito suscrito por el representante legal de la empresa, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que la información contenida en los documentos expedidos por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) e Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es auténtica.

e) Manifestación escrita de la empresa, de estar o no conforme con la retención del Dos al millar de las estimaciones de obra (en caso de haberla omitido en la proposición económica), como aportación al Instituto de Capacitación de la Cámara a la que pertenezca.

f) Escrito en el que manifieste estar de acuerdo en proporcionar la información y documentación que se le requiera por parte del Órgano de Control Interno Municipal (OCIM).

g) Comprobante de domicilio y RFC de la empresa.

h) Dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 bis de Código Fiscal del Estado de Guerrero número 429.
Artículo 26 bis (Código Fiscal del Estado de Guerrero número 429).

ARTÍCULO 26-Bis. - La Administración Pública Estatal, Centralizada y Paraestatal, así como la Procuraduría General de Justicia del Estado, en ningún caso contratarán adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas con los particulares que: (ADICIONADO, P.O. 27 DE DICIEMBRE DE 2013)

I.- Tenga a su cargo créditos fiscales firmes;
II.- Tenga a su cargo créditos fiscales determinados, firmes o no, que no se encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por este Código;
III.- No se encuentren inscritos en el Registro Estatal y Federal de Contribuyentes; y
IV.- Habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración provisional o no, y con independencia de que en la misma resulte o no cantidad pagar, ésta no haya sido presentada. Lo dispuesto en esta fracción no es aplicable tratándose de omisión en la presentación de declaraciones que sean exclusivamente informativas.
La prohibición establecida en este artículo no será aplicable a los particulares que se encuentren en los supuestos de las fracciones I y II de este artículo, siempre que celebren convenio con las autoridades fiscales en los términos que este Código establece para cubrir a plazos, ya sea como pago diferido o en parcialidades, los adeudos fiscales que tengan a su cargo con los recursos que obtengan por enajenación, arrendamiento,

servicios u obra pública que se pretendan contratar y que no se ubiquen en algún otro de los supuestos contenidos en este artículo.
Para estos efectos, en el convenio se establecerá que las dependencias antes citadas retengan una parte de la contraprestación para ser enterada al fisco estatal para el pago de los adeudos correspondientes.

Los particulares tendrán derecho al otorgamiento de subsidios o estímulos previstos en los ordenamientos aplicables, siempre que no se ubiquen en los supuestos previstos en las fracciones del presente artículo, salvo que tratándose de la fracción III, no tengan obligación de inscribirse en el Registro Estatal y Federal de Contribuyentes.
Las dependencias que tengan a su cargo la aplicación de subsidios o estímulos deberán abstenerse de aplicarlos a las personas que se ubiquen en los supuestos previstos en las fracciones del presente artículo, salvo que tratándose de la fracción III, no tengan obligación de inscribirse en el Registro Estatal y Federal de Contribuyentes.

Los particulares que tengan derecho al otorgamiento de subsidio o estímulos y que se ubiquen en los supuestos de las fracciones I y II de este artículo, no se consideran comprendidos en dichos supuestos cuando celebren convenio con las autoridades fiscales en los términos que este Código establece para cubrir a plazos, ya sea como pago diferido o en parcialidades, los adeudos fiscales que tengan a su cargo. Cuando se ubiquen en los supuestos de las fracciones III y IV, los particulares contarán con un plazo de quince días para corregir su situación fiscal, a partir del día siguiente a aquél en que la autoridad les notifique la irregularidad detectada

La no celebración del contrato citado, con motivo de la falta de presentación de la documentación antes descrita, acontecerá por causas imputables a la persona adjudicada.

C) NO FORMALIZACIÓN

En caso de que el licitante seleccionado, decida no formalizar el contrato o no presente las fianzas dentro de los plazos señalados, la adjudicación y en su caso, el contrato se considerará nulos y dicho licitante, será sancionado en los términos del artículo 89 de la LOPSEG, La convocante podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el artículo 49 de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero Numero 266 y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

D) INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

El Órgano de Control Interno Municipal, podrá intervenir en la inspección y recepción de los trabajos objeto del contrato de conformidad con lo establecido en los artículos 85 y 86 de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero, Número 266.

El contratista comunicará a la dependencia o entidad la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado en el contrato, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas. Al finalizar la verificación de los trabajos, la dependencia o entidad contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente.

E) RETENCIONES

El licitante al que se adjudique el Contrato, aceptará que le sea retenido el cinco al millar por concepto de Servicio de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de la Función Pública estipulado en el Artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. el 0.005 (cinco al millar) para las personas físicas y/o morales afiliadas a la cámara mexicana de la industria de la construcción, de conformidad con el convenio de fecha 02 de mayo de 2022, celebrado por la mencionada cámara y el instituto de capacitación de la industria de la construcción con "la secretaría", con el objeto de apoyar la capacitación de los trabajadores que laboran en la industria de la construcción.

F) BITÁCORA DE OBRA

La bitácora que registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertados por las partes en el contrato, constituye el instrumento que permite a los órganos de control, verificar los avances y modificaciones en la ejecución de los trabajos, motivo por el cual se debe considerar que dicha Bitácora forma parte del contrato.

G) ÓRGANOS DE CONTROL

Los órganos de control, en el ejercicio de sus facultades podrán solicitar datos e informes relacionados con actos relativos a obras y servicios, así como el acceso a la Bitácora, y los servidores públicos y contratistas estarán obligados a proporcionarlos, o en su caso serán sancionados en los términos que establece e la normatividad.

SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.

La S.D.U.O.P. en cumplimiento al artículo 64 de la LOPSEG a través del representante que para tal efecto designe, tendrá el derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a "el Contratista" por escrito las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecución en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le sean ordenadas.

La S.D.U.O.P. designará a un representante ante "el Contratista" y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las volumetrías soporte de las estimaciones presentadas por "el Contratista".

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

H) AJUSTE DE COSTOS

Atendiendo lo establecido en los artículos 67,68 y 69 de la LOPSEG, las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir de la presentación de la propuesta, ocurran circunstancias de orden económico no previstas que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reducción correspondiente.

Para obtener el ajuste de los precios unitarios se considerarán los términos y procedimientos siguientes:

I. la revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste;

II. la revisión por grupo de precios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el ochenta por ciento del importe total faltante del contrato; y

III. en caso de trabajos en los que se tenga establecida la proporción en que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá determinarse mediante la actualización de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones.

La aplicación de los procedimientos descritos se sujetará a lo siguiente:

A) los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al "programa de ejecución pactado" en el contrato o en caso de existir atraso no imputable a **"el Contratista"** , con respecto al programa que se hubiere convenido.

Cuando por causa imputable al contratista existiera atraso, procederá el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar de acuerdo a lo establecido en el programa presentado en su propuesta.

B) los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices nacionales de precio productor con servicios que determine el Banco de México. cuando los índices que requiera "el Contratista" y "la S.D.U.O.P." no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México" la S.D.U.O.P." procederá a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México;

C) los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. el ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del

contrato, el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que "el Contratista " haya considerado en su propuesta; y

D) a los demás lineamientos que para tal efecto emita la contraloría.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, deberá cubrirse por parte de la S.D.U.O.P., a solicitud de "el Contratista " a más tardar dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que la S.D.U.O.P. resuelva por escrito sobre la procedencia de su petición aplicando al importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los últimos que se tengan autorizados, todos los factores de ajuste concedidos deberán acumularse, en caso de presentarse reducción en los costos de los insumos, se practicará una revisión, y de ser procedente, se efectuará el ajuste correspondiente.

VIGÉSIMA OCTAVA: CONDICIONES DE PRECIO:

Los trabajos de esta licitación, se regirán bajo la modalidad de Contrato de Obra Pública a base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado.

VIGÉSIMA NOVENA: DE LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS

Análisis detallados de precios unitarios.

Se deberán analizar los precios unitarios para cada uno de los conceptos de trabajo del catálogo de conceptos; en cada uno de estos análisis se anotará después de la suma del costo directo, el porcentaje y la cantidad total correspondiente a los costos indirectos, costo de financiamiento, la utilidad y cargos adicionales para obtener el precio unitario propuesto por el contratista en el catálogo de conceptos.

Cada uno de estos análisis estará firmado por el representante legal del contratista, de acuerdo a las escrituras constitutivas, o por su representante debidamente autorizado.

El contratista deberá presentar los siguientes análisis:

1. Análisis de los costos directos de materiales, mano de obra y equipo. En el desglose que se haga para presentar este documento, se deberán hacer las siguientes consideraciones:

   a) Mano de obra: Salarios. - Estos serán los que rijan 14 días antes de la fecha de la celebración del acto de apertura de proposiciones incluyendo todos los cargos necesarios para que éstos sean aplicables en el sitio de los trabajos.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

b) Materiales. - Deberán ser costos vigentes 14 días antes de la fecha de apertura de proposiciones incluyendo todos los cargos necesarios para que éstos sean puestos en el sitio de los trabajos. Por lo anterior, la S.D.U.O.P. no pagará ningún tipo de acarreo de Materiales al sitio de la obra, adicional, ya que este costo deberá ser incluido por el contratista en su análisis de Precio Unitario.

c) Equipo. - Deberán ser costos vigentes 14 días antes del acto de apertura de proposiciones incluyendo todos los cargos necesarios para que éstos sean puestos en el sitio de los trabajos. Por lo anterior, la S.D.U.O.P. no pagará ningún tipo de acarreo de Equipo al sitio de la obra, adicional, ya que este costo deberá ser incluido por el contratista en su análisis de Precio Unitario.

2. Análisis de los costos indirectos los cuales los cuales estarán representados como un porcentaje de los costos directos. Dichos costos se desglosarán en lo correspondiente a la administración de oficinas centrales, de la obra, seguros y fianzas.

3. Análisis del costo de financiamiento de los trabajos que estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; para la determinación de este costo deberán considerarse los gastos que realizará el contratista en la ejecución de los trabajos, los pagos por estimaciones que recibirá y la tasa de interés que aplicará debiendo adjuntarse el análisis correspondiente.

La tasa de interés aplicable por financiamiento deberá calcularse por el contratista, con base en un indicador económico específico, el cual no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato; esta tasa la deberá aplicar sin puntos de porcentajes adicionales.

4. El cargo por utilidad, será fijado por el contratista mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento.

5. Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamientos ni del cargo por utilidad.

TRIGÉSIMA: FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS:

Las partes convienen que los trabajos de la obra pública objeto del presente contrato, se paguen conforme a lo establecido en el catálogo de conceptos, mediante la formulación de estimaciones sujetas al avance de los trabajos con base en los términos de referencia, que abarcarán el período mensual, las que serán presentadas por **"El Contratista"** a la residencia de obra dentro de los seis (6) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las mismas, la que será el día último de cada periodo acordado, la residencia de obra dentro de los quince (15) días naturales siguientes, deberá revisar y, en su caso, autorizar las estimaciones, mismas que serán pagadas en las oficinas de la Dirección de Egresos del Municipio de Acapulco en: Av. Costera Miguel Alemán Col. Centro C.P. 39350 Acapulco

de Juárez Gro (Palacio Federal), dentro de un plazo no mayor de veinte (20) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas, para que la S.D.U.O.P. inicie su trámite de pago. Las diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación.

TRABAJOS ADICIONALES

Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la dependencia o entidad de que se trate, para que ésta resuelva lo conducente. El contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Cuando sea la dependencia o entidad la que requiera de la ejecución de los trabajos adicionales, éstos deberán ser autorizados y registrados en la Bitácora por el residente. A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberán aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el contrato.

La dependencia o entidad deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado. Por su parte, el contratista ampliará la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato en la misma proporción sobre el monto del convenio. Tratándose de fianza, el ajuste correspondiente se realizará conforme a lo dispuesto por la fracción II y el último párrafo del artículo 98 del Reglamento de la LOPSRM.

TRIGÉSIMA PRIMERA: DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL:

El licitante adjudicado, deberá presentar para la firma del contrato, copias certificadas del Acta Constitutiva de la empresa y sus modificaciones, así como del Testimonio del apoderado legal.
La proposición del licitante favorecido con el fallo, será incorporada como documentación anexa al contrato.

La S.D.U.O.P. hace del conocimiento de los licitantes que las proposiciones que resultaron desechadas en su revisión, serán devueltas a los interesados, transcurridos 60 (sesenta) días naturales, contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitación.

TRIGESIMA SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD

El contratista no podrá suministrar información alguna relativa al proyecto, en forma de publicidad o articulo técnico a menos que cuente con la autorización previa, expresa y por escrito de la S.D.U.O.P.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

TRIGÉSIMA TERCERA: IMPREVISTOS :

Lo que no previsto en la LICITACIÓN y en el ejercicio del contrato se sujetara a lo expresamente consignado en la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero Núm. 266 y disposiciones que de ella se deriven y en cualquier otra norma legal aplicable.

TRIGÉSIMA CUARTA: INCONFORMIDADES:

Las personas interesados podrán inconformarse por escrito ante El Órgano de Control Interno Municipal de Acapulco de Juárez, en los términos de lo dispuesto por el Artículo 94 de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero Numero 266 por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto de esta Ley, cuando dichos actos se relacionen con:

La convocatoria a la licitación y la junta de aclaraciones.

En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el interesado que haya manifestado su interés en participar en el procedimiento según lo establecido en el artículo 46 de la Ley, dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la última junta de aclaraciones;

El acto de presentación y apertura de proposiciones y el fallo.

En este caso, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien hubiere presentado proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la junta pública en que se dé a conocer el fallo, o de que se haya notificado al licitante en los casos en que no se celebre junta pública.

La cancelación de la licitación.

En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el licitante que hubiere presentado proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a su notificación.

Los actos y omisiones por parte de la S.D.U.O.P, que impidan la formalización del contrato en los términos establecidos en la convocatoria a la licitación o en la Ley.
En esta hipótesis, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien haya resultado adjudicado, dentro de los seis días hábiles siguientes a aquél en que se hubiere vencido el plazo para la formalización del contrato o, en su defecto, el plazo legal.

En todos los casos en que se trate de licitantes que hayan presentado proposición conjunta, la inconformidad sólo será procedente si se promueve conjuntamente por todos los integrantes de la misma.

Cualquier inconformidad será presentada, a elección del licitante, directamente en las oficinas del Órgano Interno de Control Municipal de Acapulco de Juárez.

CONFLICTO DE INTERESES

Ninguna de las condiciones contenidas en: Bases, anexos y en las propuestas, podrán ser negociadas, sin perjuicio de que la convocante pueda solicitar a los licitantes aclaraciones o información adicional.

TRIGÉSIMA QUINTA: LETRERO INFORMATIVO DE LA OBRA

El Contratista queda obligado a colocar una "BITÁCORA SOCIAL" de 1.50 (uno punto cincuenta) por 2 (dos) metros con la leyenda que oportunamente se le proporcione.

TRIGÉSIMA SEXTA: ANEXOS A LA CONVOCATORIA:

Con el objeto de que los licitantes preparen sus proposiciones, se anexa a esta convocatoria lo siguiente:

Son parte integrante e inseparable de estas Bases los siguientes anexos:

Anexo 1.- Catalogo de Conceptos.
Anexo 2.- Documentos para la presentación de la propuesta.
Anexo 3.- Planos.
Anexo 4.- Modelo de contrato.

Estas Bases y sus anexos, una vez firmados en forma autógrafa, y entregados, formarán parte de los documentos básicos de la Licitación.

ATENTAMENTE.

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. _____

000047

DOCUMENTOS ADICIONALES

DA-1 ORIGINAL DEL ESCRITO EN EL QUE SEÑALE DOMICILIO Y UNA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO, EN CASO DE CONTAR CON ELLA, PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y, EN SU CASO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, MISMO QUE SERVIRÁ PARA PRACTICAR LAS NOTIFICACIONES AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN TODOS SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE OTRO DISTINTO.

DA-2 ORIGINAL DEL ESCRITO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE QUIEN PRETENDA SOLICITAR ACLARACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA, EN EL QUE EXPRESE SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, POR SI O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, INDICANDO LOS DATOS Y REQUISITOS SIGUIENTES:

A. DEL LICITANTE: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES; NOMBRE Y DOMICILIO, ASÍ COMO, EN SU CASO, LOS DE SU APODERADO O REPRESENTANTE. TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES, ADEMÁS SE SEÑALARÁ LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, IDENTIFICANDO LOS DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS Y, DE HABERLAS, SUS REFORMAS Y MODIFICACIONES, CON LAS QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS MORALES, ASÍ COMO EL NOMBRE DE LOS SOCIOS, Y

B. DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE: DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN LAS QUE LE FUERON OTORGADAS LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN Y SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL.

DA-3 ORIGINAL DEL ESCRITO MEDIANTE EL CUAL DECLARE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 62 Y 89, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266; Y QUE POR SU CONDUCTO NO PARTICIPAN EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SE ENCUENTREN INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DELA FUNCIÓN PÚBLICA. TRATÁNDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN.

DA-4 ORIGINAL DEL ESCRITO MEDIANTE EL CUAL LOS LICITANTES O SUS REPRESENTANTES LEGALES DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTEN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA SIN QUE RESULTE NECESARIO ACREDITAR SU PERSONALIDAD JURÍDICA, MISMO QUE CONTENDRÁ LOS DATOS SIGUIENTES:

A. DEL LICITANTE: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES; NOMBRE Y DOMICILIO, ASÍ COMO, EN SU CASO, LOS DE SU APODERADO O REPRESENTANTE. TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES, ADEMÁS SE SEÑALARÁ LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, IDENTIFICANDO LOS DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS Y, DE HABERLAS, SUS REFORMAS Y MODIFICACIONES, CON LAS QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS MORALES, ASÍ COMO EL NOMBRE DE LOS SOCIOS; Y

B. DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE: DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN LAS QUE LE FUERON OTORGADAS LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN Y SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL.

DA-5 **ORIGINAL DEL ESCRITO QUE CONTENGA LA DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL LOS LICITANTES MANIFIESTEN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE POR SÍ MISMOS, O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES. TRATÁNDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN.**

DA-6 **EN SU CASO, CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES, CELEBRADO ENTRE DOS O MÁS INTERESADOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL PUNTO 4.11 DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, RATIFICADAS LAS FIRMAS ANTE NOTARIO, CORREDOR O FEDATARIO PÚBLICO.**

DA-7 **EN SU CASO, ESCRITO EN EL QUE LOS LICITANTES MANIFIESTEN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO, INCLUYEN SUPUESTOS, ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN VERÍDICOS Y SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR, ASÍ COMO QUE, EN SU CASO, CONSIDERAN COSTOS ESTIMADOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DEL MERCADO. TRATÁNDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN.**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 000049
No. _____

DA-1 ORIGINAL DEL ESCRITO EN EL QUE SEÑALE DOMICILIO Y UNA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO, EN CASO DE CONTAR CON ELLA, PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y, EN SU CASO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, MISMO QUE SERVIRÁ PARA PRACTICAR LAS NOTIFICACIONES AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN TODOS SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE OTRO DISTINTO.

(GUÍA DE LLENADO)

SE ANOTARÁ EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE LA MANIFESTACIÓN, CONFORME AL SIGUIENTE FORMATO.

LUGAR Y FECHA
(NOMBRE Y CARGO DE QUIÉN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)
P R E S E N T E

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona física, eliminando las siguientes)

_____ **(nombre de la persona física)**, por mi propio derecho, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal, número _____, de fecha __ de _____ de 202__, relativa a los trabajos consistentes en _____, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a dispuesto por el artículo 42, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios del Estado de Guerrero No. 266 y a lo solicitado en el documento adicional DA 1 de la convocatoria a la licitación, me permito señalar como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven del procedimiento de licitación pública, el ubicado en _____, y dirección de correo electrónico _____ **(en el caso de contar con ella)**, para todos los efectos legales a que haya lugar.

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona moral, eliminando la anterior y la siguiente)

Que en mi carácter de _____, de la empresa _____ **(denominación o razón social de la persona moral)**, lo que se acredita en los términos del testimonio de la escritura pública **(o póliza, según sea el caso)** número _____, de fecha _____, otorgada ante la fe del Licenciado _____, Notario Público **(Corredor o fedatario públicos, según se trate)** número _____, de la Ciudad de _____, inscrita en el Registro Público de _____, de la Ciudad de _____, en el folio número _____, con fecha __ de _____ de 202__, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal, número _____, de fecha __ de _____ de 202__, relativa a los trabajos consistentes en _____, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a dispuesto por el artículo 42, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios del Estado de Guerrero No. 266 y a lo solicitado en el documento adicional DA 1 de la convocatoria a la licitación, a nombre de mi representada, me permito señalar como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven del procedimiento de licitación, el ubicado en _____, y dirección de correo electrónico _____ **(en el caso de contar con ella)**, para todos los efectos legales a que haya lugar.

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una agrupación de personas físicas y/o morales, eliminando las anteriores)

Que en mi carácter de representante común del grupo de personas integrado por _____, _____ y _____ **(nombre, denominación o razón social de las personas físicas y/o morales)**, lo que se acredita en los términos del convenio privado protocolizado ante la fe del Licenciado _____, Notario Público número _____ **(Corredor o fedatario públicos, según se trate)**, de la Ciudad de _____, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal. Número _____, de fecha __ de _____ de 202__, relativa a los trabajos consistentes en _____, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a dispuesto por el artículo 42, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios del Estado de Guerrero No. 266 y a lo solicitado en el documento adicional DA 1 de la convocatoria a la licitación, a nombre de mis representadas, me permito señalar como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. _____

000050

DA-1 ORIGINAL DEL ESCRITO EN EL QUE SEÑALE DOMICILIO Y UNA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO, EN CASO DE CONTAR CON ELLA, PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y, EN SU CASO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, MISMO QUE SERVIRÁ PARA PRACTICAR LAS NOTIFICACIONES AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN TODOS SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE OTRO DISTINTO.

(GUÍA DE LLENADO)

que deriven del procedimiento de licitación, el ubicado en _____, y dirección de correo electrónico _____ **(en el caso de contar con ella)**, para todos los efectos legales a que haya lugar.

ATENTAMENTE

(NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Y/O DE SU REPRESENTANTE LEGAL)

000051

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. _____

DA 2 ORIGINAL DEL ESCRITO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE QUIEN PRETENDA SOLICITAR ACLARACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA, EN EL QUE EXPRESE SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, POR SI O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, INDICANDO LOS DATOS Y REQUISITOS SIGUIENTES:

A. DEL LICITANTE: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES; NOMBRE Y DOMICILIO, ASÍ COMO, EN SU CASO, LOS DE SU APODERADO O REPRESENTANTE. TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES, ADEMÁS SE SEÑALARÁ LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, IDENTIFICANDO LOS DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS Y, DE HABERLAS, SUS REFORMAS Y MODIFICACIONES, CON LAS QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS MORALES, ASÍ COMO EL NOMBRE DE LOS SOCIOS, Y

B. DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE: DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN LAS QUE LE FUERON OTORGADAS LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN Y SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL.

TRATÁNDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN.

(GUÍA DE LLENADO)

SE ANOTARÁ EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE LA MANIFESTACIÓN, CONFORME AL SIGUIENTE FORMATO.

LUGAR Y FECHA
(NOMBRE Y CARGO DE QUIÉN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)
P R E S E N T E

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona física, eliminando la siguiente)

(nombre de la persona física), por mi propio derecho, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal. Número _____, de fecha __ de _____ de 202__, relativa a los trabajos consistentes en _____, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 44, fracción XX de la Ley de Obras Públicas y Servicios Estado de Guerrero No. 266 y en el documento adicional DA 2 de la convocatoria a la licitación, habiéndome enterado del contenido de la convocatoria a la licitación, declaro como mis datos los siguientes

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:

Asimismo, habiéndome enterado del contenido de la convocatoria a la licitación, sus anexos, modelos de contrato y de garantías a otorgarse, así como de los requisitos establecidos, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, mi interés para participar en la licitación cuyos datos han quedado anotados anteriormente.

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona moral, eliminando la anterior)

Que en mi carácter de _____, de la empresa _____**(denominación o razón social de la persona moral)**, lo que se acredita en los términos del testimonio de la escritura pública **(o póliza, según sea el caso)** número _____, de fecha _____, otorgada ante la fe del Licenciado _____, Notario Público **(Corredor o fedatario públicos, según se trate)** número _____, de la Ciudad de _____, inscrita en el Registro Público de _____, de la Ciudad de _____, en el folio número _____, con fecha __ de _____ de 202__, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal. número_____, de fecha __ de _____ de 202__, relativa a los trabajos consistentes en _____, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 44, fracción XX de la Ley de Obras Públicas y Servicios Estado de Guerrero No. 266 y en el documento adicional DA 2 de la convocatoria a la licitación, habiéndome enterado del contenido de la convocatoria a la licitación, declaro como mis datos los siguientes:

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA PERSONA MORAL:

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS:

NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DEL NOTARIO, CORREDOR O FEDATARIO PÚBLICO ANTE QUIEN SE OTORGÓ EL ACTA CONSTITUTIVA Y, EN SU CASO, LAS MODIFICACIONES:

NÚMERO, FECHA Y DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DEL ACTA CONSTITUTIVA:

NÚMERO, FECHA Y DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE LAS REFORMAS O MODIFICACIONES AL ACTA CONSTITUTIVA:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DEL NOTARIO, CORREDOR O FEDATARIO PÚBLICO ANTE QUIEN SE OTORGÓ EL INSTRUMENTO DEL QUE SE DESPRENDAN SUS FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN:

Asimismo, habiéndose enterado mi representada por conducto de su representante legal, del contenido de la convocatoria a la licitación, sus anexos, modelos de contrato y de garantías a otorgarse, así como de los requisitos establecidos, manifiesto en su nombre, bajo protesta de decir verdad, su interés para participar en la licitación cuyos datos han quedado anotados anteriormente.

ATENTAMENTE

(NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Y/O DE SU REPRESENTANTE LEGAL)

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. _____

DA-3 ORIGINAL DEL ESCRITO MEDIANTE EL CUAL DECLARE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 62 Y 89, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NO. 266; Y QUE POR SU CONDUCTO NO PARTICIPAN EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SE ENCUENTREN INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DELA FUNCIÓN PÚBLICA. TRATÁNDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN

(GUÍA DE LLENADO)

SE ANOTARÁ EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE LA MANIFESTACIÓN, CONFORME AL SIGUIENTE FORMATO.

LUGAR Y FECHA:
(NOMBRE Y CARGO DE QUIÉN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)
P R E S E N T E

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona física, eliminando la siguiente)

_____ **(nombre de la persona física)**, por mi propio derecho, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal. Número _____, de fecha __ de _____ de 202__, relativa a los trabajos consistentes en _____, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 44, fracción XX de la Ley de Obras Públicas y Servicios Estado de Guerrero No. 266, y a lo solicitado en el documento adicional DA 3 de la convocatoria a la licitación, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no me encuentro en alguno de los supuestos que establecen los artículos 62 y 89, penúltimo párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios del Estado de Guerrero No. 266 y que por mi conducto no participan en este procedimiento de licitación personas fisicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública.

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona moral, eliminando la anterior)

Que en mi carácter de _____, de la empresa _____ **(denominación o razón social de la persona moral)**, lo que se acredita en los términos del testimonio de la escritura pública **(o póliza, según sea el caso)** número _____, de fecha _____, otorgada ante la fe del Licenciado _____, Notario Público **(Corredor o fedatario públicos, según se trate)** número _____, de la Ciudad de _____, inscrita en el Registro Público de _____, de la Ciudad de _____, en el folio número _____, con fecha __ de _____ de 202__, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal, número _____, de fecha __ de _____ de 202__, relativa a los trabajos consistentes en _____, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 44, fracción XX de la Ley de Obras Públicas y Servicios Estado de Guerrero No. 266, y a lo solicitado en el documento adicional DA 3 de la convocatoria a la licitación, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no me encuentro en alguno de los supuestos que establecen los artículos 62 y 89, penúltimo párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios del Estado de Guerrero No. 266 y que por mi conducto no participan en este procedimiento de licitación personas fisicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública.

ATENTAMENTE

(NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Y/O DE SU REPRESENTANTE LEGAL)

000054

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. _____

DA-4 **ORIGINAL DEL ESCRITO MEDIANTE EL CUAL LOS LICITANTES O SUS REPRESENTANTES LEGALES DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTEN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA, SIN QUE RESULTE NECESARIO ACREDITAR SU PERSONALIDAD JURÍDICA, MISMO QUE CONTENDRÁ LOS DATOS Y REQUISITOS SIGUIENTES:**

A. **DEL LICITANTE: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES; NOMBRE Y DOMICILIO, ASÍ COMO, EN SU CASO, LOS DE SU APODERADO O REPRESENTANTE. TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES, ADEMÁS SE SEÑALARÁ LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, IDENTIFICANDO LOS DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS Y, DE HABERLAS, SUS REFORMAS Y MODIFICACIONES, CON LAS QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS MORALES, ASÍ COMO EL NOMBRE DE LOS SOCIOS; Y**

B. **DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE: DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN LAS QUE LE FUERON OTORGADAS LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN Y SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL.**

TRATÁNDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN.

(GUÍA DE LLENADO)

SE ANOTARÁ EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE LA MANIFESTACIÓN, CONFORME AL SIGUIENTE FORMATO.

LUGAR Y FECHA:
(NOMBRE Y CARGO DE QUIÉN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)
P R E S E N T E

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona física, eliminando la siguiente)

_____ **(nombre de la persona física)**, por mi propio derecho, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal. Número _____, de fecha __ de _____ de 202__, relativa a los trabajos consistentes en _____, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 42, fracción XII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios del Estado de Guerrero No. 266, y a lo solicitado en el documento adicional DA 4 de la convocatoria a la licitación, declaro como mis datos los siguientes

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que cuento con las facultades suficientes para comprometerme por sí mismo en los diversos actos de la licitación cuyos datos han quedado anotados anteriormente.

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona moral, eliminando la anterior)

Que en mi carácter de _____, de la empresa _____**(denominación o razón social de la persona moral)**, lo que se acredita en los términos del testimonio de la escritura pública **(o póliza, según sea el caso)** número _____, de fecha _____, otorgada ante la fe del Licenciado _____, Notario Público **(Corredor o fedatario públicos, según se trate)** número _____, de la Ciudad de _____, inscrita en el Registro Público de _____, de la Ciudad de _____, en el folio número _____, con fecha __ de _____ de 202__, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal. Número _____, de fecha __ de _____ de 202__, relativa a los trabajos consistentes en _____, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 42, fracción XII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios del Estado de Guerrero No. 266, y a lo solicitado en el documento adicional DA 6 de la convocatoria a la licitación, declaro como mis datos los siguientes

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA PERSONA MORAL:

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS:

NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DEL NOTARIO, CORREDOR O FEDATARIO PÚBLICO ANTE QUIEN SE OTORGÓ EL ACTA CONSTITUTIVA Y, EN SU CASO, LAS MODIFICACIONES:

NÚMERO, FECHA Y DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DEL ACTA CONSTITUTIVA:

NÚMERO, FECHA Y DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE LAS REFORMAS O MODIFICACIONES AL ACTA CONSTITUTIVA:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DEL NOTARIO, CORREDOR O FEDATARIO PÚBLICO ANTE QUIEN SE OTORGÓ EL INSTRUMENTO DEL QUE SE DESPRENDAN SUS FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN:

Asimismo, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que cuento con las facultades suficientes para comprometer a mi representada en los diversos actos de la licitación cuyos datos han quedado anotados anteriormente.

ATENTAMENTE

(NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Y/O DE SU REPRESENTANTE LEGAL)

000056

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. _____

DA-5 **ORIGINAL DEL ESCRITO QUE CONTENGA LA DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL LOS LICITANTES MANIFIESTEN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE POR SÍ MISMOS, O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES. TRATÁNDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN.**

(GUÍA DE LLENADO)

SE ANOTARÁ EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE LA MANIFESTACIÓN, CONFORME AL SIGUIENTE FORMATO.

LUGAR Y FECHA:
(NOMBRE Y CARGO DE QUIÉN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)
P R E S E N T E

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona física, eliminando la siguiente)

_____ **(nombre de la persona física)**, por mi propio derecho, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal. Número _____, de fecha __ de _____ de 202__, relativa a los trabajos consistentes en _____, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 42, fracción XII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios del Estado de Guerrero No. 266, y a lo solicitado en el documento adicional DA 5 de la convocatoria a la licitación, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación u otros aspectos que me otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona moral, eliminando la anterior)

Que en mi carácter de _____, de la empresa _____ **(denominación o razón social de la persona moral)**, lo que se acredita en los términos del testimonio de la escritura pública **(o póliza, según sea el caso)** número _____, de fecha _____, otorgada ante la fe del Licenciado _____, Notario Público **(Corredor o fedatario públicos, según se trate)** número _____, de la Ciudad de _____, inscrita en el Registro Público de _____, de la Ciudad de _____, bajo el folio número _____, con fecha __ de _____ de 202__, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal. Número _____, de fecha __ de _____ de 202__, relativa a los trabajos consistentes en _____, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 42, fracción XII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios del Estado de Guerrero No. 266, y a lo solicitado en el documento adicional DA 5 de la convocatoria a la licitación, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación u otros aspectos que me otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE

(NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Y/O DE SU REPRESENTANTE LEGAL)

000057

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No._____

DA-6 EN SU CASO, CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES, CELEBRADO ENTRE DOS O MÁS INTERESADOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL PUNTO 4.11 DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, RATIFICADAS LAS FIRMAS ANTE NOTARIO, CORREDOR O FEDATARIO PÚBLICO.

(GUÍA DE LLENADO)

LOS LICITANTES QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN PARA ESTA LICITACIÓN, DEBERÁN ANEXAR EL CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN, PROTOCOLIZADO ANTE NOTARIO, CORREDOR O FEDATARIO PUBLICO, EL CUAL DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 47, FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

El convenio privado celebrado por la agrupación de personas deberá contener lo siguiente:

a. Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

b. Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

c. Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación;

d. Descripción precisa y detallada (no en porcentajes) de la parte de la obra pública que cada persona se obligará a cumplir, así como la forma en que se garantizará y exigirá el cumplimiento de las obligaciones y la forma en que serán presentadas a cobro las estimaciones de los trabajos ejecutados, a satisfacción de la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS;

e. Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la proposición; y

f. Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta, solidaria y mancomunadamente con los demás integrantes, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo.

000058

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. _____

DA-7 EN SU CASO, ESCRITO EN EL QUE LOS LICITANTES MANIFIESTEN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO, INCLUYEN SUPUESTOS, ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN VERÍDICOS Y SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR, ASÍ COMO QUE, EN SU CASO, CONSIDERAN COSTOS ESTIMADOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DEL MERCADO. TRATÁNDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN.

(GUÍA DE LLENADO)

SE ANOTARÁ EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE LA MANIFESTACIÓN, CONFORME AL SIGUIENTE FORMATO.

LUGAR Y FECHA:
(NOMBRE Y CARGO DE QUIÉN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)
P R E S E N T E

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona física, eliminando la siguiente)

_____ **(nombre de la persona física)**, por mi propio derecho, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal. Número _____, de fecha __ de _____ de 20__, relativa a los trabajos consistentes en _____, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 42, fracción XII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios del Estado de Guerrero No. 266 y a lo solicitado en el documento adicional DA 7 de la convocatoria a la licitación, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, **(dejar la siguiente redacción en el caso de que haya realizado estudios planes o programes, en caso contrario eliminarla y dejar la siguiente)**que los estudios, planes o programas que previamente he realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado. **(Dejar la siguiente redacción en el caso de que no haya realizado estudios planes o programes, en caso contrario eliminarla y dejar la anterior)** que no he realizado estudios, planes o programas relacionados con la obra a ejecutar.

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona moral, eliminando la anterior)

Que en mi carácter de _____, de la empresa _____ **(denominación o razón social de la persona moral)**, lo que se acredita en los términos del testimonio de la escritura pública **(o póliza, según sea el caso)** número _____, de fecha _____, otorgada ante la fe del Licenciado _____, Notario Público **(Corredor o fedatario públicos, según se trate)** número _____, de la Ciudad de _____, inscrita en el Registro Público de _____, de la Ciudad de _____, en el folio número _____, con fecha __ de _____ de 202__, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal. Número _____, de fecha __ de _____ de 202__, relativa a los trabajos consistentes en _____, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 42, fracción XII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios del Estado de Guerrero No. 266 y a lo solicitado en el documento adicional DA 7 de la convocatoria a la licitación, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, **(dejar la siguiente redacción en el caso de que haya realizado estudios planes o programes, en caso contrario eliminarla y dejar la siguiente)**que los estudios, planes o programas que previamente he realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado. **(Dejar la siguiente redacción en el caso de que no haya realizado estudios planes o programes, en caso contrario eliminarla y dejar la anterior)** que no he realizado estudios, planes o programas relacionados con la obra a ejecutar.

ATENTAMENTE

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. _____

DA-7 EN SU CASO, ESCRITO EN EL QUE LOS LICITANTES MANIFIESTEN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO, INCLUYEN SUPUESTOS, ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN VERÍDICOS Y SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR, ASÍ COMO QUE, EN SU CASO, CONSIDERAN COSTOS ESTIMADOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DEL MERCADO. TRATÁNDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN.

(GUÍA DE LLENADO)

(NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Y/O DE SU REPRESENTANTE LEGAL)

000060

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL
No. _____

ANEXOS TÉCNICOS

AT-1 MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO O SITIOS DE REALIZACIÓN DE LA OBRA Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES; DE HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. LES HUBIERE PROPORCIONADO, ASÍ COMO DE HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DELA PROPOSICIÓN, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE, EN SU CASO, LE PROPORCIONE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. Y EL PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE. TRATÁNDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN.

AT-2 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. QUE EL LICITANTE PROPONE LLEVAR A CABO, TOMANDO COMO BASE TODOS LOS CONCEPTOS DEL CATALOGO, Y EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DESCRIBIENDO LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA Y DE MAQUINARIA Y EQUIPO A UTILIZAR.

AT-3 ESCRITO DE PROPOSICIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, ANEXANDO EL CURRÍCULO, CEDULA PROFESIONAL Y CONTRATO DE TRABAJO DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA, LOS QUE DEBERÁN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES, MISMOS QUE DEBERÁN ESTAR FIRMADOS POR LOS PROFESIONALES, SE CONSIDERARÁ COMO MANO DE OBRA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESPECIALISTAS, TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS NACIONALES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA DE NATURALEZA SIMILAR QUE SE REQUIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADA POR PERSONAS DE NACIONALIDAD MEXICANA.

AT-4 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS DE LA MISMA COMPLEJIDAD, MAGNITUD Y CARACTERÍSTICAS QUE LOS QUE SE ESTÁN CONVOCANDO MÍNIMA DE UN AÑO EFECTIVO ANEXAR COPIA DE CONTRATOS, ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN Y ALTA EN EL IMSS DE CADA OBRA, CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN EL CASO.

AT-5 MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LA OBRA QUE SUBCONTRATARÁ, EN CASO DE HABERSE PREVISTO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL, NÚMERO, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. DEBERÁ SOLICITAR LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN. TRATÁNDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN.

AT-6 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, LOS CUALES DEBERÁN INTEGRARSE POR COPIA SIMPLE DE LA DECLARACIÓN FISCAL DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS, DECLARACIONES PARCIALES DEL PERIODO ACTUAL Y BALANCE GENERAL CON ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS ANTERIORES Y EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS, SALVO EN EL CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN,

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL
No. _____

LAS CUALES DEBERÁN PRESENTAR LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

AT-7 **RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.**

AT-8 **MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS, CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, EN MATERIA DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL. TRATÁNDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN.**

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No.

ANEXO AT-1 **MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO O SITIOS DE REALIZACIÓN DE LA OBRA Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES; DE HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, LES HUBIERE PROPORCIONADO, ASÍ COMO DE HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DELA PROPOSICIÓN, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE, EN SU CASO, LE PROPORCIONE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. TRATÁNDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN.**

(GUÍA DE LLENADO)

SE ANOTARÁ EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE LA MANIFESTACIÓN, CONFORME AL SIGUIENTE MODELO.

LUGAR Y FECHA:
(NOMBRE Y CARGO DE QUIÉN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA ALA LICITACIÓN)
P R E S E N T E

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona física, eliminando la siguiente)

_____ **(nombre de la persona física)**, por mi propio derecho, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal, número _____, de fecha __ de _____ de 202__, relativa a los trabajos consistentes en _____, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 44, fracción XX de la Ley de Obras Públicas y Servicios Estado de Guerrero No. 266 y a lo solicitado en el anexo AT-1 de la convocatoria a la licitación, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, conocer el sitio o sitios de realización de la obra y sus condiciones ambientales; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, proporcione la propia LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.

(Dejar el siguiente párrafo si hubiere aclaraciones y/o modificaciones, mencionando el medio por el cual se hizo de su conocimiento)

Finalmente, también manifiesto el haber considerado en la integración de la proposición, las aclaraciones y/o modificaciones a la convocatoria a la licitación que mediante **(junta de aclaraciones, según corresponda)** se hicieron de mi conocimiento.

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona moral, eliminando la anterior)

Que en mi carácter de _____, de la empresa _____ **(denominación o razón social de la persona moral)**, lo que se acredita en los términos del testimonio de la escritura pública **(o póliza, según sea el caso)** número _____, de fecha _____, otorgada ante la fe del Licenciado _____, Notario Público **(Corredor o fedatario públicos, según se trate)** número _____, de la Ciudad de _____, inscrita en el Registro Público de _____, de la Ciudad de _____, en el folio número _____, con fecha __ de _____ de 202__, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal, número _____, de fecha __ de _____ de 202__, relativa a los trabajos consistentes en _____, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 44, fracción XX de la Ley de Obras Públicas y Servicios Estado de Guerrero No. 266 y a lo solicitado en el anexo AT-1 de la convocatoria a la licitación, a nombre de mi representada, manifiesto bajo protesta de decir verdad, conocer el sitio o sitios de realización de la obra y sus condiciones ambientales; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, proporcione la propia LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.

(Dejar el siguiente párrafo si hubiere aclaraciones y/o modificaciones, mencionando el medio por el cual se hizo de su conocimiento)

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No.

ANEXO AT-1 **MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO O SITIOS DE REALIZACIÓN DE LA OBRA Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES; DE HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, LES HUBIERE PROPORCIONADO, ASÍ COMO DE HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DELA PROPOSICIÓN, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE, EN SU CASO, LE PROPORCIONE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. TRATÁNDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN.**

(GUÍA DE LLENADO)

Finalmente, también manifiesto a nombre de mi representada, el haber considerado en la integración de la proposición, las aclaraciones y/o modificaciones a la convocatoria a la licitación que mediante **(junta de aclaraciones, según corresponda)** se hicieron del conocimiento de mi representada.

ATENTAMENTE

(NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Y/O DE SU REPRESENTANTE LEGAL)

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL
No. _____

ANEXO AT-2 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. QUE EL LICITANTE PROPONE LLEVAR A CABO, TOMANDO COMO BASE TODOS LOS CONCEPTOS DEL CATALOGO, Y EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DESCRIBIENDO LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA Y DE MAQUINARIA Y EQUIPO A UTILIZAR.

(GUÍA DE LLENADO)

EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE DEBERÁ ELABORAR EL **ANEXO AT-2**, DESCRIBIENDO LA PLANEACIÓN INTEGRAL INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TÉCNICAS QUE PROCEDAN CONFORME A LOS PROYECTOS Y QUE ESTABLEZCA LA COMISIÓN.

NOTA IMPORTANTE: EN LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO, EL LICITANTE DEBERÁ ANOTAR EN CADA HOJA QUE LO INTEGRE, LOS DATOS QUE SE CITAN A CONTINUACIÓN:

A). - ESCRITO:

ÁREA CONVOCANTE:	EL ESCRITO SE DEBERÁ DIRIGIR A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.
LICITACIÓN No.:	SE ANOTARÁ EL NUMERO QUE CORRESPONDA.
FECHA:	SE ANOTARÁ LA FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.

EL LICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL DEBERÁ FIRMAR EN TODAS LAS HOJAS QUE INTEGREN EL ANEXO AT-2.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. _____

ANEXO AT-3 ESCRITO DE PROPOSICIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, ANEXANDO EL CURRÍCULO, CEDULA PROFESIONAL Y CONTRATO DE TRABAJO DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA, LOS QUE DEBERÁN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES, MISMOS QUE DEBERÁN ESTAR FIRMADOS POR LOS PROFESIONALES, SE CONSIDERARÁ COMO MANO DE OBRA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESPECIALISTAS, TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS NACIONALES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA DE NATURALEZA SIMILAR QUE SE REQUIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADA POR PERSONAS DE NACIONALIDAD MEXICANA.

(GUÍA DE LLENADO)

EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE, SE DEBERÁ ELABORAR UN ESCRITO PROPONIENDO LOS PROFESIONALES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, IDENTIFICANDO A LOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACIÓN), QUIENES DEBEN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES.

A ESTE DOCUMENTO SE DEBERÁ ADJUNTAR EL CURRÍCULO DE CADA PROFESIONAL QUE SE ENCARGARÁ DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. _____

ANEXO AT-4 **DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS DE LA MISMA COMPLEJIDAD, MAGNITUD Y CARACTERÍSTICAS QUE LOS QUE SE ESTÁN CONVOCANDO MÍNIMA DE UN AÑO EFECTIVO ANEXAR COPIA DE CONTRATOS, ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN Y ALTA EN EL IMSS DE CADA OBRA, CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN EL CASO.**

(GUÍA DE LLENADO)

PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL LICITANTE Y SU PERSONAL, SE DEBERÁN ENLISTAR LOS TRABAJOS SIMILARES REALIZADOS Y AQUELLOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN EL CASO.

A). - ENCABEZADO:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.
ÁREA CONVOCANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE LA LICITACIÓN Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL.
LICITACIÓN No.:	SE ANOTARÁ EL NUMERO QUE CORRESPONDA.
FIRMA DEL LICITANTE:	EN ESTE ESPACIO DEBERÁ FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
FECHA:	SE ANOTARÁ LA FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO..

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. _____

ANEXO AT-4 **DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS DE LA MISMA COMPLEJIDAD, MAGNITUD Y CARACTERÍSTICAS QUE LOS QUE SE ESTÁN CONVOCANDO MÍNIMA DE UN AÑO EFECTIVO ANEXAR COPIA DE CONTRATOS, ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN Y ALTA EN EL IMSS DE CADA OBRA, CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN EL CASO.**

(GUÍA DE LLENADO)

HOJA No.:	SE ANOTARÁ EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

B). - COLUMNAS:

CONTRATANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE DEL CONTRATANTE, INDICANDO TAMBIÉN, SU DIRECCIÓN Y TELÉFONO.
OBJETO DE LOS TRABAJOS:	ANOTAR EL OBJETO DE LOS CONTRATOS EJECUTADOS, QUE SEAN SIMILARES A LOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.
No. DE CONTRATO:	SE ANOTARÁ EL NÚMERO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE.
LUGAR:	EL LUGAR DONDE LOS TRABAJOS SE EJECUTARON O SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.
IMPORTES EN PESO MEXICANO:	ANOTAR CON NÚMERO, EL IMPORTE TOTAL CONTRATADO, EL EJERCIDO Y/O POR EJERCER, EXPRESADOS EN PESOS MEXICANOS.
FECHA DE INICIO Y TERMINO:	SE ANOTARÁN CON NUMERO, LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINO, INDICANDO EL DÍA, MES Y AÑO.
AUSENCIA DE ANTECEDENTES DE AFECTACIÓN DE FIANZAS:	SE ANOTARÁ SI TUVO O NO ANTECEDENTES DE AFECTACIÓN DE FIANZAS DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN N°:	ANEXO TÉCNICO AT-4
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	FIRMA DEL LICITANTE:	FECHA:	HOJA: DE:

IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL.

CONTRATANTE	OBJETO DE LOS TRABAJOS	NÚMERO DE CONTRATO	LUGAR	IMPORTES EN PESOS DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS			FECHA		ANTECEDENTES DE AFECTACIÓN DE FIANZAS	
				TOTAL	EJERCIDO	POR EJERCER	INICIO	TÉRMINO	SI	NO

000069

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. _____

ANEXO AT-5 **MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LA OBRA QUE SUBCONTRATARÁ, EN CASO DE HABERSE PREVISTO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL, NÚMERO, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ DEBERÁ SOLICITAR LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN. TRATÁNDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN.**

(GUÍA DE LLENADO)

SE ANOTARÁ EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE LA MANIFESTACIÓN, CONFORME AL SIGUIENTE FORMATO.

LUGAR Y FECHA:
(NOMBRE Y CARGO DE QUIÉN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)
P R E S E N T E

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona física, eliminando la siguiente)

_____ **(nombre de la persona física)**, por mi propio derecho, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal, número _____, de fecha ___ de _____ de 202__, relativa a los trabajos consistentes en _____, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 44, fracción XX de la Ley de Obras Públicas y Servicios Estado de Guerrero No. 266, y a lo solicitado en el anexo AT-5 de la convocatoria a la licitación, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la parte de los trabajos que se subcontratarán serán los siguientes:

A). - _____;

B). - _____;

C). - _____; y

D). - _____.

La subcontratación de la parte de los trabajos antes mencionados serán encomendados a las empresas _____ y _____, mismas que cuentan con la con la experiencia y capacidad técnica y económica para ejecutarlos, anexando la documentación que lo acredita y, asimismo el suscrito será el único responsable de las obligaciones que adquieran las subcontratistas en la parte de los trabajos subcontratados y no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 83, segundo párrafo, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona moral, eliminando la anterior y la siguiente)

Que en mi carácter de _____, de la empresa _____ **(denominación o razón social de la persona moral)**, lo que se acredita en los términos del testimonio de la escritura pública **(o póliza, según sea el caso)** número _____, de fecha _____, otorgada ante la fe del Licenciado _____, Notario Público **(Corredor o fedatario públicos, según se trate)** número _____, de la Ciudad de _____, inscrita en el Registro Público de _____, de la Ciudad de _____, en el folio número _____, con fecha __ de _____ de 202__, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal, número _____, de fecha __ de _____ de 202__, relativa a los trabajos consistentes en _____, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 44, fracción XX de la Ley de Obras Públicas y Servicios Estado de Guerrero No. 266, y a lo solicitado en el anexo AT 5 de la convocatoria a la licitación, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la parte de los trabajos que se subcontratarán serán los siguientes:

A). - _____;

B). - _____;

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. _____

ANEXO AT-5 **MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LA OBRA QUE SUBCONTRATARÁ, EN CASO DE HABERSE PREVISTO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL, NÚMERO, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ DEBERÁ SOLICITAR LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN. TRATÁNDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN.**

(GUÍA DE LLENADO)

C). - _____; y

D). - _____.

La subcontratación de la parte de los trabajos antes mencionados serán encomendados a las empresas _____ y _____. mismas que cuentan con la con la experiencia y capacidad técnica y económica para ejecutarlos, anexando la documentación que lo acredita y, asimismo mi representada será la única responsable de las obligaciones que adquieran las subcontratistas en la parte de los trabajos subcontratados y no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 83, segundo párrafo, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

ATENTAMENTE

(NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Y/O DE SU REPRESENTANTE LEGAL)

ELABORAR ESTE ESCRITO SI EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN SE INDICA QUE SE PERMITIRÁ LA SUBCONTRATACIÓN, ANEXANDO TAMBIÉN, LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN **Y SI ES EL CASO DE QUE ESTA NO SE PERMITA, DEBERÁ PRESENTAR EL DOCUMENTO CON LA LEYENDA "NO APLICA"**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

000072

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. _____

ANEXO AT-6 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, LOS CUALES DEBERÁN INTEGRARSE POR COPIA SIMPLE DE LA DECLARACIÓN FISCAL DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS, DECLARACIONES PARCIALES DEL 2017 Y BALANCE GENERAL CON ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS ANTERIORES Y EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS, SALVO EN EL CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN PRESENTAR LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

(GUÍA DE LLENADO)

PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD FINANCIERA ES REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR POR PARTE DEL LICITANTE, EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS Y ANÁLISIS FINANCIERO.

EL LICITANTE DEBERÁ INTEGRAR EN ESTE DOCUMENTO COPIA DE SU DECLARACIÓN FISCAL, (DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES O FÍSICAS, DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEBIDAMENTE PRESENTADA AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA) DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR Y DEBERÁ ADJUNTAR EL BALANCE GENERAL DEBIDAMENTE DICTAMINADO, POR UN CONTADOR PÚBLICO, CONFORME A LAS NORMAS DE SU PROFESIÓN, DE LOS DOS AÑOS ANTERIORES, Y EL COMPARATIVO DE LAS RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS (PRUEBA DEL ACIDO, PRUEBA DE LA SOLVENCIA Y PRUEBA DE RENTABILIDAD), SALVO EN EL CASO DE EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN PRESENTAR LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.

DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS, MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS VERIFICARÁ, ENTRE OTROS:

A).- QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE CUBRA EL FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN LOS DOS PRIMEROS MESES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES Y PLAZOS CONSIDERADOS EN SU ANÁLISIS FINANCIERO PRESENTADO;

B).-. QUE EL LICITANTE TENGA CAPACIDAD PARA PAGAR SUS OBLIGACIONES, Y

C).-. EL GRADO EN QUE EL LICITANTE DEPENDE DEL ENDEUDAMIENTO Y LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. _____

ANEXO AT-7 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

(GUÍA DE LLENADO)

SE ANOTARÁ LA RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARE GANADOR.

A). - ENCABEZADO:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL, A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.
ÁREA CONVOCANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL.
LICITACIÓN No.:	SE ANOTARÁ EL NUMERO QUE CORRESPONDA.
FIRMA DEL LICITANTE:	EN ESTE ESPACIO DEBERÁ FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
FECHA:	SE ANOTARÁ LA FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO..

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. _____

ANEXO AT-7 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

(GUÍA DE LLENADO)

HOJA No.:	SE ANOTARÁ EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

B). - COLUMNAS:

EQUIPO No.:	SE ANOTARÁ EL NÚMERO PROGRESIVO DEL LISTADO DE LOS EQUIPOS.
NOMBRE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE GENÉRICO DE LA MAQUINARIA O EQUIPO PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (EJEMPLO: TRACTOR, RETROEXCAVADORA, ETC.)
MARCA:	SE ANOTARÁ LA MARCA CORRESPONDIENTE YA SEA COMPLETA O CON LAS ABREVIATURAS CONOCIDAS EN EL RAMO.
MODELO:	SE ANOTARÁ EL MODELO CORRESPONDIENTE.
AÑO:	ANOTAR EL AÑO EN QUE INICIÓ SU FUNCIONAMIENTO.
NUMERO DE SERIE:	SE ANOTARÁ EL NÚMERO DE SERIE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO.
CAPACIDAD:	SE ANOTARÁ LA CAPACIDAD NOMINAL DE LA MAQUINARIA O EQUIPO.
COMBUSTIBLE:	SE INDICARÁ EL TIPO DE COMBUSTIBLE QUE UTILICE LA MAQUINARIA O EQUIPO.
POTENCIA:	SE ANOTARÁ LA POTENCIA NOMINAL DE LA MAQUINARIA O EQUIPO.
UBICACIÓN FÍSICA: (ENT. FED.):	EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD Y ENTIDAD FEDERATIVA EN DONDE SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE LA MAQUINARIA O EL EQUIPO PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. _____

ANEXO AT-7 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

(GUÍA DE LLENADO)

DISPONIBILIDAD:	SE MARCARÁ CON UNA X EN LA COLUMNA QUE CORRESPONDA, SI EL EQUIPO ES PROPIO O RENTADO Y TAMBIÉN SE MARCARÁ CON UNA X, SI ES RENTADO CON OPCIÓN DE COMPRA.
FECHA:	SE INDICARÁ LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE LA MAQUINARIA O EQUIPO, EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN No:		ANEXO TÉCNICO AT-7
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	FIRMA DEL LICITANTE:	FECHA:	HOJA: DE:

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

EQUIPO No. *	NOMBRE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO	MARCA	CARACTERÍSTICAS PARTICULARES						UBICACIÓN FÍSICA (ENTIDAD FEDERATIVA)	DISPONIBILIDAD			
			MODELO	AÑO	NUMERO DE SERIE	CAPACIDAD	COMBUSTIBLE	POTENCIA		PROPIO	RENTADO	OPCIÓN DE COMPRA	FECHA

NOTA IMPORTANTE: TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN RENTADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARÁ GANADOR.

***CON ESTOS NÚMEROS SE IDENTIFICARÁ LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN, EXCEPTO EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EN LOS CUALES SE DEBERÁ ASENTAR EL NOMBRE Y MODELO DE ESTAS.**

000076

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. _____

ANEXO AT-8 **MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS, CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, EN MATERIA DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL. TRATÁNDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN.**

SE ANOTARÁ EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE LA MANIFESTACIÓN, CONFORME AL SIGUIENTE MODELO.

LUGAR Y FECHA:
(NOMBRE Y CARGO DE QUIÉN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)
P R E S E N T E

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona física, eliminando la siguiente)

_____ **(nombre de la persona física)**, por mi propio derecho, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal, número _____, de fecha __ de _____ de 202__, relativa a los trabajos consistentes en _____, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:
:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 44, fracción XX de la Ley de Obras Públicas y Servicios Estado de Guerrero No. 266 y a lo solicitado en el anexo AT-8 de la convocatoria a la licitación, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los precios consignados en la proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios.

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona moral, eliminando la anterior)

Que en mi carácter de _____, de la empresa _____ **(denominación o razón social de la persona moral)**, lo que se acredita en los términos del testimonio de la escritura pública **(o póliza, según sea el caso)** número _____, de fecha _____, otorgada ante la fe del Licenciado _____, Notario Público **(Corredor o fedatario públicos, según se trate)** número _____, de la Ciudad de _____, inscrita en el Registro Público de _____, de la Ciudad de _____, en el folio número _____, con fecha __ de _____ de 202__, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal, número _____, de fecha __ de _____ de 202__, relativa a los trabajos consistentes en _____, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:
:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 44, fracción XX de la Ley de Obras Públicas y Servicios Estado de Guerrero No. 266 y a lo solicitado en el anexo AT 8 de la convocatoria a la licitación, a nombre de mi representado manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que los precios consignados en la proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios.

ATENTAMENTE

(NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Y/O DE SU REPRESENTANTE LEGAL

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL
No. _____

ANEXOS ECONÓMICOS

AE 1 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DELA PROPOSICIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN, AGRUPADO POR:

- A MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE;
- B MANO DE OBRA; Y
- C MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

AE2 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS:

- A ANÁLISIS DEL FACTOR Tp/TI;
- B TABLA DE CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL; Y
- C ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL SALARIO REAL.

AE3 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ÉSTOS PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS.

AE4 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

AE5 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

AE6 UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.

AE7 CARGOS ADICIONALES.

AE8 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. CUANDO EXISTAN INSUMOS DE LOS SEÑALADOS EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE DEBERÁ SEÑALAR EL PRECIO OFERTADO POR EL LICITANTE.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL
No. _____

AE9 **ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRÁN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS.**

AE 10 **PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDO A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA Y EN SU CASO, CON FECHAS CRITICAS QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.**

AE11 **PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:**

- **A MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS;**
- **B MANO DE OBRA;**
- **C MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS; Y**
- **D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.**

AE12 **CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.**

AE13 **CARTA COMPROMISO.**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

000080

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No._____

ANEXO AE-1 **LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DELA PROPOSICIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES, AGRUPADO POR:**

A **MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.**

(GUÍA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERÁ ELABORAR EL DOCUMENTO REFERIDO, SEÑALANDO LOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, NACIONALES Y EXTRANJEROS, SI ES EL CASO, IDENTIFICANDO AQUELLOS QUE SERÁN PROPORCIONADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN.

A).- **ENCABEZADO:**

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE:	SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.
ÁREA CONVOCANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE LA LICITACIÓN Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL.
LICITACIÓN No.:	SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.
FIRMA DEL LICITANTE:	EN ESTE ESPACIO DEBERÁ FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
FECHA:	SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DELA PROPOSICIÓN, INDICADA EN LA CONVOCATORIA OLA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.
HOJA No.:	SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

B).- **COLUMNAS:**

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No._____

ANEXO AE-1 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DELA PROPOSICIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES, AGRUPADO POR:

A MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

(GUÍA DE LLENADO)

No.:	SE ANOTARÁ EL NÚMERO EN EL ORDEN PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA.
MATERIALES Y EQUIPOS:	SE ANOTARÁN LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, INCLUYENDO EN LA MISMA RELACIÓN, LOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ETC.
ORIGEN:	MARCAR CON UNA X, EN LA COLUMNA QUE CORRESPONDA, SI EL MATERIAL, MAQUINARIA O EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, ES DE ORIGEN NACIONAL O EXTRANJERO.
UNIDAD:	LA DE USO COMÚN PARA CADA MATERIAL O EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.
CANTIDAD:	ANOTAR LA CANTIDAD TOTAL DE CADA MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y LA DE LOS EQUIPOS O MAQUINARIA DE INSTALACIÓN PERMANENTE
COSTO:	ANOTAR EL COSTO DE CADA MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y LA DE LOS EQUIPOS O MAQUINARIA DE INSTALACIÓN PERMANENTE.
IMPORTE:	ANOTAR EL IMPORTE TOTAL DE CADA MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y LA DE LOS EQUIPOS O MAQUINARIA DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

000032

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN No.:	ANEXO ECONÓMICO AE1 A
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	FECHA:	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	FIRMA DEL LICITANTE:	HOJA: DE:

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DELA PROPOSICIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES, AGRUPADO POR:

A MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

No.	MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE	ORIGEN:		UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	IMPORTE
		NACIONAL	EXTRANJERO				

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. _____

ANEXO AE-1 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DELA PROPOSICIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES, AGRUPADO POR:

B MANO DE OBRA.

(GUÍA DE LLENADO)

A).- ENCABEZADO:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE:	SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.
ÁREA CONVOCANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE LA LICITACIÓN Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL.
LICITACIÓN No.:	SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.
FIRMA DEL LICITANTE:	EN ESTE ESPACIO DEBERÁ FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
FECHA:	SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DELA PROPOSICIÓN, INDICADA EN LA CONVOCATORIA OLA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.
HOJA No.:	SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

B).- COLUMNAS:

No.:	SE ANOTARÁ EL NÚMERO EN EL ORDEN

000084

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. _____

ANEXO AE-1 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DELA PROPOSICIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES, AGRUPADO POR:

B MANO DE OBRA.

(GUÍA DE LLENADO)

	PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA.
CATEGORÍA:	SE ANOTARÁ LA MANO DE OBRA NECESARIA CON LA ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO OPERADORES DE MAQUINARIA Y DE LOS EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.
UNIDAD:	SERÁ CONSIDERADA POR JORNADA DE OCHO HORAS.
CANTIDAD:	SE ANOTARA POR CATEGORÍA, EL NÚMERO TOTAL DE JORNADAS, NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
COSTO:	SE ANOTARA POR CATEGORÍA Y PARA JORNADA DE OCHO HORAS, EL SALARIO REAL QUE CORRESPONDA.
IMPORTE:	SE ANOTARA POR CATEGORÍA EL IMPORTE TOTAL QUE CORRESPONDA.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ *SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS*	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN No.:	**ANEXO ECONÓMICO AE1 B**
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	FECHA:	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	FIRMA DEL LICITANTE	HOJA: DE:

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES, AGRUPADO POR:

B MANO DE OBRA

Nº.	CATEGORÍA	UNIDAD	CANTIDAD	SALARIO REAL	IMPORTE

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. _____

ANEXO AE-1 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES, AGRUPADO POR:

C MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

(GUÍA DE LLENADO)

A).- ENCABEZADO:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE:	SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.
ÁREA CONVOCANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE LA LICITACIÓN Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL.
LICITACIÓN No.:	SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.
FIRMA DEL LICITANTE:	EN ESTE ESPACIO DEBERÁ FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
FECHA:	SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.
HOJA No.:	SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

B).- COLUMNAS:

No.:	SE ANOTARA EL NÚMERO PROGRESIVO DEL LISTADO DE LOS EQUIPOS, DE MANERA CONGRUENTE CON EL ASENTADO EN EL **ANEXO AT 7**.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. _____

ANEXO AE-1 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES, AGRUPADO POR:

C MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

(GUÍA DE LLENADO)

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN:	SE ANOTARÁ LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE DE ACUERDO CON LA PROPOSICIÓN SE REQUIERE PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS.
UNIDAD:	HORA EFECTIVA
CANTIDAD:	ANOTAR LA CANTIDAD TOTAL DE HORAS EFECTIVAS DE CADA EQUIPO, QUE DE ACUERDO CON LA PROPOSICIÓN SE REQUIERE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
COSTO HORARIO:	ANOTAR EL COSTO HORARIO TOTAL DE CADA EQUIPO, QUE DE ACUERDO CON LA PROPOSICIÓN SE REQUIERE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
IMPORTE:	ANOTAR EL IMPORTE TOTAL DE CADA EQUIPO, QUE DE ACUERDO CON LA PROPOSICIÓN SE REQUIERE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ *SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS*	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN No:	ANEXO ECONÓMICO AE 1 C
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	FECHA:	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	FIRMA DEL LICITANTE:	HOJA: DE:

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES, AGRUPADO POR:

C MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

No.	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO HORARIO	IMPORTE

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. _____

ANEXO AE-2 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS;

A ANÁLISIS DEL FACTOR Tp/Tl.

(GUÍA DE LLENADO)

A).- ENCABEZADO:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE:	SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.
ÁREA CONVOCANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE LA LICITACIÓN Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL.
LICITACIÓN No.:	SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.
FIRMA DEL LICITANTE:	EN ESTE ESPACIO DEBERÁ FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
FECHA:	SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.
HOJA No.:	SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

B).- COLUMNA:

CONCEPTOS GENERALES:	EN LOS ESPACIOS LIBRES DE CADA RENGLÓN Y/O COLUMNA, SE ANOTARÁ LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. _____ 000090

ANEXO AE-2 **ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS;**

A ANÁLISIS DEL FACTOR Tp/Tl.

(GUÍA DE LLENADO)

	SOLICITADA DE ACUERDO CON LO QUE SEÑALA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
DICAL:	DÍAS CALENDARIO.
DIAGI:	DÍAS POR AGUINALDO.
PIVAC:	DÍAS POR PRIMA VACACIONAL.
Tp:	DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO.
DIDOM:	DÍAS DOMINGOS EN EL AÑO.
DIVAC:	DÍAS DE VACACIONES EN EL AÑO.
DIFEO:	DÍAS FESTIVOS OFICIALES. SE DEBERÁ CONSIDERAR ÚNICAMENTE LO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
DINLA:	DÍAS NO LABORADOS AL AÑO DE ACUERDO A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. ES EL RESULTADO DE LA SUMA DE DIDOM, DIVAC Y DIFEO.
Tl:	DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO. ES EL RESULTADO DE LA DIFERENCIA DE DICAL MENOS DINLA.
Tp / Tl:	DÍAS PAGADOS / DÍAS LABORADOS. ES EL RESULTADO DE DIVIDIR TP ENTRE TL.

PARA SU DETERMINACIÓN, ÚNICAMENTE SE DEBERÁN CONSIDERAR AQUELLOS DÍAS QUE ESTÉN DENTRO DEL PERIODO ANUAL REFERIDO Y QUE, DE ACUERDO A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LOS CONTRATOS COLECTIVOS, RESULTEN PAGOS OBLIGATORIOS, AUNQUE NO SEAN LABORABLES.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN No:	ANEXO ECONÓMICO AE2 A
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	FECHA:	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	FIRMA DEL LICITANTE:	HOJA: DE:

FACTOR DE SALARIO REAL

A ANÁLISIS DEL FACTOR Tp/TI

(DICAL)	DÍAS CALENDARIO	
DIAGI	AGUINALDO	
PIVAC	PRIMA VACACIONAL (6 DÍAS POR 25 %)	
(Tp)	DÍAS REALMENTE PAGADOS EN UN AÑO CALENDARIO	
(DIDOM)	DÍAS DOMINGO	
(DIVAC)	DÍAS DE VACACIONES	
(DIFEO)	DÍAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)	
(DINLA)	DÍAS NO LABORADOS AL AÑO.	
(TI)	DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO.(DICAL- DINLA)	
FACTOR Tp/TI	DÍAS PAGADOS / DÍAS LABORADOS (Tp/TI)	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. _____ 000092

ANEXO AE-2 **ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS:**

B TABLA DE CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.

(GUÍA DE LLENADO)

A).- ENCABEZADO:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE:	SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.
ÁREA CONVOCANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE LA LICITACIÓN Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL.
LICITACIÓN No.:	SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.
FIRMA DEL LICITANTE:	EN ESTE ESPACIO DEBERÁ FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
FECHA:	SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.
HOJA No.:	SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

B).- TEXTO:

CLAVE.:	SE ANOTARÁ EN LA COLUMNA EL NÚMERO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. _____ 000093

ANEXO AE-2 **ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS:**

B TABLA DE CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.

(GUÍA DE LLENADO)

	CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA.
CATEGORÍAS:	LA CATEGORÍA DEL PERSONAL DE MANO DE OBRA.
SALARIO TABULADO:	EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR LAS DIFERENTES CATEGORÍAS Y ESPECIALIDADES DE ACUERDO A LOS SALARIOS QUE PREVALEZCAN EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS.
SALARIO BASE COTIZACIÓN	EL QUE RESULTE DE MULTIPLICAR EL SALARIO TABULADO POR EL FACTOR Tp/DICAL
FACTOR DE SALARIO REAL:	EL QUE RESULTE DE INCLUIR ÚNICAMENTE LAS PRESTACIONES DERIVADAS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES O DE LOS CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO EN VIGOR

FORMULA $$Fsr = Ps\left(\frac{TP}{TI}\right) (+) \frac{TP}{TI}$$

Donde:

Fsr= **Representa el factor de salario real.**

Ps= **Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.**

TP= **Representa los días realmente pagados durante un periodo anual (de Enero a Diciembre).**

TI= **Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual.**

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. _____ 000094

ANEXO AE-2 **ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS:**

B TABLA DE CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.

(GUÍA DE LLENADO)

000095

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ SECRETARIA DE DESAARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN No:		ANEXO ECONÓMICO AE2 B
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	FIRMA DEL LICITANTE:	FECHA:	HOJA: DE:

TABLA DE CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

CLAVE	CATEGORÍA	SALARIO TABULADO (Sn)	Tp/DIC AL	SALARIO BASE DE COTIZACIÓN	LEY I.M.S.S.									LEY INFONAVIT CUOTAS	TOTAL DE CUOTAS $	(Ps) EN FRACCIÓN DECIMAL	FACTOR SALARIO REAL (Fsr)
					ART. 25	ART. 72 Y 73	ART. 106		ART. 107	ART. 147	ART. 168		ART. 211				
							FRACC. I	FRACC. II			FRACC. I	FRACC. II					

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. _____

ANEXO AE-2 **ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS:**

C ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL SALARIO REAL.

(GUÍA DE LLENADO)

SE ANOTARAN POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS LA INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS.

A).- ENCABEZADO:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE:	SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL, A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.
ÁREA CONVOCANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL.
LICITACIÓN No.:	SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.
FIRMA DEL LICITANTE:	EN ESTE ESPACIO DEBERÁ FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
FECHA:	SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.
HOJA No.:	SE ANOTARÁ EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

B). - COLUMNAS:

TABULADOR DE SALARIOS REALES:

No.:	SE ANOTARÁ EN LA COLUMNA EL NÚMERO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. _____

ANEXO AE-2 **ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS:**

C **ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL SALARIO REAL.**

(GUÍA DE LLENADO)

	CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA.
CATEGORÍAS:	LAS CATEGORÍAS DEL PERSONAL DE MANO DE OBRA CONSIDERADAS EN EL **ANEXO AE 2 B**.
SALARIO TABULADO:	EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR LAS DIFERENTES CATEGORÍAS Y ESPECIALIDADES DE ACUERDO A LOS SALARIOS QUE PREVALEZCAN EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS.
FACTOR DE SALARIO REAL:	LOS OBTENIDOS EN EL **ANEXO AE 2 B.**
SALARIO REAL:	SE OBTIENE MULTIPLICANDO EL SALARIO TABULADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUREZ SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN No:	ANEXO ECONÓMICO AE2 C
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	FIRMA DEL LICITANTE:	FECHA:	HOJA: DE:

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

No.	CATEGORÍAS	SALARIO TABULADO	FACTOR DE SALARIO REAL	SALARIO REAL

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. _____

ANEXO AE-3 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ÉSTOS PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS.

(GUÍA DE LLENADO)

A).- ENCABEZADO:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE:	SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL, A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.
ÁREA CONVOCANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL.
LICITACIÓN No.:	SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.
FIRMA DEL LICITANTE:	EN ESTE ESPACIO DEBERÁ FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
FECHA:	SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.
HOJA No.:	SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

B). -TEXTO:

MÁQUINA NÚMERO:	EL NÚMERO QUE LE CORRESPONDA, DE ACUERDO AL **ANEXO AT 7**.
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:	NOMBRE, MARCA Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MAQUINARIA, SU POTENCIA, TIPO DE MOTOR Y ELEMENTOS DE QUE CONSTE.

C). - DATOS GENERALES:

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. _____

ANEXO AE-3 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ÉSTOS PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS.

(GUÍA DE LLENADO)

TIPO DE COMBUSTIBLE:	INDICAR EL TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA MAQUINARIA.
(Pm) PRECIO DEL EQUIPO:	EL COSTO COMERCIAL DE ADQUISICIÓN DE LA MÁQUINA CONSIDERADA COMO NUEVA CON TODOS SUS EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O PIEZAS ESPECIALES; SIN INCLUIR I.V.A.
(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS:	EN SU CASO SE ANOTARÁ EL PRECIO DE ADQUISICIÓN DE LAS LLANTAS, CONSIDERANDO EL VALOR DE LLANTAS NUEVAS.
(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC Y/O PZAS ESP.:	EN SU CASO SE ANOTARÁ EL PRECIO DE ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O PIEZAS ESPECIALES, CONSIDERANDO EL VALOR DE ESTOS COMO NUEVOS.
(Vm) VALOR DE LA MÁQUINA:	ES EL VALOR DE LA MÁQUINA, CONSIDERÁNDOSE COMO NUEVA DESCONTANDO EL PRECIO DE LAS LLANTAS, EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O PIEZAS ESPECIALES EN SU CASO.
(Vr) VALOR DE RESCATE:	REPRESENTA EL VALOR DE RESCATE DE LA MÁQUINA QUE EL CONTRATISTA CONSIDERE RECUPERAR POR SU VENTA, AL TÉRMINO DE SU VIDA ECONÓMICA.
(Ve) VIDA ECONÓMICA:	SE ANOTARÁ LA VIDA ECONÓMICA DE LA MÁQUINA EXPRESADO EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO.
(IC) INDICADOR ECONÓMICO:	SE ANOTARÁ UN INDICADOR ECONÓMICO ESPECIFICO PARA LA TASA DE INTERÉS ANUAL
(i) TASA DE INTERÉS ANUAL:	SE ANOTARÁ EN FRACCIÓN DECIMAL LA TASA DE INTERÉS ANUAL.
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR AÑO:	SE ANOTARÁ EL NÚMERO DE HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO DE LA MÁQUINA, POR AÑO.
(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS:	SE ANOTARÁ INDICADOR ECONÓMICO ESPECIFICO DEL MERCADO DE SEGUROS.
(s) PRIMA ANUAL PROMEDIO:	SE ANOTARÁ EN FRACCIÓN DECIMAL LA TASA PROMEDIO DE SEGUROS.
(Ko)COEFICIENTE MTTO. MAYOR Y MENOR:	SE ANOTARÁ EL COEFICIENTE ADECUADO DE ACUERDO AL TIPO DE LA MÁQUINA Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. _____

ANEXO AE-3 **ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ÉSTOS PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS.**

(GUÍA DE LLENADO)

(HP) POTENCIA NOMINAL:	SE ANOTARÁN LOS HP DEL O LOS MOTORES ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO.
(Fo) FACTOR DE OPERACIÓN:	SE ANOTARÁ EL FACTOR DE OPERACIÓN ADECUADO PARA EL MOTOR DE LA MÁQUINA.
(HPop) POTENCIA DE OPERACIÓN (HP x Fo):	SE ANOTARÁ LA POTENCIA DE OPERACIÓN, COMO PRODUCTO DE LA POTENCIA NOMINAL POR EL FACTOR DE OPERACIÓN.
(Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE:	SE ANOTARÁ LA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO.
(Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE:	SE ANOTARÁ EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE PUESTO EN LA MÁQUINA, SIN IVA.
(C) CAPACIDAD DEL CARTER:	SE ANOTARÁ LA CAPACIDAD DEL CÁRTER (RECIPIENTE DE LUBRICANTE) DE LA MÁQUINA.
(t) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE:	SE ANOTARÁ EL NÚMERO DE HORAS ENTRE CAMBIOS SUCESIVOS DE LUBRICANTE.
(Ga) CONSUMO ENTRE CAMBIOS DE LUB:	ESTÁ DETERMINADA POR LA CAPACIDAD DEL RECIPIENTE DENTRO DE LA MÁQUINA Y LOS TIEMPOS ENTRE CAMBIOS SUCESIVOS DE ACEITES.
(Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE:	REPRESENTA LA CANTIDAD DE ACEITES LUBRICANTES CONSUMIDOS POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO.
(Pa) COSTO DEL LUBRICANTE:	SE ANOTARÁ EL PRECIO DEL LUBRICANTE PUESTO EN EL EQUIPO, SIN IVA.
(Vn) VIDA DE LAS LLANTAS:	SE ANOTARÁN LAS HORAS DE VIDA ECONÓMICA DE LAS LLANTAS TOMANDO EN CUENTA LAS CONDICIONES DE TRABAJO IMPUESTAS A LAS MISMAS.
(Va) VIDA DEL EQUIP. ACC Y/O PZASESP:	SE ANOTARÁN LAS HORAS DE VIDA ECONÓMICA DE LOS EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O PIEZAS ESPECIALES TOMANDO EN CUENTA LAS CONDICIONES DE TRABAJO IMPUESTAS A LAS MISMAS.
(Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO:	SE ANOTARÁN LAS HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO DE LA MÁQUINA DENTRO DEL TURNO.
(Sr) SALARIOS POR TURNO:	SE ANOTARÁN LOS SALARIOS REALES POR TURNO DEL PERSONAL NECESARIO PARA OPERAR LA MÁQUINA.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN No:	ANEXO ECONÓMICO AE3
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	FIRMA DEL LICITANTE:	FECHA:	HOJA: DE:

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

EQUIPO No.	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:

DATOS GENERALES:

TIPO DE COMBUSTIBLE : ___ GASOLINA ___ DIESEL ___ OTRO _____

(Pm) PRECIO DE LA MÁQUINA	$	(HP)	POTENCIA NOMINAL		HP
(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS	$	(Fo)	FACTOR DE OPERACIÓN		
(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS. ESP.	$	(HPop)	POTENCIA DE OPERACIÓN (HP x Fo)		HP
(Vm) VALOR DE LA MÁQUINA	$	(Gh)	CANTIDAD DE COMBUSTIBLE		LITROS/ HR.
(Vr) VALOR DE RESCATE	$	(Pc)	PRECIO DEL COMBUSTIBLE		LITRO
(Ve) VIDA ECONÓMICA	HORAS	(C)	CAPACIDAD DEL CARTER		LITROS
		(t)	HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE		HORAS
(IC) INDICADOR ECONÓMICO PARA TASA DE INTERES ANUAL		(Ah)	CANTIDAD DE LUBRICANTE		LITROS/HR.
(i) TASA DE INTERES ANUAL		(Pa)	COSTO DEL LUBRICANTE		LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR AÑO	HORAS	(Vn)	VIDA DE LAS LLANTAS		HORAS
(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS		(Va)	VIDA DEL EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP.		HORAS
(s) PRIMA ANUAL PROMEDIO		(Ht)	HORAS EFECTIVAS POR TURNO		HORAS
(Ko) COEF. PARA MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR	%	(Sr)	SALARIOS POR TURNO		TURNO
(Ga) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t	LITROS/HR.				

I.- CARGOS FIJOS :

I.1.- DEPRECIACIÓN	D = (Vm-Vr) / Ve	=
I.2.- INVERSIÓN	Im= (Vm + Vr) i/ 2 Hea	=
I.3.- SEGUROS	Sm= (Vm+ Vr) s / 2 Hea	=
I.4.- MANTENIMIENTO	Mm =KoX D	=
	(1) SUMA CARGOS FIJOS	

II.- CONSUMOS :

II.1.- COMBUSTIBLES	Co =GhX Pc	=
II.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA		=
II.3.- LUBRICANTES	Lb=(Ah+Ga) Pa	=
II.4.- LLANTAS	N =Pn/Vn=	=
II.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP.	Ae=Pa/Va =	=
	(2) SUMA CONSUMOS	

III.- OPERACIÓN :

CATEGORÍAS	CANTIDAD	SALARIO REAL	IMPORTE

(Sr) = $

III.1.- OPERACIÓN Po = Sr / Ht= _____ =

(3) SUMA OPERACIÓN

COSTO DIRECTO POR HORA (1) + (2) + (3) = $

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. _____

ANEXO AE-4 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

(GUÍA DE LLENADO)

SE IDENTIFICARÁN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES

A).- ENCABEZADO:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE:	SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL, A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.
ÁREA CONVOCANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL.
LICITACIÓN No.:	SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.
FIRMA DEL LICITANTE:	EN ESTE ESPACIO DEBERÁ FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
FECHA:	SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.
HOJA No.:	SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.
B). - TEXTO:	EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EL ANÁLISIS DETALLADO DE LOS COSTOS INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS.

PARA EL ANÁLISIS CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES, SE PODRÁN CONSIDERAR EN FORMA ENUNCIATIVA, MÁS NO LIMITATIVA, LOS QUE A

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. _____

ANEXO AE-4 **ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.**

(GUÍA DE LLENADO)

CONTINUACIÓN SE MENCIONAN EN LA **TABLA AE 4**.

NOTA: LOS COSTOS CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL SOLO COMPRENDERÁN LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS			CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN No:	ANEXO ECONÓMICO AE 4
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	FIRMA DEL LICITANTE:	FECHA:	HOJA: DE:

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS

CONCEPTO	IMPORTES POR ADMINISTRACIÓN	
	CENTRAL	CAMPO
HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES A.- PERSONAL DIRECTIVO B.- PERSONAL TÉCNICO C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C. E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C. F.- PASAJES Y VIÁTICOS PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C. G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C.		
(SUBTOTALES) $ =		
DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS A.- EDIFICIOS Y LOCALES B.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA C.- BODEGAS D.- INSTALACIONES GENERALES E.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES F.- DEPRECIACIÓN O RENTA Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOS G.- CAMPAMENTOS		
(SUBTOTALES) $ =		
SERVICIOS A.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		
(SUBTOTALES) $ =		
ETES Y ACARREOS A.- CAMPAMENTOS B.- EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN C.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES D.- MOBILIARIO		
(SUBTOTALES) $ =		
GASTOS DE OFICINA A.- PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO B.- CORREOS, FAX, TELÉFONOS, TELÉGRAFOS, RADIO C.- EQUIPO DE COMPUTACIÓN D.- SITUACIÓN DE FONDOS E.- COPIAS Y DUPLICADOS F.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS G.- GASTOS DE LA LICITACIÓN		
(SUBTOTALES) $ =		
CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO		
(SUBTOTALES) $ =		
SEGURIDAD E HIGIENE		
(SUBTOTALES) $ =		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN No:	ANEXO ECONÓMICO AE 4 CONTINUACIÓN
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	FIRMA DEL LICITANTE:	FECHA:	HOJA: DE:

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS

CONCEPTO	IMPORTES POR ADMINISTRACIÓN	
	CENTRAL	CAMPO
SEGUROS Y FIANZAS		
A.- PRIMAS POR SEGUROS		
B.- PRIMAS POR FIANZAS		
(SUBTOTALES) $ =		
TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES		
CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO		
B.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO		
C.- CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES GENERALES		
1.- DE CAMPAMENTOS		
2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		
3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES		
(SUBTOTALES) $ =		
COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =		
C.I. %= C.I./C.D. X100		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

000107

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. _____

ANEXO AE-5 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

(GUÍA DE LLENADO)

A).- ENCABEZADO:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE:	SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL, A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.
ÁREA CONVOCANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL.
LICITACIÓN No.:	SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.
FIRMA DEL LICITANTE:	EN ESTE ESPACIO DEBERÁ FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
FECHA:	SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.
HOJA No.:	SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

B).-TEXTO:

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA SU ANÁLISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS OTORGADOS, EN SU CASO, Y DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON LOS PROGRAMAS MENCIONADOS EN LOS **AE-11** Y EL PLAZO INDICADO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRÁ DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. _____

ANEXO AE-5 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

(GUÍA DE LLENADO)

LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA TASA DE INTERÉS PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MÁS LOS COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERÁ INDICAR EN EL ANÁLISIS DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO LA TASA DE INTERÉS Y EL INDICADOR ECONÓMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRÁ SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

LA OMISIÓN DE NO SEÑALAR EL INDICADOR ECONÓMICO, SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACPULCO DE JUAREZ SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN No:		ANEXO ECONÓMICO AE5
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	FIRMA DEL LICITANTE:	FECHA:	HOJA: DE:

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

CONCEPTO	MES												TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
EGRESOS													
MATERIALES													
MANO DE OBRA													
EQUIPO													
COSTO DIRECTO													
COSTO INDIRECTO													
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO													
EGRESOS ACUMULADOS													
INGRESOS													
ESTIMACIONES DE OBRA													
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO													
ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO													
ANTICIPOS													
INGRESOS ACUMULADOS													
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADOS													
COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)													
COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADOS													

INDICADOR ECONÓMICO:
TASA DE INTERÉS:

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= $\dfrac{\text{COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO X 100}}{\text{COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO}}$

601009

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

000110

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. _____

ANEXO AE-6 UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.

(GUÍA DE LLENADO)

A).- ENCABEZADO:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE:	SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL, A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.
ÁREA CONVOCANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL.
LICITACIÓN No.:	SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.
FIRMA DEL LICITANTE:	EN ESTE ESPACIO DEBERÁ FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
FECHA:	SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.
HOJA No.:	SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

B). - TEXTO:

CARGO POR UTILIDAD:	SE DETERMINARÁ MULTIPLICANDO EL PORCENTAJE DE UTILIDAD CONSIDERADO POR EL LICITANTE POR LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

EL PORCENTAJE SERÁ FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERÁ EL QUE RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.
ESTE CARGO, DEBERÁ CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.
NOTA: NO ES NECESARIO SU DESGLOSE.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN No:	ANEXO ECONÓMICO AE6
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	FIRMA DEL LICITANTE:	FECHA:	HOJA: DE:

CARGO POR UTILIDAD

FORMULA GENERAL PARA OBTENER EL CARGO POR UTILIDAD

$$U = \frac{U.\ NETA}{1-(I.S.R. + P.T.U.)}$$

DONDE:

U=	*UTILIDAD*
U. NETA=	*UTILIDAD NETA*
I.S.R.=	*IMPUESTO SOBRE LA RENTA*
P.T.U.=	*PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA*

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

000112

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. _____

ANEXO AE-7 CARGOS ADICIONALES.

(GUÍA DE LLENADO)

A).- ENCABEZADO:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE:	SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL, A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.
ÁREA CONVOCANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL.
LICITACIÓN No.:	SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.
FIRMA DEL LICITANTE:	EN ESTE ESPACIO DEBERÁ FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
FECHA:	SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.
HOJA No.:	SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

B). - TEXTO:

CARGOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES A:	LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO OBLIGACIONES ADICIONALES O PORQUE DERIVAN DE UN IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL CARGO POR UTILIDAD.
ORDENAMIENTO LEGAL:	ÚNICAMENTE QUEDARÁN INCLUIDOS, AQUELLOS CARGOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO IMPUESTOS LOCALES Y FEDERALES Y GASTOS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS Y SERVICIOS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. _____

ANEXO AE-7 CARGOS ADICIONALES.

(GUÍA DE LLENADO)

QUE REALIZA LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERÁN SER AFECTADOS POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERÁN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO DESPUÉS DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: SE DEBERÁ INDICAR EL PORCENTAJE ORDENADO LEGALMENTE.

INSUMO O PARTE DE APLICACIÓN: SE INDICARÁ EL INSUMO O PARTE DEL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS EN QUE SE APLICARÁ.

NOTAS:

PARA EFECTOS DEL CÁLCULO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SE PODRÁ APLICAR LA FORMULA SIGUIENTE:

$$CA = \frac{CD+CI+CF+CU}{1-0.005} - (CD+CI+CF+CU)$$

CA= CARGO ADICIONAL.

CD= COSTO DIRECTO.

CI= COSTO INDIRECTO.

CF= COSTO DE FINANCIAMIENTO.

CU= COSTO DE UTILIDAD.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN No:	ANEXO ECONÓMICO AE7
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	FIRMA DEL LICITANTE:	FECHA:	HOJA: DE:

CARGOS ADICIONALES

No	CARGOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES A	ARTÍCULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL QUE LO NORMA (ADJUNTAR COPIA FOTOSTÁTICA)	% QUE APLICA	INSUMO O PARTE DEL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO EN QUE SE APLICARÁ
C.A.1				
C.A.2				
ETC.				

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. _____

ANEXO AE-8 **RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. CUANDO EXISTAN INSUMOS DE LOS SEÑALADOS EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE DEBERÁ SEÑALAR EL PRECIO OFERTADO POR EL LICITANTE.**

(GUÍA DE LLENADO)

SE ANOTARÁ LA RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. SE DEBERÁ SEÑALAR EL PRECIO OFERTADO POR EL LICITANTE CUANDO EXISTAN INSUMOS DE LOS SEÑALADOS EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTICULO 44 DEL REGLAMENTO. DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

A).- ENCABEZADO:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE:	SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL, A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.
ÁREA CONVOCANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL.
LICITACIÓN No.:	SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.
FIRMA DEL LICITANTE:	EN ESTE ESPACIO DEBERÁ FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
FECHA:	SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.
HOJA No.:	SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

B). - COLUMNAS:

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. _____

ANEXO AE-8 **RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. CUANDO EXISTAN INSUMOS DE LOS SEÑALADOS EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE DEBERÁ SEÑALAR EL PRECIO OFERTADO POR EL LICITANTE.**

(GUÍA DE LLENADO)

No.:	SE ANOTARÁ EL NUMERO CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO CON LOS **ANEXOS AT 9 A Y AE 1**.
DESCRIPCIÓN DE LOS COSTOS BÁSICOS:	SE ANOTARÁ CLARAMENTE EL NOMBRE DE LOS COSTOS BÁSICOS, INDICANDO SUS CARACTERÍSTICAS.
UNIDAD:	SE ANOTARÁ LA UNIDAD DE MEDIDA DEL COSTO BÁSICO.
CANTIDAD DEL COSTO BÁSICO:	SE ANOTARA LA CANTIDAD DEL COSTO BÁSICO.
COSTO (SIN IVA):	SE ANOTARÁ EL COSTO DIRECTO DEL COSTO BÁSICO PUESTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.
IMPORTE:	SE ANOTARA EL IMPORTE CORRESPONDIENTE.

NOTA: EL COSTO BÁSICO NO DEBERÁ SER AFECTADO POR EL I.V.A .EN ESTE DOCUMENTO SE DEBERÁN ANEXAR LOS ANÁLISIS.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN No:	ANEXO ECONÓMICO AE8
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	FIRMA DEL LICITANTE:	FECHA:	HOJA: DE:

RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS

No.	DESCRIPCIÓN DE LOS COSTOS BÁSICOS	UNIDAD	CANTIDAD DEL COSTO BÁSICO	COSTO (SIN I.V.A.)	IMPORTE

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. _____

ANEXO AE-9 **ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRÁN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS.**

(GUÍA DE LLENADO)

DEBERÁN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SE DEBERÁ PRESENTAR EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

A).- ENCABEZADO:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE:	SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL, A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.
ÁREA CONVOCANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL.
LICITACIÓN No.:	SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.
FIRMA DEL LICITANTE:	EN ESTE ESPACIO DEBERÁ FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
FECHA:	SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.
HOJA No.:	SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

B). -TEXTO:

MATERIALES:	NOMBRE DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN EN EL ANÁLISIS, INDICANDO SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES.
UNIDAD:	LA UNIDAD DE MEDIDA DEL MATERIAL.
CANTIDAD:	LA CUANTIFICACIÓN DEL MATERIAL CONSIDERADO PARA EJECUTAR EL CONCEPTO DE TRABAJO.
COSTO UNITARIO:	EL COSTO UNITARIO DEL MATERIAL SIN INCLUIR I.V.A.
IMPORTE:	SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. _____

ANEXO AE-9 **ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRÁN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS.**

(GUÍA DE LLENADO)

POR EL COSTO UNITARIO CORRESPONDIENTE.

SUMA: SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES PARCIALES DE LOS MATERIALES.

PERSONAL DE MANO DE OBRA:

CATEGORÍA: SE ANOTARÁ LA CATEGORÍA DEL PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL CONCEPTO DE TRABAJO.

UNIDAD: LA CORRESPONDIENTE AL RENDIMIENTO Y AL PERSONAL EMPLEADO (HORA, JORNAL, ETC.).

CANTIDAD: SE ANOTARÁ EL RENDIMIENTO QUE DESARROLLA EL PERSONAL.

COSTO UNITARIO: EL SALARIO DEL PERSONAL POR JORNADA, SEGÚN LA CATEGORÍA EMPLEADA.

IMPORTE: SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD POR EL SALARIO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE.

SUMA: SERÁ EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES PARCIALES DEL PERSONAL.

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN:

MAQUINARIA Y/O EQUIPO: EL NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE SE UTILIZA EN EL CONCEPTO DE TRABAJO.

UNIDAD: EN HORAS.

RENDIMIENTO: EL RENDIMIENTO DEL EQUIPO EN CUESTIÓN.

COSTO UNITARIO: EL COSTO POR HORA EFECTIVA.

IMPORTE: SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD POR EL COSTO UNITARIO CORRESPONDIENTE.

HERRAMIENTA: EN EL CASO QUE SE UTILICE HERRAMIENTA MENOR EN EL CONCEPTO, SE PROCEDERÁ COMO SIGUE: EN EL ESPACIO DESTINADO PARA EL NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO, SE ANOTARÁ LA LEYENDA HERRAMIENTA MENOR; EN EL ESPACIO DE LA UNIDAD, EL SIGNO %, EN EL ESPACIO DE CANTIDAD, EL POR CIENTO QUE SE EMPLEARÁ CON RESPECTO AL IMPORTE DE LA MANO DE OBRA, EN EL ESPACIO DE COSTO UNITARIO, EL IMPORTE DE LA MANO DE OBRA; EN EL ESPACIO DE IMPORTE, SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL POR CIENTO POR EL IMPORTE DE LA MANO DE OBRA.

EQUIPO DE SEGURIDAD: EN EL CASO QUE SE UTILICE EQUIPO DE SEGURIDAD EN EL CONCEPTO, SE CALCULARÁ EN LA MISMA FORMA QUE LA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. _____

ANEXO AE-9 **ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRÁN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS.**

(GUÍA DE LLENADO)

	HERRAMIENTA CONSIDERANDO EL % CORRESPONDIENTE.
SUMA:	SERÁ EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES PARCIALES DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.
COSTO DIRECTO:	EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES TOTALES DE MATERIAL, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.
PORCENTAJES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO UTILIDAD Y ADICIONALES:-	LOS INDICADOS EN LOS **ANEXOS AE 4, AE 5, AE 6 Y AE 7**.
IMPORTE POR CONCEPTO DE INDIRECTOS:	SERÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL PORCENTAJE OBTENIDO EN EL **ANEXO AE 4** POR EL COSTO DIRECTO.
COSTO POR FINANCIAMIENTO:	SERÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL PORCENTAJE OBTENIDO EN EL DOCUMENTO **AE5** POR LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.
IMPORTE POR CONCEPTO DE UTILIDAD:	SERÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL PORCENTAJE OBTENIDO EN EL **ANEXO AE 6** POR LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y COSTO DE FINANCIAMIENTO.
IMPORTE POR CONCEPTO DE CARGOS ADICIONALES:	SERÁN LOS CALCULADOS DE ACUERDO A LO RELACIONADO EN EL **ANEXO AE 7**.
PRECIO UNITARIO:	EL RESULTANTE DE SUMAR LOS IMPORTES DE COSTO DIRECTO, COSTO INDIRECTO, COSTO POR FINANCIAMIENTO, UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES.
UNIDAD:	LA QUE CORRESPONDA AL CONCEPTO DE TRABAJO.

NOTA: **EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BÁSICOS UTILIZAR EL DEL ANEXO AE 8.**

SI SE UTILIZAN CUADRILLAS O CUALQUIER OTRO COSTO UNITARIO BÁSICO, EN LA INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR SU ANÁLISIS CORRESPONDIENTE.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN No:	ANEXO ECONÓMICO AE9
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	FIRMA DEL LICITANTE:	FECHA:	HOJA: DE:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

CLAVE:	CONCEPTO:			
MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE

MANO DE OBRA	SUMA $

CATEGORÍA	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	IMPORTE

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	SUMA $

NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO HORARIO	IMPORTE

SUMA $

COSTO DIRECTO =	TOTAL $

FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD	PORCENTAJE	IMPORTE
COSTO INDIRECTO = % C. I. x (C. D.)		
COSTO POR FINANCIAMIENTO = % C. F. x (C. D. + C. I.)		
CARGO POR UTILIDAD = % C. U. x (C. D. + C. I. + C. F.)		
CARGO ADICIONAL: C.A.1		
CARGO ADICIONAL: C.A.2		
CARGO ADICIONAL: C.A etc.		

PRECIO UNITARIO = (C. D. + C. I. + C. F. + C. U. + C.A.)	UNIDAD	

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. _____

ANEXO AE-10 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDO A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA Y EN SU CASO, CON FECHAS CRITICAS QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

(GUÍA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS DESGLOSADO POR PARTIDAS, SUBPARTIDAS Y CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

A).- ENCABEZADO:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE:	SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.
ÁREA CONVOCANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE LA LICITACIÓN Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL.
LICITACIÓN No.:	SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.
FIRMA DEL LICITANTE:	EN ESTE ESPACIO DEBERÁ FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
FECHA:	SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.
FECHA DE INICIO:	SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.
FECHA DE TERMINACIÓN:	SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACIÓN INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. _____

ANEXO AE-10 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDO A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA Y EN SU CASO, CON FECHAS CRITICAS QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

(GUÍA DE LLENADO)

	URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.
HOJA No.:	SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

B).- **TEXTO:**

CLAVE:	SE ANOTARÁ EL NÚMERO QUE CORRESPONDA A LA PARTIDA, SUBPARTIDA Y CONCEPTO DE TRABAJO.
DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS, SUBPARTIDAS CONCEPTOS.:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL Y CONCEPTO, Y EN SU CASO TAMBIÉN LAS PARTIDAS Y SUBPARTIDAS QUE LE CORRESPONDAN, DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE CONCEPTOS.
UNIDAD:	UNIDAD DE MEDICIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO.
CANTIDAD:	SE ANOTARA LA CANTIDAD DE TRABAJO POR EJECUTAR DEL CONCEPTO, DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO.
IMPORTE:	IMPORTE TOTAL DEL CONCEPTO DE TRABAJO
AÑO:	DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN, SE ANOTARÁ EL AÑO DE QUE SE TRATE.
MES:	EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE ANOTARA EL NOMBRE DEL MES QUE CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR DE ESTAS, SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA CADA CONCEPTO Y SE ANOTARAN LAS CANTIDADES E IMPORTES PARCIALES DE TRABAJO A EJECUTAR, EXPRESADAS EN LAS UNIDADES DE MEDICIÓN CONVENCIONALES.

NOTAS: EL CONCEPTO O EN SU CASO, LA PARTIDA O SUBPARTIDA CON QUE INICIEN LOS TRABAJOS DEBERÁN INDICAR LA FECHA DE INICIO CITADA EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN. ASIMISMO, DEBERÁ INDICAR, EN EL DIAGRAMA, LA FECHA DE LA ÚLTIMA ACTIVIDAD QUE SE EJECUTE.

CADA COLUMNA REPRESENTA EL PERIODO DE CORTE DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR, INDICADO EN SU PROGRAMA.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO			CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN No:	ANEXO ECONÓMICO AE 10
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:			FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINACIÓN:	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	FIRMA DEL LICITANTE	FECHA:	PLAZO DE EJECUCIÓN:	HOJA: DE:

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDO A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA Y EN SU CASO, CON FECHAS CRITICAS QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

CLAVE			DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	AÑO													
PARTIDA	SUBPARTIDA	CONCEPTO					MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES

000124

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. _____

ANEXO AE-11 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

A MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS.

(GUÍA DE LLENADO)

EN ESTE DOCUMENTO SE ELABORARA EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE SUMINISTRO Y/O UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, INDICANDO LAS CANTIDADES POR MES A UTILIZAR.

A).- ENCABEZADO:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE:	SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.
ÁREA CONVOCANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE LA LICITACIÓN Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL.
LICITACIÓN No.:	SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.
FIRMA DEL LICITANTE:	EN ESTE ESPACIO DEBERÁ FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
FECHA:	SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.
FECHA DE INICIO:	SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.
FECHA DE TERMINACIÓN:	SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACIÓN INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCIÓN INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. _____

ANEXO AE-11 **PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:**

A MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS.

(GUÍA DE LLENADO)

MEDIANTE ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.

HOJA No.: SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

B).- TEXTO:

No. SE ANOTARÁ EL NÚMERO QUE CORRESPONDA DEBIENDO SER CONGRUENTE CON EL ASENTADO EN LOS **AE 11 A**.

DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES Y/ O EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE. SE ANOTARA EL NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

ÁREA DE TRABAJO: SE ANOTARA LA CLAVE DEL CONCEPTO EN EL QUE SE VA A UTILIZAR LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

UNIDAD: UNIDAD DE MEDICIÓN DE LOS MATERIALES Y/O DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

CANTIDAD TOTAL: SE ANOTARA LA CANTIDAD TOTAL DE MATERIALES Y/O DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, QUE DE ACUERDO CON LA PROPOSICIÓN SE VAYA A REQUERIR.

IMPORTE: IMPORTE TOTAL

AÑO: DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN, SE ANOTARÁ EL AÑO DE QUE SE TRATE.

MES: EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE ANOTARA EL NOMBRE DEL MES QUE CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR DE ESTAS, SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA EL SUMINISTRO Y/O UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE Y SE ANOTARAN LAS CANTIDADES E IMPORTES PARCIALES DE CADA UNO, EXPRESADAS EN LAS UNIDADES DE MEDICIÓN CONVENCIONALES.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACPULCO DE JUAREZ SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN No: 000127	
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:			FECHA DE INICIO:	ANEXO ECONÓMICO AE11 A
			FECHA DE TERMINACIÓN:	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	FIRMA DEL LICITANTE	FECHA:	PLAZO DE EJECUCIÓN:	HOJA: DE:

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

A MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS.

No	DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES Y/O EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE	ÁREA DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	IMPORTE TOTAL	AÑO													
						MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. _____

ANEXO AE-11 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

B MANO DE OBRA.

(GUÍA DE LLENADO)

EN ESTE DOCUMENTO SE ELABORARA EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE SUMINISTRO Y/O UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA, INDICANDO LAS CANTIDADES POR MES, A UTILIZAR.

A).- ENCABEZADO:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE:	SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.
ÁREA CONVOCANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE LA LICITACIÓN Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL.
LICITACIÓN No.:	SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.
FIRMA DEL LICITANTE:	EN ESTE ESPACIO DEBERÁ FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
FECHA:	SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.
FECHA DE INICIO:	SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.
FECHA DE TERMINACIÓN:	SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACIÓN INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. _____

ANEXO AE-11 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

B MANO DE OBRA.

(GUÍA DE LLENADO)

PLAZO DE EJECUCIÓN:	SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCIÓN INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.
HOJA No.:	SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

B).- TEXTO:

No.:	SE ANOTARÁ EL NÚMERO QUE CORRESPONDA DEBIENDO SER CONGRUENTE CON EL ASENTADO EN LOS **AE 11 B**.
DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE LA MANO DE OBRA:	SE ANOTARÁN LAS CATEGORÍAS DEL PERSONAL QUE ESTARÁ ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
ÁREA DE TRABAJO:	SE ANOTARA LA CLAVE DEL CONCEPTO EN EL QUE SE VA A UTILIZAR LA MANO DE OBRA.
UNIDAD:	LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ POR JORNAL.
CANTIDAD TOTAL:	SE ANOTARA LA CANTIDAD TOTAL DE JORNALES, DESGLOSADA POR CADA CATEGORÍA.
IMPORTE TOTAL:	IMPORTE TOTAL DEL CONCEPTO.
AÑO:	DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN, SE ANOTARÁ EL AÑO DE QUE SE TRATE.
MES:	EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE ANOTARA EL NOMBRE DEL MES QUE CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR DE ESTAS, SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA Y SE ANOTARAN LAS CANTIDADES E IMPORTES PARCIALES DE CADA CATEGORÍA, EXPRESADAS EN LAS UNIDADES DE MEDICIÓN CONVENCIONALES.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONL DE ACAPULCO DE JUAREZ SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN No:	ANEXO ECONÓMICO AE11 B
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:			FECHA DE INICIO:	
			FECHA DE TERMINACIÓN:	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	FIRMA DEL LICITANTE	FECHA:	PLAZO DE EJECUCIÓN:	HOJA: DE:

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

B MANO DE OBRA.

No.	DESCRIPCIÓN DE CATEGORÍAS DE LA MANO DE OBRA	ÁREA DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	IMPORTE TOTAL	AÑO													
						MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. _____

ANEXO AE-11 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

C MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS.

(GUÍA DE LLENADO)

EN ESTE DOCUMENTO SE ELABORARA EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE SUMINISTRO Y/O UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS, INDICANDO LAS CANTIDADES POR MES A UTILIZAR.

A).- ENCABEZADO:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE:	SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.
ÁREA CONVOCANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE LA LICITACIÓN Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL.
LICITACIÓN No.:	SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.
FIRMA DEL LICITANTE:	EN ESTE ESPACIO DEBERÁ FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
FECHA:	SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.
FECHA DE INICIO:	SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.
FECHA DE TERMINACIÓN:	SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACIÓN INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. _____

ANEXO AE-11 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

C MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS.

(GUÍA DE LLENADO)

PLAZO DE EJECUCIÓN: SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCIÓN INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.

HOJA No.: SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

B).- TEXTO:

No.: SE ANOTARÁ EL NÚMERO QUE CORRESPONDA DEBIENDO SER CONGRUENTE CON EL ASENTADO EN LOS **AE 11 C**.

NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO: SE ANOTARÁN EL NOMBRE GENÉRICO DE LAS MAQUINARIAS Y DE LOS EQUIPOS A UTILIZAR.

UTILIZACIÓN: SE ANOTARA LA CLAVE DEL CONCEPTO EN EL QUE SE VA A UTILIZAR.

RENDIMIENTO: SE ANOTARA EL RENDIMIENTO DE CADA EQUIPO, POR HORA DE TRABAJO, Y DE CONFORMIDAD CON LA UTILIZACIÓN DE ESTOS.

UNIDAD: LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ POR HORA EFECTIVA (H.E.).

CANTIDAD TOTAL: SE ANOTARAN LAS CANTIDADES DE CADA EQUIPO Y LAS HORAS EFECTIVAS, DESGLOSADAS PARA CADA ACTIVIDAD.

IMPORTE: SE ANOTARA EL IMPORTE DE LA MAQUINARIA, POR CONCEPTO.

AÑO: DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN, SE ANOTARÁ EL AÑO DE QUE SE TRATE.

MES: EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE ANOTARA EL NOMBRE DEL MES QUE CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR DE ESTAS, SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA Y SE ANOTARAN LAS CANTIDADES E IMPORTES PARCIALES DE CADA CATEGORÍA, EXPRESADAS EN LAS UNIDADES DE MEDICIÓN CONVENCIONALES.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ SECCRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN No: 00015	ANEXO ECONÓMICO AE11 C
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:			FECHA DE INICIO:	
			FECHA DE TERMINACIÓN:	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	FIRMA DEL LICITANTE	FECHA:	PLAZO DE EJECUCIÓN:	HOJA: DE:

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

C MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS.

No	NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO	UTILIZACIÓN	RENDIMIENTO	UNIDAD	CANTIDAD		IMPORTE	AÑO													
					EQUIPO	HE		MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. _____

ANEXO AE-11 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

(GUÍA DE LLENADO)

EN ESTE DOCUMENTO SE ELABORARA EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO, ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

A).- ENCABEZADO:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE:	SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.
ÁREA CONVOCANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE LA LICITACIÓN Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL.
LICITACIÓN No.:	SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.
FIRMA DEL LICITANTE:	EN ESTE ESPACIO DEBERÁ FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
FECHA:	SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.
FECHA DE INICIO:	SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.
FECHA DE TERMINACIÓN:	SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACIÓN INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. _____ 000135

ANEXO AE-11 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

(GUÍA DE LLENADO)

PLAZO DE EJECUCIÓN:	SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCIÓN INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.
HOJA No.:	SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

B).- TEXTO:

No.:	SE ANOTARÁ EL NÚMERO DEL ORDEN PROGRESIVO QUE CORRESPONDA.
DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORÍAS DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO:	SE ANOTARÁN LAS CATEGORÍAS DEL PERSONAL QUE ESTARÁ ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
ÁREA DE TRABAJO:	SE ANOTARA EL ÁREA DE TRABAJO DONDE DESEMPEÑA SUS FUNCIONES.
UNIDAD:	LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ POR JORNAL. O DE ACUERDO CON LA MINISTRACIÓN DE SUS SALARIOS.
CANTIDAD TOTAL:	SE ANOTARA LA CANTIDAD TOTAL DE JORNALES, SEMANAS, QUINCENAS O MESES DESGLOSADA POR CADA CATEGORÍA.
IMPORTE:	SE ANOTARA EL IMPORTE DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CATEGORÍA.
AÑO:	DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN, SE ANOTARÁ EL AÑO DE QUE SE TRATE.
MES:	EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE ANOTARA EL NOMBRE DEL MES QUE CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR DE ESTAS, SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA Y SE ANOTARAN LAS CANTIDADES E IMPORTES PARCIALES DE CADA CATEGORÍA, EXPRESADAS EN LAS UNIDADES DE MEDICIÓN CONVENCIONALES.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ SECRETARIA DE DESARROLLO URBABO Y OBRAS PUBLICAS			CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN No:	ANEXO ECONÓMICO AE11 D
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:			FECHA DE INICIO:	
			FECHA DE TERMINACIÓN:	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	FIRMA DEL LICITANTE	FECHA:	PLAZO DE EJECUCIÓN:	HOJA: DE:

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

No	DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORÍAS DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO	ÁREA DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	IMPORTE	AÑO													
						MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

000137

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. _____

ANEXO AE-12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

(GUÍA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARÁ EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERÁ CONTENER: DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

A).- ENCABEZADO:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE:	SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL, A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.
ÁREA CONVOCANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL.
LICITACIÓN No.:	SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.
FIRMA DEL LICITANTE:	EN ESTE ESPACIO DEBERÁ FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
FECHA:	SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.
HOJA No.:	SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

B). -TEXTO:

CLAVE:	SE ANOTARÁ EL NÚMERO DE CLAVE CORRESPONDIENTE DEL CONCEPTO.
DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS, SUBPARTIDAS:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE Y DESCRIPCIÓN. DE LAS PARTIDAS Y SUBPARTIDAS QUE LE CORRESPONDAN, DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE CONCEPTOS.
DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS:	SE ANOTARÁ CON CLARIDAD LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO CORRESPONDIENTE, EMPLEÁNDOSE EN SU

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

000138

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. _____

ANEXO AE-12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

(GUÍA DE LLENADO)

	CASO UN NÚMERO RAZONABLE DE RENGLONES.
CANTIDAD DE TRABAJO:	LA CUANTÍA DEL CONCEPTO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE.
UNIDAD:	LA UNIDAD DE MEDIDA DEL CONCEPTO DE TRABAJO.
PRECIO UNITARIO CON NÚMERO:	EN EL RENGLÓN CORRESPONDIENTE SE ANOTARÁ CON NÚMERO EL PRECIO UNITARIO.
PRECIO UNITARIO CON LETRA:	EN EL RENGLÓN CORRESPONDIENTE SE ANOTARÁ CON LETRA EL PRECIO UNITARIO.
IMPORTE EN PESOS DEL CONCEPTO:	ES EL RESULTADO DE LA OPERACIÓN DE LA CANTIDAD POR EL PRECIO UNITARIO.
PARTIDAS:	EN EL CASO DE QUE SE HAYA INDICADO, SE ANOTARA LA SUMA DE LOS IMPORTES DE LOS CONCEPTOS QUE LA INTEGREN.
SUBPARTIDAS:	EN EL CASO DE QUE SE HAYA INDICADO, SE ANOTARA LA SUMA DE LOS IMPORTES DE LOS CONCEPTOS QUE LA INTEGREN.
SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ÉSTA HOJA:	EL IMPORTE PARCIAL DE LA HOJA EN CUESTIÓN.
PROPOSICIÓN QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:	EL IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA EN CUESTIÓN.
MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN:	EN LA ÚLTIMA HOJA DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, INDICARA EL MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN.
ESTA HOJA:	SE DEJARÁ EN BLANCO PARA REVISIÓN DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.
ACUMULADO:	SE DEJARÁ EN BLANCO PARA REVISIÓN DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN No:	ANEXO ECONÓMICO AE12
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE	FECHA:	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	HOJA: DE:

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE

CLAVE	PARTIDA	SUBPARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	CANTIDAD DE TRABAJO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS
						CON NÚMERO	CON LETRA	

RESULTE NECESARIO MODIFICAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INICIALMENTE OTORGADA. CUANDO EXISTAN TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DEL PERÍODO PROGRAMADO, POR CAUSA IMPUTABLE A **"EL CONTRATISTA",** EL AJUSTE SE REALIZARÁ CONSIDERANDO EL PERÍODO EN QUE DEBIERON SER EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, SALVO EN EL CASO DE QUE EL FACTOR DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES EN EL QUE EFECTIVAMENTE SE EJECUTARON, SEA INFERIOR A AQUEL EN QUE DEBIERON EJECUTARSE, EN CUYO SUPUESTO SE APLICARÁ ESTE ÚLTIMO.

DECIMA: SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.

"LA SECRETARÍA" A TRAVÉS DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRÁ EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A **"EL CONTRATISTA"** POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCIÓN EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE SEAN ORDENADAS.

POR SU PARTE **"LA SECRETARÍA"** EN APEGO A LO DISPUESTO POR LOS **ARTÍCULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266** Y 112 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DESIGNA COMO SU **RESIDENTE** EN LA OBRA PARA PODER TRATAR LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON O DERIVADOS DE LOS TRABAJOS, A EL C. **${sup_nombre}** **"LA SECRETARÍA"** DESIGNARÁ POR ESCRITO AL **RESIDENTE** RESPONSABLE DE LA OBRA, CON LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES MENCIONADAS EN EL ARTÍCULO **113 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**.

"LA SECRETARÍA" PODRÁ ORDENAR LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA DE LOS TRABAJOS CUANDO **"EL CONTRATISTA"** NO CUMPLA LAS ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO O EN SU CASO, A LAS INSTRUCCIONES RECIBIDAS POR ESCRITO O EN LA BITÁCORA DE OBRA POR PARTE DEL SUPERVISOR, DEBIENDO **"EL CONTRATISTA"** REALIZARLAS POR SU CUENTA Y SIN DERECHO A RETRIBUCIÓN ALGUNA. ASÍ MISMO **"LA SECRETARÍA"** PODRÁ ORDENAR LA **SUSPENSIÓN** TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA CONTRATADA, EN TANTO SE LLEVEN A CABO LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN O REPOSICIÓN, SIN QUE SEA MOTIVO DE AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS.

DÉCIMA PRIMERA: REPRESENTANTE DEL "CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER LA RESIDENCIA DE OBRA DEBIENDO ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE SERÁ **EL SUPERINTENDENTE** DE CONSTRUCCIÓN Y PARA TAL EFECTO "EL CONTRATISTA" DESIGNA AL **${representante_tecnico_nombre}** CON CEDULA PROFESIONAL **No ${representante_tecnico_cedula},** EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, EL **${representante_tecnico_fecha_cedula_dia} DE ${representante_tecnico_fecha_cedula_mes} DEL ${representante_tecnico_fecha_cedula_ano}**, REGISTRADO COMO **SUPERINTENDENTE**, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES TÉCNICAS EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

QUE DEBERÁ CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, CATÁLOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCIÓN Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN Y

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

NORMAS DE CALIDAD, BITÁCORA, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DESIGNADO POR **"EL CONTRATISTA"**, TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE CONOCER EL CONTRATO, EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEBERÁ ESTAR FACULTADO PARA DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA ACEPTAR U OBJETAR LAS ESTIMACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN Y, EN GENERAL, PARA ACTUAR A NOMBRE DEL **"CONTRATISTA"** CON LAS FACULTADES LEGALES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DEBE ESTAR FACULTADO POR **"EL CONTRATISTA"**, PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, ASÍ COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"LA SECRETARÍA" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, Y DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCIÓN DEL MISMO, Y **"EL CONTRATISTA"** EN UN PLAZO DE CINCO DÍAS NATURALES TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOMBRAR A OTRO QUE REÚNA LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DE ESTA CLÁUSULA.

DÉCIMA SEGUNDA: RELACIONES LABORALES.

"EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL.

"EL CONTRATISTA" CONVIENE, POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE **"LA SECRETARÍA",** QUIEN QUEDA EXCLUIDO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD ANTE RECLAMACIONES JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES.

DE IGUAL FORMA, **"EL CONTRATISTA"** RESPONDERÁ POR CUALQUIER RELACIÓN JURÍDICA QUE SE ORIGINE POR ACTOS JURÍDICOS CONTRAÍDOS CON PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS Y DEMÁS OPERARIOS QUE CONTRATE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, MATERIA DE ESTE CONTRATO.

DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DEL "CONTRATISTA".

CON EL OBJETO DE LLEVAR UNA PERMANENTE VIGILANCIA DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN **"EL CONTRATISTA"** DEBERÁ RESPONDER POR LA DEBIDA CAPACIDAD Y PROFESIONALISMO DE SUS TÉCNICOS Y TRABAJADORES QUE EJECUTEN LA OBRA, PERMITIENDO EN TODO MOMENTO Y OTORGANDO TODAS LAS FACILIDADES NECESARIAS AL PERSONAL TÉCNICO DE **"LA SECRETARÍA"** PARA REALIZAR LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN, PROPORCIONANDO TODA LA INFORMACIÓN QUE SEA REQUERIDA.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS, Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE **"LA SECRETARÍA";** ASÍ,

COMO A RESPONDER, POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, SE LLEGUEN A CAUSAR A **"LA SECRETARÍA",** O A TERCEROS; EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO HASTA POR SU MONTO TOTAL.

IGUALMENTE, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES Y TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARAN ESTE CONTRATO (ESTIMACIONES DE OBRA, FACTURAS O CONTRA RECIBOS) SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE **"LA SECRETARÍA".**

"EL CONTRATISTA" NO PODRÁ SUBCONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA O PARTE DE LA MISMA.

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CUANDO ÉSTOS NO SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE POR ESCRITO LE PROPORCIONE **"LA SECRETARÍA"** ÉSTE ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA Y SERÁN POR CUENTA DE **"EL CONTRATISTA".**

"EL CONTRATISTA" DEBERÁ SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD QUE **"LA SECRETARÍA"** TENGA ESTABLECIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, ASÍ COMO A LOS DEMÁS REGLAMENTOS U ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PÚBLICA.

"EL CONTRATISTA" SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A **"LA SECRETARÍA"** O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS POR NO AJUSTARSE AL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES. LOS RIESGOS Y LA CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA DEFINITIVA A **"A SECRETARÍA",** SERÁN A CARGO DE **"EL CONTRATISTA".**

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE TODOS LOS ADEUDOS QUE FRENTE AL FISCO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL TENGA, CON MOTIVO DE CONTRIBUCIONES QUE SE CAUSEN COMO CONSECUENCIA Y EN EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE CONTRATAN (IMPUESTOS, DERECHOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL).

DÉCIMA CUARTA: MODIFICACIONES AL CONTRATO.

"LA SECRETARÍA" PODRÁ DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, MODIFICAR ESTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARÍAN EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRÁN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERÁN SER SUSCRITOS BAJO RESPONSABILIDAD DE

LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE HAYAN FIRMADO EL CONTRATO O QUIENES LOS SUSTITUYAN EN EL CARGO. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRÁN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO **DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266**.

LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRÁN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE EN REDUCCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN O MONTO DEL MISMO. SI SE MODIFICA EL PLAZO, LOS PERIODOS SE EXPRESARÁN EN DÍAS NATURALES, Y LA DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE VARIACIÓN SE HARÁ CON RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO; EN TANTO QUE SI ES AL MONTO, LA COMPARACIÓN SERÁ CON BASE EN EL MONTO CONVENIDO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SERÁN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AÚN CUANDO PARA FINES DE SU FORMALIZACIÓN PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.

LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO LAS PARTES CONVIENEN EN QUE **"EL CONTRATISTA"** PODRÁ SOLICITAR POR ESCRITO UNA AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, SIEMPRE QUE POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR, CASOS FORTUITOS O CUALESQUIERA OTRA CAUSA NO IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA"**, LE FUERE IMPOSIBLE CUMPLIR CABALMENTE EN EL PLAZO ESTABLECIDO.

LAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN QUE **"LA SECRETARÍA"** TIENE LA FACULTAD DE AUTORIZAR O DENEGAR LA SOLICITUD, CUANDO A SU JUICIO EXISTAN LOS ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEN FEHACIENTEMENTE O NO LA PROCEDENCIA.

SE DEBERÁ SUSTENTAR EL DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, SEGÚN SEA EL CASO, CONSIDERÁNDOSE ÉSTOS PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA **"EL CONTRATISTA"** Y **"LA SECRETARÍA"** LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN.

DÉCIMA QUINTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.

"LA SECRETARÍA" EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA, PARA LO CUAL SE ELABORARÁ UN DICTAMEN QUE JUSTIFIQUE LAS CAUSAS QUE MOTIVAN LA SUSPENSIÓN, ESTABLECIENDO EL PLAZO DE LA SUSPENSIÓN, QUE PODRÁ PRORROGARSE SI LAS CIRCUNSTANCIAS QUE DIERON ORIGEN A LA INTERRUPCIÓN PERSISTEN, DEBIENDO INFORMAR EL CONTENIDO DE ESTA RESOLUCIÓN A **"EL CONTRATISTA"**; EN ESTE CASO SE INTERRUMPIRÁ EL CALENDARIO ORIGINALMENTE PREVISTO PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, SIN QUE ESTO IMPLIQUE LA CANCELACIÓN, EXTINCIÓN O DISMINUCIÓN DE LAS GARANTÍAS OTORGADAS.

CUANDO OCURRA LA SUSPENSIÓN, EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR **"LA SECRETARÍA"** NOTIFICARÁ POR ESCRITO A **"EL CONTRATISTA"**, SEÑALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

EN CASO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** HAYA SUSPENDIDO LOS TRABAJOS, CON BASE A LA INSTRUCCIÓN RECIBIDA POR ESCRITO, LA FECHA DE TERMINACIÓN SE PRORROGARÁ EN IGUAL PROPORCIÓN AL PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSIÓN, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIDO, FORMALIZÁNDOLA MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN, LA QUE CONTENDRÁ COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR **EL ARTÍCULO 147 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**.

CUANDO LA SUSPENSIÓN SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"**, DEBIENDO ÚNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE SUSPENSIÓN Y LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAJOS RESULTEN DAÑADOS O DESTRUIDOS Y ÉSTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERÁN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO EN LOS TÉRMINOS DEL **ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266**, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRÉ EL CONVENIO PARA CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA"**.

NO SERÁ MOTIVO DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE **"EL CONTRATISTA"**.

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS O SI LA SUSPENSIÓN EXCEDE SEIS MESES **"EL CONTRATISTA"** TENDRÁ DERECHO A SOLICITAR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO, ATENDIENDO A LAS CIRCUNSTANCIAS DE CADA CASO EN CONCRETO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN.

DÉCIMA SEXTA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

"LA SECRETARÍA" PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL MUNICIPIO; O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS. DE PRESENTARSE ESTA SITUACIÓN, **"LA SECRETARÍA"** PAGARÁ A **"EL CONTRATISTA"** LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

DE IGUAL FORMA, CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, **"EL CONTRATISTA"** PODRÁ SUSPENDER LAS OBRAS EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR SU SOLICITUD A **"LA SECRETARÍA"**, QUIEN RESOLVERÁ DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA MISMA, EN CASO DE NEGATIVA, SERÁ NECESARIO QUE **"EL CONTRATISTA"** OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL CORRESPONDIENTE LA DECLARATORIA RESPECTIVA.

SE ENTIENDE POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, AQUELLOS FENÓMENOS DE LA NATURALEZA O HECHOS DE PERSONAS CON AUTORIDAD PÚBLICA, GENERAL, INSUPERABLE, IMPREVISIBLE, O QUE PREVIÉNDOSE NO SE PUEDAN EVITAR, Y QUE ORIGINEN QUE UNA PERSONA REALICE UNA CONDUCTA DAÑOSA, CONTRARIA A UN DEBER JURÍDICO O A UNA OBLIGACIÓN. FENÓMENOS DE LA NATURALEZA O HECHOS DEL HOMBRE, TALES COMO (ENUNCIATIVAMENTE MAS NO LIMITATIVA) MOTINES, ACTOS DE TERRORISMO, CUARENTENAS, EPIDEMIAS, GUERRAS (DECLARADAS O NO), DISTURBIOS CIVILES, INSURRECCIONES, INCENDIOS (CUANDO NO SE HAYA DADO CAUSA O CONTRIBUIDOS A ELLOS) TORMENTAS, IMPIDIÉNDOLE TEMPORALMENTE O DEFINITIVAMENTE EN FORMA ABSOLUTA EL CUMPLIMIENTO PARCIAL O TOTAL DE LA OBLIGACIÓN, SIN QUE TALES HECHOS LE SEAN IMPUTABLES DIRECTA O INDIRECTAMENTE Y CUYA AFECTACIÓN NO PUEDE EVITARSE CON LOS INSTRUMENTOS DE QUE NORMALMENTE SE DISPONGA, YA PARA PREVENIR EL ACONTECIMIENTO O PARA OPONERSE A EL Y RESISTIRLO.

ASÍ MISMO, LA EXTINCIÓN O PÉRDIDA DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE **"EL CONTRATISTA"** DARÁ LUGAR A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, ACORDÁNDOSE PAGAR A SUS SUCESORES O BENEFICIARIOS LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERÁN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITÁCORA, DEBIENDO **"LA SECRETARÍA"** LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS INDICADOS POR EL ARTÍCULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO A **"EL CONTRATISTA"** POR **"LA SECRETARÍA"** ÉSTA PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE **"EL CONTRATISTA"**, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A **"LA SECRETARÍA"** EN UN TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

CUANDO SE DÉ POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, DEBERÁ ELABORARSE EL FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN **LOS ARTÍCULOS 168, 169, 170, 171 Y 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.**

DÉCIMA SÉPTIMA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

"LA SECRETARÍA2 PODRÁ, EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA"** POR LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE **EL ART. 72 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, Y 154, 155, Y 157 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS** Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS,

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

ASÍ COMO EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO, SUS ANEXOS Y EN SU CASO, DE SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS.

DARÁN LUGAR A DETERMINAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN LOS SUPUESTOS SIGUIENTES:

I. POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME AL ART. **73 LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 Y EL REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**;

II. INTERRUMPA INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O SE NIEGUE A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS QUE SE HAYA DETECTADO COMO DEFECTUOSA POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD;

III. NO EJECUTE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATE LAS ÓRDENES DADAS POR EL RESIDENTE;

IV. NO DÉ CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN CONVENIDOS POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y, A JUICIO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO. NO IMPLICARÁ RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO Y, POR TANTO, NO SE CONSIDERARÁ COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISIÓN, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR LA FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES O LA FALTA DE INFORMACIÓN REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FÍSICA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, DE LICENCIAS Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR LA CONTRATANTE, ASÍ COMO CUANDO LA DEPENDENCIA O ENTIDAD HAYA ORDENADO LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS;

V. SEA DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANÁLOGA;

VI. SUBCONTRATE PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD;

VII. TRANSFIERA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD;

VIII. NO DÉ A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS;

IX. CAMBIE SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD;

X. SI SIENDO EXTRANJERO, INVOQUE LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL CONTRATO;

XI. INCUMPLA CON EL COMPROMISO QUE, EN SU CASO, HAYA ADQUIRIDO AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, RELATIVO A LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA

INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, Y

XII. EN GENERAL, INCUMPLA CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO.

LAS CAUSALES REFERIDAS DAN LUGAR A LA RESCISIÓN INMEDIATA DE ESTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA **"LA SECRETARÍA"**, ADEMÁS DE QUE SE LE APLIQUEN A **"EL CONTRATISTA"** LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISIÓN, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACIÓN DE UNO O DE OTRO, INDEPENDIENTEMENTE DE HACER EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y APLICARSE EN SU CASO A **"EL CONTRATISTA"** LOS DEMÁS CARGOS QUE PROCEDAN.

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** SE ENCUENTRE EN ALGUNA DE LAS CAUSALES INDICADAS EN LA CLÁUSULA ANTERIOR, EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA SE SUJETARÁ A LO SIGUIENTE:

1. EL PROCEDIMIENTO INICIARÁ A PARTIR DE QUE **"LA SECRETARÍA"** LE NOTIFIQUE A **"EL CONTRATISTA"** POR OFICIO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, SEÑALANDO LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVARON SU DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, RELACIONÁNDOLO CON LAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

2. TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE EL NUMERAL ANTERIOR, **"LA SECRETARÍA"** RESOLVERÁ CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER **"EL CONTRATISTA"**.

3. LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO POR PARTE DE **"LA SECRETARÍA"**, DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 1(UNO) DE ESTA CLÁUSULA.

UNA VEZ NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, **"LA SECRETARÍA"** SE ABSTENDRÁ, COMO MEDIDA PRECAUTORIA, DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA COMUNICACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS.

EN EL FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME EL PROGRAMA VIGENTE, ATENDIENDO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 162 Y 163 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO **"LA SECRETARÍA"** LE HAYA ENTREGADO A **"EL CONTRATISTA"**, ASÍ COMO CONSIDERAR EN SU INTEGRACIÓN LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE HAYA REALIZADO **"EL CONTRATISTA"** HASTA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO LOS EQUIPOS, MATERIALES QUE SE HUBIERAN INSTALADO EN LA OBRA O SE ENCUENTREN EN PROCESO DE FABRICACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SEAN SUSCEPTIBLES DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE OBRAS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 Y 161 DE SU REGLAMENTO.

EL SOBRECOSTO QUE SE DETERMINE AL ELABORAR EL FINIQUITO, SERÁ INDEPENDIENTE DE LAS GARANTÍAS, PENAS CONVENCIONALES Y DEMÁS CARGOS QUE DEBAN CONSIDERARSE EN LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.

COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO PROCEDERÁ A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE **"EL CONTRATISTA"**, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN Y ANTES DE SU CONCLUSIÓN, **"LA SECRETARÍA"** PODRÁ A SU JUICIO, SUSPENDER EL TRÁMITE DEL CITADO PROCEDIMIENTO, CUANDO SE HUBIERE INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO. EN EL CASO DE QUE SE DETERMINE NO RESCINDIR EL CONTRATO, SE REPROGRAMARÁN LOS TRABAJOS UNA VEZ NOTIFICADA LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE POR **"LA SECRETARÍA"** A **"EL CONTRATISTA"**.

"LA SECRETARÍA" PODRÁ OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISIÓN, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACIÓN DE UNAS O DE OTRO.

DECIMA OCTAVA: PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE ESTE CONTRATO, **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** CONVIENEN LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES RETENCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES:

A).- "LA SECRETARÍA" TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR MENSUALMENTE SI LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR **"EL CONTRATISTA"** DE ACUERDO CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO; PARA LO CUAL, **"LA SECRETARÍA"** COMPARARÁ EL AVANCE MES A MES CONTRA EL PROGRAMA, Y LOS TRABAJOS EFECTIVOS EJECUTADOS.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE, **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A HACER LAS RETENCIONES ECONÓMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN QUE SE DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA, HASTA LA DE REVISIÓN. LAS RETENCIONES SERÁN DETERMINADAS ÚNICAMENTE EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO OPORTUNAMENTE CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

CUANDO **"EL CONTRATISTA"** REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO SEÑALADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN, PODRÁ RECUPERAR LAS RETENCIONES ECONÓMICAS QUE SE LE HAYAN EFECTUADO, POR LO QUE **"LA SECRETARÍA"** LE REINTEGRARÁ EL IMPORTE DE LAS MISMAS QUE AL MOMENTO DE LA REVISIÓN TUVIERA ACUMULADAS.

LA APLICACIÓN DE ESTAS RETENCIONES TENDRÁ EL CARÁCTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, ÉSTOS NO SE HAN CONCLUIDO.

B).- SI **"EL CONTRATISTA"** NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO Y EN EL PROGRAMA DE TRABAJO, **"LA SECRETARÍA"** LE APLICARÁ LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR CADA MES O FRACCIÓN QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACIÓN PACTADA EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO HASTA EL MOMENTO DE SU TERMINACIÓN. DICHAS PENAS NO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES SE DESCONTARÁN ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN Y EL DE LAS PENAS CONVENCIONALES EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, Y SE APLICARÁN, SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA"** Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL QUE A JUICIO DE **"LA SECRETARÍA"** NO SE ATRIBUYA A CULPA DE **"EL CONTRATISTA"**.

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN, **"LA SECRETARÍA"** PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, O BIEN, LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA GARANTÍA DEL ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGÚN PROCEDA EN LA RESCISIÓN, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

SI **"LA SECRETARÍA"** OPTA POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, SE APEGARÁ A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA DE ESTE CONTRATO.

DECIMA NOVENA: TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARÁ A TRAVÉS DE LA BITÁCORA O POR ESCRITO A **"LA SECRETARÍA"** SOBRE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS ANEXANDO LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRÁ UNA RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA, Y ÉSTA VERIFICARÁ DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, SALVO QUE SE PACTE EXPRESAMENTE OTRO PLAZO, QUE LOS MISMOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS.

SI DURANTE LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, **"LA SECRETARÍA"** ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, DEBERÁ SOLICITAR A **"EL CONTRATISTA"** SU REPARACIÓN, A EFECTO DE QUE ÉSTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS. EN TAL CASO, EL PLAZO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE PODRÁ PRORROGAR POR EL PERIODO QUE ACUERDEN **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** PARA LA REPARACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE **"LA SECRETARÍA"** OPTE POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

UNA VEZ QUE SE HAYA CONSTATADO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A LA RECEPCIÓN FORMAL DE LOS MISMOS, EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, SUSCRIBIENDO EL **"ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN"** EN LA QUE CONSTE ESTE HECHO, DEBIENDO CONTENER COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 166 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR **A "LA SECRETARÍA"** DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE **A "LA SECRETARÍA"** HAYA CONSTATADO LA TERMINACIÓN REAL DE LOS TRABAJOS, TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL **FINIQUITO DEL CONTRATO**, INCLUYENDO ESTIMACIONES POR CONCEPTO DE OBRA EJECUTADA, CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA FUERA DE CATÁLOGO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, SOLICITUD DE AJUSTE A LOS COSTOS POR CONCEPTO DE IMPACTO INFLACIONARIO (EN CASO DE EXISTIR) Y **PLANO DE OBRA TERMINADA** EN EL QUE SE PLASMEN TODAS LAS MODIFICACIONES Y ADECUACIONES AL PROYECTO ORIGINAL PROPORCIONADO A **"EL CONTRATISTA"** PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, TODO DEBIDAMENTE JUSTIFICADO Y CON LOS APOYOS NECESARIOS PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN POR PARTE DE **A "LA SECRETARÍA".**

"LA SECRETARÍA" NO ESTARÁ OBLIGADA A DAR TRÁMITE A LAS SOLICITUDES O DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTE SI **"EL CONTRATISTA"** NO CUMPLIESE CON LA ENTREGA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN ESTA CLÁUSULA.

VIGÉSIMA: FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** EN ESTE CONTRATO, SE DEBERÁ ELABORAR EL **FINIQUITO DE OBRA** CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS.

"LA SECRETARÍA" DEBERÁ NOTIFICAR POR OFICIO A **"EL CONTRATISTA"** LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL FINIQUITO; **"EL CONTRATISTA"** TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE ACUDIR AL LLAMADO QUE SE LE HAGA MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO.

EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERÁ REUNIR COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTÍCULO 170 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS EL FINIQUITO DEBERÁ SER ELABORADO POR **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, HACIÉNDOSE CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE, DEBIENDO EXPONER, EN SU CASO, LAS RAZONES DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, **"EL CONTRATISTA"** NO ACUDA CON **"LA SECRETARÍA"** PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL TÉRMINO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR POR OFICIO SU RESULTADO A **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DEL TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE SU

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A **"EL CONTRATISTA"**, ÉSTE TENDRÁ EL TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA; SI TRANSCURRIDO ESTE TÉRMINO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO.

SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE **"EL CONTRATISTA"**, **"LA SECRETARÍA"** DEBERÁ LIQUIDARLOS DENTRO DEL TÉRMINO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES. SI RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE **"LA SECRETARÍA"** EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRÁ DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES ÉSTOS, DEBERÁ EXIGIRSE POR OFICIO SU REINTEGRO, MÁS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"LA SECRETARÍA"**, EN CASO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO, **"LA SECRETARÍA"** PODRÁ HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES. EN FORMA SIMULTÁNEA, SE LEVANTARÁ EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DÉ POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** EN ESTE CONTRATO, LA QUE DEBERÁ REUNIR COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS SEÑALADOS POR EL ARTÍCULO 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA LIQUIDACIÓN DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO PODRÁ UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** EN ESTE CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR ÚNICAMENTE UNA MANIFESTACIÓN DE **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE TENDRÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN. AL NO SER FACTIBLE EL PAGO EN EL TÉRMINO INDICADO, SE PROCEDERÁ A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA, QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** EN ESTE CONTRATO.

VIGÉSIMA PRIMERA: OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS.

"EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

- **EL 0.005** (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN PARA CUMPLIR CON EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, LO ANTERIOR, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

- **EL 0.005** (CINCO AL MILLAR) PARA LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES AFILIADAS A LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO DE FECHA **02 DE MAYO DE 2022**, CELEBRADO POR LA MENCIONADA CÁMARA Y EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN CON **"LA**

SECRETARÍA", CON EL OBJETO DE APOYAR LA CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

VIGÉSIMA SEGUNDA: JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES.

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CON SEDE EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, POR LO TANTO, **"EL CONTRATISTA"** RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LEÍDO POR LAS PARTES QUE EN ÉL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS FOJAS ÚTILES EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO, EL DÍA **${contrato_fecha_firma_dia} DE ${contrato_fecha_firma_mes} DEL ${contrato_fecha_firma_ano}.**

POR "LA SECRETARÍA".

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"EL CONTRATISTA".


${representante_tecnico_nombre}
${datRe_empresaNom}

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco


FIANZA CUMPLIMIENTO


FIANZA OTORGADA A FAVOR DE LA **SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS** DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. GARANTIZAR POR EL CONTRATISTA _____, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN: _____ _____ Y R.F.C. _____., LA CANTIDAD DE $_____ (_____) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO _____, DE FECHA ___ DE _____ DE 200___, CON IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $_____ (_____) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CUYO OBJETO ES _____ _____, CELEBRADO POR LA **SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO**. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, Y ESTARÁ VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS CUANDO ASÍ SE HAYA CONVENIDO, Y EN SU CASO, HASTA QUE SE SUSTITUYA POR OTRA EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 92 DE SU REGLAMENTO. LA COMPAÑÍA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN MÁS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ÉSTA FIANZA SE SUBSTITUIRÁ POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y MODIFICACIONES CONTRACTUALES, SI LAS HUBIERE; D).- EN EL CASO DE QUE LA **SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS** DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO OTORGUE PRÓRROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA, DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA FIANZA, LA QUE CONTINUARA VIGENTE HASTA LA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y SEA SUBSTITUIDA POR PARTE DEL CONTRATISTA POR LA FIANZA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; E).- LA FIANZA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y EN CONSECUENCIA LA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.; F).- LA FIANZA SE HARÁ EFECTIVA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA AL CONTRATISTA LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO; G).- ÉSTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O DE LA SECETARIA DE DESARROLLO URBABNO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; H).- LA FIANZA SE LIBERARÁ CUANDO EL


CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, HAGA PAGO TOTAL Y EN FORMA INCONDICIONAL DE LOS SALDOS QUE RESULTEN A SU CARGO EN EL FINIQUITO, CONSTITUYA Y ENTREGUE, PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, FIANZA QUE GARANTICE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA **SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO**, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO b) DEL ARTÍCULO 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERÁ LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ÉSTA CONTINUARÁ VIGENTE; Y, I).- LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE ÉSTA PÓLIZA DE FIANZA. =FIN DE TEXTO=

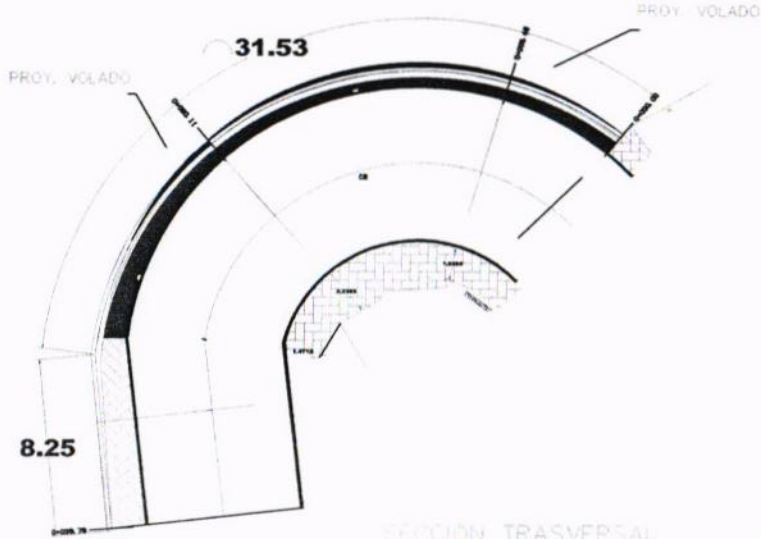


SECCION TRASVERSAL








DETALLE A

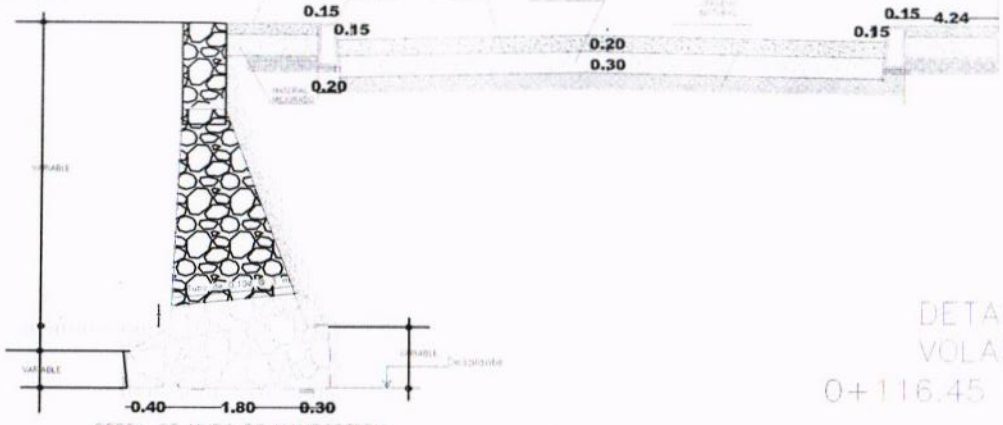

PERFIL DE MURO DE MAMPOSTERIA


BANQUETA
VIALIDAD

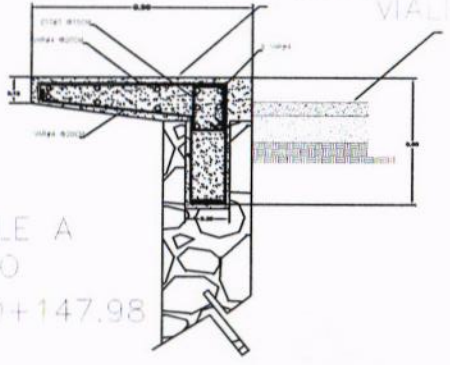

DETALLE A
VOLADO
0+116.45 0+147.98

0001697

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS





SIMBOLOGIA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

NOMBRE DE LA OBRA:
PAVIMENTACIÓN INTEGRAL DE CALLE FELIPE II

UBICACIÓN:
FRACC. FARALLON DEL OBISPO

CLAVE DEL PLANO:
A-3

NOMBRE DE PLANO:
PLANTA Y SECCIONES DE CURVA

ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO., 25 DE JULIO DEL 2023.

ACTA DE VISITA

Nº	ACCIÓN / OBRA	LICITACION PUBLICA (ESTATAL)
1	Rehabilitación de Calle Felipe II, Tramo Farallón Av. Universidad, Fracc. Magallanes, Acapulco De Juárez, Guerrero.	41066004-016-2023

Nº	NOMBRE DE LA EMPRESA	REPRESENTANTE	FIRMA	HORA
1	IMEXA CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	VICENTE ALARCON SEVERIANO		9:35
2	SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRAS A Y A S.A DE C.V.	LUIS ANTONIO AGUICERA BARRIENTOS		9:37
3	ALEXARDER CASTILLO LOPEZ	ARQ. BENJAMIN SOLIS HERRERIA		9:40

ARQ. OPIEL SALMERON J.
RESIDENTE

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

MODALIDAD	LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL	
Nº	**ACCIÓN / OBRA**	**LICITACION PUBLICA ESTATAL**
1	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.	41066004-016-2023

LUGAR Y FECHA: **Acapulco de Juárez, Guerrero a 26 de julio del 2023.**

Acta que se formula, siendo las **10:00** horas en el lugar y fecha citados, correspondiente a la junta convocada por el H. Ayuntamiento de Acapulco, en relación con la invitación y obra cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en **las Bases de Licitación, cláusula Decima Octava, visita al sitio de los trabajos de la obra pública y junta(s) de aclaraciones**, con el objeto de que los licitantes soliciten aclaraciones o modificaciones a las bases, sus anexos y a las cláusulas del modelo de contrato, a las cuales dará respuesta por parte de la convocante, y así mismo, se determinen los datos relevantes de la visita al sitio de realización de los trabajos.

Se reunieron en la sala de juntas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Acapulco los licitantes o sus representantes legales, invitados y servidores públicos de la convocante, cuya asistencia se enlistan y firman al finalizar la junta, una vez de hacer las aclaraciones necesarias.

PREGUNTAS:

SIN PREGUNTAS

NOTAS ACLARATORIAS:

LA INTEGRACION DE SU PROPUESTA SE DEBERA APEGAR AL CATALOGO DE CONCEPTOS PROPORCIONADO.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA INCISO I) DICE:

LOS LICITANTES DEBERÁN ESTAR REGISTRADOS EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL ESTADO DE GUERRERO; DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS NÚMERO 31 Y 34 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266., DEBERÁN PRESENTAR LA CONSTANCIA DEL REGISTRO O REFRENDO ACTUALIZADA.

PARA EFECTOS DE ESTA LICITACION, POR MOTIVOS DE DESFASAMIENTO DE ENTREGAS DE REGISTRO O REFRENDOS ACTUALIZADOS DEL PADRON DE CONTRATISTAS DEL ESTADO DE GUERRERO, **SE ACEPTARÁ TAMBIEN EL PADRON ANTERIOR, MAS EL ACUSE DE QUE REALIZO EL TRAMITE EN TIEMPO Y FORMA PARA SU REGISTRO DEL PRESENTE AÑO Y EN SU CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACION OFICIO DE QUE ESTA EN TREMITE DICHO REGISTRO.**

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

MODALIDAD	LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL	
Nº	**ACCIÓN / OBRA**	**LICITACION PUBLICA ESTATAL**
1	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.	41066004-016-2023

LUGAR Y FECHA: **Acapulco de Juárez, Guerrero a 26 de julio del 2023.**

POR LOS LICITANTES, FUNCIONARIOS E INVITADOS REPRESENTANTES.

No.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIO, RAZÓN SOCIAL O ÁREA RESPONSABLE A LA QUE PERTENECE	FIRMAS
1	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ SUPERVISOR DE OBRA DEL AREA URBANA	
2	ARQ. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES	

No.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE Y RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA	FIRMAS
1	DESARROLLOS TOAN, S.A. DE C.V. ARQ. JUAN DAVID SALMERON GAVILAN	
2	C. ALEXANDER CASTILLO LOPEZ	
3	IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. C. VICENTE ALARCON SEVERIANO	
4	SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRAS A Y A, S.A. DE C.V. C.LUIS ANTONIO AGUILERA BARRIENTOS	

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2021-2024

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION PUBLICA (ESTATAL)
No. _____

000140

ANEXO AE 13 CARTA COMPROMISO.

(GUÍA DE LLENADO)

A). -TEXTO

LUGAR Y FECHA:	Ciudad y el día de la presentación de la propuesta
PERSONA QUE SUSCRIBE LA INVITACIÓN:	Ing. LUZ MARIA MERAZA RADILLA. Secretario de la S.D.U.O.P.
LICITACION No:	El número que corresponde
DE FECHA:	Fecha de publicación de la Invitación
LICITACION No.:	La clave que le corresponda.
RELATIVA A LOS TRABAJOS:	Se especificará el nombre de la obra.
REPRESENTANTE LEGAL DE:	Nombre de la Licitante.
IMPORTE TOTAL $:	Cantidad con número y letra de la oferta presentada.
PLAZO DE EJECUCION:	Con número la cantidad de días naturales por emplearse.
ATENTAMENTE:	Firma del Representante Legal de la Licitante

NOTA IMPORTANTE: LA REDACCIÓN DE LA CARTA COMPROMISO DEBERÁ TRANSCRIBIRSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION PUBLICA (ESTATAL)
No. _____

000141

ANEXO AE 13 CARTA COMPROMISO.

(GUÍA DE LLENADO)

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**DOCUMENTO** **AE-13**

CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION

LUGAR Y FECHA:

PERSONA QUE SUSCRIBE LA LICITACIÓN:

_____

P R E S E N T E .

Me refiero a la convocatoria No.___ de fecha _____, mediante la cual se invita a participar en la Licitación Pública Estatal No. _____ relativa a los trabajos: _____ _____.

Sobre el particular, por mi propio derecho en su caso o como representante legal de: _____ _____ manifiesto a usted lo siguiente:

Se han adquirido oportunamente las BASES DE LA LICITACION, relativas a la preparación e integración de la proposición para la celebración de la LICITACION de que se trata; enterados de su contenido y aceptadas íntegramente. Para tal efecto se presenta nuestra proposición firmada, en apego a las INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.

Igualmente expongo que se han tomado las providencias indicadas en las BASES y que hemos tenido la debida participación de lo tratado, aceptando lo asentado tanto en la(s) acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones, como de la(s) aclaración(es) complementaria(s) que se ha(n) generado al respecto, así también declaro que mi representada posee y conoce toda la información adicional proporcionada por LA S.D.U.O.P. como complemento de la documentación inicial que se recibió.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios del Estado de Guerrero No. 266, así como las disposiciones administrativas expedidas en la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley, aceptándose en lo conducente a la LICITACIÓN correspondiente y demás actos que de ella se deriven.

De conformidad con lo anterior, se presenta la siguiente proposición con un importe total de: $ _____ (_____ pesos 00/100 M. N.) sin incluir el importe al valor agregado, cuyo desglose y resumen aparecen en el "Catálogo de Conceptos" del Documento AE-12 siendo el plazo de ejecución de ____ días naturales contados a partir del aviso de iniciación de trabajos que LA S.D.U.O.P. dé por escrito al CONTRATISTA.

Por último, se manifiesta que esta proposición se presenta según se estipula en las BASES cuya documentación esta completa.

A T E N T A M E N T E

CONTRATO No. ${contrato_num}

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO **${contrato_num},** RELATIVO A LA OBRA: **${obra_nombre}** UBICADA EN **${obra_ubicacion}**, GUERRERO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, **LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ**, GUERRERO A QUIEN SE DENOMINARÁ **"LA SECRETARÍA"**, REPRESENTADA POR EL **C. ING. ARQ. ARMANDO JAVIER SALINAS,** EN SU CARÁCTER DE **SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS**, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO., Y POR LA OTRA **${datRe_empresaNom}** REPRESENTADA POR C. **${representante_tecnico_nombre}, CON NÚMERO DE REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS ${datRe_folioOper},** EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL A QUIEN SE DENOMINARÁ **"EL CONTRATISTA"** DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

I.- DECLARA "LA SECRETARÍA" MEDIANTE SUS REPRESENTANTES.

1.- QUE EN TÉRMINO DE LO PREVISTO POR EL **ARTÍCULO 115 FRACCIONES I, II Y III A), D), E), F), G), H), I), Y IV), B), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS** Y ARTÍCULO 3 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO, ES UN MUNICIPIO GOBERNADO POR UN AYUNTAMIENTO DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA, INVESTIDO DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CON LIBRE ADMINISTRACIÓN DE SU HACIENDA, RECURSOS Y SERVICIOS DESTINADOS A LA COMUNIDAD, SIN MÁS LÍMITES QUE LOS SEÑALADOS EXPRESAMENTE EN LAS LEYES APLICABLES.

1.1.- **QUE CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 170 NUMERAL 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO**; 26, 29, 30, 31 DEL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO, Y; 2 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, EL AYUNTAMIENTO ES EL ÓRGANO DE GOBIERNO A CUYA DECISIÓN SE SOMETEN LOS ASUNTOS DE LA VIDA PÚBLICA MUNICIPAL Y LOS DE SU PROPIA ADMINISTRACIÓN QUE LAS LEYES PREVÉN, ASÍ COMO LA DE EJERCER VIGILANCIA DIRECTA DE LOS ACTOS DE SUS MIEMBROS EN TODO MOMENTO, CUYAS FACULTADES DE EJECUCIÓN ESTÁN DEPOSITADAS EN EL PRESIDENTE MUNICIPAL.

1.2.- QUE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 29 FRACCIONES I, V, Y VII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO EN VIGOR, TUVO A BIEN DESIGNAR COMO **SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS A EL C. ING. ARQ. ARMANDO JAVIER SALINAS,** Y POR ENDE, TIENE LA FACULTAD Y REPRESENTACIÓN LEGAL PARA CELEBRAR CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SUS SERVICIOS A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 72 Y 73 FRACCIONES IX Y X DE LA LEY ORGÁNICA INVOCADA EN RELACIÓN CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS **27 FRACCIONES XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXVIII, Y 28 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO**, Y SUS DEMÁS DISPOSICIONES, EN VIRTUD DE QUE **"LA SECRETARÍA"**, ES LA ENTIDAD MUNICIPAL ENCARGADA DE ORDENAR LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS, REGULAR EL DESARROLLO URBANO, ASÍ COMO CONDUCIR,

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

NORMAR, PROYECTAR Y EJECUTAR LAS OBRAS PÚBLICAS, INSERTAS EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES EN LA MATERIA.

1.3.- SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, EL UBICADO EN LA AV. CUAUHTÉMOC S/N INTERIOR PARQUE PAPAGAYO, COL. HORNOS INSURGENTES, ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. C. P. 39350.

1.4.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SE AUTORIZÓ LA INVERSIÓN MEDIANTE EL **${contrato_autoris_inversion}.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 AUTORIZADO MEDIANTE EL OFICIO ${contrato_oficio} DE FECHA ${contrato_fecha_dia} DE ${contrato_fecha_mes} DEL ${contrato_fecha_ano},** CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE A SU VEZ SE HAYA INCLUIDO EN EL PROGRAMA DE OBRAS PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2019.

1.5.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICÓ A **"EL CONTRATISTA"** PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS A QUE SE DESTINA LA INVERSIÓN AUTORIZADA QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACIÓN 1.4, A TRAVÉS DE **LICITACION PUBLICA ESTATAL, O TAL** COMO LO SEÑALA **LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 EN SU ARTÍCULO 39 FRACCIÓN II.**

2. "EL CONTRATISTA" DECLARA:

2.1.- ACREDITAR LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO **${datRe_escRegPub} DE FECHA ${datRe_escFechaActa_dia} DE ${datRe_escFechaActa_mes} DEL ${datRe_escFechaActa_ano},** OTORGADA ANTE LA FE DEL **${datRe_escLicenciado},** CON REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO **${datRe_escFechaReg_dia} DE ${datRe_escFechaReg_mes} DEL ${datRe_escFechaReg_ano}.**

2.2.- EL C. **${representante_tecnico_nombre},** QUIEN SE IDENTIFICA CON **CREDENCIAL DE ELECTOR**, ACREDITA SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO **${datRe_escRegPub} DE ${datRe_escFechaActa_dia} DE ${datRe_escFechaActa_mes} DEL ${datRe_escFechaActa_ano}** OTORGADA ANTE LA FE DEL **${datRe_escLicenciado},** INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, BAJO EL FOLIO **${datRe_escFechaReg_dia} DE ${datRe_escFechaReg_mes} DEL ${datRe_escFechaReg_ano},** MANDATO QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO NI REVOCADO, LO QUE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

2.3.- TENER ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN **${datRe_empresaDireccion},** MISMO QUE SEÑALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

2.4.- QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

2.5.- QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, SE OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

2.6.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE, CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO

POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO BAJO PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

2.7.- QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACIÓN, LOS CUALES ESTÁN VIGENTES.

- REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO NO. **${datRe_empresaRFC}.**

- REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ N°. **${datRe_folioOper}.**

- REGISTRO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL E INSTITUTO DEL FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES NO. **${datRe_empresaIMSS}.**

2.8.- QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NINGUNA DE LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE ESTA SOCIEDAD DESEMPEÑA ALGÚN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO, ASÍ COMO QUE NO TIENE IMPEDIMENTO LEGAL ALGUNO QUE LE IMPOSIBILITE A OBLIGARSE EN TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO.

2.9.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN **LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, Y EL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**, ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS APLICABLES Y ANEXOS.

2.10.- CONOCER EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, Y CONSECUENTEMENTE, HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN.

3. AMBAS PARTES DECLARAN:

3.1.- SUJETARSE ESTRICTAMENTE A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO; ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE **LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 Y EL REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.** ASÍ COMO EL MANUAL ÚNICO DE OPERACIÓN DEL RAMO **(XXXIII, VARIA DEPENDIENDO EL RAMO).**

3.2.- QUE EL PRESENTE CONTRATO, SUS ANEXOS Y LA BITÁCORA DE LOS TRABAJOS, SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

3.3.- CONOCER EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 Y EL REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y, EN GENERAL, TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES Y DEFINICIONES ANTERIORES, SUSCRIBEN DE CONFORMIDAD LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

"LA SECRETARÍA" ENCOMIENDA A **"EL CONTRATISTA"** LA REALIZACIÓN DE LA OBRA CONSISTENTE EN: **${obra_nombre},** UBICADA EN **${obra_ubicacion},** DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN LA DECLARACIÓN 3.3 DE ESTE CONTRATO Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO; SIENDO **"EL CONTRATISTA"** RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y QUE ÉSTOS CUMPLAN CON TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR **"LA SECRETARÍA",** COMO SON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO SI SE INSERTASEN A LA LETRA COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS, PROYECTOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES A QUE SE ALUDE EN ESTA CLÁUSULA, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS OTORGANTES, COMO ANEXOS, PASARÁN A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

QUEDA ENTENDIDO POR LAS PARTES QUE LA BITÁCORA QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, FORMARÁ PARTE DEL MISMO Y SU USO SERÁ OBLIGATORIO. DE IGUAL FORMA, QUEDA PACTADO QUE EL ACTA ADMINISTRATIVA A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE INSTRUMENTO, PASARÁ A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL MISMO

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA CUYA EJECUCIÓN SE CONTRATA ES POR LA CANTIDAD DE: **$${contrato_subtotal_F} (${contrato_subtotal_letras}),** MÁS IMPUESTO AL VALOR AGREGADO **$${contrato_iva_F} (${contrato_iva_letras})**, CONSECUENTEMENTE EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO RESULTA DE **$${contrato_total_F} (${contrato_total_letras}),** DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO DE OBRA PRESENTADO POR **"EL CONTRATISTA"**.

EL MONTO TOTAL DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO CUBRE A **"EL CONTRATISTA"** TODAS LAS PRESTACIONES, GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA MISMA, INCLUYENDO LOS IMPUESTOS O DERECHOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE SE CAUSEN, SIENDO IMPROCEDENTE EL INCREMENTO AL PRECIO DE OPERACIÓN ESTABLECIDO.

"LA SECRETARÍA" LLEVARÁ A CABO LAS RETENCIONES FISCALES CORRESPONDIENTES, QUE SE ORIGINEN POR CONCEPTO DE LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN.

EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ES DE **${plazo} DIAS** NATURALES, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA **${contrato_fecha_inicio_dia} DE ${contrato_fecha_inicio_mes} DEL ${contrato_fecha_inicio_ano}** Y A TERMINARLOS A MÁS TARDAR EL DÍA **${contrato_fecha_fin_dia} DE ${contrato_fecha_fin_mes} DEL ${contrato_fecha_fin_ano},** DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA PRESENTADO POR **"EL CONTRATISTA"**. TODOS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN ESTE CONTRATO SE ENTENDERÁN COMO DÍAS CALENDARIO, COMPRENDIENDO AQUELLOS QUE SEGÚN LA LEY SEAN INHÁBILES PERO CUANDO UN PLAZO TERMINE EN UN DÍA INHÁBIL, CONCLUIRÁ A LAS 24 HORAS DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE.

ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO QUE EL DÍA DE INICIO DE LOS TRABAJOS LA **RESIDENCIA**, HAGA LA APERTURA A LA BITÁCORA DE OBRA, INSTRUMENTO EN EL QUE DEBERÁN REFERIRSE LOS ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y POR MEDIO DE EL DAR INSTRUCCIONES Y RECIBIR SOLICITUDES QUE SE FORMULEN ENTRE **LA RESIDENCIA Y LA SUPERINTENDENCIA**, EL USO DE LA BITÁCORA SE REGIRÁ CONFORME AL CAPÍTULO IV FRACCIÓN II, ARTÍCULOS 122, 123, 124 Y 125 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

"LA SECRETARÍA" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE **"EL CONTRATISTA"**, PREVIAMENTE A LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO; EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. EL DIFERIMIENTO SE CONSIGNARÁ EN EL CONVENIO QUE PARA TAL EFECTO CELEBREN LAS PARTES.

ASÍ MISMO, **"EL SECRETARIA"**, DEBERÁ TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS, ASÍ COMO LA PROPIEDAD O LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE VÍA Y EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES SOBRE LOS CUALES SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PREVISTAS POR LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERA PARA LA INICIACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS AMPARADOS POR EL PRESENTE CONTRATO.

QUINTA: ANTICIPO, PORCENTAJE, AMORTIZACIÓN Y COMPROBACIÓN.

PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, INICIO DE TRABAJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES, TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES DE INSTALACIÓN PERMANENTE Y DEMÁS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, **"LA SECRETARÍA"** NO **OTORGARA ANTICIPIO** AL CONTRATO.

SEXTA: FORMA DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, QUE ABARCARÁN PERIODOS NO MAYOR DE UN MES CALENDARIO Y SERÁN PRESENTADAS POR **"EL CONTRATISTA"** A LA RESIDENCIA, DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE CORRESPONDIENTE, CONTANDO CON UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN A LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN PARA QUE **"LA SECRETARÍA"**, INICIE SU TRÁMITE DE PAGO.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

EL RESIDENTE DE OBRA EFECTUARÁ LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE QUINCE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTE DE COSTOS POR PARTE DE **"LA SECRETARÍA",** ÉSTA A SOLICITUD DE **"EL CONTRATISTA"** Y DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, PAGARÁ GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"EL CONTRATISTA".**

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO **"EL CONTRATISTA",** ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "LA DEPENDENCIA".

NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"** SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁN COMO ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE **"LA SECRETARÍA."** TENDRÁ EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

SI **"EL CONTRATISTA"** REALIZA TRABAJOS EXCEDENTES O EXTRAORDINARIOS, SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE PARTE DE LA **"LA RESIDENCIA"**, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI LA MODIFICACIÓN ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ÉSTOS O POR SU PRESENTACIÓN INCORRECTA O EXTEMPORÁNEA, NO SERÁ MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS.

SÉPTIMA: LUGAR DE PAGO:

VÍA ELECTRÓNICA, MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA.

OCTAVA: GARANTÍAS.

A) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE HABER RECIBIDO LA CARTA DE ADJUDICACIÓN A CONSTITUIR UNA FIANZA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, MISMA QUE ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"**, Y ÉSTE HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FINIQUITO, **"LA SECRETARÍA"** DEBERÁ LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA; EN CASO CONTRARIO, **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS.

C) GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, **"EL CONTRATISTA"** MEDIANTE FIANZA EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO MAS I.V.A. EXPEDIDA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN CONTRAVENCIÓN AL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS DATOS DEL PROYECTO ANEXO A ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN **EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266; 89, 94, 95, 96, 97 Y 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SUS DEMÁS APLICABLES EN LA LEY.**

LA PÓLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS QUE.

a) LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD;

b) LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS;

c) CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN MÁS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUBSTITUIRÁ EN EL O LOS SIGUIENTES EJERCICIOS POR OTRO U OTRAS EQUIVALENTES AL IMPORTE DE LOS TRABAJOS FALTANTES POR EJECUTAR, ACTUALIZANDO LOS IMPORTES DE ACUERDO CON LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS Y MODIFICACIONES CONVENIDAS SI LAS HUBIERE;

d) EN EL CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA Y PARA EL CASO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN O EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE

e) LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACIÓN DE **"LA SECRETARÍA"**.

f) ÉSTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DE **"EL CONTRATISTA"** O DE **"LA SECRETARÍA"**, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA;

g) QUE LA FIANZA SE OTORGA TAMBIÉN PARA GARANTIZAR LA CORRECCIÓN DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN QUE RESULTEN, DE LOS VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO **"EL CONTRATISTA"** CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

h) LA FIANZA SE CANCELARÁ CUANDO **"EL CONTRATISTA"** L CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE **"LA SECRETARÍA"**, SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERÁ LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ÉSTA CONTINUARÁ VIGENTE;

i) CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA Y ESTE EFECTUÉ LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, **"LA SECRETARÍA"**, DEBERÁ LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA, SIEMPRE Y CUANDO SEA PROCEDENTE EN LOS TÉRMINOS AQUÍ ESTIPULADOS

j) LA FIANZA CONTINUARA EN VIGOR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO ALGUNA RESPONSABILIDAD A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"** POR DEFECTOS DE LA OBRA, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO **"EL CONTRATISTA"**, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, **"EL CONTRATISTA"** GARANTIZA LOS MISMOS EN LOS TÉRMINOS DE LOS **ARTÍCULOS 77 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 Y 95 DEL REGLAMENTO**, POR LO QUE TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE) MESES, SIN QUE EXISTA RECLAMACIÓN ALGUNA POR PARTE DE **"LA SECRETARÍA"**, LA FIANZA QUEDARÁ CANCELADA, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE **"LA SECRETARÍA"**, PARA CANCELAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDOS A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"** LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE.

k) EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS POR PARTE DE **"EL CONTRATISTA"**, **"LA SECRETARÍA"** LO COMUNICARÁ DE INMEDIATO Y POR ESCRITO A LA AFIANZADORA A EFECTO DE QUE ÉSTA NO SEA CANCELADA Y NOTIFICARA POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ÉSTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, TRANSCURRIDO ÉSTE TÉRMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO, **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA ESTA FIANZA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO AL CONTRATISTA LA RESOLUCIÓN DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. SI LA CORRECCIÓN O REPOSICIÓN REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, **"EL**

CONTRATISTA" Y **"LA SECRETARÍA"**, PODRÁN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE ESTA PÓLIZA DE FIANZA;

l) LA FIANZA SE HARÁ EFECTIVA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA AL CONTRATISTA LA RESOLUCIÓN DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO;

m) LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 279, 280 281 Y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR, OTORGANDO LA AFIANZADORA EL CONSENTIMIENTO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 179 DEL CITADO ORDENAMIENTO

SI **"EL CONTRATISTA"** NO PRESENTARA LAS GARANTÍAS EN LA FORMA Y TÉRMINOS SEÑALADOS, **"LA SECRETARÍA"** PODRÁ DETERMINAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

NOVENA: AJUSTE DE COSTOS.

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO Y AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE.

PARA OBTENER EL AJUSTE DE LOS PRECIOS UNITARIOS SE CONSIDERARAN LOS TÉRMINOS Y **PROCEDIMIENTOS DEL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266**, DE LA MANERA SIGUIENTES:

I. LA REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE;

II. LA REVISIÓN POR GRUPO DE PRECIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN CUANDO MENOS EL OCHENTA POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO; Y

III. EN CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE SE TENGA ESTABLECIDA LA PROPORCIÓN EN QUE INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO PODRÁ DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN DICHAS PROPORCIONES.

LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DESCRITOS SE SUJETARÁ A LO SIGUIENTE:

LOS AJUSTES SE CALCULARÁN A PARTIR DEL MES EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, CON RESPECTO AL PROGRAMA CONVENIDO. CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A **"EL CONTRATISTA"**, PROCEDERÁ EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO.

PARA EFECTOS DE CADA UNA DE LAS REVISIONES Y AJUSTE DE LOS COSTOS, QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL MES DE ORIGEN DE LOS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

PRECIOS SERÁ EL DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, APLICÁNDOSE EL ÚLTIMO FACTOR QUE SE HAYA AUTORIZADO.

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERÁN CALCULADOS CON BASE EN LOS ÍNDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR/ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE OBRAS PÚBLICAS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO. CUANDO LOS ÍNDICES QUE REQUIERAN TANTO **"EL CONTRATISTA"** COMO **"LA SECRETARÍA"**, NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO, **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A CALCULARLOS EN CONJUNTO CON **"EL CONTRATISTA"** CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN, POR MERCADEO DIRECTO O EN PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS NACIONALES O INTERNACIONALES CONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES DISTINTAS O UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE EXPIDA EL BANCO DE MÉXICO.

LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A AJUSTES DE ACUERDO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS QUE LE CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SUS PROPOSICIÓN.

SI TRANSCURRIDO DICHO PLAZO NO PROMOVIERA **"EL CONTRATISTA"** LA SOLICITUD SEÑALADA, PRELUCIRÁ PARA ÉSTE EL DERECHO PARA RECLAMAR EL AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE QUE SE TRATE Y DE REALIZARLO A LA BAJA POR PARTE DE **"LA SECRETARÍA"**.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DEL **"EL CONTRATISTA"**, DEBERÁ EMITIR POR OFICIO LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA. EN CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRÁ POR APROBADA.

CUANDO LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVA LOS AJUSTES DE COSTOS SEA DEFICIENTE O INCOMPLETA, **"LA SECRETARÍA"** APERCIBIRÁ POR ESCRITO A QUE **"EL CONTRATISTA"** PARA QUE, EN EL PLAZO DE DIEZ DÍAS HÁBILES A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACIÓN SOLICITADA. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO SIN QUE **"EL CONTRATISTA"** DIERA RESPUESTA AL APERCIBIMIENTO, O NO LO ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE TENDRÁ COMO NO PRESENTADA LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS.

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DEBERÁ CUBRIRSE POR PARTE DE **"LA SECRETARÍA"** A SOLICITUD DE **"EL CONTRATISTA"**, CONSIDERANDO EL ÚLTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUTORIZADO, EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A **"EL CONTRATISTA"**, PROCEDERÁ EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO.

UNA VEZ APLICADO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y DETERMINADOS LOS FACTORES DE AJUSTE, ÉSTOS SE APLICARÁN AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES GENERADAS, SIN QUE

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. **41066004-016-2023.**
REFERENTE A LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**

000171

AT-2 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. QUE EL LICITANTE PROPONE LLEVAR A CABO, TOMANDO COMO BASE TODOS LOS CONCEPTOS DEL CATALOGO, Y EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DESCRIBIENDO LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA Y DE MAQUINARIA Y EQUIPO A UTILIZAR

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01 CEL. 744 2354717 / 744 4490912 E-MAIL: mexa@telmexmail.com gno_0301@hotmail.com

ANEXO AT-2 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. QUE EL LICITANTE PROPONE LLEVAR A CABO, TOMANDO COMO BASE TODOS LOS CONCEPTOS DEL CATALOGO, Y EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DESCRIBIENDO LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA Y DE MAQUINARIA Y EQUIPO A UTILIZAR.

Acapulco de Juárez, Gro., a 03 de agosto de 2023.

Ing. Luz María Meraza Radilla.
Secretaría De Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
del Municipio De Acapulco De Juárez, Guerrero
Presente

Que en mi carácter de **Administrador Único**, de la empresa **IMEXA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.**, lo que se acredita en los términos del testimonio de la póliza número **1585**, de fecha **16 de diciembre de 2009**, otorgada ante la fe del Licenciado **SHUNASHI JAZMÍN ALTAMIRANO PINEDA** Corredor Público número 5, de la Ciudad de Acapulco, Gro., inscrita en el Registro Público de la Ciudad de Acapulco, Guerrero, en el folio número **10160*17**, con fecha **17 de febrero de 2010**, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal, número **41066004-016-2023**, de fecha **18 de julio de 2023**, relativa a los trabajos consistentes en **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**, respetuosamente presento a usted lo siguiente:

La planeación integral y el proceso constructivo de los trabajos a ejecutar para la construcción de la obra mencionada anteriormente.

En relación a las bases de la licitación Pública Estatal No. 41066004-016-2023, referentes a la obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.
LA OBRA SE INICIARÁ EL 14 DE AGOSTO DEL 2023 Y TENDRA UN PERIODO DE EJECUCION DE 90 DÍAS NATURALES.
PLANEACION INTEGRAL DE LA OBRA
SE INSTALARAN LAS OFICINAS CENTRALES LAS CUALES ESTARÁN EN COORDINACIÓN CON LA DEPENDENCIA A FIN DE LLEVAR A CABO TODO LO QUE SE RELACIONADO CON LA FIRMA DEL CONTRATO, ELABORACIÓN Y TRAMITE DE FIANZAS, COBRO DEL ANTICIPO, PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES, ACLARACIONES ADMINISTRATIVAS, ADQUISICIÓN Y COMPRA DE LOS INSUMOS QUE INTERVENGAN EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE CUIDAR LA BUENA RELACIÓN CON LA DEPENDENCIA CONTRATANTE PARA AGILIZAR CUALQUIER CAMBIO QUE SE PRESENTE COMO PUEDE SER CAMBIO DE PROYECTO, VOLUMETRÍAS EXCEDENTES EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CANCELACIÓN O CAMBIO DE CONCEPTOS DE CATÁLOGO, PRESENTACIÓN DE OFICIOS Y ESTIMACIONES, ASÍ COMO CUIDAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA AUTORIZADO. ESTA OFICINA CONTARA CON EL SIGUIENTE PERSONAL. DIRECTIVO: UN GERENTE GENERAL, JEFE DEL DEPARTAMENTO, DE COSTOS, ANALISTA DE COSTOS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, CONTADOR, AUXILIAR DE CONTADOR, SECRETARIA, VELADOR, CHOFER Y AUXILIAR DE LIMPIEZA.

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01
CEL. 744 2354717 / 744 4490912 E-MAIL: imexa@tolmexmail.com, gno_0301@hotmail.com

LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CAMPO

PARA LA BUENA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA TENDREMOS EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN LETRERO INFORMATIVO DE 1.50 MTS X 2.00 MTS. CON LA LEYENDA QUE OPORTUNAMENTE SE NOS PROPORCIONE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA, ASÍ MISMO SE HARÁ EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCIÓN EN OBRAS VIALES CON EL OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACIÓN DE VEHICULOS, SE TRABAJARA POR ALAS EN FORMA ALTERNADA COLOCANDO EL SEÑALAMIENTO RESPECTIVO, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS Y DE LA OBRA, DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN LA RESPONSABILIDAD RECAE EN EL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO QUE INTERVIENE EN CAMPO PUES LA IMPORTANCIA DE LA OBRA ASÍ LO REQUIERE Y ESTARÁ FORMADA CON EL SIGUIENTE PERSONAL CONTARA CON UN INGENIERO SUPERINTENDENTE Y UN RESIDENTE CON LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN LA REALIZACIÓN DE ESTE TIPO DE OBRA, ASÍ COMO UN INGENIERO AUXILIAR QUE SE ENCARGARA DE VIGILAR QUE SE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES QUE MARCA EL PROYECTO Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA EN TIEMPO Y CALIDAD, TODO EL PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO TENDRÁ LA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS ALTAMENTE NECESARIOS PARA LLEVAR A BUEN TÉRMINO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ MISMO CONTARA CON PERSONAL ADMINISTRATIVO EN OFICINAS DE CAMPO DICHO PERSONAL SERÁ: UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ALMACENISTA GENERAL, BODEGUERO, VELADOR, CHOFER, ESTOS SERÁN LOS ENCARGADOS DE CUIDAR QUE LOS MATERIALES NECESARIOS ESTÉN EN LA OBRA OPORTUNAMENTE, NUESTRA EMPRESA CONTARA CON LOS TRABAJADORES DE OFICIO Y TÉCNICOS QUE SE REQUIERAN PARA LA BUENA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL PERSONAL TÉCNICO DE ESTAS OFICINAS TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE ELABORAR Y CONCILIAR LOS NÚMEROS GENERADORES DE LAS VOLUMETRÍAS EJECUTADAS CON EL SUPERVISOR DE LA DEPENDENCIA ASÍ COMO ATENDER TODO CAMBIO DE CARÁCTER TÉCNICO QUE SE PRESENTE EN EL PROCESO DE ESTA, LLEVAR UN BUEN CONTROL DE LA BITÁCORA DE OBRA YA QUE ESTA NOS MARCARÁ TODA LA HISTORIA TÉCNICA DEL PROCESO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, UNA VEZ QUE ESTA OFICINA CONCILIO NÚMEROS GENERADORES LOS MANDARA A OFICINAS CENTRALES PARA QUE SE PROCEDA A LA ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y COBRO DE LA ESTIMACIÓN RESPECTIVA, LAS OFICINAS DE CAMPO, BODEGAS, EQUIPO Y MAQUINARIA PERMANECERÁN EN EL LUGAR DONDE SE REALICEN LOS TRABAJOS, HASTA QUE SE REALICE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS HASTA SU ENTREGA RECEPCIÓN.

PROCESO CONSTRUCTIVO

EN LO RELATIVO A LA CONSTRUCCION SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES PARTIDAS DE TRABAJO:

PRELIMINARES.

INICIAMOS CON LOS TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICAS DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, EL PROCESO DE REALIZAR EL TRAZO CONSISTE EN UBICAR Y DEFINIR EN EL TERRENO LOS EJES SEÑALADOS EN EL PLANO DE LA OBRA, ES DECIR EN ESTE PROCESO SE COMIENZA A PLASMAR EL PLANO DEL PROYECTO YA DIRECTAMENTE EN EL TERRENO SELECCIONADO PARA EL MISMO. A LA PAR SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE LA NIVELACIÓN, EL CUAL CONSISTE EN DETERMINAR LA DIFERENCIA DE ALTURAS ENTRE UN ORIGEN CONOCIDO (O BANCO DE NIVEL COMO SE LE CONOCE) Y VARIOS PUNTOS. EL LLEVAR A CABO CONJUNTAMENTE ESTE PROCESO NOS LLEVA A

OBTENER LAS REFERENCIAS NECESARIAS PARA UBICAR CON PRECISIÓN EL PROYECTO EN LA SUPERFICIE DEL TERRENO DE ACUERDO A LOS NIVELES Y DIMENSIONES DEFINIDOS. EXISTEN DOS FORMAS DE LLEVAR A CABO EL TRAZO Y LA NIVELACIÓN:
DE FORMA MANUAL: SI SE TRATA DE UNA SUPERFICIE DE TAMAÑO MENOR Y CUYAS DIMENSIONES NO SEAN MAYORES AL MARGEN DE ERROR ESTABLECIDO.
CON APARATOS DE PRECISIÓN: EN SUPERFICIES MAYORES Y CON DESNIVELES SENSIBLES QUE PUEDAN ESTAR EXPUESTAS A MÁRGENES DE ERROR CONSIDERABLES PARA LA PRECISIÓN DEL PROYECTO. PARA ESTE MÉTODO SE UTILIZAN EL NIVEL Y EL TRÁNSITO, CONTINUAMOS CON LAS DEMOLICIONES POR MEDIOS MECANICOS DE CARPETA ASFALTICA DE 5.00 A 10 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR, DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE SECCION 15X20X50 CM., ASI MISMO EL DESCORONAMIENTO DE MURO DE PIEDRA BRAZA DE 30 CMS. DE ANCHO, DE ACUERDO AL AVANCE FÍSICO DE LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN INICIAMOS CON EL RETIRO DEL MATERIAL DE DEMOLICIÓN REALIZANDO LA CARGA MECÁNICA CON USO DE RETROEXCAVADORA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A TIRO LIBRE, UNA VEZ CONCLUIDOS ESTOS TRABAJOS CONTINUAMOS CON LA PARTIDA DE ALBAÑILERIA.

ALBAÑILERIA
INICIAMOS CON LA EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, UNA VEZ QUE SE TIENE LA EXCAVACION PROCEDEMOS CON EL DESPLANTE DEL MURO DE PIEDRA DE LA REGION, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO COMUN, EL MURO DE CONTECION ES UNA ESTRUCTURA SOLIDA A BASE DE MAMPOSTERIA Y CEMENTO ARMADO QUE ESTA SUJETA A FLEXION POR TENER QUE SOPORTAR EMPUJES HORIZONTALES DE DIVERSOS MATERIALES, SOLIDOS, GRANULADOS Y LIQUIDOS.
EL OBJETIVO ES DETENER O REDUCIR EL EMPUJE HORIZONTAL DEBIDO A TIERRA, AGUA Y VIENTOS EN LAS VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE, FLUVIAL, OLEAJE, ALUDES Y EROSION EN LA RIBERAS.
COLOCACION DE DRENES PARA MURO DE MAMPOSTERÍA A BASE DE PVC 4" TIPO RÍGIDO, EL MURO DE CONTENCIÓN DEBERÁ TENER DRENES A DIFERENTES ALTURAS PARA EVITAR LA ACUMULACIÓN DE AGUA, ESTOS SERÁN COLOCADOS EN FUNCIÓN DE LA ALTURA DEL MURO Y PERMEABILIDAD DEL SUELO, EN LA PARTE POSTERIOR DEL MURO DE CONTENCIÓN SE COLOCARÁ UN FILTRO DE GRAVA Y/O RAJUELA DE PIEDRA DE 30 CMS. DE ESPESOR, PARA EVITAR EL TAPONAMIENTO DE LOS DRENES CON LA TIERRA, CONTINUAMOS CON EL ANCLAJE DE CASTILLO DE 20X15 CMS. 4 VAR. #4 Y ESTRIBOS DEL #2 A.C. 20 CMS. HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 50 CMS. CONCRETO F'C=200 KG/CM2, HABILITADO DE LA CADENA DE DESPLATE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, DE 15X20 CM, ARMADO CON 6 VARILLAS NO.4 Y ESTRIBOS NO. 2 A CADA 25 INCLUYE CIMBRA COMÚN, FINALMENTE PROCEDEMOS A LA COLOCACIÓN DE LOS RELLENOS TANTO MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MANO INCORPORANDO HUMEDAD EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR Y RELLENO CON MATERIAL INERTE DE BANCO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO INCORPORANDO HUMEDAD EN CAPAS DE 20 CMS, DE ESPESOR, POSTERIORMENTE SE HARÁ LA LOSA DE CONCRETO F´C= 250 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VAR. NO. 4 A CADA 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, PARA PASO PEATONAL, SEGÚN

PLANOS ESTRUCTURALES.

INSTALACIÓN HIDRÁULICA.
INICIAMOS CON LA EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II-A, EN SECO Y BARRETA DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, UNA VEZ REALIZADA LA EXCAVACIÓN A LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA NECESARIAS, NOS ASEGURAMOS QUE EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN SE ENCUENTRA EXENTO DE ELEMENTOS GRUESOS, SE DEBE RASANTEAR Y NIVELAR Y, EN CONDICIONES ESPECIALES COMO UN NIVEL FREÁTICO ALTO, SE DEBEN COLOCAR GEOTEXTILES, MATERIAL GRANULAR Y OTROS ELEMENTOS, EN ESTE CASO COLOCAREMOS UNA CAMA DE ARENA QUE SERVIRÁ DE APOYO A LA TUBERÍA PROCEDIENDO AL TENDIDO DE TUBERÍA DE PVC 3" CED RD-26 PARA LÍNEA DE AGUA POTABLE, ASÍ MISMO SE HARÁ EL ACOSTILLADO CON ARENA PARA PROTECCIÓN DE LA TUBERÍA, DANDO PASO A LA COLOCACIÓN DEL RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR.
EL MATERIAL UTILIZADO PARA EL RELLENO PARCIAL DEBE SITUARSE UNIFORMEMENTE EN LA ZANJA. HASTA UNA ALTURA DE 30 CM POR ENCIMA DE LA CLAVE DEL TUBO. SIEMPRE QUE EL TERRENO NATURAL TENGA LA CALIDAD ADECUADA, SE EMPLEARÁ EN EL RELLENO EL MISMO MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DEBIDAMENTE SELECCIONADO, EVITANDO LA CAÍDA DE PIEDRAS U OTROS OBJETOS QUE PUDIERAN DAÑAR AL GOLPEAR LOS TUBOS DURANTE EL VERTIDO. CUANDO LAS PRUEBAS DE PRESIÓN EN OBRA SEAN SATISFACTORIAS, SE PROCEDERÁ AL RELLENO DE LAS JUNTAS DESCUBIERTAS PARA COMPLETAR EL RELLENO DE LA ZONA DEL TUBO, CUIDANDO EL RELLENO Y RETACADO EN LOS RIÑONES DE MANERA QUE NO QUEDEN COQUERAS AL OBJETO DE QUE EL TUBO QUEDE PERFECTAMENTE APOYADO EN EL ÁNGULO DE APOYO PREVISTO EN PROYECTO. PARA TERMINAR EL RELLENO HASTA LA RASANTE DEL SUELO, SE PUEDEN UTILIZAR MATERIALES ORDINARIOS EN LOS QUE SE HAYAN ELIMINADO LOS TERRONES Y PIEDRAS GRUESAS. ESTE RELLENO SERÁ COMPLETADO POR CAPAS DE ALREDEDOR DE 30 CM DE ESPESOR, NIVELADAS Y CUIDADOSAMENTE APISONADAS, UTILIZANDO PISONES MECÁNICOS LIGEROS O PLACAS VIBRATORIAS LIGERAS.
SE PROCEDE CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LAS TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE CON TUBO DE CPVC DE 13 MM DE 6 MTS. DE LONGITUD, INCLUYE: VÁLVULA DE INSERCIÓN, ABRAZADERA DE 4", COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA DE CPVC 13 MM. Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA (BOTA) INCLUYE: LLAVE DE CUADRO ROSCABLE ½".

INSTALACIÓN SANITARIA.
EN ESTA PARTIDA AL IGUAL QUE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA SERÁN EJECUTADAS A LA PAR DONDE SE TIENE LA EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, UNA VEZ QUE SE TIENE UN AVANCE DEL 50% DE LA EXCAVACIÓN Y QUE EL FONDO DE LA CEPA ESTE AFINADO SE COLOCARA LA CAMA DE ARENA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA PROTECCIÓN DE LA MISMA, CONFORME SE VAYA AVANZANDO CON ESTOS TRABAJOS PROCEDEMOS CON LA INSTALACIÓN DE TUBO PVC SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO, SUMINISTRO DE TUBO DE PVC SANITARIO DE NORMA LISO DE 150 MM DE DIÁMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO PVC SANITRAIO DE 6"X45", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIÓN DE SERVICIO DE PVC DE 150 MM (6") DE DIÁMETRO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, TAMBIÉN SE INICIA CON LA CONSTRUCCIÓN DE POZO

DE VISITA DE FORMA CÓNICA DE 0.60 A 1.20 MTS. DE DIÁMETRO INTERIOR POR 1.50 MTS. DE ALTURA A BASE DE MAMPOSTERÍA, MURO DE TABIQUE DE 25 CMS. CON APLANADO ACABADO PULIDO, CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 0.40X0.60X0.60 MTS. A BASE DE TABICÓN 10X14X28, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO, DE TAL MANERA QUE DE ACUERDO AL AVANCE FÍSICO DE LOS TRABAJOS DE EXCAVACIONES, INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA SE REALIZARAN LOS RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR Y RELLENO CON MATERIAL INERTE DE BANCO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, UNA VEZ CONCLUIDOS LOS POZOS DE VISITA SE REALIZARÁ LA COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO ALTA RESISTENCIA ABIERTO O CERRADO DE 60 CM. DE DIÁMETRO.

TERRACERÍAS

UNA VEZ QUE SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS CONTINUAMOS CON LA EXCAVACIÓN DEL TERRENO NATURAL PARA DAR NIVEL DE SUB-RASANTE EN UNA CAPA DE 0.50 M. DE ESPESOR. CONSIDERA TODAS LAS OPERACIONES; EN EXCAVAR TODO LO NECESARIO DE ACUERDO CON EL PROYECTO GEOMÉTRICO; EN LA REMOCIÓN DE TODOS LOS MATERIALES QUE A JUICIO DEL INGENIERO NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DANDO A LA APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO II-A, POSTERIORMENTE TENEMOS EL AFINE Y COMPACTACIÓN DE SUB RASANTE AL 90% PROCTOR MÍNIMO, PARA DAR PASO A LA FORMACIÓN DE BASE DE 30 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO CON EQUIPO MECÁNICO INCLUYE VERTIDO, AFINE, COMPACTADO AL 95% PROCTOR, EL TRABAJO CONSISTE EN EFECTUAR TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA CONSTRUIR SOBRE LAS TERRACERÍAS O TERRENO NATURAL COMPACTADO UNA CAPA DE MATERIAL ESPECIFICADO (BASE) DE UN ESPESOR DE 30 CM COLOCADO EN LA LÍNEA Y ELEVACIÓN QUE SE MUESTRE EN LOS PLANOS. LA BASE DEBERÁ SER CONSTRUIDA CON MATERIAL PRODUCTO DEL BANCO.

EL MATERIAL UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS BASES DEBERÁ ESTAR LIBRE DE TRONCOS, RAMAS, ETC., Y EN GENERAL DE TODA MATERIA VEGETAL Y VALIDADOS POR EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA DEPENDENCIA. PARA EL EFECTO, LOS BANCOS DE PRÉSTAMO SERÁN FIJADOS POR EL CONTRATISTA CON LA ANUENCIA DEL SUPERVISOR Y DEL LABORATORIO. LA BASE DEBERÁ COMPACTARSE EN UNA CAPA DE 30 CM DE ESPESOR Y UNA COMPACTACIÓN NO MENOR DE 95% DE PESO VOLUMÉTRICO MÁXIMO OBTENIDO EN EL LABORATORIO MEDIANTE LA PRUEBA PROCTOR O PORTER.

PAVIMENTACIÓN.

PARA LA REALIZACION DE ESTA PARTIDA TENEMOS PRIMERAMENTA LA EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II-A, EN SECO Y BARRETA DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD QUE SERVIRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE F´C=200 KG/CM2 DE 20X15X40 CM. DE SECCIÓN, DEFINICION: LAS GUARNICIONES SON ELEMENTOS PARCIALMENTE ENTERRADOS, COMÚNMENTE DE CONCRETO HIDRÁULICOS O MAMPOSTERÍA, QUE SE EMPLEAN PRINCIPALMENTE PARA LIMITAR LAS BANQUETAS, FRANJAS SEPARADORAS CENTRALES, CAMELLONES O ISLETAS Y DELINEAR LA ORILLA DEL PAVIMENTO. LA EJECUCION: LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES,

CUMPLIRÁN CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS APLICABLES. PARAEL COLADO DE LAS GUARNICIONES SE UTILIZARÁN MOLDES RIGIDOS COLOCADOS SOBRE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE, CON LA SUFICIENTE RIGIDEZ PARA QUE NO SE DEFORMEN DURANTE LAS OPERACIONES DE VACIADO Y VIBRADO, AJUSTADO PERFECTAMENTE PARA EVITAR ESCURRIMIENTOS DE LECHADAS POR LAS JUNTAS. EL VACIADO DE CONCRETO HIDRAULICO SERA EN FORMA CONTINUA, TENDIENDOSE EN DOS CAPAS DE IGUAL ESPESOR. SI LA DEPENDENCIA NO INDICA OTRA COSA, LAS JUNTAS DE CONSTRUCCION Y DILATACION SE HARAN A CADA TRES (3) METROS DE DISTANCIA. POSTERIORMENTE TENEMOS LA COLOCACION DE RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, ASI MISMO SE HARA LA PREPARACION DEL TERRENO CON EL AFINE Y COMPACTACIÓN EN BANQUETA, ANDADORES Y PLAZA A MANO, QUE SERVIRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE F´C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, T.M.A. 3/4". UNA VEZ QUE TENGAMOS PREPARA LA BASE PARA RECIBIR EL CONCRETO PROCEDEMOS A LA COLOCACION DEL HULE NEGRO CALIBRE 600 ESTO EVITARA LA DESHIDRATACION DEL CONCRETO, DANDO PASO AL CONCRETO DONDE TENEMOS QUE EL CONCRETO HIDRÁULICO ES UNA COMBINACIÓN DE CEMENTO PORTLAND, AGREGADOS PÉTREOS, AGUA Y ADITIVOS, PARA FORMAR UNA MEZCLA MOLDEABLE QUE, AL FRAGUAR, FORME UN ELEMENTO RÍGIDO Y RESISTENTE. PARA SU EJECUCIÓN LOS MATERIALES A UTILIZAR PARA SU ELABORACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICOS, CUMPLIRÁN CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS.

LOS MATERIALES PÉTREOS, EL CEMENTO PORTLAND LOS ADITIVOS Y LAS FIBRAS QUE SE EMPLEAN EN LA ELABORACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, SE MEZCLARAN EN LAS PROPORCIONES NECESARIAS PARA PRODUCIR UN CONCRETO HOMOGÉNEO, CON RESISTENCIA F'C=300 KGCM2. POR LO TANTO, NUESTRO PAVIMENTO TIENE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS PAVIMENTO PREMEZCLADO F'C= 300 KG/CM2, T.A.M. 3/4" DE 20 CM. DE ESPESOR RESISTENCIA NORMAL, ACABADO A REGLA INCLUYE JUNTA CONSTRUCTIVA CON CHAFLAN DE 1/2", EN CADA JUNTA FRÍA (AL TERMINO DEL COLADO) SE PROCEDERÁ A COLOCAR 8 CONECTORES CON VARILLA DE 1/2" A CADA 60 CMS. 30-30 CMS., FIBRA MICROSINTETICA, CURADO CON CURACRETO, VIBRADO, DE ACUERDO AL AVANCE FÍSICO EN EL COLADO DEL PAVIMENTO SE TRABAJARA CON EL CORTE DE JUNTAS EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA MANUAL DE DISCO DIAMANTADO, ASÍ MISMO SE AVANZARA CON EL CALAFATEO EN LOSAS Y GUARNICIONES A BASE DE ASFALTO OXIDADO. ASÍ MISMO SE HARÁ LA COLOCACIÓN DE BARANDAL DE TUBO DE ACERO NEGRO DE 1 1/2" CON DIVISIÓN DE TUBO DE 1" CON POSTES DE 1 1/2" A CADA METRO SOLDADO A PLACA DE 1/2" DE 15X15 CMS. EMBUTIDA EN LOSA Y LA APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE AMARILLO TRÁFICO EN GUARNICIONES CON DESARROLLO DE 30.0 CM.

LUMINARIAS.

EN LA PARTIDA DE LUMINARIAS TENEMOS LA CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS AUXILIARES PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE 50X60X65MTS., A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28 CMS., CON 14 CMS. DE ESPESOR ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR F´C=100KG/CM2, MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/2"X3/16" CONCRETO F´C=200KG/CM2 EN TAPA Y FIJACIÓN DE MARCO, DRÉN DE GRAVA DE 20 CMS DE ESPESOR, ASI MIMO SE REALIZARÁ EL TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO 50 MM DE DIÁMETRO, CONECTANDO DE REGISTRO A REGISTRO.

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01
CEL. 744 2354717 / 744 4490912 E-MAIL: imexa@telmexmail.com, gno_0301@hotmail.com

ACARREOS Y LIMPIEZAS.
FINALMENTE, EN ESTA PARTIDA SE REALIZARÁ LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA TANTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMO MATERIAL DE DESPERDICIO DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS Y BASURA QUE HAYA EN LA OBRA, REALIZANDO LA CARGA MECÁNICA CON RETROEXCAVADORA Y EN CAMIÓN VOLTEO A TIRO LIBRE, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS; PROCEDIENDO A INFORMAR A LA SUPERVISION PARA QUE ESTE A SU VEZ PROGRAME LA VISITA Y SE LLEVE A CABO LA REVISION FISICA DE TODA LA OBRA, ASI MISMO SE ELABORARA EL FINIQUITO DE OBRA.

ATENTAMENTE

ING. IRINA SALGADO HERNÁNDEZ.
ADMINISTRADOR ÚNICO.

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01
CEL. 744 2354717 / 744 4490912 E-MAIL: imexa@telmexmail.com, gno_0301@hotmail.com

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. **41066004-016-2023.**
REFERENTE A LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**

000179

AT-3 ESCRITO DE PROPOSICIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, ANEXANDO **EL CURRÍCULO Y CEDULA PROFESIONAL DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES** TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCION DE LA OBRA, LOS QUE DEBERÁN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES, MISMOS QUE DEBERÁN ESTAR FIRMADOS POR LOS PROFESIONALES. SE CONSIDERARÁ COMO MANO DE OBRA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESPECIALISTAS, TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS NACIONALES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA DE NATURALEZA SIMILAR QUE SE REQUIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADA **POR PERSONAS DE NACIONALIDAD MEXICANA (SUS CURRICULAS DEBERÁN ANEXARSE CON FIRMA AUTÓGRAFA COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL DE NO SER A SI SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN).**

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01 CEL. 744 2354717 / 744 4490912 E-MAIL: [illegible], gno_0301@hotmail.com

ANEXO AT-3 ESCRITO DE PROPOSICIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, ANEXANDO EL CURRÍCULO, CEDULA PROFESIONAL Y CONTRATO DE TRABAJO DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA, LOS QUE DEBERÁN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES, MISMOS QUE DEBERÁN ESTAR FIRMADOS POR LOS PROFESIONALES, SE CONSIDERARÁ COMO MANO DE OBRA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESPECIALISTAS, TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS NACIONALES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA DE NATURALEZA SIMILAR QUE SE REQUIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADA POR PERSONAS DE NACIONALIDAD MEXICANA.

Acapulco de Juárez, Gro., a 03 de agosto de 2023.

Ing. Luz María Meraza Radilla.
Secretaría De Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
del Municipio De Acapulco De Juárez, Guerrero
Presente

Que en mi carácter de **Administrador Único**, de la empresa **IMEXA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.**, lo que se acredita en los términos del testimonio de la póliza número **1585**, de fecha **16 de diciembre de 2009**, otorgada ante la fe del Licenciado **SHUNASHI JAZMÍN ALTAMIRANO PINEDA** Corredor Público número 5, de la Ciudad de Acapulco, Gro., inscrita en el Registro Público de la Ciudad de Acapulco, Guerrero, en el folio número **10160*17**, con fecha **17 de febrero de 2010**, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal, número **41066004-016-2023**, de fecha **18 de julio de 2023**, relativa a los trabajos consistentes en **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Presento a usted la relación los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de la obra.

No.	Nombre	Profesión	Cargo propuesto
1.-	GENOVEVA MORALES ROMAN	ARQUITECTO	SUPERINTENDENTE
2.-	VICENTE ALARCON SEVERIANO	ARQUITECTO	RESIDENTE
3.-	MIGUEL ANGEL ROBLEDO VARGAS	ARQUITECTO	RESIDENTE
4.-	JOSE FRANCISCO ANDRES SANCHEZ	INGENIERO TOPOGRAFO GEODESTA	TOPOGRAFO O JEFE DE TOPOGRAFIA

ATENTAMENTE

ING. IRINA SALGADO HERNÁNDEZ.
ADMINISTRADOR ÚNICO.


000181

ORGANIGRAMA

Acapulco de Juárez, Gro., a 03 de agosto de 2023.

Ing. Luz María Meraza Radilla.
Secretaría De Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
del Municipio De Acapulco De Juárez, Guerrero
Presente

Que en mi carácter de **Administrador Único**, de la empresa **IMEXA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.**, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal, número **41066004-016-2023**, de fecha **18 de julio de 2023**, relativa a los trabajos consistentes en **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**, respetuosamente *respetuosamente plasmo el organigrama del personal técnico para el desarrollo de los trabajos, responsables de la ejecución de los trabajos objeto de la presente licitación.*

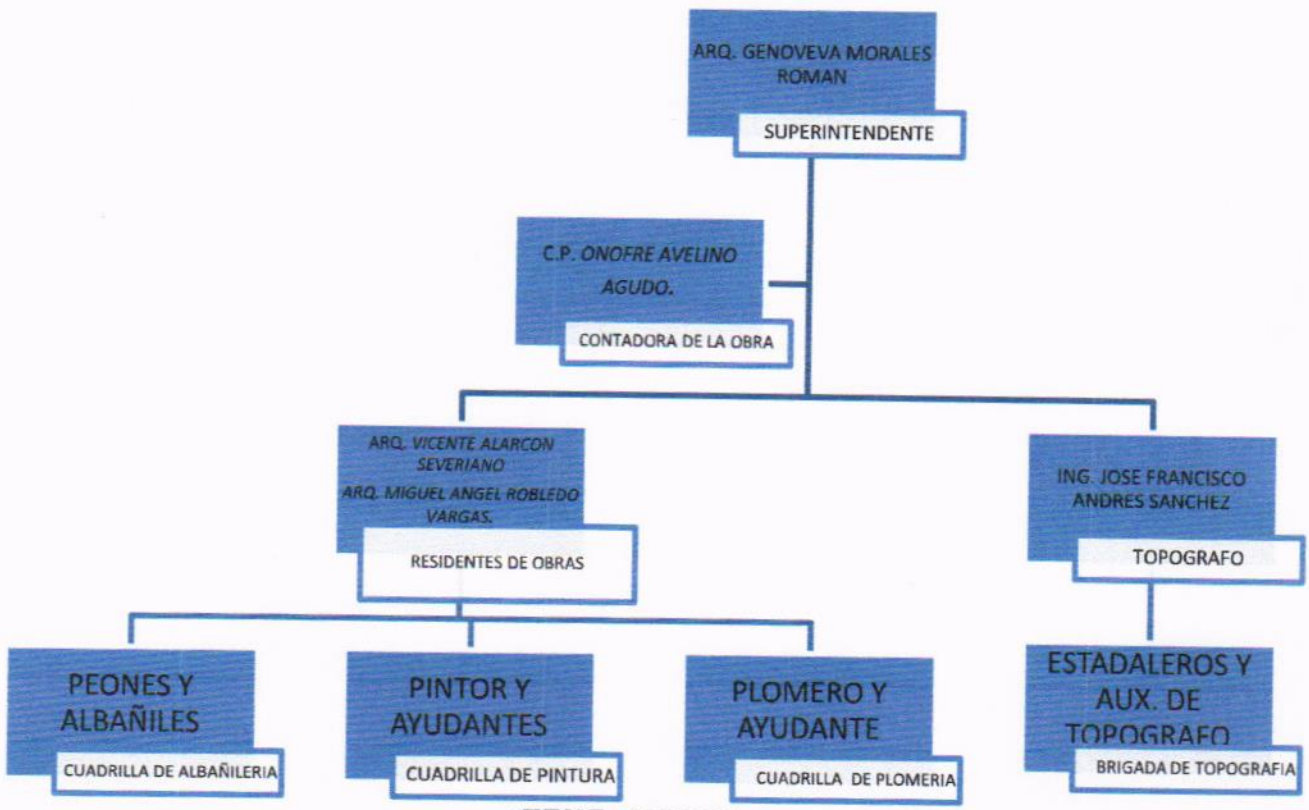

ATENTAMENTE

ING. IRINA SALGADO HERNÁNDEZ.
ADMINISTRADOR ÚNICO.

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01
CEL. 744 2354717 / 744 4490912 E-MAIL: imexa@telmexmail.com, gno_0301@hotmail.com

000182

Currículum vitae

ARQ. GENOVEVA MORALES ROMAN

000183

Currículum vitae

Arq. Genoveva Morales Román

Calle Corregidora No. 6
Col. El Mirador
C.P. 39550
Acapulco, Guerrero.

744-44 490912
gno_0301@hotmail.com

INFORMACION PERSONAL

FECHA DE NACIMIENTO:	**03 DE ENERO DE 1967**
LUGAR DE NACIMIENTO:	**ACAPULCO, DE JUAREZ, GRO.**
ESTADO CIVIL:	**CASADA**
R.F.C.:	**MORG 670103 SY3**
EDAD:	**54 AÑOS**

ESTUDIOS

1979-1982	**ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 1** **CERTIFICADO DE SECUNDARIA**
1982-1985	**ESC. PREPARATORIA JOSE VASCONCELOS** **CERTIFICADO DE PREPARATORIA**
1986-1991	**INSTITUTO TECNOLOGICO DE ACAPULCO** **LICENCIATURA EN ARQUITECTURA**
TITULO N°	**59766**
CEDULA N°	**2326937**
2007	**DIPLOMADO EN ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** **CURSO DE LEY DE OBRA PÚBLICA** **DIPLOMA POR LA C.M.I.C.**

Genoveva M. R.

EXPERIENCIA LABORAL

1992 PROYECTO Y CONSTRUCCION DE CASA HABITACION
CHILPANCINGO, GRO.
EL PEDREGOSO, ACAPULCO, GRO.

1993 INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS (ICA)
OBRA: PUENTE MEZCALA
PUESTO: AUXILIAR EN EL DEPTO. TECNICO
JEFE INMEDIATO: ING. MAURO A. LOPEZ AGUILAR

1994 DESARROLLO URBANO INTEGRAL S.A. DE C.V. (GMD)
ESTUDIO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL
PUERTO DE ACAPULCO
JEFE INMEDIATO: ING. ALFREDO MALDONADO DIAZ
OCT. DE 1993 A JUNIO DE 1994

1994 OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. (GMD)
OBRA: F-94-05
VIALIDAD AGUAS BLANCAS
JEFE INMEDIATO: ING. MARIO MARQUEZ MARTINEZ
JULIO DE 1994 A JUNIO DE 1996

1996 CONSTRUCTORA PANAC, S.A. DE C.V.
OBRA: VILLAS "LAUREL", CHILPANCINGO, GRO.
VILLAS "SAN RAFAEL", CHILPANCINGO, GRO.
VILLAS "LAS FLORES", CORDOBA VERACRUZ
CONDOMINIOS "VISTA ALEGRE", ACAPULCO, GRO.
CONDOMINIOS "CUMBRES I Y II", ACAPULCO, GRO.
JEFE INMEDIATO: LIC. HUMBERTO CAMACHO DOMINGUEZ
PUESTO: SUPERINTENDENTE DE OBRA

1998 INGENIERIA SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE "BAJA CALIFORNIA", ACAPULCO, GRO.
CONSTRUCCION DE PUENTE "BERNAL DIAZ", ACAPULCO, GRO. CONSTRUCCION DE PUENTE "DURANGO", ACAPULCO, GRO. CONSTRUCCION DE PUENTE "PALMA SOLA", ACAPULCO, GRO. CONSTRUCCION DE PUENTE "EL ZOPILOTE", HUAMUXTITLAN, GRO. CONSTRUCCION DE PUENTE "LAGUNILLAS", ZIHUATANEJO, GRO
PUESTO: JEFE DEL DEPTO. TECNICO
JEFE INMEDIATO: FRANCISCO COTA
MAYO DE 1998 A SEPTIEMBRE DE 2000

2000 CRYDASA CONSTRUCCIONES S.A. DE CV.

PUESTO: JEFE DEPTO. TECNICO
DE OCTUBRE DE 2000 A DICIEMBRE DE 2009

RELACION DE CONTRATOS DE OBRA

2000 RADIO MOVIL DIPSA, (TELCEL).

CONSTRUCCION DE RADIO BASE ICACOS.
COLONIA ICACOS.
ACAPULCO, GUERRERO.

CONSTRUCCION DE RADIO BASE CONVENCIONES.
FRACCIONAMIENTO COSTA AZUL.
ACAPULCO, GUERRERO.

MANTENIMIENTOS.
RADIO BASE POZA HONDA, CHILAPA, GUERRERO.
RADIO BASE ESCORPION, TIERRA COLORADA, GUERRERO.
RADIO BASE PETETLAN, PETATLAN, GUERRERO.
RADIO BASE AEROPUERTO, ACAPULCO, GUERRERO.
CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES ICACOS, ACAPULCO, GUERRERO.

EDIFICACIONES A PARTICULARES.

CONSTRUCCION DE CASA-HABITACION.
CALLE NIÑO PERDIDO # 5 COL. STA. CRUZ.
ACAPULCO, GUERRERO.

SUPERVISIÓN Y CÁLCULO ESTRUCTURAL.
CONSAGRADOS DEL SANTISIMO SALVADOR
EDIFICIO A TRES NIVELES DE AULAS Y CONVENTO DE HERMANAS
SAN ISIDRO, PIE DE LA CUESTA, GUERRERO.

H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO.
CALLE ANDRES FIGUEROA, COL. POPULAR.
ACAPULCO, GUERRERO.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
CALLE CORREGIDORA 1ª. ETAPA, COL. EL MIRADOR.
ACAPULCO, GUERRERO.

2001 H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
CONTRATO N° MAJ-FISM/250-2001/AD
IMPORTE CONTRATO $ 459, 533.89
AVENIDA REFORMA, COLONIA MORELOS.
ACAPULCO, GUERRERO.

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR Y CANAL PLUVIAL
CONTRATO N° MAJ-FISM/092-2001/AD
IMPORTE DE CONTRATO $ 326, 482.90
CALLE CORREGIDORA, COLONIA EL MIRADOR.
ACAPULCO, GUERRERO.

RADIO MOVIL DIPSA, (TELCEL).

CONSTRUCCION DE RADIO BASE ALBORADA.
CALLE 14 MANZANA 26 LOTE 320, COL. POSTAL.
ACAPULCO, GUERRERO.

CONSTRUCCION DE RADIO BASE MARQUEZ.
ANTIGUA CARRETERA AL AEROPUERTO S/N, COL. GRANJAS DEL MARQUEZ.
ACAPULCO, GUERRERO.

CONSTRUCCION DE RADIO BASE CAPIRE.
BARRIO DEL HOSPITAL
ACAPULCO, GUERRERO.

CONSTRUCCION DE RADIO BASE POZA VERDE.
CD. RENACIMIENTO.
ACAPULCO, GUERRERO.

CONSTRUCCION DE MICROCELULAS.

ALTAMIRANO,	ACAPULCO, GUERRERO.
PESCADO	ACAPULCO, GUERRERO.
PLAYA LARGA	ACAPULCO, GUERRERO.
RESIDENCIAL AMERICAS	ACAPULCO, GUERRERO.
CONSTITUYENTES	ACAPULCO, GUERRERO.
PAPAGAYO	ACAPULCO, GUERRERO.
LA SALLE	ACAPULCO, GUERRERO.

2002 H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
CONTRATO N° MAJ-FISM/015-2002/AD
IMPORTE CONTRATO $ 427, 711.08
CALLE CORREGIDORA 2ª. ETAPA, COLONIA EL MIRADOR.
ACAPULCO, GUERRERO.

CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN A BASE DE PIEDRA BRAZA.
CONTRATO N° MAJ-FISM/049-2002/AD
IMPORTE CONTRATO $ 434, 998.53
CALLE ANTONIA NAVA, COL. ALTA CUAUHTEMOC.
ACAPULCO, GERRERO.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
CONTRATO N° MAJ-FISM/098-2002/AD
IMPORTE CONTRATO $ 370, 634.32
AV. LAZARO CARDENAS, COL. ALTA CUAUHTEMOC
ACAPULCO, GRO.

2003 H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
CONTRATO N° MAJ-FISM/071-2003/AD
IMPORTE CONTRATO $ 294, 169.14
CALLE ANTONIA NAVA, COLONIA ALTA CUAUHTEMOC
ACAPULCO, GUERRERO.

CONSTRUCCION DE ANDADOR DRAGOS.
CONTRATO N° MAJ-FISM/350-2003/AD
IMPORTE CONTRATO $ 133, 648.18
CALLE DRAGOS, FRACC. LAS PLAYAS.
ACAPULCO, GUERRERO.

EDIFICACIONES A PARTICULARES

NAVETA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONSTRUCCION DE VILLAS FAIRMONT HERITAGE PLACE
IMPORTE CONTRATO $ 3, 935, 267.62
BOULEVARD LAS PALMAS (A UN COSTADO DEL HOTEL PRINCESS)
ACAPULCO, GUERRERO.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO

ASESORIA, PROYECTO Y CONSTRUCCION DE:

PAVIMENTACION DE CALLE SILVESTRE CASTRO
COL. SILVESTRE CASTRO.
PAVIMENTACION DE CALLE 18
COL. AMP. SILVESTRE CASTRO.
CONSTRUCCION DE ANDADOR CALLE 9
COL. JUAN R. ESCUDERO.

RADIO MOVIL DIPSA, (TELCEL).

MANTENIMIENTOS Y ADECUACION DE NUEVOS SITIOS
BTS LAS PLAYAS, FRACC. LAS PLAYAS ACAPULCO, GRO.
BTS. LA CIMA, ACAPULCO, GRO.
RB. PTO. ESCONDIDO, PUERTO ESCONDIDO OAXACA.
LOCAL AAA LOPEZ PORTILLO, ACAPULCO, GRO.
MICROCELULA LA CIMA, ACAPULCO, GRO.
RB. PINOTEPA CENTRO, PINOTEPA, OAXACA

2004 H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO

ASESORIA, PROYECTO Y CONSTRUCCION DE:
PAVIMENTACION DE CALLE CORREGIDORA
COL. EL MIRADOR
CONSTRUCCION DE ANDADOR CALLE 6
COL. JUAN R. ESCUDERO.

EDIFICACIONES A PARTICULARES

NAVETA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONSTRUCCION DE VILLAS FAIRMONT HERITAGE PLACE
IMPORTE CONTRATO $ 6, 371, 815. 90
BOULEVARD LAS PALMAS (A UN COSTADO DEL HOTEL PRINCESS)
ACAPULCO, GUERRERO.

RADIO MOVIL DIPSA, (TELCEL).

MANTENIMIENTOS Y ADECUACION DE NUEVOS SITIOS
BTS VICENTE GUERRERO, ACAPULCO, GRO.
RB. PLAYA DIAMANTE, ACAPULCO, GRO..
RB. LAS ANCLAS, ACAPULCO, GRO

2005 EDIFICACIONES A PARTICULARES

NAVETA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONSTRUCCION DE VILLAS FAIRMONT HERITAGE PLACE
IMPORTE CONTRATO $ 1, 016, 000. 00
BOULEVARD LAS PALMAS (A UN COSTADO DEL HOTEL PRINCESS)
ACAPULCO, GUERRERO.

RADIO MOVIL DIPSA, (TELCEL).
MANTENIMIENTOS Y ADECUACION DE NUEVOS SITIOS

LOCAL " A " NIÑOS HEROES, ACAPULCO, GRO.
LOCAL " A " BERNAL DIAZ DEL CASTILLO, ACAPULCO, GRO.
LOCAL " BBB " 5 DE MAYO, ACAPULCO, GRO
LOCAL " BBB " SOLIDARIDAD, ACAPULCO, GRO.
LOCAL " AAA " LA JOYA, BOULEVARD DE LAS NACIONES, ACAPULCO, GRO.
LOCAL " AAA " CARR. NAL. CHILPANCINGO, GRO.
LOCAL " AAA " CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO, GRO.
LOCAL " AAA " LA POZA, ACAPULCO, GRO.
LOCAL " AAA " LAS PALMAS, BOULEVAR DE LAS NACIONES, ACAPULCO, GRO.

MAQUINARIA DIESEL S.A. DE C.V. (M A D I S A)

REMODELACION DE CAMPAMENTO LOS FILOS.
IMPORTE CONTRATO $ 224, 924.25
MEZCALA, GRO.

MAQUINARIA DIESEL S.A. DE C.V. (M A D I S A)

CONSTRUCION Y REMODELACION DE NAVE DE TALLER, ALMACEN Y OFICINAS.
IMPORTE CONTRATO $ 1, 765, 000.00
BOULEVAR DE LAS NACIONES NUM. 935
FRACC. GRANJAS DEL MARQUEZ, ACAPULCO, GRO.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EVA ZAMANO
CONTRATO No. SDUOP-IED-AD-130-2005
IMPORTE CONTRATO $ 457,539.10
UBICACIÓN: CALLE EVA ZAMANO, COL. JOSE LOPEZ PORTILLO
ACAPULCO, GUERRERO.

PAVIMENTACION DE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ (2ª ETAPA) CAD. 0+060 AL 0+134.91
CONTRATO No. MAJ-FISM/228-2005/AD
IMPORTE CONTRATO $ 400,000.00
UBICACIÓN: CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, COL. JOSE LOPEZ PORTILLO
ACAPULCO, GUERRERO.

2006

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PARA LA PREVENCION Y ATENCION DEL SIDA E INFECCIONES DE TRASMISION SEXUAL (CAPASITS)
CONTRATO No. SDUOP-IED-INV-008-2006
IMPORTE CONTRATO $ 2,233730.07
UBICACIÓN: CD. RENACIMIENTO
ACAPULCO, GUERRERO.

CONSTRUCCION DE PLAZOLETA RECREATIVA
CONTRATO No. SDUOP-PAFEF-AD-370-2006
IMPORTE CONTRATO $ 499,895.05
UBICACIÓN: 3RA. ETAPA EN LA COL. INFONAVIT ALTA PROGRESO
ACAPULCO, GUERRERO.

SECRETARIA DE SALUD
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE "MALDONADO"
CONTRATO No. SES-FOSS-AD-074-2006
IMPORTE CONTRATO $ 208,689.12 S/IVA
UBICACIÓN: MALDONADO, MPIO. DE CUAJIINICUILAPA, GRO.

REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE "SAN NICOLAS"
CONTRATO No. SES-FOSS-AD-075-2006
IMPORTE CONTRATO $ 229,888.97 S/IVA
UBICACIÓN: SAN NICOLAS, MPIO. DE CUAJIINICUILAPA, GRO.

REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE "TIERRA COLORADA"
CONTRATO No. SES-FOSS-AD-076-2006
IMPORTE CONTRATO $ 208,643.15 S/IVA
UBICACIÓN: TIERRA COLORADA, MPIO. DE CUAJIINICUILAPA, GRO.

REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE "COMALTEPEC"
CONTRATO No. SES-FOSS-AD-077-2006
IMPORTE CONTRATO $ 58,769.57 S/IVA
UBICACIÓN: COMALTEPEC, MPIO. DE CUAJIINICUILAPA, GRO.

SECRETARIA DE EDUCACION
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE 5 PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA REGION CENTRO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO.
CONTRATO No. AD-OP-007/2006
IMPORTE CONTRATO $ 3, 657,500.00
UBICACIÓN: TIXTLA, GRO.

2007

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO
CONTRATO No. SDUOP-FIES-AD-244-2007
IMPORTE CONTRATO $ 940,171.89
UBICACIÓN: ACAPULCO, GRO.

RADIO MOVIL DIPSA, (TELCEL).
MANTENIMIENTOS Y ADECUACION DE NUEVOS SITIOS

LOCAL " AAA "	CENTRO DE ATENCION A CLIENTES, IXTAPA, GRO.
RADIO BASE	LAS ANCLAS, ACAPULCO, GRO.
RADIO BASE	ESTUARIO DEL PATAL, ACAPULCO, GRO
LOCAL " BBB "	CALLE HIDALGO, ACAPULCO, GRO.
LOCAL " BBB "	RENACIMIENTO, ACAPULCO, GRO.

SECRETARIA DE SALUD
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN "CAPASITS" DE CD. RENACIMIENTO
CONTRATO No. CMA/SDUOP-IED-INV-008-2006
IMPORTE CONTRATO $ 1, 550,000.00
UBICACIÓN: CD. RENACIMIENTO
ACAPULCO, GUERRERO

2008

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

REHABILITACIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS
"ALEJANDRO GÓMEZ MAGANDA"
CONTRATO No. SDUOP-FIES-AD-322-2008
IMPORTE CONTRATO $ 323,376.00
UBICACIÓN: COL. EL COLOSO

TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCION DE 2
AULAS EN LA ESCUELA DE CONTABILIDAD
Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO
CONTRATO No. SDUOP-FAFEF-AD-126-2008
IMPORTE CONTRATO $ 186,000.00
UBICACIÓN: ACAPULCO, GRO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

PAVIMENTACIÓN DE ANDADOR HERMANOS ESCUDERO
CONTRATO No. MAJ-FISM/401-2008/AD
IMPORTE CONTRATO $ 700,000.00
UBICACIÓN: COL. AMPLIACIÓN LA VENTA

REHABILITACIÓN DE BOULEVARD JOSE LOPEZ PORTILLO
TRAMO AURRERA-GASOLINERA
CONTRATO No. MAJ-FISM/419-2005/AD
IMPORTE CONTRATO $ 1,049,481.36
UBICACIÓN: CD. RENACIMIENTO
(NOTA: FECHA DE INICIO 26 DE MARZO DE 2008)

RADIO MÓVIL DIPSA, (TELCEL).
MANTENIMIENTOS Y ADECUACIÓN DE NUEVOS SITIOS

LOCAL "AAA" LA ISLA
INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, TRABAJOS DE TABLAROCA, PISOS, CANCELERIA A BASE DE CRISTAL TEMPLADO.
IMPORTE CONTRATO $ 208,000.00

LOCAL CUAUHTEMOC, LA GRAN PLAZA, ICACOS
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL
IMPORTE CONTRATO: VARIABLE

2009

O.P.D. COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO

CONSERVACIÓN DEL CAMINO SANTA CRUZ-OCOTITLAN-COACOYUL
CONTRATO No. OPDCICAEG/FISE/AD/161/2008
IMPORTE CONTRATO $ 750,423.72
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 09/12/2008 AL 22/01/2009
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE ZITLALA, GRO

DE MARZO DE 2010 A LA FECHA

PUESTO: APODERADA LEGAL Y JEFE DEL DEPTO . TECNICO DE: IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

RELACION DE CONTRATOS DE OBRA

2010 **SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE GUERRERO**

"CENTRO DE INTERPRETACION AMBIENTAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO", UBICADA EN EL CERRO EL MOGOTE, INTERIOR DEL PARQUE PAPAGAYO, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
CONTRATO No. SEMAREN-AD-003-2010
IMPORTE CONTRATO: $ 970, 423.40
IMPORTE CONVENIO ADICIONAL:$ 318, 988.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO
CONTRATO No. SDUOP-FAFEF-AD-041-2010
IMPORTE CONTRATO $ 487, 394.96
UBICACIÓN: COL.INFONAVIT, ALTA PROGRESO,
MPIO. DE ACAPULCO, GRO.

REMODELACION E IMAGEN URBANA DEL ENTORNO Y PLAZOLETA EN EL BARRIO DE LA "POCITA" POR LA CALLE "LERDO DE TEJADA" Y BARRIO DE LA "GUINEA"
CONTRATO No. SDUOP-FAFEF-AD-160-2010
IMPORTE CONTRATO $ 487, 394.96
UBICACIÓN: BARRIO DE LA POCITA, ACAPULCO,
MPIO. DE ACAPULCO, GRO.

HABILITACION COMO PARQUE RECREATIVO EL ANDADOR QUE COMUNICA LAS CALLES "HILARIO MALPICA" Y "NIÑOS HEROES DE VERACRUZ".
CONTRATO NO. SDUOP-FAFEF-AD-161-2010
IMPORTE CONTRATO $ 487, 394.96
UBICACIÓN: COL. COSTA AZUL, ACAPULCO,
MPIO. DE ACAPULCO, GRO.

ADAPTACIÓN DE AREAS VERDES COMO PARQUE INFANTIL EN LA ETAPA 44 DEL "COLOSO".
CONTRATO No. SDUOP-FAFEF-AD-167-2010
IMPORTE CONTRATO $ 487, 394.96
UBICACIÓN: COL. EL COLOSO, ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO, GRO.

CONTRATOS DE OBRA PRIVADA

2011

CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE 4 DEPARTAMENTOS
PROPIETARIO: SRA. ROSA ISELA VALVERDE QUEVEDO.
CONTRATO No. IMEX-003-2011
IMPORTE CONTRATO $ 2,396, 000.00
UBICACION: CALLE ZACATECAS #14, COL. PROGRESO,
MPIO. DE ACAPULCO, GRO.

REMODELACION DE CASA HABITACION
PROPIETARIO: SR. ISIDORO CARBAJAL
IMPORTE CONTRATO $ 389, 408.25
CONTRATO No. IMEX-005-2011
UBICACION: AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS #1385,
FRACC. LAS PLAYAS, MPIO. DE ACAPULCO, GRO

2012

CONSTRUCCION DE CASA HABITACION
PROPIETARIO: SR. FREDY MARTINEZ ARROYO
IMPORTE CONTRATO $ 1,123, 466.00
CONTRATO No. IMEX-004-2011
UBICACION: CALLE CORREGIDORA #2235,
COL. EL MIRADOR, MPIO. DE ACAPULCO, GRO

2013

CONSTRUCCION DE CASA HABITACION
CONTRATO No. IMEX-005-2013
IMPORTE CONTRATO $ 853, 564.00
UBICACIÓN: CALLE REFORMA,
COL. MORELOS EN ACAPULCO, GRO

CONTRATOS C.F.E.

2014

SERVICIO DE INSTALACION DE MATERIALES
PARA REHABILITACION DE SERVICIO MONOFASICO
EN BAJA TENSION EN TABLERO DE MEDICION.
CONTRATO No. 800691625
IMPORTE CONTRATO $ 150, 000.00
UBICACIÓN: UNIDAD HAB COLOSO,
MPIO. DE ACAPULCO, GRO

SERVICIO DE INSTALACION DE MATERIALES
PARA REHABILITACION DE SERVICIO MONOFASICO
EN BAJA TENSION EN TABLERO DE MEDICION.
CONTRATO No. 800698203
IMPORTE CONTRATO $ 149, 000.00
UBICACIÓN: COLONIA PROGRESO,
MPIO. DE ACAPULCO, GRO

2015 **GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO**
SECRETARIA DE CULTURA

CONTRATO DE SERVICIOS PARA:

CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA A BASE DE MADERA DE PINO DE 16.00 X 12.00 X 6.00 MT. DE SECCION, ASI COMO ELABORACION DE TEJIDO EN FORMA DE CAPULLO EN INTERIOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE SECCION SIMILAR A LA MISMA UBICADA DENTRO DE LA GRAN GALERIA DEL CENTRO CULTURAL ACAPULCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. **(EXPOSICION PRESENTADA "INEFABLE" POR EL ESCULTOR JORGE ALFARO)**

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL ÁREA, PARA EL PROYECTO DENOMINADO **"ROSA DE LOS VIENTOS"** EN EL POLIDEPORTIVO DE CD. RENACIMIENTO, ACAPULCO, DENTRO DEL PROGRAMA DE MÉXICO CULTURA PARA LA ARMONÍA.

2016 **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN ANDADOR 3
CONTRATO No. MAJ-FISM/238-2016/AD
IMPORTE CONTRATO $ 500,000.00
UBICACIÓN: COL. VILLA GUERRERO, ACAPULCO.

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANGOS
CONTRATO No. MAJ-FISM/268-2016/AD
IMPORTE CONTRATO $ 733,284.15
UBICACIÓN: COL. ANTORCHA REVOLUCIONARIA, ACAPULCO.

CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESC, PRIM. "VICENTE GUERRERO"
CONTRATO No. MAJ-FISM/326-2016/AD
IMPORTE CONTRATO $ 500,000.00
UBICACIÓN: POB. EL CERRITO

MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD
CONTRATO No. MAJ-FISM/530-2016/AD
IMPORTE CONTRATO $ 184,865.36
UBICACIÓN: POB. EL VELADERO

CONTRATOS DE OBRA PRIVADA

2017

DEMOLICION DE VILLAS Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA.
PROPIETARIO: PARQUE RESIDENCIAL EL SOL (EX CASA LUIS MIGUEL)
CONTRATO No. IMEX-006-2017
IMPORTE CONTRATO $ 450, 000.00
UBICACION: CARRETERA BARRA VIEJA, POB. BONFIL
MPIO. DE ACAPULCO, GRO.

2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DEL CHORRITO
CONTRATO No. MAJ-FISM/130-2017/AD
IMPORTE CONTRATO $ 750,000.00
UBICACIÓN: COL. LOMA LARGA, ACAPULCO.

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
CONTRATO No. MAJ-FISM/135-2017/AD
IMPORTE CONTRATO $ 750,000.00
UBICACIÓN: COL. MIGUEL DE LA MADRID, ACAPULCO.

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AMISTAD
CONTRATO No. MAJ-FISM/136-2017/AD
IMPORTE CONTRATO $ 750,000.00
UBICACIÓN: COL. BOSQUES DE LA CAÑADA, ACAPULCO.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CONSTRUCCION DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION DE ANDADOR CERRADA DE ZARAGOZA
CONTRATO No. SDUOPOT-IF-AD-1083-2017
IMPORTE CONTRATO $ 974,106.62 C/I.V.A.
UBICACIÓN: COL. CENTRO, ACAPULCO, GRO.

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION EN AV. DEL TANQUE.
CONTRATO No. SDUOPOT-IF-AD-1086-2017
IMPORTE CONTRATO $ 703,196.90 C/I.V.A.
UBICACIÓN: COL. 13 DE JUNIO, ACAPULCO, GRO.

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y PAVIMENTACION EN ANDADOR PLAN DE AYALA.
CONTRATO No. SDUOPOT-IF-AD-1090-2017
IMPORTE CONTRATO $ 1,254,368.19 C/I.V.A.
UBICACIÓN: COL. CHINAMECA, ACAPULCO, GRO.

CONSTRUCCION DE MUROS DE PROTECCION EN TELESECUNDARIA UNIDAD CIUDADANA, CLAVE: 2DTV0987N,
EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO.
CONTRATO No. SDUOPOT-IF-INV-1166-2017
IMPORTE CONTRATO $ 2,940,011.05 C/I.V.A.
UBICACIÓN: COL. UNIDAD CIUDADANA, ACAPULCO, GRO

INTRODUCCION DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION DE CALLE ALTAMIRANO, COL. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO,
EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO.
CONTRATO No. SDUOPOT-IF-AD-1326-2017
IMPORTE CONTRATO $ 1,753,589.365 C/I.V.A.
UBICACIÓN: COL. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, ACAPULCO, GRO

2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INSURGENTES
CONTRATO No. MAJ-FISM/110-2018/AD
IMPORTE CONTRATO $ 800,000.00
UBICACIÓN: COL. C.N.C., ACAPULCO.

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESC. TELESECUNDARIA UNIDAD CIUDADANA
CONTRATO No. MAJ-FISM/108-2018/AD
IMPORTE CONTRATO $ 800,000.00
UBICACIÓN: COL. UNIDAD CIUDADANA.

2019 **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. UNIVERSIDAD
CONTRATO No. MAJ-FISM/085-2019/AD
IMPORTE CONTRATO $ 710,003.52
UBICACIÓN: COL. VALLE DE AS LORES

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. LINDA VISTA
CONTRATO No. MAJ-FISM/084-2019/AD
IMPORTE CONTRATO $ 1,448,102.22
UBICACIÓN: COL. LINDA VISTA

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA TELESECUNDARIA
CONTRATO No. MAJ-FISM/571-2019/AD
IMPORTE CONTRATO $ 1,000,000.00
UBICACIÓN: POB. APANHUAC

2020 **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

PAVIMENTACION DE CALLE PRIV. SANTA MARIA DEL MAR
CONTRATO No. MAJ-FISM/263-2020/AD
IMPORTE CONTRATO $ 1,999,999.42
UBICACIÓN: FRACC. LAS PLAYAS

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. SEC. FEDERAL No 2 JESUS MASTACHE ROMAN"
CONTRATO No. MAJ-FISM/262-2020/AD
IMPORTE CONTRATO $ 2,000,000.00
UBICACIÓN: COL. MORELOS

PAVIMENTACION DE CALLE UNIVERSIDAD
CONTRATO No. MAJ-FISM/175-2020/AD
IMPORTE CONTRATO $ 1,349,726.65
UBICACIÓN: COL. VILLA DE LAS FLORES

PAVIMENTACION DE CALLE 10
CONTRATO No. MAJ-FISM/244-2020/AD
IMPORTE CONTRATO $ 750,000.00
UBICACIÓN: COL. CUMBRES DE LLANO LARGO

PAVIMENTACION DE CALLE CERRADA DE MONTE ALBAN
CONTRATO No. MAJ-FISM/264-2020/AD
IMPORTE CONTRATO $ 1,999,999.42
UBICACIÓN: FRACC. HORNOS INSURGENTES

2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRIV. SANTA MARIA DEL MAR
CONTRATO No. MAJ-FISM/291-2021/AD
IMPORTE CONTRATO $ 634,000.00
UBICACIÓN: FRACC. LAS PLAYAS

AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CALLE CERRADA DE MONTE ALBAN
CONTRATO No. MAJ-FISM/293-2021/AD
IMPORTE CONTRATO $ 1,135,000.00
UBICACIÓN: FRACC. HORNOS INSURGENTES

AMPLIACION DE TECHADO EN ESC. SEC. FED. No 2 "JESUS MASTACHE ROMAN"
CONTRATO No. MAJ-FISM/290-2021/AD
IMPORTE CONTRATO $ 1,694,998.94
UBICACIÓN: COL. MORELOS

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO
CONTRATO No. MAJ-FISM/287-2021/AD
IMPORTE CONTRATO $ 1,477,000.00
UBICACIÓN: POB. EL SALTO

ATENTAMENTE


ARQ. GENOVEVA MORALES ROMAN

CEDULA PROFESIONAL

ARQ. GENOVEVA MORALES ROMAN





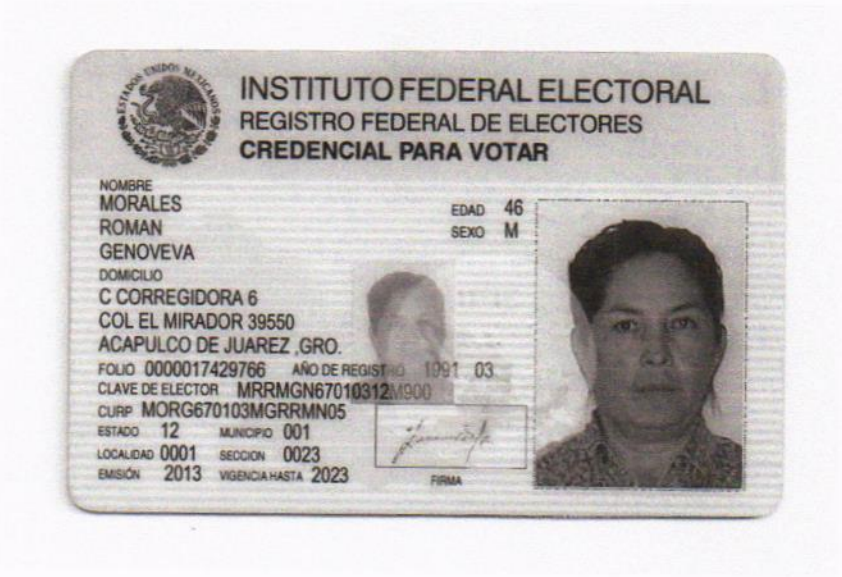

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
MORALES
ROMAN
GENOVEVA

EDAD 46
SEXO M

DOMICILIO
C CORREGIDORA 6
COL EL MIRADOR 39550
ACAPULCO DE JUAREZ ,GRO.

FOLIO 0000017429766 AÑO DE REGISTRO 1991 03
CLAVE DE ELECTOR MRRMGN67010312M900
CURP MORG670103MGRRMN05
ESTADO 12 MUNICIPIO 001
LOCALIDAD 0001 SECCION 0023
EMISIÓN 2013 VIGENCIA HASTA 2023

FIRMA



0023036672996

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE, NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO

ONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, **IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.** CON DOMICILIO EN: **CALLE CORREGIDORA NO. 4 COL. MORELOS, C.P. 39530, ACAPULCO, GRO.** COMO PATRON, REPRESENTADA POR LA C. ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ Y POR LA OTRA PARTE LA **C. ARQ. GENOVEVA MORALES ROMAN**, COMO TRABAJADOR, CUYAS GENERALES SON:

EDAD:	56 AÑOS
SEXO:	FEMENINO
ESTADO CIVIL:	CASADA
INSTRUCCIÓN:	ARQUITECTA
DOMICILIO:	CALLE CORREGIDORA No. 6, COL. EL MIRADOR C.P. 39550 EN ACAPULCO, GRO.

LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- El trabajador se obliga a presentar al patrón o a su representante, sus servicios como empleado de confianza para desarrollar los servicios que a continuación se indiquen: JEFE DEL DEPTO. DE PROYECTOS, obligándose el trabajador en todo tiempo a desempeñar los servicios que se le consignan en este contrato, con la intensidad, cuidado y esmero apropiados en el domicilio principal del patrón en cualquiera de la sucursales que tienen o pudieran establecer, en cualquier parte de la Republica.

SEGUNDA. - Las partes convienen en que la relación de trabajo objeto de este contrato es por: TIEMPO INDETERMINADO.

TERCERA. - El trabajador declarara bajo protesta de decir verdad, que tiene la capacidad, experiencia y los conocimientos necesarios para desempeñar el trabajo señalado, en la cláusula PRIMERA, con la calidad que requiere el patrón.

CUARTA. - La duración de la jornada semanal de trabajo, será hasta de 48 horas, que el patrón podrá distribuir de acuerdo con lo que establece el Art. 59 de la Ley Federal del Trabajo, para que el trabajador pueda disponer del reposo del sábado en la tarde o cualquier otra modalidad equivalente.

QUINTA. - Las partes convienen en el que el trabajador recibirá por los servicios prestados en virtud de este contrato, la cantidad de $16,000.00 (DIECISEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) como salario mensual, suma en la cual se incluye el sueldo del séptimo día de descanso obligatorio, cuyo pago será hecho en quincenas vencidas, el último día laborable del periodo correspondiente, en el local de patrón y dentro de las horas de trabajo.

IMEXA
Constructores, S.A. de C.V.
Calle Corregidora # 4, Col. Morelos
C.P. 39530 Acapulco, Gro.
R.F.C.: ICO-091216-UUA

SEXTA. - El trabajador expresa su conformidad y autoriza al patrón para que deduzca de su sueldo, los impuestos que sean a su cargo, las cuotas obreras del Instituto Mexicano del seguro Social, así como cualquier otra cantidad a cuyo pago pudiera estar obligada el trabajador, y en especial aquellos a que se refieren los artículos 97 y 100 de la Ley Federal del trabajo.

SEPTIMA. - El trabajador disfrutará de un día de descanso por cada seis días de trabajo en forma expresa, el trabajo devengado a que tuviera derecho hasta la fecha del mismo, conviniéndose en que su firma, implicará un finiquito total o de obligaciones del patrón hasta esa fecha.

OCTAVA. - En caso de que el trabajador tenga que laborar mayor tiempo del que fija la jornada legal, recabará del patrón por escrito, la orden para trabajar horas extra, sin cuyo requisito, no deberá presentar su servicio en jornadas extraordinarias.

NOVENA. - El trabajador disfrutará de un periodo semestral de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior al que señale el Art. 76 de la Ley Federal de Trabajo.

DECIMA. - El trabajador se obligará a sujetarse y cumplir con los planes y programas de capacitación y adiestramiento que el patrón establezca en el centro o centros de trabajo establecidos o que establezca y preste sus servicios a la trabajadora.

DECIMA PRIMERA. - El presente contrato se rescindirá o terminará por incumplimiento de las cláusulas del mismo o por los casos establecidos por La Ley Federal del trabajo.

DECIMA SEGUNDA. - El patrón y el trabajador convienen en forma expresa que todo lo no previsto en este contrato, se resolverá conforme a La Ley Federal del trabajo.

DECIMA TERCERA. - Debidamente enteradas las partes del contenido y alcance de las estipulaciones contenidas en las cláusulas de este contrato, lo firman de común acuerdo en Acapulco, Gro., a los 16 días del mes de enero del 2023.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
Ing. Irina Salgado Hernández
Representante Legal

ARQ. GENOVEVA MORALES ROMAN
CED. PROF. NO. 2326937

IMEXA
Constructores, S.A. de C.V.
Calle Corregidora # 4, Col. Morelos
C.P. 39530 Acapulco, Gro.
R.F.C. ICO-091216-UUA
imexa@telmexmail.com

000202



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
SALGADO
HERNANDEZ
IRINA

SEXO M

DOMICILIO
C NUEVO LEON 23
COL. PROGRESO 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE DE ELECTOR SLHRIR67082312M900
CURP
SAHI670823MGRLRR09
AÑO DE REGISTRO
1993 06
FECHA DE NACIMIENTO
23/08/1967
SECCIÓN
0057
VIGENCIA
2023 - 2033



INE

IDMEX2412998667<<0057054805632
6708238M3312315MEX<06<<00253<9
SALGADO<HERNANDEZ<<IRINA<<<<<<

IMEXA
Constructores, S.A. de C.V.
Calle Corregidora # 4, Col. Morelos
C.P. 39530 Acapulco, Gro.
R.F.C.: ICO-091216-UUA
imexa@telmexmail.com



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR


NOMBRE
MORALES
ROMAN
GENOVEVA

EDAD 46
SEXO M

DOMICILIO
C CORREGIDORA 6
COL EL MIRADOR 39550
ACAPULCO DE JUAREZ ,GRO.

FOLIO 0000017429766 AÑO DE REGISTRO 1991 03
CLAVE DE ELECTOR MRRMGN67010312
CURP MORG670103MGRRMN05
ESTADO 12 MUNICIPIO 001
LOCALIDAD 0001 SECCION 0023
EMISION 2013 VIGENCIA HASTA 2023

FIRMA

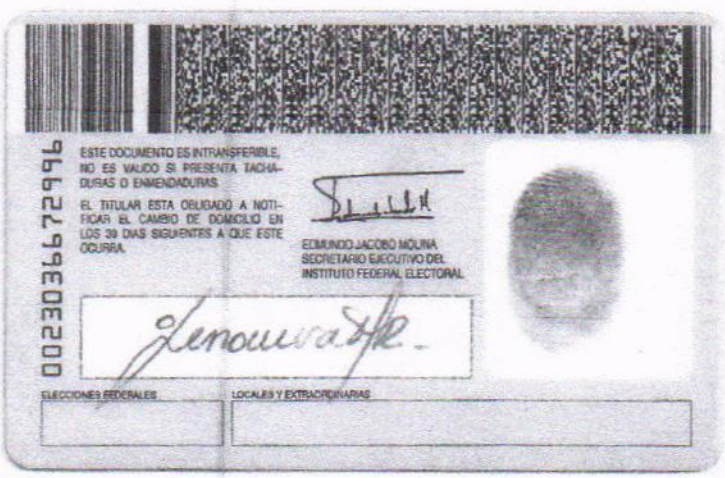

0023036672996

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE, NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

IMEXA
Constructores, S.A. de C.V.

Calle Corregidora # 4, Col. Morelos
C.P. 39530 Acapulco, Gro.
R.F.C.: ICO-091216-UUA

ONOFRE AVELINO AGUDO
Dirección
Calle Benito Juárez No. 4
Col. El mirador C.P.39530
Acapulco de Juárez, Gro.
Cel. **744341 10 93**
Correo electrónico: avagono@hotmail.com

000204

Lugar Y Fecha De Nacimiento: Puerto Escondido Oaxaca 12 de junio 1965
Edad: 58 años
Estado Civil: casado.

FORMACION ACADEMICA

Profesión: lic. En contaduría.

Cedula Profesional: 657254

Primaria Y Secundaria: Villas de Tututepec, Oaxaca.

Bachillerato Y Licenciatura: U.N.A.M

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Empresa: Lobato Y Asociados, Despacho Contable.

Puesto: Auxiliar Contable

Periodo: enero 1987 A diciembre 1989 2 Años

Jefe Inmediato: Andrés Martínez Lobato.

Domicilio: Melchor Ocampo No. 1 despacho 106

Colonia. Centro.

ONOFRE AVELINO AGUDO
Dirección
Calle Benito Juárez No. 4
Col. El mirador C.P.39530
Acapulco de Juárez, Gro.
Cel. **744341 10 93**
Correo electrónico: avagono@hotmail.com

000205

Empresa: Avelino Flores Y asociados despacho contable

Puesto: Contador.

Periodo: enero de 1990 a diciembre de 1991 2 años.

Domicilio: Av. Cuauhtémoc No. 76 despacho 106.

Colonia: Centro.

Empresa: Internacional Trading Market, S.A. de C.V. grupo Pepsi.

Puesto: Contador.

Periodo: enero de 1992 a octubre 1992 10 meses.

Jefe inmediato: Luis Enrique Fernando Molina Galeana.

Domicilio; Antón de Alaminos No. 34.

Colonia: Fraccionamiento Magallanes

Empresa: Sindicato de materiales para la construcción (C.RO.C.)

Puesto: Contador.

Periodo: Noviembre de 1992 abril de 1998. 6 años.

Secretario General: Raúl Ávila Morales.

Domicilio: av. Cuauhtémoc No. 283.

Colonia: El Roble.

ONOFRE AVELINO AGUDO
Dirección
Calle Benito Juárez No. 4
Col. El mirador C.P.39530
Acapulco de Juárez, Gro.
Cel. **744341 10 93**
Correo electrónico: avagono@hotmail.com

000206

Empresa: Materiales Costa Granda, S.A. de C.V.

Puesto: Contador.

Periodo: Noviembre 1992 abril de 1988 6 años.

Jefe Inmediato: Raúl Ávila Morales.

Domicilio: Av. Cuauhtémoc No. 283.

Colonia: El Roble.

Empresa: Avelino Flores y asociados despacho contable.

Puesto: contador

Periodo: mayo 1998 hasta la fecha.

COFERENCIAS Y CURSOS:

Preparación y elaboración de las declaraciones anuales del Impuesto Sobre la Renta (I.S.R.) persona moral y física.

Reformas al código fiscal de la federación y misceláneas fiscales.

ONOFRE AVELINO AGUDO
Dirección
Calle Benito Juárez No. 4
Col. El mirador C.P.39530
Acapulco de Juárez, Gro.
Cel. **744341 10 93**
Correo electrónico: avagono@hotmail.com

000207

OTROS CARGOS:

Secretario de Finanzas de la unión de inquilinos y arrimados de Acapulco, A.C.

Colabore en la campaña del C.P. Carlos Zeferino Torreblanca Galindo a la presidencia de Acapulco.

Colabore en la campaña del Lic. Alberto López Rosas, a la presidencia de Acapulco.

Asesor y responsable del área administrativa de Imexa Constructores, S.A. de C.V.

ATENTAMENTE:

C.P. ONOFRE AVELINO AGUDO

CEDULA 657254

TITULO REGISTRADO A FOJAS 25

DEL LIBRO SETECIENTOS DOS

DE REGISTRO DE TITULOS PROFESIONALES Y GRADOS A



FIRMA DEL INTERESADO

TGN.

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES

657254

EN VIRTUD DE QUE ONOFRE AVELINO AGUDO

CUMPLIO CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 5º CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE PROFESIONES Y SU REGLAMENTO SE LE EXPIDE LA PRESENTE

CEDULA

CON EFECTOS DE PATENTE PARA EJERCER LA PROFESION DE


LICENCIADO EN CONTADURIA


MEXICO, D.F. A 5 DE Enero DE 1987.

EL DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

LIC. ANTONIO CUELLAR SALAS

000209

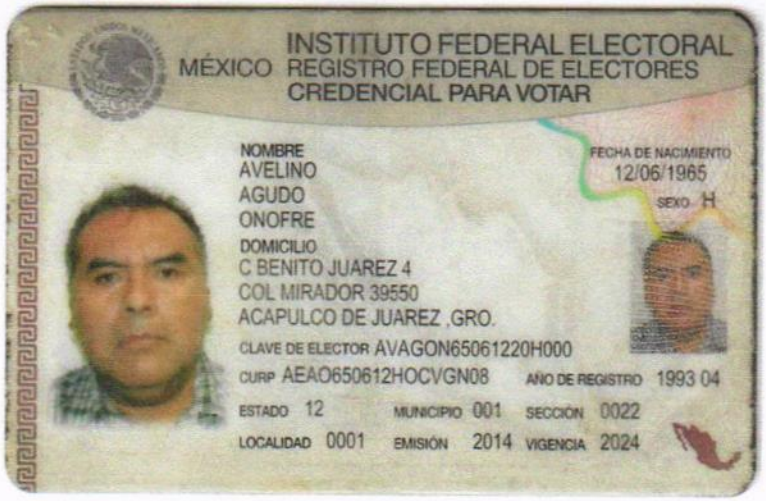
MÉXICO
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
AVELINO
AGUDO
ONOFRE
DOMICILIO
C BENITO JUAREZ 4
COL MIRADOR 39550
ACAPULCO DE JUAREZ ,GRO.
FECHA DE NACIMIENTO
12/06/1965
SEXO H
CLAVE DE ELECTOR AVAGON65061220H000
CURP AEAO650612HOCVGN08
AÑO DE REGISTRO 1993 04
ESTADO 12
MUNICIPIO 001
SECCIÓN 0022
LOCALIDAD 0001
EMISIÓN 2014
VIGENCIA 2024

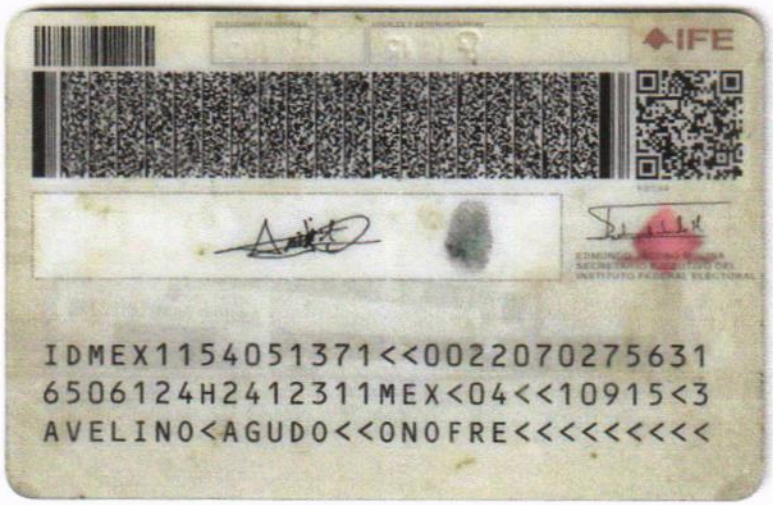
IFE
IDMEX1154051371<<0022070275631
6506124H2412311MEX<04<<10915<3
AVELINO<AGUDO<<ONOFRE<<<<<<<<<

000210

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, **IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.** CON DOMICILIO EN: **CALLE CORREGIDORA NO. 4 COL. MORELOS, C.P. 39530, ACAPULCO, GRO.** COMO PATRON, REPRESENTADA POR LA ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ Y POR LA OTRA PARTE EL C.P. ONOFRE AVELINO AGUDO, COMO TRABAJADOR, CUYAS GENERALES SON:

EDAD:	58 AÑOS
SEXO:	MASCULINO
ESTADO CIVIL:	CASADO
INSTRUCCIÓN:	CONTADOR PUBLICO
DOMICILIO:	C. BENITO JUAREZ #4, COL. MIRADOR C.P. 39550 EN ACAPULCO, GRO.

LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- El trabajador se obliga a presentar al patrón o a su representante, sus servicios como empleado de confianza para desarrollar los servicios que a continuación se indiquen: ASESOR CONTABLE Y RESPONSABLE DEL AREA ADMINISTRATIVA, obligándose el trabajador en todo tiempo a desempeñar los servicios que se le consignan en este contrato, con la intensidad, cuidado y esmero apropiados en el domicilio principal del patrón en cualquiera de la sucursales que tienen o pudieran establecer, en cualquier parte de la Republica.

SEGUNDA. - Las partes convienen en que la relación de trabajo objeto de este contrato es por: TIEMPO INDETERMINADO.

TERCERA. - El trabajador declarara bajo protesta de decir verdad, que tiene la capacidad, experiencia y los conocimientos necesarios para desempeñar el trabajo señalado, en la cláusula PRIMERA, con la calidad que requiere el patrón.

CUARTA. - La duración de la jornada semanal de trabajo, será hasta de 30 horas, que el patrón podrá distribuir de acuerdo con lo que establece el Art. 59 de la Ley Federal del Trabajo, para que el trabajador pueda disponer del reposo del sábado en la tarde o cualquier otra modalidad equivalente.

QUINTA. - Las partes convienen en el que el trabajador recibirá por los servicios prestados en virtud de este contrato, la cantidad de $12,000.00 (DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.) como salario mensual, suma en la cual se incluye el sueldo del séptimo día de descanso obligatorio, cuyo pago será hecho en quincenas vencidas, el último día laborable del periodo correspondiente, en el local de patrón y dentro de las horas de trabajo.

IMEXA
Constructores, S.A. de C.V.

Calle Corregidora # 4, Col. Morelos
C.P. 39530 Acapulco, Gro.
R.F.C.: ICO-091216-UUA
imexa@telmexmail.com

SEXTA. - El trabajador expresa su conformidad y autoriza al patrón para que deduzca de su sueldo, los impuestos que sean a su cargo, las cuotas obreras del Instituto Mexicano del seguro Social, así como cualquier otra cantidad a cuyo pago pudiera estar obligada el trabajador, y en especial aquellos a que se refieren los artículos 97 y 100 de la Ley Federal del trabajo.

SEPTIMA. - El trabajador disfrutará de un día de descanso por cada seis días de trabajo en forma expresa, el trabajo devengado a que tuviera derecho hasta la fecha del mismo, conviniéndose en que su firma, implicará un finiquito total o de obligaciones del patrón hasta esa fecha.

OCTAVA. - En caso de que el trabajador tenga que laborar mayor tiempo del que fija la jornada legal, recabará del patrón por escrito, la orden para trabajar horas extra, sin cuyo requisito, no deberá presentar su servicio en jornadas extraordinarias.

NOVENA. - El trabajador disfrutará de un periodo semestral de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior al que señale el Art. 76 de la Ley Federal de Trabajo.

DECIMA. - El trabajador se obligará a sujetarse y cumplir con los planes y programas de capacitación y adiestramiento que el patrón establezca en el centro o centros de trabajo establecidos o que establezca y preste sus servicios a la trabajadora.

DECIMA PRIMERA. - El presente contrato se rescindirá o terminará por incumplimiento de las cláusulas del mismo o por los casos establecidos por La Ley Federal del trabajo.

DECIMA SEGUNDA. - El patrón y el trabajador convienen en forma expresa que todo lo no previsto en este contrato, se resolverá conforme a La Ley Federal del trabajo.

DECIMA TERCERA. - Debidamente enteradas las partes del contenido y alcance de las estipulaciones contenidas en las cláusulas de este contrato, lo firman de común acuerdo en Acapulco, Gro., a los 16 días del mes de enero del 2023.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
Ing. Irina Salgado Hernández
Representante Legal

C.P. ONOFRE AVELINO AGUDO
CED. PROF. NO. 657254

IMEXA
Constructores, S.A. de C.V.

Calle Corregidora # 4, Col. Morelos
C.P. 39530 Acapulco, Gro.
R.F.C.: ICO-091216-UUA
imexa@telmexmail.com

CEDULA 657254

TITULO REGISTRADO A FOJAS 25

DEL LIBRO SETECIENTOS DOS

DE REGISTRO DE TITULOS PROFESIONALES Y GRADOS A



FIRMA DEL INTERESADO

TGN

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES

657254

EN VIRTUD DE QUE ONOFRE AVELINO ACUDO

CUMPLIO CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 5º CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE PROFESIONES Y SU REGLAMENTO SE LE EXPIDE LA PRESENTE

CEDULA

CON EFECTOS DE PATENTE PARA EJERCER LA PROFESION DE


LICENCIADO EN CONTADURIA

MEXICO, D.F. A 5 DE Enero DE 1987.

EL DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

LIC. ANTONIO CUELLAR SALAS

000213

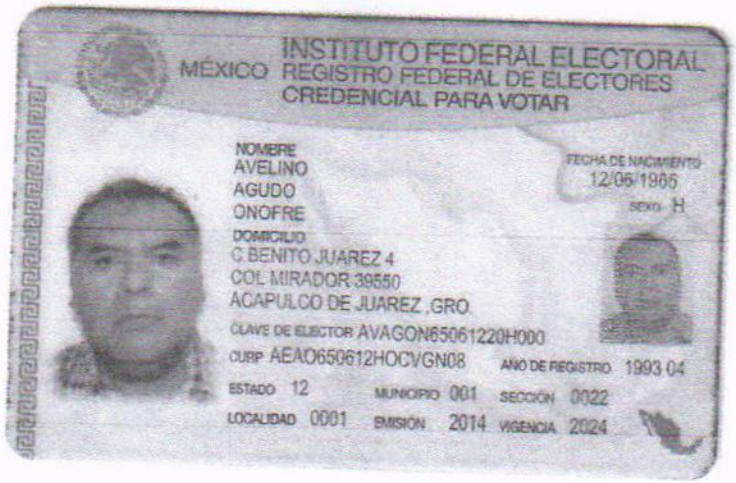
MÉXICO
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
AVELINO
AGUDO
ONOFRE
FECHA DE NACIMIENTO
12/06/1965
SEXO H
DOMICILIO
C BENITO JUAREZ 4
COL MIRADOR 39550
ACAPULCO DE JUAREZ ,GRO.
CLAVE DE ELECTOR AVAGON65061220H000
CURP AEAO650612HOCVGN08
AÑO DE REGISTRO 1993 04
ESTADO 12
MUNICIPIO 001
SECCIÓN 0022
LOCALIDAD 0001
EMISIÓN 2014
VIGENCIA 2024


IFE
IDMEX1154051371<<0022070275631
6506124H2412311MEX<04<<10915<3
AVELINO<AGUDO<<ONOFRE<<<<<<<<<

000214

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, **IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.** CON DOMICILIO EN: **CALLE CORREGIDORA NO. 4 COL. MORELOS, C.P. 39530, ACAPULCO, GRO.** COMO PATRON, REPRESENTADA POR LA ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ Y POR LA OTRA PARTE EL C.P. ONOFRE AVELINO AGUDO, COMO TRABAJADOR, CUYAS GENERALES SON:

EDAD:	58 AÑOS
SEXO:	MASCULINO
ESTADO CIVIL:	CASADO
INSTRUCCIÓN:	CONTADOR PUBLICO
DOMICILIO:	C. BENITO JUAREZ #4, COL. MIRADOR C.P. 39550 EN ACAPULCO, GRO.

LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- El trabajador se obliga a presentar al patrón o a su representante, sus servicios como empleado de confianza para desarrollar los servicios que a continuación se indiquen: ASESOR CONTABLE Y RESPONSABLE DEL AREA ADMINISTRATIVA, obligándose el trabajador en todo tiempo a desempeñar los servicios que se le consignan en este contrato, con la intensidad, cuidado y esmero apropiados en el domicilio principal del patrón en cualquiera de la sucursales que tienen o pudieran establecer, en cualquier parte de la Republica.

SEGUNDA. - Las partes convienen en que la relación de trabajo objeto de este contrato es por: TIEMPO INDETERMINADO.

TERCERA. - El trabajador declarara bajo protesta de decir verdad, que tiene la capacidad, experiencia y los conocimientos necesarios para desempeñar el trabajo señalado, en la cláusula PRIMERA, con la calidad que requiere el patrón.

CUARTA. - La duración de la jornada semanal de trabajo, será hasta de 30 horas, que el patrón podrá distribuir de acuerdo con lo que establece el Art. 59 de la Ley Federal del Trabajo, para que el trabajador pueda disponer del reposo del sábado en la tarde o cualquier otra modalidad equivalente.

QUINTA. - Las partes convienen en el que el trabajador recibirá por los servicios prestados en virtud de este contrato, la cantidad de $12,000.00 (DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.) como salario mensual, suma en la cual se incluye el sueldo del séptimo día de descanso obligatorio, cuyo pago será hecho en quincenas vencidas, el último día laborable del periodo correspondiente, en el local de patrón y dentro de las horas de trabajo.

IMEXA
Constructores, S.A. de C.V.
Calle Corregidora # 4, Col. Morelos
C.P. 39530 Acapulco, Gro.
R.F.C.: ICO-091216-UUA
imexa@telmexmail.com

SEXTA. - El trabajador expresa su conformidad y autoriza al patrón para que deduzca de su sueldo, los impuestos que sean a su cargo, las cuotas obreras del Instituto Mexicano del seguro Social, así como cualquier otra cantidad a cuyo pago pudiera estar obligada el trabajador, y en especial aquellos a que se refieren los artículos 97 y 100 de la Ley Federal del trabajo.

SEPTIMA. - El trabajador disfrutará de un día de descanso por cada seis días de trabajo en forma expresa, el trabajo devengado a que tuviera derecho hasta la fecha del mismo, conviniéndose en que su firma, implicará un finiquito total o de obligaciones del patrón hasta esa fecha.

OCTAVA. - En caso de que el trabajador tenga que laborar mayor tiempo del que fija la jornada legal, recabará del patrón por escrito, la orden para trabajar horas extra, sin cuyo requisito, no deberá presentar su servicio en jornadas extraordinarias.

NOVENA. - El trabajador disfrutará de un periodo semestral de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior al que señale el Art. 76 de la Ley Federal de Trabajo.

DECIMA. - El trabajador se obligará a sujetarse y cumplir con los planes y programas de capacitación y adiestramiento que el patrón establezca en el centro o centros de trabajo establecidos o que establezca y preste sus servicios a la trabajadora.

DECIMA PRIMERA. - El presente contrato se rescindirá o terminará por incumplimiento de las cláusulas del mismo o por los casos establecidos por La Ley Federal del trabajo.

DECIMA SEGUNDA. - El patrón y el trabajador convienen en forma expresa que todo lo no previsto en este contrato, se resolverá conforme a La Ley Federal del trabajo.

DECIMA TERCERA. - Debidamente enteradas las partes del contenido y alcance de las estipulaciones contenidas en las cláusulas de este contrato, lo firman de común acuerdo en Acapulco, Gro., a los 16 días del mes de enero del 2023.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
Ing. Irina Salgado Hernández
Representante Legal

C.P. ONOFRE AVELINO AGUDO
CED. PROF. NO. 657254

IMEXA
Constructores, S.A. de C.V.
Calle Corregidora # 4, Col. Morelos
C.P. 39530 Acapulco, Gro.
R.F.C.: ICO-091216-UUA
imexa@telmexmail.com

000216


MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
SALGADO
HERNANDEZ
IRINA

SEXO M

DOMICILIO
C NUEVO LEON 23
COL PROGRESO 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.


CLAVE DE ELECTOR SLHRIR67082312M900
CURP
SAHI670823MGRLRR09
AÑO DE REGISTRO
1993 06
FECHA DE NACIMIENTO
23/08/1967
SECCIÓN
0057
VIGENCIA
2023 - 2033


INE

IDMEX2412998667<<0057054805632
6708238M3312315MEX<06<<00253<9
SALGADO<HERNANDEZ<<IRINA<<<<<<

imexa
Constructores
S.A. de C.V.

IMEXA
Constructores, S.A. de C.V.
Calle Corregidora # 4, Col. Morelos
C.P. 39530 Acapulco, Gro.
R.F.C.: ICO-091216-UU
imexa@telmexmail.com

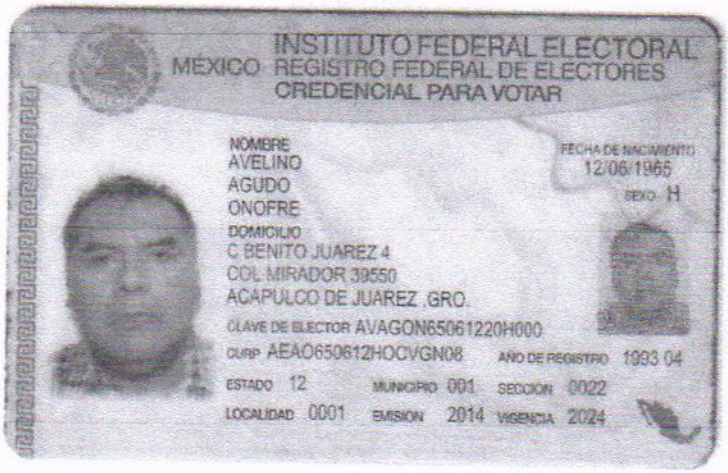

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
MÉXICO REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
AVELINO
AGUDO
ONOFRE

FECHA DE NACIMIENTO
12/06/1965

SEXO H


DOMICILIO
C BENITO JUAREZ 4
COL MIRADOR 39550
ACAPULCO DE JUAREZ ,GRO.

CLAVE DE ELECTOR AVAGON65061220H000

CURP AEAO650612HOCVGN08 AÑO DE REGISTRO 1993 04

ESTADO 12 MUNICIPIO 001 SECCION 0022

LOCALIDAD 0001 EMISION 2014 VIGENCIA 2024

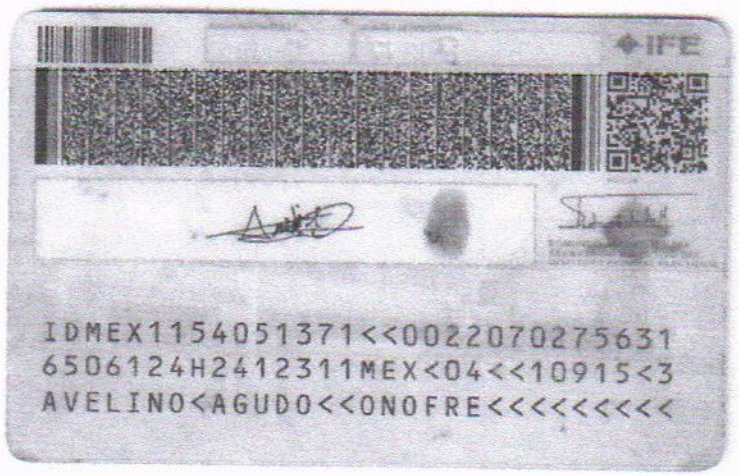

IDMEX1154051371<<0022070275631
6506124H2412311MEX<04<<10915<3
AVELINO<AGUDO<<ONOFRE<<<<<<<<<

IMEXA
Constructores, S.A. de C.V.
Calle Corregidora # 4, Col. Morelos
C.P. 39530 Acapulco, Gro.
R.F.C.: ICO-091216-UUA
imexa@telmexmail.com

000218

Currículum vitae

M. en Arq. Vicente Alarcón Severiano

000219

Currículum vitae

M. en Arq. Vicente Alarcón Severiano

Av. Reforma No. 2060
Col. Morelos
C.P. 39530
Acapulco, Guerrero.

Móvil 74 42-35-47-17
viasev@hotmail.com

INFORMACION PERSONAL

FECHA DE NACIMIENTO:21 DE DICIEMBRE DE 1968

LUGAR DE NACIMIENTO: **ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**

ESTADO CIVIL: **CASADO**

R.F.C.: **AASV 681221 1Z7**

EDAD: **53 AÑOS**

ESTUDIOS

1980-1983	**ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL No. 2** **CERTIFICADO DE SECUNDARIA**
1983-1986	**PREPARATORIA No. 17** **UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO** **CERTIFICADO DE PREPARATORIA**
1986-1991	**INSTITUTO TECNOLOGICO DE ACAPULCO** **LICENCIATURA EN ARQUITECTURA** **CEDULA N° 2220846**
1992-1994	**MAESTRIA EN ARQUITECTURA** **UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA.**
2005	**DIPLOMADO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA** **DIPLOMA POR LA UNIVERSIDAD LOYOLA DEL PACIFICO**
2007	**DIPLOMADO EN ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** **CURSO DE LEY DE OBRA PÚBLICA** **DIPLOMA POR LA C.M.I.C.**
2011	**CURSO LA INTERVENCION DEL PERITO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO** **DIPLOMA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO**
2012	**DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA No. 513**
2014	**CURSO COMO EVALUADOR DE DAÑOS EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA** **DIPLOMA OTORGADO POR EL INIFED Y LA SEP**
2 0 1 9	**MAESTRIA EN VALUACION INMOBILIARIA, INDUSTRIAL Y DE BIENES NACIONALES.** **INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION (C.M.I.C.)** **CEDULA PROF: 11844062**
	CURSO LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS **DIPLOMA POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE GUERRERO.**

000220

EXPERIENCIA LABORAL

REPRESENTANTE TECNICO DE
IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
DE 2010 A LA FECHA

2022 **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA
CONTRATO No. MAJ-FISM/242-2022/AD
IMPORTE CONTRATO $ 600,000.00
UBICACIÓN: COL. HERMENEGILDO GALEANA

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CIRUELOS
CONTRATO No. MAJ-FISM/243-2022/AD
IMPORTE CONTRATO $ 800,000.00
UBICACIÓN: COL. SAN ISIDRO

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR 2
CONTRATO No. MAJ-FISM/247-2022/AD
IMPORTE CONTRATO $ 600,000.00
UBICACIÓN: COL. ALIANZA POPULAR

AMPLIACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO
CONTRATO No. MAJ-FISM/038-2022/AD
IMPORTE CONTRATO $ 447,011.13
UBICACIÓN: POB. EL SALTO

2021 **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRIV. SANTA MARIA DEL MAR
CONTRATO No. MAJ-FISM/291-2021/AD
IMPORTE CONTRATO $ 634,000.00
UBICACIÓN: FRACC. LAS PLAYAS

AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CALLE CERRADA DE MONTE ALBAN
CONTRATO No. MAJ-FISM/293-2021/AD
IMPORTE CONTRATO $ 1,135,000.00
UBICACIÓN: FRACC. HORNOS INSURGENTES

AMPLIACION DE TECHADO EN ESC. SEC. FED. No 2 "JESUS MASTACHE ROMAN"
CONTRATO No. MAJ-FISM/290-2021/AD
IMPORTE CONTRATO $ 1,694,998.94
UBICACIÓN: COL. MORELOS

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO
CONTRATO No. MAJ-FISM/287-2021/AD
IMPORTE CONTRATO $ 1,477,000.00
UBICACIÓN: POB. EL SALTO

2020 **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

PAVIMENTACION DE CALLE PRIV. SANTA MARIA DEL MAR
CONTRATO No. MAJ-FISM/263-2020/AD
IMPORTE CONTRATO $ 1,999,999.42
UBICACIÓN: FRACC. LAS PLAYAS

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. SEC. FEDERAL No 2 JESUS MASTACHE ROMAN"
CONTRATO No. MAJ-FISM/262-2020/AD
IMPORTE CONTRATO $ 2,000,000.00
UBICACIÓN: COL. MORELOS

PAVIMENTACION DE CALLE UNIVERSIDAD
CONTRATO No. MAJ-FISM/175-2020/AD
IMPORTE CONTRATO $ 1,349,726.65
UBICACIÓN: COL. VILLA DE LAS FLORES

PAVIMENTACION DE CALLE 10
CONTRATO No. MAJ-FISM/244-2020/AD
IMPORTE CONTRATO $ 750,000.00
UBICACIÓN: COL. CUMBRES DE LLANO LARGO

PAVIMENTACION DE CALLE CERRADA DE MONTE ALBAN
CONTRATO No. MAJ-FISM/264-2020/AD
IMPORTE CONTRATO $ 1,999,999.42
UBICACIÓN: FRACC. HORNOS INSURGENTES

DOCENCIA

UNIVERSIDAD LOYOLA DEL PACIFICO, A. C.

CATEDRAS IMPARTIDAS EN EL PERIODO PRIMAVERA 2020

ARQUITECTURA SUSTENTABLE
HORARIO: MARTES DE 1:00 PM A 3:00 AM
JUEVES DE 1:00 PM A 3:00 AM

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
HORARIO: MARTES DE 3:00 PM A 5:00 AM
JUEVES DE 3:00 PM A 5:00 AM
UBICACIÓN: ACAPULCO, GRO.

CATEDRAS IMPARTIDAS EN EL PERIODO PRIMAVERA 2019

ARQUITECTURA SUSTENTABLE
HORARIO: MARTES DE 1:00 PM A 3:00 AM
JUEVES DE 1:00 PM A 3:00 AM

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
HORARIO: MARTES DE 3:00 PM A 5:00 AM
JUEVES DE 3:00 PM A 5:00 AM
UBICACIÓN: ACAPULCO, GRO.

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. UNIVERSIDAD
CONTRATO No. MAJ-FISM/085-2019/AD
IMPORTE CONTRATO $ 710,003.52
UBICACIÓN: COL. VALLE DE AS LORES

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. LINDA VISTA
CONTRATO No. MAJ-FISM/084-2019/AD
IMPORTE CONTRATO $ 1,448,102.22
UBICACIÓN: COL. LINDA VISTA

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA TELESECUNDARIA
CONTRATO No. MAJ-FISM/571-2019/AD
IMPORTE CONTRATO $ 1,000,000.00
UBICACIÓN: POB. APANHUAC

DOCENCIA

UNIVERSIDAD LOYOLA DEL PACIFICO, A. C.

CATEDRAS IMPARTIDAS EN EL PERIODO OTOÑO 2019

INSTALACIONES ELECTRICAS Y ESPECIALES
HORARIO: MARTES DE 1:00 PM A 3.00 PM
JUEVES DE 1.00 PM A 3.00 AM.

PROYECTO Y SOCIEDAD
HORARIO: LUNES DE 3.00 PM A 6.00 PM
MIERCOLES DE 3.00 PM A 6.00 P.M
UBICACIÓN: ACAPULCO, GRO.

CATEDRAS IMPARTIDAS EN EL PERIODO PRIMAVERA 2019

ARQUITECTURA SUSTENTABLE
HORARIO: MARTES DE 1:00 PM A 3:00 AM
JUEVES DE 1:00 PM A 3:00 AM

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
HORARIO: MARTES DE 3:00 PM A 5:00 AM
JUEVES DE 3:00 PM A 5:00 AM
UBICACIÓN: ACAPULCO, GRO.

2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INSURGENTES
CONTRATO No. MAJ-FISM/110-2018/AD
IMPORTE CONTRATO $ 800,000.00
UBICACIÓN: COL. C.N.C., ACAPULCO.

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESC. TELESECUNDARIA UNIDAD CIUDADANA
CONTRATO No. MAJ-FISM/108-2018/AD
IMPORTE CONTRATO $ 800,000.00
UBICACIÓN: COL. UNIDAD CIUDADANA

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO
CONTRATO No. MAJ-FISM/512-2018/AD
IMPORTE CONTRATO $ 1,083,654.09
UBICACIÓN: COL. AMPLIACION SAN ISIDRO, ACAPULCO

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR LAS TORRES
CONTRATO No. MAJ-FISM/511-2018/AD
IMPORTE CONTRATO $ 433,384.27
UBICACIÓN: COL. PASO LIMONERO, ACAPULCO

2018

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

CONSTRUCCION DE RED DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION EN CALLE MIMOSA EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
CONTRATO No. SDUOPOT-IF-AD-198-2018
IMPORTE CONTRATO $ 1,236,840.09
UBICACIÓN: COL. JARDIN, ACAPULCO

CONSTRUCCION DE ANDADOR CERRADA TROPICAL, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
CONTRATO No. SDUOPOT-IF-AD-198-2018
IMPORTE CONTRATO $ 1,236,840.09
UBICACIÓN: FRACC. LAS PLAYAS, ACAPULCO

CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL PARA LA CONEXIÓN DEL ANDADOR MANUEL AVILA CAMACHO Y JULIAN BLANCO, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
CONTRATO No. SDUOPOT-IF-AD-201-2018
IMPORTE CONTRATO $ 1,229,546.31
UBICACIÓN: COL. 20 DE NOVIEMBRE

CONSTRUCCION DE ANDADOR SIN NOMBRE ESQ. AV DEL TANQUE, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
CONTRATO No. SDUOPOT-IF-AD-160-2018
IMPORTE CONTRATO $ 547,362.71
UBICACIÓN: COL. 13 DE JUNIO, ACAPULCO

CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN TELESECUNDARIA UNIDAD CIUDADANA, CLAVE 12DTV0987, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
CONTRATO No. SDUOPOT-IF-INV-276-2018
IMPORTE CONTRATO $ 1,699,969.26
UBICACIÓN: COL. UNIDAD CIUDADANA, ACAPULCO

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION MEMBRILLO, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
CONTRATO No. SDUOPOT-IF-INV-273-2018
IMPORTE CONTRATO $2, 569,778.16
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS, ACAPULCO

2018

DOCENCIA
UNIVERSIDAD LOYOLA DEL PACIFICO, A. C.

CATEDRAS IMPARTIDAS EN EL PERIODO OTOÑO 2018

INSTALACIONES ELECTRICAS Y ESPECIALES
HORARIO: MARTES DE 1:00 PM A 3.00 PM
JUEVES DE 1.00 PM A 3.00 AM.

PROYECTO Y SOCIEDAD
HORARIO: LUNES DE 3.00 PM A 6.00 PM
MIERCOLES DE 3.00 PM A 6.00 P.M
UBICACIÓN: ACAPULCO, GRO.

CATEDRAS IMPARTIDAS EN EL PERIODO PRIMAVERA 2018

GESTION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL
HORARIO: LUNES DE 7.00 AM A 9.00 AM
MIERCOLES DE 9.00 AM A 11.00 AM.

ARQUITECTURA SUSTENTABLE
HORARIO: LUNES DE 9.00 AM A 11.00 AM
MIERCOLES DE 11.00 AM A 1.00 P.M
UBICACIÓN: ACAPULCO, GRO.

2017

DOCENCIA
UNIVERSIDAD LOYOLA DEL PACIFICO, A. C.

CATEDRAS IMPARTIDAS EN EL PERIODO OTOÑO 2017

GESTION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL
HORARIO: LUNES DE 7.00 AM A 9.00 AM
MIERCOLES DE 9.00 AM A 11.00 AM.

ARQUITECTURA SUSTENTABLE
HORARIO: LUNES DE 9.00 AM A 11.00 AM
MIERCOLES DE 11.00 AM A 1.00 P.M
UBICACIÓN: ACAPULCO, GRO.

CATEDRAS IMPARTIDAS EN EL PERIODO PRIMAVERA 2017

GESTION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL
HORARIO: LUNES DE 7.00 AM A 9.00 AM
MIERCOLES DE 9.00 AM A 11.00 AM.

ARQUITECTURA SUSTENTABLE
HORARIO: LUNES DE 9.00 AM A 11.00 AM
MIERCOLES DE 11.00 AM A 1.00 P.M
UBICACIÓN: ACAPULCO, GRO.

2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. EL CHORRITO
CONTRATO No. MAJ-FISM/130-2017/AD
IMPORTE CONTRATO $ 750,000.00
UBICACIÓN: COL. LOMA LARGA, ACAPULCO.

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
CONTRATO No. MAJ-FISM/135-2017/AD
IMPORTE CONTRATO $ 750,000.00
UBICACIÓN: COL. MIGUEL DE LA MADRID, ACAPULCO

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AMISTAD
CONTRATO No. MAJ-FISM/136-2017/AD
IMPORTE CONTRATO $ 750,000.00
UBICACIÓN: COL. BOSQUES DE LA CAÑADA, ACAPULCO

2016

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN ANDADOR 3
CONTRATO No. MAJ-FISM/238-2016/AD
IMPORTE CONTRATO $ 500,000.00
UBICACIÓN: COL. VILLA GUERRERO, ACAPULCO.

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANGOS
CONTRATO No. MAJ-FISM/268-2016/AD
IMPORTE CONTRATO $ 733,284.15
UBICACIÓN: COL. ANTORCHA REVOLUCIONARIA, ACAPULCO.

CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESC, PRIM. "VICENTE GUERRERO"
CONTRATO No. MAJ-FISM/326-2016/AD
IMPORTE CONTRATO $ 500,000.00
UBICACIÓN: POB. EL CERRITO

DOCENCIA
UNIVERSIDAD LOYOLA DEL PACIFICO, A. C.

CATEDRAS IMPARTIDAS EN EL PERIODO PRIMAVERA 2016

GESTION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL
HORARIO: LUNES DE 7.00 AM A 9.00 AM
MIERCOLES DE 9.00 AM A 11.00 AM.

ARQUITECTURA SUSTENTABLE
HORARIO: LUNES DE 9.00 AM A 11.00 AM
MIERCOLES DE 11.00 AM A 1.00 P.M
UBICACIÓN: ACAPULCO, GRO.

2015

DOCENCIA
UNIVERSIDAD LOYOLA DEL PACIFICO, A. C.

CATEDRAS IMPARTIDAS EN EL PERIODO OTOÑO 2015
PROGRAMAS ARQUITECTONICOS COMPLEJOS 90 HRS. CLASE
INSTALACIONES ELECTRICAS ESPECIALES 60 HRS. CLASE
UBICACIÓN: ACAPULCO, GRO.

CATEDRAS IMPARTIDAS EN EL PERIODO PRIMAVERA 2015
PROGRAMAS ARQUITECTONICOS COMPLEJOS 90 HRS. CLASE
UBICACIÓN: ACAPULCO, GRO.

SECRETARIA DE CULTURA
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

CONTRATO DE SERVICIOS PARA:

CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA A BASE DE MADERA DE PINO DE 16.00 X 12.00 X 6.00 MT. DE SECCION, ASI COMO ELABORACION DE TEJIDO EN FORMA DE CAPULLO EN INTERIOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE SECCION SIMILAR A LA MISMA UBICADA DENTRO DE LA GRAN GALERIA DEL CENTRO CULTURAL ACAPULCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL ÁREA, PARA EL PROYECTO DENOMINADO "ROSA DE LOS VIENTOS" EN EL POLIDEPORTIVO DE CD. RENACIMIENTO, ACAPULCO, DENTRO DEL PROGRAMA DE MÉXICO CULTURA PARA LA ARMONÍA.

2014

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA INSTALACION DE SERVICIO MONOFASICO EN BAJA TENSION EN TABLERO DE MEDICION.
CONTRATO NUM.: 800698203
IMPORTE CONTRATO: $172,840.00
UBICACIÓN: COL. PROGRESO

SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA INSTALACION DE SERVICIO MONOFASICO EN BAJA TENSION EN TABLERO DE MEDICION.
CONTRATO NUM.: 800691625
IMPORTE CONTRATO: $171,000.00
UBICACIÓN: UNIDAD HAB. EL COLOSO

DOCENCIA
UNIVERSIDAD LOYOLA DEL PACIFICO, A. C

CATEDRAS IMPARTIDAS EN EL PERIODO OTOÑO 2014
PROGRAMAS ARQUITECTONICOS COMPLEJOS 90 HRS. CLASE
UBICACIÓN: ACAPULCO, GRO.

CATEDRAS IMPARTIDAS EN EL PERIODO VERANO 2014
ARQUITECTURA DE INTERIORES 90 HRS. CLASE
DEL 26 DE MAYO AL 04 DE JULIO DE 2014.
UBICACIÓN: ACAPULCO, GRO.

CATEDRAS IMPARTIDAS EN EL PERIODO PRIMAVERA 2014
ARQUITECTURA DE INTERIORES 90 HRS. CLASE
UBICACIÓN: ACAPULCO, GRO.

OBRAS PARTICULARES

2013

CONSTRUCCION DE CASA HABITACION
CONTRATO No. IMEX-005-2013
IMPORTE CONTRATO $ 853, 564.00
UBICACIÓN: CALLE REFORMA,
COL. MORELOS EN ACAPULCO, GRO

DOCENCIA
UNIVERSIDAD LOYOLA DEL PACIFICO, A. C.

CATEDRAS IMPARTIDAS EN EL PERIODO OTOÑO 2013
PROGRAMAS ARQUITECTONICOS COMPLEJOS 120 HRS. CLASE
UBICACIÓN: ACAPULCO, GRO.

CATEDRAS IMPARTIDAS EN EL PERIODO PRIMAVERA 2013
ARQUITECTURA DE INTERIORES 120 HRS. CLASE
UBICACIÓN: ACAPULCO, GRO.

OBRAS PARTICULARES

2012

CONSTRUCCION DE CASA HABITACION
CONTRATO No. IMEX-004-2012
IMPORTE CONTRATO $ 1, 123, 466.00
UBICACIÓN: CALLE CORREGIDORA
COL. MORELOS EN ACAPULCO, GRO

CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS
CONTRATO No. IMEX-003-2012
IMPORTE CONTRATO $ 2, 396, 000.00
UBICACIÓN: CALLE ZACATECAS,
COL. PROGRESO EN ACAPULCO, GRO.

2011

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

"CENTRO DE INTERPRETACION AMBIENTAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO", UBICADA EN EL CERRO EL MOGOTE, INTERIOR DEL PARQUE PAPAGAYO, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
CONTRATO No. SEMAREN-AD-003-2011
IMPORTE CONTRATO: $ 1, 288, 423.40

2010

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

REHABILITACIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL ANDADOR QUE COMUNICA LAS CALLES HILARIO MALPICA Y NIÑOS HEROES DE VERACRUZ
CONTRATO No. SDUOP-FAFEF-AD-161-2010
IMPORTE CONTRATO $ 487,394.96
UBICACIÓN: COL. COSTA AZUL, ACAPULCO, GRO.

ADAPTACIÓN DE AREAS VERDES COMO PARQUE INFANTIL EN LA ETAPA 44 DEL COLOSO
CONTRATO No. SDUOP-FAFEF-AD-167-2010
IMPORTE CONTRATO $ 487,394.96
UBICACIÓN: COL. EL COLOSO, ACAPULCO, GRO.

REMODELACIÓN E IMAGEN URBANA DEL ENTORNO Y PLAZOLETA EN EL BARRIO DE LA POCITA POR LA CALLE LERDO DE TEJADA Y BARRIO DE LA GUINEA
CONTRATO No. SDUOP-FAFEF-AD-160-2010
IMPORTE CONTRATO $ 487,394.96
UBICACIÓN: COL. EL COLOSO, ACAPULCO, GRO.

REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO
CONTRATO No. SDUOP-FAFEF-AD-041-2010
IMPORTE CONTRATO $ 487,394.96
UBICACIÓN: COL. INFONAVIT, ALTA PROGRESO, ACAPULCO, GRO.

2009

CRYDASA CONSTRUCCIONES S.A. DE CV.

PUESTO: SOCIO FUNDADOR Y GERENTE DE CONSTRUCCION
DE ABRIL DE 1997 A FEBRERO DE 2010

RELACION DE CONTRATOS DE OBRA

O.P.D. COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO

CONSERVACIÓN DEL CAMINO SANTA CRUZ-OCOTITLAN-COACOYUL
CONTRATO No. OPDCICAEG/FISE/AD/161/2008
IMPORTE CONTRATO $ 750,423.72
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 09/12/2008 AL 22/01/2009
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE ZITLALA, GRO.

2008

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

REHABILITACIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS "ALEJANDRO GÓMEZ MAGANDA"
CONTRATO No. SDUOP-FIES-AD-322-2008
IMPORTE CONTRATO $ 323,376.00
UBICACIÓN: COL. EL COLOSO

TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO
CONTRATO No. SDUOP-FAFEF-AD-126-2008
IMPORTE CONTRATO $ 186,000.00
UBICACIÓN: ACAPULCO, GRO

2008

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

PAVIMENTACIÓN DE ANDADOR HERMANOS ESCUDERO
CONTRATO No. MAJ-FISM/401-2008/AD
IMPORTE CONTRATO $ 700,000.00
UBICACIÓN: COL. AMPLIACIÓN LA VENTA

REHABILITACIÓN DE BOULEVARD JOSE LOPEZ PORTILLO TRAMO AURRERA-GASOLINERA
CONTRATO No. MAJ-FISM/419-2005/AD
IMPORTE CONTRATO $ 1,049,481.36
UBICACIÓN: CD. RENACIMIENTO

OBRAS PARTICULARES

RADIO MÓVIL DIPSA, (TELCEL).
MANTENIMIENTOS Y ADECUACIÓN DE NUEVOS SITIOS

LOCAL "AAA" LA ISLA
INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, TRABAJOS DE TABLAROCA, PISOS, CANCELERIA A BASE DE CRISTAL TEMPLADO.
IMPORTE CONTRATO $ 208,000.00

LOCAL CUAUHTEMOC, LA GRAN PLAZA, ICACOS,
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL
IMPORTE CONTRATO: VARIABLE

2007

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO
CONTRATO No. SDUOP-FIES-AD-244-2007
IMPORTE CONTRATO $ 940,171.89
UBICACIÓN: ACAPULCO, GRO.

OBRAS PARTICULARES

RADIO MOVIL DIPSA, (TELCEL).
MANTENIMIENTOS Y ADECUACION DE NUEVOS SITIOS

LOCAL "AAA "	CENTRO DE ATENCION A CLIENTES, IXTAPA, GRO.
RADIO BASE	LAS ANCLAS, ACAPULCO, GRO.
RADIO BASE	ESTUARIO DEL PATAL, ACAPULCO, GRO
LOCAL "BBB"	CALLE HIDALGO, ACAPULCO, GRO.
LOCAL "BBB "	RENACIMIENTO, ACAPULCO, GRO.

SECRETARIA DE SALUD
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN "CAPASITS" DE CD. RENACIMIENTO
CONTRATO No. CMA/SDUOP-IED-INV-008-2006
IMPORTE CONTRATO $ 1, 550,000.00
UBICACIÓN: CD. RENACIMIENTO
ACAPULCO, GUERRERO.

2006

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PARA LA PREVENCION Y ATENCION DEL SIDA E INFECCIONES DE TRASMISION SEXUAL (CAPASITS)
CONTRATO No. SDUOP-IED-INV-008-2006
IMPORTE CONTRATO $ 2,233730.07
UBICACIÓN: CD. RENACIMIENTO
ACAPULCO, GUERRERO.

CONSTRUCCION DE PLAZOLETA RECREATIVA
CONTRATO No. SDUOP-PAFEF-AD-370-2006
IMPORTE CONTRATO $ 499,895.05
UBICACIÓN: 3RA. ETAPA EN LA COL. INFONAVIT ALTA PROGRESO ACAPULCO, GUERRERO.

SECRETARIA DE SALUD
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE "MALDONADO"
CONTRATO No. SES-FOSS-AD-074-2006
IMPORTE CONTRATO $ 208,689.12 S/IVA
UBICACIÓN: MALDONADO, MPIO. DE CUAJIINICUILAPA, GRO.

REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE "SAN NICOLAS"
CONTRATO No. SES-FOSS-AD-075-2006
IMPORTE CONTRATO $ 229,888.97 S/IVA
UBICACIÓN: SAN NICOLAS, MPIO. DE CUAJIINICUILAPA, GRO.

REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE "TIERRA COLORADA"
CONTRATO No. SES-FOSS-AD-076-2006
IMPORTE CONTRATO $ 208,643.15 S/IVA
UBICACIÓN: TIERRA COLORADA, MPIO. DE CUAJIINICUILAPA, GRO.

REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE "COMALTEPEC"
CONTRATO No. SES-FOSS-AD-077-2006
IMPORTE CONTRATO $ 58,769.57 S/IVA
UBICACIÓN: COMALTEPEC, MPIO. DE CUAJIINICUILAPA, GRO.

SECRETARIA DE EDUCACION
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE 5 PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA REGION CENTRO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO.
CONTRATO No. AD-OP-007/2006
IMPORTE CONTRATO $ 3, 657,500.00
UBICACIÓN: TIXTLA, GRO.

DOCENCIA
UNIVERSIDAD LOYOLA DEL PACIFICO, A. C.

CATEDRAS IMPARTIDAS EN EL PERIODO OTOÑO 2006
PROYECTOS II Y III 120 HRS. CLASE
UBICACIÓN: ACAPULCO, GRO.

CATEDRAS IMPARTIDAS EN EL PERIODO PRIMAVERA 2006
PROYECTOS III, IV Y V 120 HRS. CLASE
UBICACIÓN: ACAPULCO, GRO.

EDIFICACIONES A PARTICULARES

2005

NAVETA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONSTRUCCION DE VILLAS FAIRMONT HERITAGE PLACE
IMPORTE CONTRATO $ 1, 016, 000. 00
BOULEVARD LAS PALMAS (A UN COSTADO DEL HOTEL PRINCESS)
ACAPULCO, GUERRERO.

RADIO MOVIL DIPSA, (TELCEL).
MANTENIMIENTOS Y ADECUACION DE NUEVOS SITIOS

LOCAL "AAA " NIÑOS HEROES, ACAPULCO, GRO.
LOCAL "AAA " BERNAL DIAZ DEL CASTILLO, ACAPULCO, GRO.
LOCAL "BBB " 5 DE MAYO, ACAPULCO, GRO
LOCAL "BBB " SOLIDARIDAD, ACAPULCO, GRO.
LOCAL "AAA " LA JOYA, BOULEVARD DE LAS NACIONES, ACAPULCO, GRO.
LOCAL "AAA " CARR. NAL. CHILPANCINGO, GRO.
LOCAL "AAA " CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO, GRO.
LOCAL "AAA " LA POZA, ACAPULCO, GRO.
LOCAL "AAA " LAS PALMAS, BOULEVAR DE LAS NACIONES, ACAPULCO, GRO.

MAQUINARIA DIESEL S.A. DE C.V. (M A D I S A)

REMODELACION DE CAMPAMENTO LOS FILOS.
IMPORTE CONTRATO $ 224, 924.25
MEZCALA, GRO.

CONSTRUCION Y REMODELACION DE NAVE DE TALLER, ALMACEN Y OFICINAS.
IMPORTE CONTRATO $ 1, 765, 000.00
BOULEVAR DE LAS NACIONES NUM. 935
FRACC. GRANJAS DEL MARQUEZ, ACAPULCO, GRO.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EVA ZAMANO
CONTRATO No. SDUOP-IED-AD-130-2005
IMPORTE CONTRATO $ 457,539.10
UBICACIÓN: CALLE EVA ZAMANO, COL. JOSE LOPEZ PORTILLO
ACAPULCO, GUERRERO.

2005

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

PAVIMENTACION DE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ (2ª ETAPA) CAD. 0+060 AL 0+134.91
CONTRATO No. MAJ-FISM/228-2005/AD
IMPORTE CONTRATO $ 400,000.00
UBICACIÓN: CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, COL. JOSE LOPEZ PORTILLO
ACAPULCO, GUERRERO.

2005

DOCENCIA
UNIVERSIDAD LOYOLA DEL PACIFICO, A. C.

CATEDRAS IMPARTIDAS EN EL PERIODO OTOÑO 2005
PROYECTOS III Y IV 120 HRS. CLASE
UBICACIÓN: ACAPULCO, GRO.

CATEDRAS IMPARTIDAS EN EL PERIODO PRIMAVERA 2005
PROYECTOS IV 120 HRS. CLASE
UBICACIÓN: ACAPULCO, GRO.

2004

H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO

ASESORIA, PROYECTO Y CONSTRUCCION DE:
PAVIMENTACION DE CALLE CORREGIDORA
COL. EL MIRADOR
CONSTRUCCION DE ANDADOR CALLE 6
COL. JUAN R. ESCUDERO.

EDIFICACIONES A PARTICULARES

NAVETA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONSTRUCCION DE VILLAS FAIRMONT HERITAGE PLACE
IMPORTE CONTRATO $ 6, 371, 815. 90
BOULEVARD LAS PALMAS (A UN COSTADO DEL HOTEL PRINCESS)
ACAPULCO, GUERRERO.

RADIO MOVIL DIPSA, (TELCEL).

MANTENIMIENTOS Y ADECUACION DE NUEVOS SITIOS
BTS VICENTE GUERRERO, ACAPULCO, GRO.
RB. PLAYA DIAMANTE, ACAPULCO, GRO.
RB. LAS ANCLAS, ACAPULCO, GRO

DOCENCIA
UNIVERSIDAD LOYOLA DEL PACIFICO, A. C.

CATEDRAS IMPARTIDAS EN EL PERIODO OTOÑO 2004
PROYECTOS IV Y V 120 HRS. CLASE
UBICACIÓN: ACAPULCO, GRO.

CATEDRAS IMPARTIDAS EN EL PERIODO PRIMAVERA 2004
PROYECTOS V Y VI 120 HRS. CLASE
UBICACIÓN: ACAPULCO, GRO.

H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO.

2003

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
CONTRATO N° MAJ-FISM/071-2003/AD
IMPORTE CONTRATO $ 294, 169.14
CALLE ANTONIA NAVA, COLONIA ALTA CUAUHTEMOC
ACAPULCO, GUERRERO.

000235

CONSTRUCCION DE ANDADOR DRAGOS.
CONTRATO N° MAJ-FISM/350-2003/AD
IMPORTE CONTRATO $ 133, 648.18
CALLE DRAGOS, FRACC. LAS PLAYAS.
ACAPULCO, GUERRERO.

EDIFICACIONES A PARTICULARES

NAVETA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONSTRUCCION DE VILLAS FAIRMONT HERITAGE PLACE
IMPORTE CONTRATO $ 3, 935, 267.62
BOULEVARD LAS PALMAS (A UN COSTADO DEL HOTEL PRINCESS)
ACAPULCO, GUERRERO.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO

ASESORIA, PROYECTO Y CONSTRUCCION DE:

PAVIMENTACION DE CALLE SILVESTRE CASTRO
COL. SILVESTRE CASTRO.
PAVIMENTACION DE CALLE 18

COL. AMP. SILVESTRE CASTRO.
CONSTRUCCION DE ANDADOR CALLE 9
COL. JUAN R. ESCUDERO.

RADIO MOVIL DIPSA, (TELCEL).

MANTENIMIENTOS Y ADECUACION DE NUEVOS SITIOS
BTS LAS PLAYAS, FRACC. LAS PLAYAS ACAPULCO, GRO.
BTS. LA CIMA, ACAPULCO, GRO.
RB. PTO. ESCONDIDO, PUERTO ESCONDIDO OAXACA.
LOCAL AAA LOPEZ PORTILLO, ACAPULCO, GRO.
MICROCELULA LA CIMA, ACAPULCO, GRO.
RB. PINOTEPA CENTRO, PINOTEPA, OAXACA.

DOCENCIA

UNIVERSIDAD LOYOLA DEL PACIFICO, A. C.

CATEDRAS IMPARTIDAS EN EL PERIODO OTOÑO 2003
PROYECTOS IV Y V 120 HRS. CLASE
UBICACIÓN: ACAPULCO, GRO.

H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO.

2002

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
CONTRATO N° MAJ-FISM/015-2002/AD
IMPORTE CONTRATO $ 427, 711.08
CALLE CORREGIDORA 2ª. ETAPA, COLONIA EL MIRADOR.
ACAPULCO, GUERRERO.

CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN A BASE DE PIEDRA BRAZA.
CONTRATO N° MAJ-FISM/049-2002/AD
IMPORTE CONTRATO $ 434, 998.53
CALLE ANTONIA NAVA, COL. ALTA CUAUHTEMOC.
ACAPULCO, GERRERO.

2002

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
CONTRATO N° MAJ-FISM/098-2002/AD
IMPORTE CONTRATO $ 370, 634.32
AV. LAZARO CARDENAS, COL. ALTA CUAUHTEMOC
ACAPULCO, GRO.

H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO.

2001

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
CONTRATO N° MAJ-FISM/250-2001/AD
IMPORTE CONTRATO $ 459, 533.89
AVENIDA REFORMA, COLONIA MORELOS.
ACAPULCO, GUERRERO.

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR Y CANAL PLUVIAL
CONTRATO N° MAJ-FISM/092-2001/AD
IMPORTE DE CONTRATO $ 326, 482.90
CALLE CORREGIDORA, COLONIA EL MIRADOR.
ACAPULCO, GUERRERO.

RADIO MOVIL DIPSA, (TELCEL).

CONSTRUCCION DE RADIO BASE ALBORADA.
CALLE 14 MANZANA 26 LOTE 320, COL. POSTAL.
ACAPULCO, GUERRERO.

CONSTRUCCION DE RADIO BASE MARQUEZ.
ANTIGUA CARRETERA AL AEROPUERTO S/N, COL. GRANJAS DEL MARQUEZ.
ACAPULCO, GUERRERO.

CONSTRUCCION DE RADIO BASE CAPIRE.
BARRIO DEL HOSPITAL
ACAPULCO, GUERRERO.

CONSTRUCCION DE RADIO BASE POZA VERDE.
CD. RENACIMIENTO.
ACAPULCO, GUERRERO.

CONSTRUCCION DE MICROCELULAS.

ALTAMIRANO	ACAPULCO, GUERRERO.
PESCADO	ACAPULCO, GUERRERO.
PLAYA LARGA	ACAPULCO, GUERRERO.
RESIDENCIAL AMERICAS	ACAPULCO, GUERRERO.
CONSTITUYENTES	ACAPULCO, GUERRERO.
PAPAGAYO	ACAPULCO, GUERRERO.
LA SALLE	ACAPULCO, GUERRERO.

2000 **CONSTRUCCION DE RADIO BASE ICACOS.**
COLONIA ICACOS.
ACAPULCO, GUERRERO.

CONSTRUCCION DE RADIO BASE CONVENCIONES.
FRACCIONAMIENTO COSTA AZUL.
ACAPULCO, GUERRERO.

MANTENIMIENTOS.
RADIO BASE POZA HONDA, CHILAPA, GUERRERO.
RADIO BASE ESCORPION, TIERRA COLORADA, GUERRERO.
RADIO BASE PETETLAN, PETATLAN, GUERRERO.
RADIO BASE AEROPUERTO, ACAPULCO, GUERRERO.
CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES ICACOS, ACAPULCO, GUERRERO.

2000 **EDIFICACIONES A PARTICULARES.**

CONSTRUCCION DE CASA-HABITACION.
CALLE NIÑO PERDIDO # 5 COL. STA. CRUZ.
ACAPULCO, GUERRERO.

SUPERVISIÓN Y CÁLCULO ESTRUCTURAL.
CONSAGRADOS DEL SANTISIMO SALVADOR
EDIFICIO A TRES NIVELES DE AULAS Y CONVENTO DE HERMANAS
SAN ISIDRO, PIE DE LA CUESTA, GUERRERO.

H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO.
CALLE ANDRES FIGUEROA, COL. POPULAR.
ACAPULCO, GUERRERO.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
CALLE CORREGIDORA 1ª. ETAPA, COL. EL MIRADOR.
ACAPULCO, GUERRERO.

S.D.U.O.P. GUERRERO.

1999 **REORDENAMIENTO URBANO, COSTERA–PAPAGAYO.**
CONSTRUCCION DE RESTAURANTE.
ACAPULCO, GUERRERO.

EDIFICACION A PARTICULARES.

CONSTRUCCION DE CASA–HABITACIÓN.
AV. CUAUTEMOC No. 2414 C.P. 39650 COL. GARITA.
ACAPULCO, GUERRERO.

1998 **EDIFICACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS.**
AV. CUAUHTEMOC No. 134-4 C.P. 39350 COL. HORNOS.
ACAPULCO, GUERRERO.

000238


1998–1997 **VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL.**
CONSTRUCCIÓN DE 4 EDIFICIOS DE CINCO NIVELES, ESTACIONAMIETO
Y AREAS COMUNES.
CALLE RIO IXTAPA No. 5 COL. VISTA ALEGRE.
ACAPULCO, GRO.

ATENTAMENTE

M. EN ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO


CEDULA PROFESIONAL - LICENCIATURA EN ARQUITECTURA

Arq. Vicente Alarcón Severiano

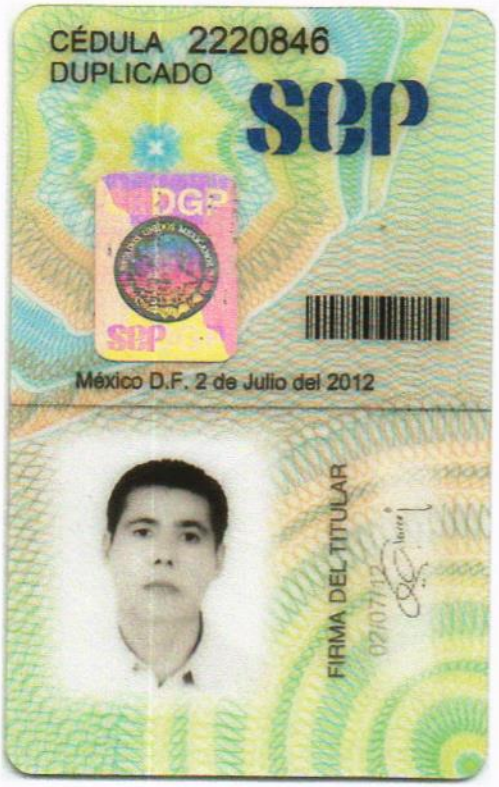



000240

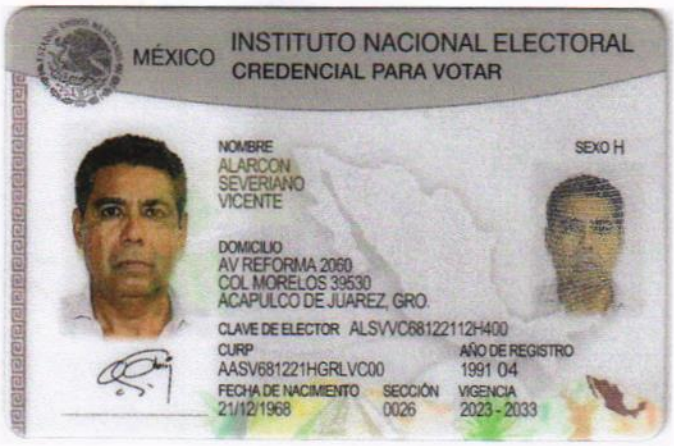

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
ALARCON
SEVERIANO
VICENTE

SEXO H

DOMICILIO
AV REFORMA 2060
COL MORELOS 39530
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE DE ELECTOR ALSVVC68122112H400
CURP AASV681221HGRLVC00
AÑO DE REGISTRO 1991 04
FECHA DE NACIMIENTO 21/12/1968
SECCIÓN 0026
VIGENCIA 2023 - 2033



INE

IDMEX2414903999<<0026047494258
6812218H3312315MEX<04<<00374<3
ALARCON<SEVERIANO<<VICENTE<<<<

IMEXA
Constructores, S.A. de C.V.

Calle Corregidora # 4, Col. Morelos
C.P. 39530 Acapulco, Gro.
R.F.C.: ICO-091216-UUA
imexa@telmexmail.com

000241

CEDULA PROFESIONAL ELECTRONICA: MAESTRIA EN VALUACION INMOBILIARIA INDUSTRIAL Y DE BIENES NACIONALES

Estados Unidos Mexicanos
Secretaría de Educación Pública
Dirección General de Profesiones
Cédula Profesional Electrónica

Número de Cédula Profesional
11844062

Clave Única de Registro de Población
AASV681221HGRLVC00

Entidad Federativa de Registro
CIUDAD DE MÉXICO

Libro	Foja	Número	Tipo
1184	226	13	C1

Se expide a:

Datos del profesionista

Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido
VICENTE	ALARCON	SEVERIANO

Quien cumplió con los requisitos establecidos en la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México y su Reglamento, la cédula con efectos de patente para ejercer profesionalmente en el nivel de:

Nombre del programa	Clave
MAESTRÍA EN VALUACIÓN INMOBILIARIA, INDUSTRIAL Y DE BIENES NACIONALES	619536

Datos de la institución educativa

Nombre o denominación	Clave
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN	120103

Datos de expedición y firma electrónica

Fecha	Hora
11/12/2019	21:58:54

Se expide la presente cédula electrónica de conformidad con el artículo 32 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México y demás relativos y aplicables.

El presente acto administrativo cuenta con la firma electrónica avanzada del servidor público competente, amparada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración y es válido de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

Firma electrónica

Cadena original

[11844062|1184|226|13|C1|11/12/2019 00:00:00|CIUDAD DE MÉXICO|AASV681221HGRLVC00|VICENTE|ALARCON|SEVERIANO|120|INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCION|2|103|MAESTRÍA EN VALUACIÓN INMOBILIARIA, INDUSTRIAL Y DE BIENES NACIONALES|619536]

Firma electrónica avanzada del servidor público facultado

[illegible]

DR. JUSTINO EDUARDO ANDRADE SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

Sello digital de tiempo SEP

[illegible]

QR para validar la información

La presente cédula electrónica, su integridad y autoría se podrá comprobar en: www.gob.mx/cedulaprofesional

Identificador electrónico: cédula

11844062

000242

La Universidad Autónoma de Guadalajara

Otorga a

Vicente Alarcón Severiano

el Grado de

Maestría en Arquitectura



en atención a que demostró con los certificados respectivos de aprobación haber realizado los estudios conforme a los planes autorizados por el Consejo Universitario y porque fue aprobado en el examen correspondiente que sustentó el día 19 de Marzo de 1996 según constancias archivadas en esta Universidad.

"Ciencia y Libertad"

Dado en la ciudad de Guadalajara Jalisco.
el día 19 de Marzo de 1996

El Secretario General

Lic. Carlos Pérez Vizcaíno

El Rector

Dr. Luis Garibay Gutiérrez

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

000243

La Secretaría de Educación Pública

por acuerdo del C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos otorga al C.



Vicente Alarcón Severiano

el título de

Arquitecto

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE INSTITUTOS TECNOLOGICOS
DEPTO. DE SERVICIOS ESCOLARES

en virtud de haber concluido los estudios requeridos de acuerdo a los planes y programas en vigor y haber sido aprobado en el acto recepcional que sustentó con fecha 28 de Octubre de 1993 en el

Instituto Tecnológico de Acapulco

Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal el día 31 de mayo de 1995

S. E. P.
DIRECCION GENERAL DE
INSTITUTOS TECNOLOGICOS
DIRECCION GENERAL

El Director General de Institutos Tecnológicos

Esteban Hernández Pérez

El Secretario de Educación Pública

Miguel Limón Rojas

83-9

COLEGIO E INSTITUTO DE VALUADORES DE GUERRERO, A.C.

GUERRERO FECOVAL FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE VALUADORES. A.C. CIVAGRO, A.C.

Otorga la presente

CONSTANCIA

al

ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

Por su asistencia en las:

"Actualizaciones de temas varios en la metodología de avalúos para créditos garantizados a vivienda 2022"

Martes 13 de septiembre del 2022
"Fideicomiso para zona restingida"
Expositor: **Lic. Violeta Montufar Ochoa**

Martes 25 de octubre del 2022
"Factores que influyen para estimar el valor comercial de un bien inmueble"
Expositor: **M.V.B.I. Carlos Peñaloza Mireles**

Martes 16 de noviembre del 2022
"Proyecto funcional en inmuebles para garantía hipotecaria"
Expositor: **M.V.B.I. Guadalupe Ludwig Castro**

Con valor curricular de capacitación: Total 10 Hrs.

COLEGIO E INSTITUTO DE VALUADORES DE GUERRERO, A. C. Consejo Directivo 2021-2023

M.V.B.I. Francisco Castro De la Cruz
Presidente

Ing. Juan Enrique Tejedo García de Alba
Vocal de Estudios Técnicos y Adminsión

000244

COLEGIO E INSTITUTO DE VALUADORES DE GUERRERO, A.C.

GUERRERO FECOVAL FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE VALUADORES, A.C. CIVAGRO, A.C.

Otorga la presente

CONSTANCIA

al

ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

Por su asistencia en el curso taller:

"Condominios y cálculo de indivisos"

Los días 29 y 30 de agosto del 2022, en modalidad virtual.
Con valor curricular de 10 horas.

COLEGIO E INSTITUTO DE VALUADORES DE GUERRERO, A. C.
Consejo Directivo 2021-2023

Arq. José Raúl Manuel Téllez Gómez
Vicepresidente

M.V.B.I. Francisco Castro De la Cruz
Presidente

Ing. Juan Enrique Tejedo García de Alba
Vocal de Estudios Técnicos y Adminsión

000245

COLEGIO E INSTITUTO DE VALUADORES DE GUERRERO, A.C.

GUERRERO
FECOVAL
FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE VALUADORES. A.C.
CIVAGRO, A.C.

Otorga la presente

CONSTANCIA

al

ARQ. VICENTE ALARCÓN SEVERIANO

Por su participación en el curso taller:

"Procedimiento práctico para estimar el valor por capitalización de rentas y cálculo de la tasa de capitalización"

Los días 24 y 25 de marzo del 2022,
en modalidad virtual con valor curricular de 10 horas.

M.V.B.I. Francisco Castro De la Cruz
Presidente

Esp. En Val. Arq. Salvador Padilla Castillo
Expositor

Ing. Juan Enrique Tejedo García de Alba
Vocal de Estudios Técnicos y Adminsión

000246

Colegio e Instituto de Valuadores de Guerrero, A. C.

y

Federación de Colegio de Valuadores, A .C.

Otorgan la presente

Constancia

a

Arq. Vicente Alarcón Severiano

Por su participación en el Curso

"Rangos, Formulas y Factores de ajuste al momento de ejecutar la homologación, "

Impartido en Acapulco de Juárez, Guerrero, el 06 de Julio del 2019

Valor curricular 8 horas

M.V. Arq. Norma Herlinda Aguilar Frías.
Ponente

E.V.I. Arq. Tomás Hernández Maldonado
Presidente
Colegio e Instituto de Valuadores de Guerrero, A. C.

E.V.I. Arq. José Navarrete Heredia
Vocal de Estudios Técnicos
Colegio e Instituto de Valuadores de Guerrero, A. C.

000247

uia

FEDERACIÓN PANAMERICANA DE ASOCIACIONES DE ARQUITECTOS

APEC Asia-Pacific Economic Cooperation

FCARM

Folio FCARM 0152

CONSTANCIA DE MEMBRESÍA

La Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana AC

Extiende la presente a:

Arq. Vicente Alarcón Severiano

Perteneciente al **Colegio de Arquitectos de Guerrero AC** como integrante de número de dicho colegio, el cual se encuentra afiliado a esta Federación y al corriente de sus obligaciones.

Para el periodo enero-diciembre 2021.

Arq. Marco Antonio Vegara Vázquez
Presidente FCARM

Arq. Úrsula Ruíz Segura
Secretaria General FCARM

Arq. Juan Alberto Carmona González
Vicepresidente Región I

Arq. Blanca Lilia Trujillo García
Presidente del Colegio de Arquitectos de Guerrero AC

000248

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

EL INSTITUTO NACIONAL DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

otorga la presente

ACREDITACIÓN

a

Vicente Alarcón Severiano

como Evaluador de Obra del Programa Escuelas Dignas,
julio de 2014, Guerrero

Ing. Héctor Rodríguez Quiroz
Gerente de Certificación, Diagnóstico y Evaluación

Vigencia: 1 año

000249

00282_EO

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

EL INSTITUTO NACIONAL DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

otorga la presente

ACREDITACIÓN

a

Vicente Alarcón Severiano

como Evaluador de Daños de la Infraestructura Física Educativa,
julio de 2014, Guerrero

Ing. Héctor Rodríguez Quiroz
Gerente de Certificación, Diagnóstico y Evaluación

Vigencia: 1 año

000250

00282_ED

000251

UNIVERSIDAD LOYOLA DEL PACÍFICO

La Universidad Loyola del Pacífico

Otorga la presente

Constancia

a

Arq. Vicente Alarcón Severiano

por su participación en el Taller

La Enseñanza del Proyecto Arquitectónico

Impartido por la Arq. Liliana Murillo Castro

con una duración 30 hrs.

21, 22, 28 y 29 de Enero de 2005

ING. ENRIQUE PASTA MUÑUZURI
Rector Universidad Loyola del Pacifico

ARQ. ROGELIO ZUBILLAGA LUNA
Coordinador de Arquitectura

Acapulco Gro. 29 de Enero 2005

000252

Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero

Poder Judicial del Estado de Guerrero

otorga la presente

Constancia

Al Arq. Vicente Alarcón Severiano

Por su asistencia al *curso denominado* ***"La Intervención del perito en el Sistema Penal Acusatorio"***, impartido del 09 de julio al 03 de septiembre de 2011, *con una duración de 25 horas*, en la ciudad de Chilpancingo, de los Bravo, Guerrero.

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE GUERRERO

Dr. Jesús Martínez Garnelo

Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero

Juicio Oral

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción A.C. otorgan el presente

DIPLOMA

a: **Arq. Vicente Alarcón Severiano**

por su participación en:

Curso de Ley de Obras Públicas

con duración de **20** horas que se llevó a cabo en **Acapulco de Juárez**

del **12** al **15 de Noviembre** de **2007**

Ing. Rubén Tejeda Ortega
Vicepresidente ICIC Acapulco

Ing. Carlos Sánchez Gómez
Instructor

REG. STPS ICI-780419001013

439081

000253

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el
Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción A.C.
otorgan el presente

DIPLOMA

a: **Arq. Vicente Alarcón Severiano**

por su participación en:

Diplomado de Precios Unitarios

con duración de **60** horas que se llevó a cabo en **Acapulco de Juárez**

del **6** al **29 de Agosto** de **2007**

Ing. Rubén Tejeda Ortega
Vicepresidente ICIC Acapulco

Ing. Carlos Sánchez Gómez
Instructor

REG. STPS ICI-780419001013

368764

000254

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el
Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción A.C.
otorgan el presente

DIPLOMA

a: **Arq. Vicente Alarcón Severiano**

por su participación en:

Curso de Neodata Nivel Avanzado

con duración de **12** horas que se llevó a cabo en **Acapulco de Juárez**

del **16,18** al **20 y 23 de Abril** de **2007**

Ing. Rubén Tejeda Ortega
Vicepresidente ICIC Acapulco

Arq. Juan Alberto Carmona González
Instructor

REG. STPS ICI-780419001013

371904

000255

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, **IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.** CON DOMICILIO EN: **CALLE CORREGIDORA NO. 4 COL. MORELOS, C.P. 39530, ACAPULCO, GRO.** COMO PATRON, REPRESENTADA POR LA ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ Y POR LA OTRA PARTE EL M. EN ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO, COMO TRABAJADOR, CUYAS GENERALES SON:

EDAD:	54 AÑOS
SEXO:	MASCULINO
ESTADO CIVIL:	CASADO
INSTRUCCIÓN:	ARQUITECTO
DOMICILIO:	AV. REFORMA NUM. 2060, COL. MORELOS C.P. 39530 EN ACAPULCO, GRO.

LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- El trabajador se obliga a presentar al patrón o a su representante, sus servicios como empleado de confianza para desarrollar los servicios que a continuación se indiquen: REPRESENTANTE TECNICO Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, obligándose el trabajador en todo tiempo a desempeñar los servicios que se le consignan en este contrato, con la intensidad, cuidado y esmero apropiados en el domicilio principal del patrón en cualquiera de la sucursales que tienen o pudieran establecer, en cualquier parte de la Republica.

SEGUNDA. - Las partes convienen en que la relación de trabajo objeto de este contrato es por: TIEMPO INDETERMINADO.

TERCERA. - El trabajador declarara bajo protesta de decir verdad, que tiene la capacidad, experiencia y los conocimientos necesarios para desempeñar el trabajo señalado, en la cláusula PRIMERA, con la calidad que requiere el patrón.

CUARTA. - La duración de la jornada semanal de trabajo, será hasta de 48 horas, que el patrón podrá distribuir de acuerdo con lo que establece el Art. 59 de la Ley Federal del Trabajo, para que el trabajador pueda disponer del reposo del sábado en la tarde o cualquier otra modalidad equivalente.

QUINTA. - Las partes convienen en el que el trabajador recibirá por los servicios prestados en virtud de este contrato, la cantidad de $18,000.00 (DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) como salario mensual, suma en la cual se incluye el sueldo del séptimo día de descanso obligatorio, cuyo pago será hecho en quincenas vencidas, el último día laborable del periodo correspondiente, en el local de patrón y dentro de las horas de trabajo.

imexa
Constructores S.A. de C.V.

IMEXA
Constructores, S.A. de C.V.

Calle Corregidora # 4, Col. Morelos
C.P. 39530 Acapulco, Gro.
R.F.C.: ICO-091216-UUA
imexa@telmexmail.com

SEXTA. - El trabajador expresa su conformidad y autoriza al patrón para que deduzca de su sueldo, los impuestos que sean a su cargo, las cuotas obreras del Instituto Mexicano del seguro Social, así como cualquier otra cantidad a cuyo pago pudiera estar obligada el trabajador, y en especial aquellos a que se refieren los artículos 97 y 100 de la Ley Federal del trabajo.

SEPTIMA. - El trabajador disfrutará de un día de descanso por cada seis días de trabajo en forma expresa, el trabajo devengado a que tuviera derecho hasta la fecha del mismo, conviniéndose en que su firma, implicará un finiquito total o de obligaciones del patrón hasta esa fecha.

OCTAVA. - En caso de que el trabajador tenga que laborar mayor tiempo del que fija la jornada legal, recabará del patrón por escrito, la orden para trabajar horas extra, sin cuyo requisito, no deberá presentar su servicio en jornadas extraordinarias.

NOVENA. - El trabajador disfrutará de un periodo semestral de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior al que señale el Art. 76 de la Ley Federal de Trabajo.

DECIMA. - El trabajador se obligará a sujetarse y cumplir con los planes y programas de capacitación y adiestramiento que el patrón establezca en el centro o centros de trabajo establecidos o que establezca y preste sus servicios a la trabajadora.

DECIMA PRIMERA. - El presente contrato se rescindirá o terminará por incumplimiento de las cláusulas del mismo o por los casos establecidos por La Ley Federal del trabajo.

DECIMA SEGUNDA. - El patrón y el trabajador convienen en forma expresa que todo lo no previsto en este contrato, se resolverá conforme a La Ley Federal del trabajo.

DECIMA TERCERA. - Debidamente enteradas las partes del contenido y alcance de las estipulaciones contenidas en las cláusulas de este contrato, lo firman de común acuerdo en Acapulco, Gro., a los 16 días del mes de enero del 2023.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
Ing. Irina Salgado Hernández
Representante Legal

M. en Arq. Vicente Alarcón Severiano
CED. PROF. NO. 2220846

IMEXA
Constructores, S.A. de C.V.

Calle Corregidora # 4, Col. Morelos
C.P. 39530 Acapulco, Gro.
R.F.C.: ICO-091216-UUA
imexa@telmexmail.com

000258


MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
ALARCON
SEVERIANO
VICENTE

SEXO H

DOMICILIO
AV REFORMA 2000
COL MORELOS 39530
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE DE ELECTOR ALSVVC68122112H400
CURP
AASV681221HGRLVC00
AÑO DE REGISTRO
1991 04
FECHA DE NACIMIENTO
21/12/1968
SECCIÓN
0026
VIGENCIA
2023 - 2033


INE

IDMEX2414903999<<0026047494258
6812218H3312315MEX<04<<00374<3
ALARCON<SEVERIANO<<VICENTE<<<<

IMEXA
Constructores, S.A. de C.V.

Calle Corregidora # 4, Col. Morelos
C.P. 39530 Acapulco, Gro.
R.F.C.: ICO-091216-UUA
imexa@telmexmail.com

000259


MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
SALGADO
HERNANDEZ
IRINA

SEXO M

DOMICILIO
C NUEVO LEON 23
COL PROGRESO 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE DE ELECTOR SLHRIR670823 12M900
CURP
SAHI670823MGRLRR09
AÑO DE REGISTRO
1993 06
FECHA DE NACIMIENTO
23/08/1967
SECCIÓN
0057
VIGENCIA
2023 - 2033


INE

IDMEX2412998667<<0057054805632
6708238M3312315MEX<06<<00253<9
SALGADO<HERNANDEZ<<IRINA<<<<<<

IMEXA
Constructores, S.A. de C.V.
Calle Corregidora # 4, Col. Morelos
C.P. 39530 Acapulco, Gro.
R.F.C.: ICO-091216-UUA
imexa@telmexmail.com

CALLE JUAN ESCUTIA No. 460.
COL. LAZARO CARDENAS.
ACAPULCO; GRO.

Teléfono
7441077073
Fax
Correo electrónico
miguelrobledo1000@gmail.com



000260

MIGUEL ANGEL ROBLEDO VARGAS

Información personal

Estado civil: Casado

Nacionalidad: Mexicana

Edad: 54 Años

Lugar de nacimiento: Acapulco; Gro.

Educación

1974 – 1980 ESC. PRIM. FED. URB. VESP. MARGARITA MAZA DE JUAREZ. ACAPULCO; GRO.
CERTIFICADO DE EDUCACION PRIMARIA.

1980- 1983 ESC. SEC. FED.URB. MAT. No. 4
ACAPULCO; GRO.
CERTIFICADO DE EDUCACION SECUNDARIA.

1983- 1986 ESC. PREPARATORIA No. 27.
ACAPULCO; GRO.
CERTIFICADO DE EDUCACION PREPARATORIA.

1986- 1991 INSTITUTO TECNOLOGICO DE ACAPULCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA.
ACAPULCO; GRO.
CERTIFICADO DE LICENCIATURA EN ARQ.
TITULO PROFESIONAL.

1992 – 1992 CONSTRUCTORA RAGOM S.A. DE C.V. ACAPULCO; GRO.
RESIDENTE DE OBRA, CONTRATISTA.
CONSTRUCCION DEL HOTEL CAMINO REAL PICHILINGUE
DIAMANTE

1993–1993 CONSTRUCTORA TORREBLANCA S.A. DE C.V. ACAPULCO;GRO.
CONTRATISTA.
PAVIMENTACION Y RESTAURACION DE CALLES CON EL PROGRAMA
SOLIDARIDAD

1993 – 1993 CONSTRUCTORA URBE DEL PACIFICO S.A. DE C.V. ACAPULCO; GRO.
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS.
DISEÑO DE PROYECTOS VIVIENDA DE INTERES SOCIAL.

1993 – 1993 HABITACIONES HORIZONTALES S.A. DE C.V. ACAPULCO; GRO.
RESIDENTE DE OBRA.
REMODELACION HOTEL ACAPULCO DOLPHINS.

1995 – 1995 CONSTRUCTORA COSTA DEL SOL S.A. DE C.V. ACAPULCO; GRO.
RESIDENTE DE OBRA.
CONSTRUCCION DE CONDOMINIOS NIVEL MEDIO EN EL AREA DE CALETA ,
REMODELACIONES EN LAS BRISAS Y CONDOMINIO ACAPULCO MARQUEZ.

1995 – 1995 CONSTRUCTORA ESC S.A. DE C.V. ACAPULCO; GRO.
RESIDENTE DE OBRA.
CONSTRUCCION DE CLINICA RURAL Y AULAS ESCOLARES EN EL POBLADO DE
AHUELICAN, GRO. MUNICIPIO DE EDUARDO C. NERI

1996 – 1997 ARTEC S.A. DE C.V. ACAPULCO; GRO.
RESIDENTE DE OBRA.
REMODELACION DE BUGALOWS BELL–AIR, MOTEL PALADIN Y MOTEL LAS
VEGAS , ACAPULCO , GRO.

1997 – 1997 CRYDASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ACAPULCO; GRO.
CONTRATISTA.
CONSTRUCCION DE FUENTE EN RESIDENCIA EN EL POBLADO DE SAN LUIS LA
LOMA, GRO.

1997 – 1998 CONSTRUCTORA PANAC S.A. DE C.V. ACAPULCO; GRO.
CONTRATISTA.
CONSTRUCCION DE UNIDAD HABITACIONAL, 4 EDIFICIOS DE INTERES SOCIAL Y ESTACIONAMIENTO COMUN, ACAPULCO, GRO.

1998 – 1998 CRYDASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ACAPULCO; GRO.
RESIDENTE DE OBRA.
CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, ACAPULCO, GRO.

1998 – 1998 CALMECAC CONSULTORES S.A. DE C.V. ACAPULCO; GRO.
AUXILIAR DE SUPERVISION.
CONSTRUCCION DE PUENTE EJIDO 1 Y PUENTE CALLE 13, ACAPULCO, GRO.

1999 – 1999 CONSTRUCTORA HOME S.A. DE C.V. ACAPULCO; GRO.
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y CONTROL PRESUPUESTAL.
PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CALLES: CHIHUAHUA,SAN LUIS POTOSI , LAS PALMAS , ACCESO A COLONIA LAS PAROTAS., Y AV. LA SIUZA . ACAPULCO, GRO.

1999 – 1999 DICTEC CONSULTORES S.A. DE C.V. ACAPULCO; GRO.
SUPERVISION EXTERNA.
CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL Y OBRAS INDUCIDAS DE CALLE AV. LA SUIZA DEL CADENAMIENTO 0+340 – 0+0.000 ACAPULCO, GRO.

1999 – 1999 CRYDASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ACAPULCO;GRO.
RESIDENTE DE OBRA.
CONSTRUCCION DE CASA–HABITACION COL. " GARITA " ACAPULCO ,GRO.

1999 – 2000 CRYDASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ACAPULCO; GRO.
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y CONTROL PRESUPUESTAL.
CONSTRUCCION DE RESTAURANTE DE PLAYA EN EL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO URBANO DE LA ZONA MARITIMA BOULEVARD PAPAGAYO ACAPULCO, GRO.

2000 – 2000 CONVENTO DEL PERPETUO SOCORRO ACAPULCO; GRO.
SUPERVISION DE OBRA.
CONSTRUCCION DE CIMENTACION PARA EDIFICIO DE CONVENTO DE PERPETUO SOCORRO ACAPULCO, GRO.

2000 – 2000 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. REGION DE LA COSTA CHICA .
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, GRO.

2001 CRYDASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ACAPULCO; GRO.
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y CONTROL PRESUPUESTAL.
CONSTRUCCION DE RADIO BASE ICACOS, RADIO BASE CONVENCIONES,EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO.

2001 CRYDASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ACAPULCO; GRO.
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO.
CALLE ANDRES FIGUEROA, COL. POPULAR. H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO.
ACAPULCO, GUERRERO.

2001 CRYDASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ACAPULCO; GRO.

CONSTRUCCION DE MICROCELULAS RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.

- **ALTAMIRANO, ACAPULCO, GUERRERO.**
- **PESCADO, ACAPULCO, GUERRERO.**
- **PLAYA LARGA, ACAPULCO, GUERRERO.**
- **RESIDENCIAL AMERICAS, ACAPULCO, GUERRERO.**
- **CONSTITUYENTES, ACAPULCO, GUERRERO.**
- **PAPAGAYO, ACAPULCO, GUERRERO.**
- **LA SALLE, ACAPULCO, GUERRERO.**

2001 CRYDASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ACAPULCO; GRO.

CONSTRUCCION DE RADIO BASES RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.

- CONSTRUCCION DE RADIO BASE ALBORADA.

CALLE 14 MANZANA 26 LOTE 320, COL. POSTAL.
ACAPULCO, GUERRERO.

- CONSTRUCCION DE RADIO BASE MARQUEZ.

ANTIGUA CARRETERA AL AEROPUERTO S/N, COL. GRANJAS DEL MARQUEZ.
ACAPULCO, GUERRERO.

- CONSTRUCCION DE RADIO BASE CAPIRE.

BARRIO DEL HOSPITAL
ACAPULCO, GUERRERO.

- CONSTRUCCION DE RADIO BASE POZA VERDE.

CD. RENACIMIENTO.
ACAPULCO, GUERRERO.

2002 CRYDASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ACAPULCO; GRO.
MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES A RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.

MANTENIMIENTOS Y ADECUACION DE SITIOS

- BTS LAS PLAYAS, FRACC. LAS PLAYAS ACAPULCO, GRO.
- BTS. LA CIMA, ACAPULCO, GRO.
- RB. PTO. ESCONDIDO, PUERTO ESCONDIDO OAXACA.
- LOCAL AAA LOPEZ PORTILLO, ACAPULCO, GRO.
- MICROCELULA LA CIMA, ACAPULCO, GRO.
- RB. PINOTEPA CENTRO, PINOTEPA, OAXACA.
- BTS CRUCERO.
- BTS PESCADO II

2003-2004 CRYDASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ACAPULCO; GRO.

- **SUB CONTRATO CON NAVETA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**
-

CONSTRUCCION DE VILLAS FAIRMONT HERITAGE PLACE
BOULEVARD LAS PALMAS (A UN COSTADO DEL HOTEL PRINCESS)
ACAPULCO, GUERRERO

2003 CRYDASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ACAPULCO; GRO.
MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES A RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.

MANTENIMIENTOS Y ADECUACION DE SITIOS

- BTS VICENTE GUERRERO, ACAPULCO, GRO.
- RB. PLAYA DIAMANTE, ACAPULCO, GRO..
- RB. LAS ANCLAS, ACAPULCO, GRO

2003 CRYDASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ACAPULCO; GRO.
MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES, RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.

- RB IGUALA CENTRO, IGUALA, GRO.
- RB. CIUDAD COYUCA, COYUCA DE BENITEZ, GRO.
- RB. PLAN DE LOS AMATES; ACAPULCO, GRO.

.2004 -2005

RESIDENTE DE COSTOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN MAYAN RESORT ACAPULCO: OBRAS A CARGO:

CENTRO DE ENTRETENIMIENTO, TERRAZA FIESTA TEMA,SALA DE VENTAS NACIONALES,MANTENIMIENTO DE HOTEL MAYAN RESORT Y CONDOMINIOS.

2005

CONSTRUCCION DE NODO BTS LLANO GRANDE ACAPULCO; GRO.
PARA RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE OBRA DE BAJA TENSION OBRA CIVIL EN MICRO. PRINCESS PARA RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V. ACAPULCO; GRO.

2005

SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE GASOLINERA DE OBRA CIVIL EN EL INTERIOR DE CLUB DE YATES ACAPULCO

2006

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (CAPASITS), ACAPULCO; GRO., PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE GUERRERO

2006

REHABILITACION DE CLINICA DE SALUD EN LOS POBLADOS DE SAN NICOLAS, TIERRA COLORADA, MALDONADO Y COMALTEPEC; MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA; GRO.

2006 – 2007.

RESIDENTE DE COSTOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE CUARTOS Y AREAS COMUNES DENTRO DEL GRUPO MAYAN ACAPULCO, DENOMINADO MAYAN REGENCY GOLF.

2006 - 2010
RESIDENTE DE COSTOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ,

CONSTRUCCION DE MAYAN REGENCY GOLF, 5 EDIFICIOS DE 3 NIVELES , AREAS EXTERIORES, ALBERCAS, MOTOR LOBBY.
EDIFICIOS MAYAN LAKES 3 NIVELES, AREAS EXTERIORES, VIALIDADES, ALBERCAS CTO. DE FILTROS, SNACK,MAYAN LAKES 3ª.ETAPA ,CASA CLUB, ALBERCA, EDIFICIO DE 10 NIVELES MAYAN VIEV LAKES, MAYAN VIEW LAKES EDIFICIO DE 6 NIVELES Y AREAS EXTERIORES, MAYAN PALACE PLAYA EDIF. DE 14 NIVELES Y AREAS EXTERIORES

2010

INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION

OBRAS DIVERSAS DE INSTALACIONES : DEPARTAMENTO DE COSTOS Y CONTROL PRESUPUESTAL

2010

CASA – HABITACION EN EL POBLADO DE LA BONFIL EN ACAPULCO GRO.

2010- 2012

GRUPO MEXICANO DE DESARROLLO (GMD)

JEFE DE FRENTE
PROYECTO. MARINA MAJAHUA: MUELLE PUBLICO, PROYECTO DE MARINA DIQUE NORTE Y DIQUE PONIENTE(CABO MARQUES)
ACAPULCO; GUERRERO

2012-2013

PLAZA OLIMPICA DEL CLUB DE YATES ACAPULCO;
ACAPULCO; GUERRERO

CONSTRUCCION DE CANCHA DE PADEL Y AREAS EXTERIORES EN VILLA NAS DEL FRACCIONAMIENTO LAS BRISAS ACAPULCO,
ACAPULCO; GUERRERO

REHABILITACION DE PLAFONES EN EL AEROPUERTO DE ACAPULCO EN EL AREA DE ACCESO AL PUBLICO
ACAPULCO; GUERRERO

COSTRUCCION DE PROYECTO TURISTICOS Y NATURALEZA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE MARQUELIA GUERRERO PARA LA S.D.U.O.P. DEL ESTADO DE GUERRERO

2013-2015

GRUPO VIDANTA (EDIFICADORA DE INMUEBLES TURISTICOS S.A. DE C.V) ADMINISTRACION DE PROYECTOS, CONTROL PRESUPUESTAL PLAZA ACAPULCO,
OBRAS:

- **EDIFICIO MAYAN PALACE PLAYA NIVELES 14 HASTA NIVEL 10**
- **AREAS EXTERIORES MAYAN PALACE PLAYA (ALBERCAS Y MODULOS DE ACTIVIDADES, TOALLAS, SERVICIOS)**
- **EDIFICIOS DE SERVICIOS AREAS EXTERIORES MAYAN PALACE PLAYA (CUARTO DE MAQUINAS Y FILTROS)**
- **EDIFICIO PLAZA**
- **AREAS EXTERIORES DE GRAND MAYAN (ALBERCA, LAGO, RIO LENTO, SNACK, MODULOS DE ACTIVIDADES, TOALLAS)**
- **EDIFICIOS DE SERVICIOS AREAS EXTERIORES GRAND MAYAN (CUARTO DE MAQUINAS Y FILTROS)**
- **CTOS. MUESTRA THE BLISS, GRAND BLISS & GRAND LUXE**
- **REHABILITACION DE RESTAURANT EPAZONTE**

2015

- **CONSTRUCCCION DE PUENTE EL MAMEY 1 LIBRAMIENTO NORTE DE ACAPULCO PUNTA DIAMANTE-ZIHUATANEJO (CONTRATISTA DE ESTRUCTURA)**

2016

- PAVIMENTACION DE CALLE GERANIOS COLONIA UNIDOS POR GUERRERO ACAPULCO GRO. CALVO CONSTRUCTORA (RESIDENTE DE OBRA)
- PAVIMENTACION DE CALLE CONSTITUCION DE COLOMBIA COLONIA SIMON BOLIVAR ACAPULCO GRO. CALVO CONSTRUCTORA (RESIDENTE DE OBRA)

2016-2017

- CONSTRUCCION DE CASETAS DE COBRO EN VIADUCTO DIAMANTE ACAPULCO; GRO. GRUPO MEXICANO DE DESARROLLO (JEFE DE FRENTE)

2017-ENERO 2020

- COORDINADOR DE CONTROL PRESUPUESTAL: CONSTRUCCION DE EDIFICIO MAYAN PALACE PLAYA II ESTRUCTURA Y ALBAÑILERIA DE 10 NIVELES, EDIFICIO PLAZA (TIENDA DE CONVENIENCIA), REPARACION DE PLAFONES Y COCINETAS GRAND MAYAN, OBRAS MENORES (AREAS EXTERIORES), CAMBIO DE PALAPAS EN SANTUARIO SEGUNDA ETAPA GRUPO VIDANTA, ACAPULCO; GRO.

FEB-2020 A LA FECHA

- JEFE DE DEPTO. DEL AREA TECNICA EN IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. (CONTROL Y SUPERVISION DE ESTIMACIONES, PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTOS, CONCURSOS Y TODO LO REFERENTE AL AREA TECNICA).

Tipos de programas que se tiene conocimientos.	**PAQUETERIA DE OFFICE, PROGRAMA DE PRECIOS UNITARIOS " OPUS " ,PHOTO EXPRESS, ENKONTROL , AUTOCAD.**
Actividades en la comunidad	**ELABORACION DEL PROYECTO Y EJECUCION DEL PUENTE VEHICULAR DENOMINADO PUENTE ACCION NACION DE LA CALLE JUAN ESCUTIA DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS ACAPULCO, GRO. ABRIL DE 1994.**
Objetivo	**EL OBJETIVO DE ESTE CURRICULUM ES DAR A CONOCER LA EXPERIENCIA ADQUIRIDA DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DE LOS AÑOS E IR AUMENTANDO LOS CONOCIMIENTOS DIA A DIA PARA ESTAR EN LA MEJOR DISPOSICION PARA CUALQUIER TRABAJO QUE PUEDA DESEMPEÑAR DE ACUERDO A MI ESPECIALIDAD.**

ATENTAMENTE


MIGUEL A. ROBLEDO V.

ARQ. MIGUEL ANGEL ROBLEDO VARGAS

000269

CEDULA PROFESIONAL

ARQ. MIGUEL ANGEL ROBLEDO VARGAS

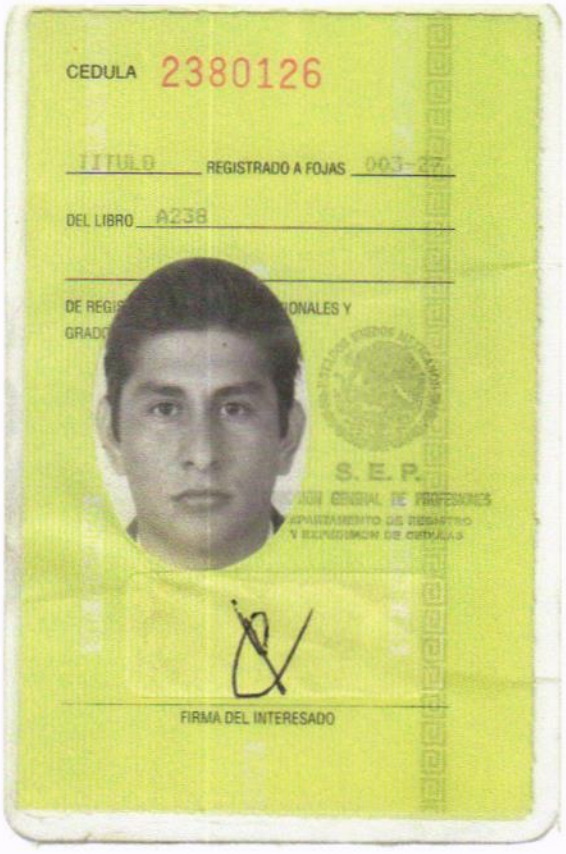
CEDULA 2380126

TITULO REGISTRADO A FOJAS 003-27

DEL LIBRO A238

DE REGI... ...IONALES Y

GRADO


S. E. P.

...ION GENERAL DE PROFESIONES

...APARTAMENTO DE REGISTRO

...Y EXPEDICION DE CEDULAS

FIRMA DEL INTERESADO

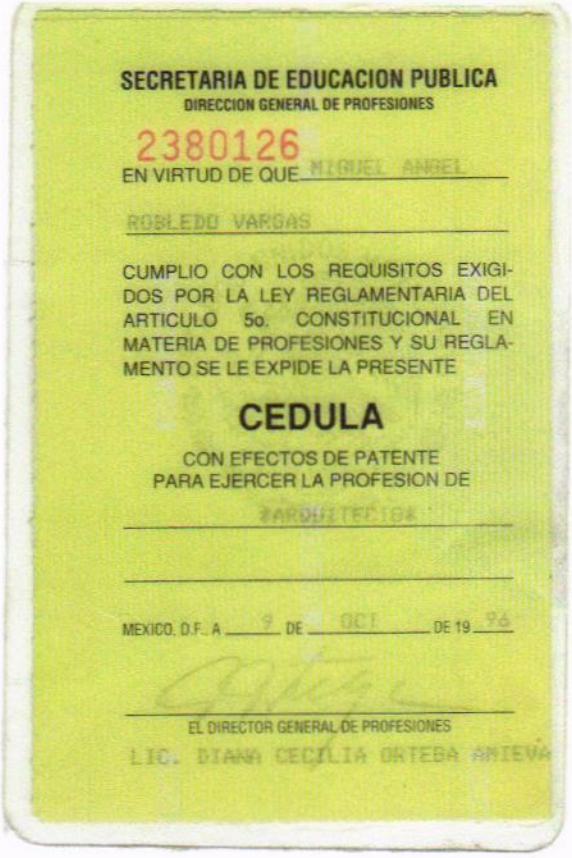
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES

2380126

EN VIRTUD DE QUE MIGUEL ANGEL

ROBLEDO VARGAS

CUMPLIO CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 5o. CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE PROFESIONES Y SU REGLAMENTO SE LE EXPIDE LA PRESENTE

CEDULA

CON EFECTOS DE PATENTE
PARA EJERCER LA PROFESION DE

ARQUITECTO

MEXICO, D.F. A 9 DE OCT DE 19 96

EL DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

LIC. DIANA CECILIA ORTEGA ANIEVA

000270



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
ROBLEDO
VARGAS
MIGUEL ANGEL

SEXO H

DOMICILIO
AND 1 DE MAYO MZ 111 LT 7
U HAB TAXCO 39470
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE DE ELECTOR RBVRMG67111312H400
CURP ROVM671113HGRBRG03
AÑO DE REGISTRO 1994 02
FECHA DE NACIMIENTO 13/11/1967
SECCIÓN 0052
VIGENCIA 2021 - 2031



IDMEX2114415761<<0052025639431
6711137H3112319MEX<02<<02943<4
ROBLEDO<VARGAS<<MIGUEL<ANGEL<<

000271

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, **IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.** CON DOMICILIO EN: **CALLE CORREGIDORA NO. 4 COL. MORELOS, C.P. 39530, ACAPULCO, GRO.** COMO PATRON, REPRESENTADA POR LA C. ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ Y POR LA OTRA PARTE EL **C. ARQ. MIGUEL ANGEL ROBLEDO VARGAS**, COMO TRABAJADOR, CUYAS GENERALES SON:

EDAD:	54 AÑOS
SEXO:	MASCULINO
ESTADO CIVIL:	CASADO
INSTRUCCIÓN:	ARQUITECTO
DOMICILIO:	AND. 1 DE MAYO MZ 111 LT. 7, U. HAB. TAXCO C.P. 39470 EN ACAPULCO, GRO.

LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- El trabajador se obliga a presentar al patrón o a su representante, sus servicios como empleado de confianza para desarrollar los servicios que a continuación se indiquen: JEFE DEL DEPTO. TECNICO (área Costos y Licitaciones), obligándose el trabajador en todo tiempo a desempeñar los servicios que se le consignan en este contrato, con la intensidad, cuidado y esmero apropiados en el domicilio principal del patrón en cualquiera de la sucursales que tienen o pudieran establecer, en cualquier parte de la Republica.

SEGUNDA. - Las partes convienen en que la relación de trabajo objeto de este contrato es por: TIEMPO INDETERMINADO.

TERCERA. - El trabajador declarara bajo protesta de decir verdad, que tiene la capacidad, experiencia y los conocimientos necesarios para desempeñar el trabajo señalado, en la cláusula PRIMERA, con la calidad que requiere el patrón.

CUARTA. - La duración de la jornada semanal de trabajo, será hasta de 48 horas, que el patrón podrá distribuir de acuerdo con lo que establece el Art. 59 de la Ley Federal del Trabajo, para que el trabajador pueda disponer del reposo del sábado en la tarde o cualquier otra modalidad equivalente.

QUINTA. - Las partes convienen en el que el trabajador recibirá por los servicios prestados en virtud de este contrato, la cantidad de $16,000.00 (DIECISEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) como salario mensual, suma en la cual se incluye el sueldo del séptimo día de descanso obligatorio, cuyo pago será hecho en quincenas vencidas, el último día laborable del periodo correspondiente, en el local de patrón y dentro de las horas de trabajo.

IMEXA
Constructores, S.A. de C.V.

Calle Corregidora # 4, Col. Morelos
C.P. 39530 Acapulco, Gro.
R.F.C. IC[illegible]
imexa@telmexmail.com

SEXTA. - El trabajador expresa su conformidad y autoriza al patrón para que deduzca de su sueldo, los impuestos que sean a su cargo, las cuotas obreras del Instituto Mexicano del seguro Social, así como cualquier otra cantidad a cuyo pago pudiera estar obligada el trabajador, y en especial aquellos a que se refieren los artículos 97 y 100 de la Ley Federal del trabajo.

SEPTIMA. - El trabajador disfrutará de un día de descanso por cada seis días de trabajo en forma expresa, el trabajo devengado a que tuviera derecho hasta la fecha del mismo, conviniéndose en que su firma, implicará un finiquito total o de obligaciones del patrón hasta esa fecha.

OCTAVA. - En caso de que el trabajador tenga que laborar mayor tiempo del que fija la jornada legal, recabará del patrón por escrito, la orden para trabajar horas extra, sin cuyo requisito, no deberá presentar su servicio en jornadas extraordinarias.

NOVENA. - El trabajador disfrutará de un periodo semestral de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior al que señale el Art. 76 de la Ley Federal de Trabajo.

DECIMA. - El trabajador se obligará a sujetarse y cumplir con los planes y programas de capacitación y adiestramiento que el patrón establezca en el centro o centros de trabajo establecidos o que establezca y preste sus servicios a la trabajadora.

DECIMA PRIMERA. - El presente contrato se rescindirá o terminará por incumplimiento de las cláusulas del mismo o por los casos establecidos por La Ley Federal del trabajo.

DECIMA SEGUNDA. - El patrón y el trabajador convienen en forma expresa que todo lo no previsto en este contrato, se resolverá conforme a La Ley Federal del trabajo.

DECIMA TERCERA. - Debidamente enteradas las partes del contenido y alcance de las estipulaciones contenidas en las cláusulas de este contrato, lo firman de común acuerdo en Acapulco, Gro., a los 16 días del mes de enero del 2023.

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
Ing. Irina Salgado Hernández
Representante Legal

MIGUEL A. ROBLEDO V.
ARQ. MIGUEL ANGEL ROBLEDO VARGAS
CED. PROF. NO. 2380126

IMEXA
Constructores, S.A. de C.V.

Calle Corregidora # 4, Col. Morelos
C.P. 39530 Acapulco, Gro.
R.F.C.: ICO-091216-UUA
imexa@telmexmail.com

000273



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
SALGADO
HERNANDEZ
IRINA

SEXO M

DOMICILIO
C NUEVO LEON 23
COL PROGRESO 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE DE ELECTOR SLHRIR67082312M900
CURP
SAHI670823MGRLRR09
AÑO DE REGISTRO
1993 06
FECHA DE NACIMIENTO
23/08/1967
SECCION
0057
VIGENCIA
2023 - 2033




INE

IDMEX2412998667<<0057054805632
6708238M3312315MEX<06<<00253<9
SALGADO<HERNANDEZ<<IRINA<<<<<<

IMEXA
Constructores, S.A. de C.V.

Calle Corregidora # 4, Col. Morelos
C.P. 39530 Acapulco, Gro.
R.F.C.: ICO-091216-UUA
imexa@telmexmail.com

000274

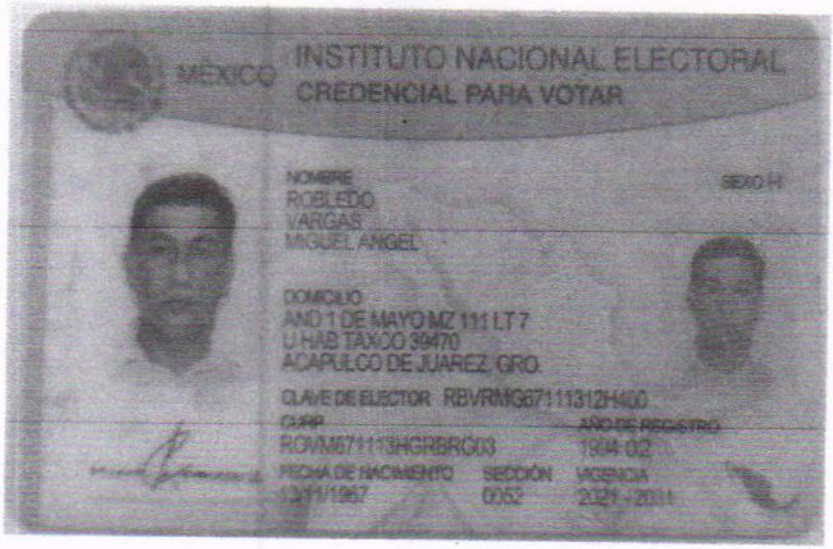
MÉXICO
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
ROBLEDO
VARGAS
MIGUEL ANGEL

SEXO H

DOMICILIO
AND 1 DE MAYO MZ 111 LT 7
U HAB TAXCO 39470
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE DE ELECTOR RBVRMG67111312H400
CURP
ROVM671113HGRBRG03
AÑO DE REGISTRO
1994 02
FECHA DE NACIMIENTO
13/11/1967
SECCIÓN
0052
VIGENCIA
2021 - 2031


IDMEX2114415761<<0052025639431
6711137H3112319MEX<02<<02943<4
ROBLEDO<VARGAS<<MIGUEL<ANGEL<<

IMEXA
Constructores, S.A. de C.V.

Calle Corregidora # 4, Col. Morelos
C.P. 39530 Acapulco, Gro.
R.F.C.: ICO-091216-UUA
imexa@telmexmail.com

CEDULA PROFECIONAL: 8667154

CURRICULUM VITAE

JOSÉ FRANCISCO ANDRÉS SÁNCHEZ

ING. TOPÓGRAFO GEODESTA

Fecha de Nacimiento: 25 de Febrero de 1984

Edad: 36 años

Lugar de Nacimiento: Tixtla Guerrero de Gro

Nacionalidad: Mexicano

Estado Civil: soltero

Domicilio: Calle Allende #11, Barrio de Santa Cecilia, Tixtla de Guerrero Gro.

Número telefónico: 754-106-9816

CEDULA PROFECIONAL: 8667154

Estudios Realizados:

Escuela superior: Ingeniero Topógrafo Geodesta.

Periodo: 2005-2009

Lugar: Chilpancingo de los Bravos

Documento: Certificado, Titulo y Cedula Profesional.

Escuela media superior: Preparatoria #29, Emiliano Zapata

Periodo: 2002-2005

Lugar: Tixtla Guerrero de Gro.

Documento: Certificado

Escuela secundaria: Heroína de Tixtla

Periodo: 1999-2002

Lugar: Tixtla Guerrero de Gro.

Documento: Certificado

Escuela primaria: Ignacio Manuel Altamirano.

Periodo: 1993-1999

Lugar: Tixtla Guerrero de Gro.

Documento: Certificado.

CEDULA PROFECIONAL: 8667154

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Empresa: **EDIFICACIONES Y COMERCIALIZACIONES BALAM 2000 S.A DE C.V**

Conservación periódica mediante trabajos de micro carpeta de concreto asfaltico con asfalto grado **PG**, con una meta de 22 kms. del km. 75+000 al km. 97+000, del tramo y carretera: Chilpancingo -Acapulco, en el estado de Guerrero.

Levantamiento topográfico de la micro carpeta. Sacando volúmenes.

Empresa: **CAMINOS Y PAVIMENTOS TERRA S.A DE C.V**

Seguimiento y control de la modernización del camino Iguala-Teloloapan-Arcelia, tramo del km 111+500 al km 117+500, en una log de 6.00 kms, en el municipio de Arcelia, en el estado de Guerrero"

Como supervisión externa en el área de topografía.

Haciendo comparación del proyecto con lo ejecutado; sacando volúmenes de terracerías y espesores de pavimentos y haciendo las comparaciones de volúmenes del proyecto con lo ejecutado.

Empresa: **CONSTRUCCIONES SEYNA S.A. DE C.V.**

Obra: modernización del camino rural: ayutla-pascala del oro, tramo: del km 38+100 al km 40+500, en el municipio de ayutla de los libres, estado de guerrero.

Llevando el control del trazo y nivelación topográfico.

Empresa: **FECSA** S.A DE C.V

Levantamiento topográfico para proyecto de Drenaje de las Calles del Centro de Tecpan de Galeana.

Empresa: **FECSA S.A DE C.V**

Levantamiento topográfico para proyecto de drenaje en la comunidad, de Nuxco pertenece al municipio de Tecpan de Galiana.

CEDULA PROFECIONAL: 8667154

Empresa: **CEIGRO S.A DE C.V.**

Levantamiento topográfico, proyecto de pavimentación y llevando el control de la obra, de la Avenida Escénica. De Zihuatanejo de Azueta Gro.

Empresa: **SEYNA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V**

Levantamiento topográfico y dibujo de la carretera del Mango a San Pedro, comunidad de San Luis Acatlán. Región costa chica.

Empresa: **SEYNA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V**

Levantamiento Topográfico, dibujo y llevando el control del Trazo y nivelación de la Carretera, del Sauce al Calvario. Comunidad de Teloloapan Gro.

Empresa: **SEYNA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V**

Levantamiento Topográfico, dibujo y llevando el control del trazo y nivelación de la carretera, de Chacamerito a Chacamero el Grande, Municipio de Altamirano.

Empresa: **CEIGRO S.A DE C.V.**

Levantamiento Topográfico, dibujo y llevando el control del trazo y nivelación de la calle escobitas, municipio de Cutzamala de pinzón.

Empresa: **SEYNA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.**

Levantamiento topográfico y dibujo. De la calle Cuauhtémoc, municipio de Coyuca de catalán.

Ejecución de la obra y colocación de la línea de drenaje de la calle Cuauhtémoc de Coyuca de catalán.

CEDULA PROFECIONAL: 8667154

Empresa: **SEYNA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.**

Levantamiento topográfico, dibujo y replanteo del eje de la carretera de San Antonio a Guayameo, Comunidad de Zirandaro de los Chávez.

Empresa: **CEIGRO S.A DE C.V.**

Levantamiento topográfico, dibujo y llevando el control del trazo y nivelación de la, calle Cuauhtémoc y serrada de Cuauhtémoc, Municipio de Zihuatanejo de Azueta.

Empresa: **SEYNA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.**

Replanteo del eje y control de la nivelación, de la carretera de Patambo a san Fernando.

Municipio de Coyuca de catalán.

Empresa: **SEYNA CONSTRUCCIONES S.A DÉ .C.V.**

Levantamiento topográfico, diseño de la carretera de la Parota Aratichanguio Municipio de Zirandaro de los Chávez.

Dependencia: **OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE CHILAPA DE ALVAREZ**.

Levantamiento topográfico de la planta tratadora de aguas residuales de Chilapa de Álvarez, llevando el trazo y nivelación del cárcamo y los arrastres hidráulicos de las tuberías.

Dependencia: **OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ.**

Levantamiento topográfico de la línea de conducción y distribución de agua potable. De la colonia, zapata de Chilapa de Álvarez. Y la elaboración del proyecto.

CEDULA PROFECIONAL: 8667154

Dependencia: **OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ.**

Levantamiento topográfico de la línea de conducción de agua potable y elaboración del proyecto. De la Colonia el soyatal de Chilapa de Álvarez.

Dependencia: **OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ.**

Levantamiento topográfico de drenaje, cálculo de los arrastres hidráulicos y ejecución del proyecto. De la comunidad de Ayahualulco, Municipio de Chilapa de Álvarez.

Dependencia: **OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ**.

Ejecución de la obra de agua potable en la comunidad de Ayahualulco, Municipio de chilpa de Álvarez

Dependencia: **OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTODE CHILAPA DE ÁLVAREZ**.

Levantamiento topográfico del rio ajo lotero, para el desazolvé y el cálculo del tirante hidráulico.

Dependencia: **OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ.**

Levantamiento topográfico de la línea de conducción de agua potable y elaboración del proyecto. De la Comunidad de Trigomila, Municipio de Chilapa de Álvarez.

CEDULA PROFECIONAL: 8667154

INSTRUMENTOS TOPOGRÁFICOS QUE UTILIZO. PROGRAMAS QUE UTILIZO

Instrumentos topográficos

Transito

Estación total

Navegadores (GPS)

Nivel fijo

Nivel de mano

Programas que utilizo

Excel

Word

Power point

Autocad

Civilcad


CEDULA PROFECIONAL: 8667154



Empresa: **EDIFICACIONES Y COMERCIALIZACIONES BALAM 2000 S.A DE C.V**

Conservación periódica mediante trabajos de micro carpeta de concreto asfaltico con asfalto grado **PG**, con una meta de 22 kms. del km. 75+000 al km. 97+000, del tramo y carretera: Chilpancingo -Acapulco, en el estado de Guerrero.

Levantamiento topográfico de micro carpeta

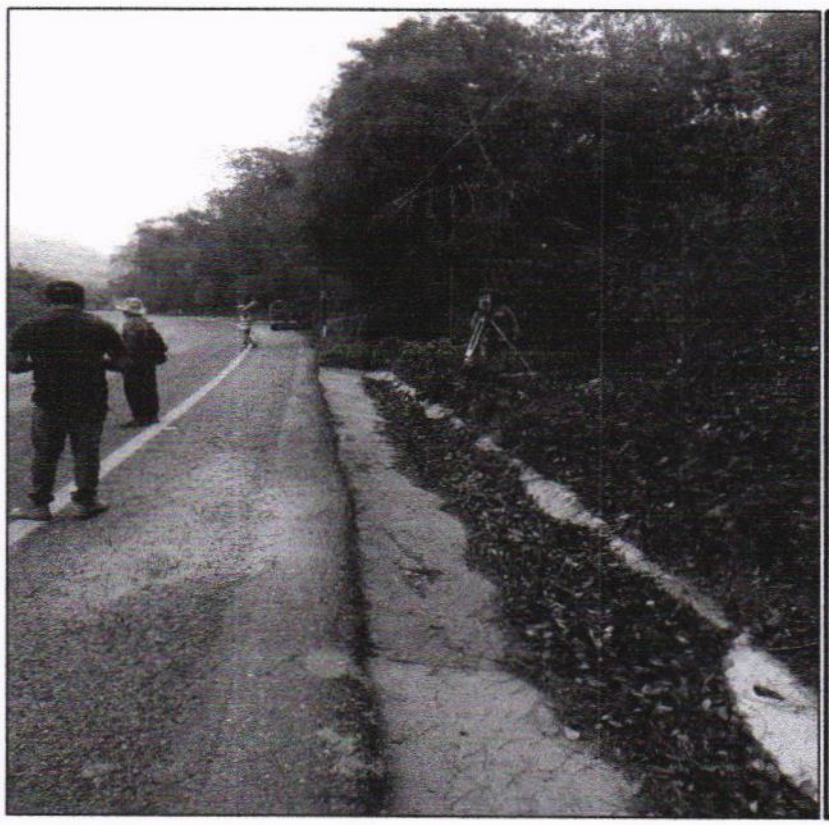


Empresa: **EDIFICACIONES Y COMERCIALIZACIONES BALAM 2000 S.A DE C.V**

Conservación periódica mediante trabajos de micro carpeta de concreto asfaltico con asfalto grado **PG**, con una meta de 22 kms. del km. 75+000 al km. 97+000, del tramo y carretera: Chilpancingo -Acapulco, en el estado de Guerrero.

Levantamiento topográfico de micro carpeta


CEDULA PROFECIONAL: 8667154

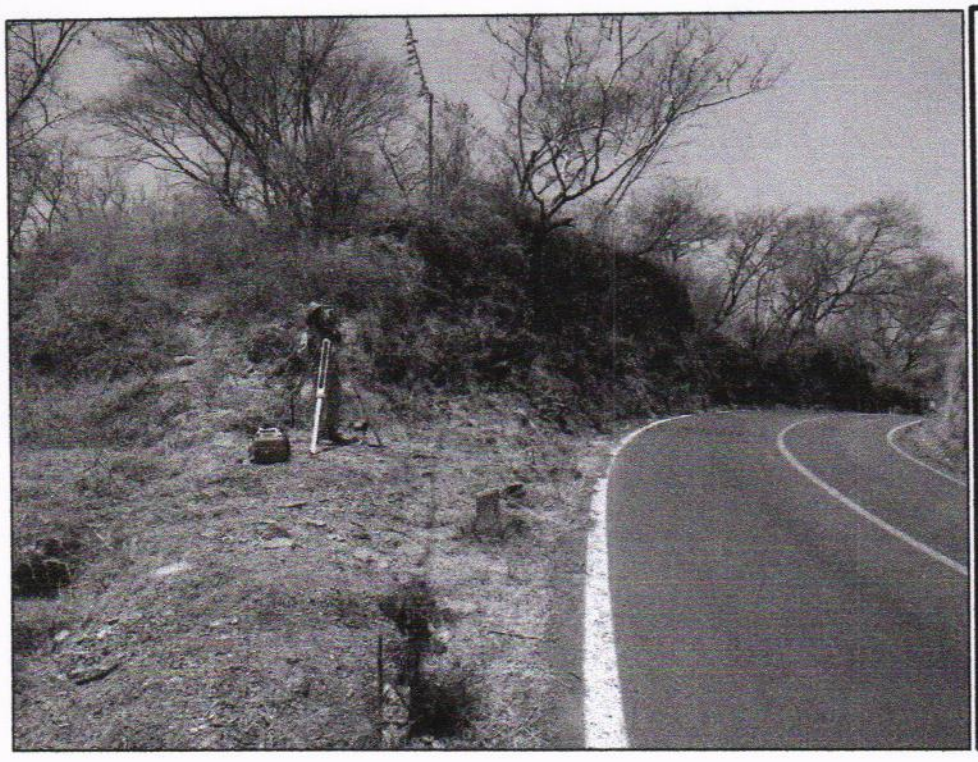

Empresa: **CAMINOS Y PAVIMENTOS TERRA S.A DE C.V**

Seguimiento y control de la modernización del camino Iguala-Teloloapan-Arcelia, tramo del km 111+500 al km 117+500, en una log de 6.00 kms, en el municipio de Arcelia, en el estado de Guerrero".

Sacando las secciones del terreno natural.

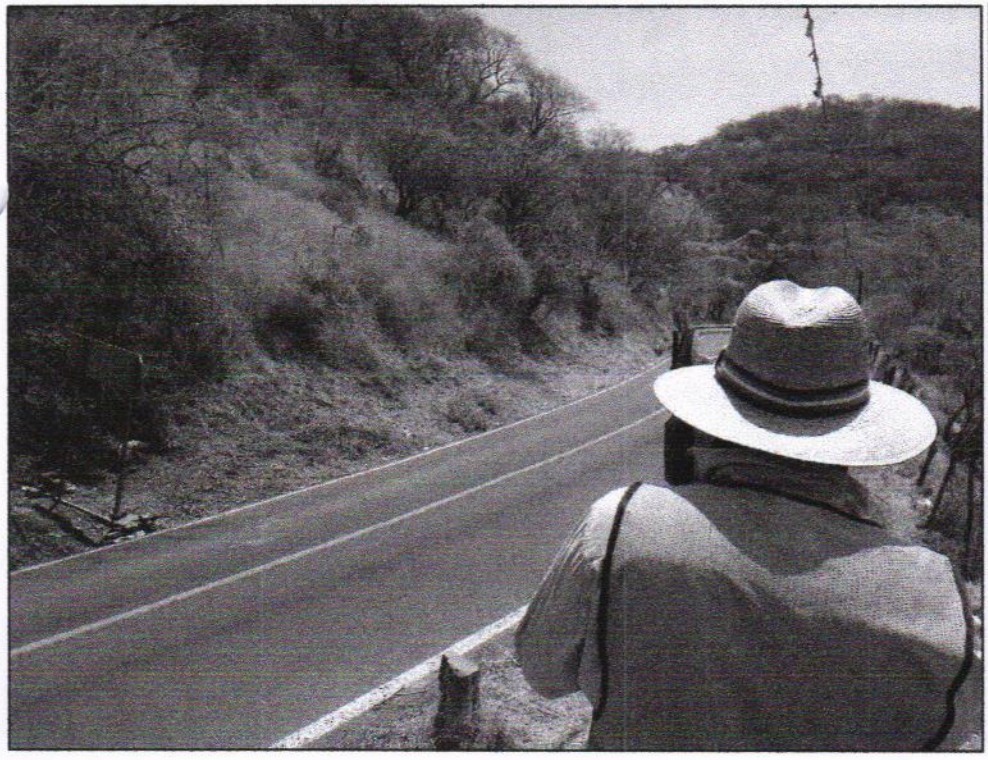

Empresa: **CAMINOS Y PAVIMENTOS TERRA S.A DE C.V**

Seguimiento y control de la modernización del camino Iguala-Teloloapan-Arcelia, tramo del km 111+500 al km 117+500, en una log de 6.00 kms, en el municipio de Arcelia, en el estado de Guerrero".

Sacando las secciones del terreno natural.

CEDULA PROFECIONAL: 8667154



Empresa:
CONSTRUCCIONES SEYNA S.A. DE C.V.

Modernización del camino rural: Ayutla-Pascala del oro, tramo: del km 38+100 al km 40+500, en el Municipio de Ayutla de los libres, Estado de Guerrero.

Marcando el eje, poniendo ceros y levantando el terreno natural, para sacar la comparación del volumen del proyecto.



Empresa:
CONSTRUCCIONES SEYNA S.A. DE C.V.

Modernización del camino rural: Ayutla-Pascala del oro, tramo: del km 38+100 al km 40+500, en el Municipio de Ayutla de los libres, Estado de Guerrero.

Marcando el eje, poniendo ceros y levantando el terreno natural, para sacar la comparación del volumen del proyecto.

000285

CEDULA PROFECIONAL: 8667154

ATENTAMENTE

ING. TOPOGRAFO GEODESTA
JOSE FRANCISCO ANDRES SANCHEZ

TIXTLA GRO., JULIO, DEL 2023

000286



La Universidad Autónoma de Guerrero

Otorga a

José Francisco Andrés Sánchez

el Título de

Ingeniero Topógrafo Geodesta

En atención a que demostró tener hechos los estudios y llenar los demás requisitos de ley, según consta en el acta de Examen Profesional con fecha 30 de Marzo de 2012, que aparece archivada en la Secretaría de esta misma Institución.

Chilpancingo, Guerrero México a 04 de Marzo de 2014.

Dr. Javier Saldaña Almazán
Rector
RECTORÍA

Dr. Salvador Rogelio Ortega Martínez
Secretario(a) General
SECRETARIA GENERAL



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES

CÉDULA 8667154

EN VIRTUD DE QUE

JOSE FRANCISCO
ANDRES
SANCHEZ

CURP: AESF840226HGRNNR05

CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL Y SU REGLAMENTO SE LE EXPIDE

EN EDUCACIÓN DE TIPO SUPERIOR LA

CÉDULA

PERSONAL CON EFECTOS DE PATENTE PARA EJERCER PROFESIONALMENTE EN EL NIVEL DE

LICENCIATURA COMO

INGENIERO TOPÓGRAFO GEODESTA

JAIME HUGO TALANCÓN ESCOBEDO
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

000287

000288



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
ANDRES
SANCHEZ
JOSE FRANCISCO

SEXO H

DOMICILIO
C ALLENDE 11
COL CENTRO 39170
TIXTLA DE GUERRERO, GRO.

CLAVE DE ELECTOR ANSNFR84022512H600
CURP
AESF840225HGRNNR05
AÑO DE REGISTRO
2004 01
FECHA DE NACIMIENTO
25/02/1984
SECCIÓN
2483
VIGENCIA
2020 - 2030



INE

IDMEX2064199542<<2483068316525
8402253H3012316MEX<01<<06866<0
ANDRES<SANCHEZ<<JOSE<FRANCISCO

Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción

El Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción
otorga el presente

DIPLOMA

a: *JOSÉ FRANCISCO ANDRES SÁNCHEZ*

por su participación en:

EL CURSO DE ESTACIÓN TOTAL

con duración de 20 horas que se llevó a cabo en CMIC GUERRERO

del 25 al 29 de ENERO DEL 2016

ARQ. SERGIO ISAAC REYES CARBAJAL
PRESIDENTE

ING. ISAÍ MARTÍNEZ CARBAJAL
VCPDTE. DE INSTITUCIONES

REG. STPS ICI-780419AJ7-0013

842976

000289

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción

El Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción

otorga el presente

DIPLOMA

a: *JOSÉ FRANCISCO ANDRÉS SÁNCHEZ*

por su participación en:

EL CURSO DE CIVILCAD

con duracion de 20 horas que se llevó a cabo en CMIC GUERRERO

del 12 al 15 de SEPTIEMBRE DEL 2016

ARQ. SERGIO ISAAC REYES CARBAJAL
PRESIDENTE

LIC. CAROLINA LIBORIO VALDEZ
GERENTE GENERAL

000290

REG. STPS ICI-780419AJ7-0013

861322

000291

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, **IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.** CON DOMICILIO EN: **CALLE CORREGIDORA NO. 4 COL. MORELOS, C.P. 39530, ACAPULCO, GRO.** COMO PATRON, REPRESENTADA POR LA ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ Y POR LA OTRA PARTE EL M. EN ING. JOSÉ FRANCISCO ANDRES SANCHEZ, COMO TRABAJADOR, CUYAS GENERALES SON:

EDAD:	39 AÑOS
SEXO:	MASCULINO
ESTADO CIVIL:	CASADO
INSTRUCCIÓN:	INGENIERO TOPOGRAFO GEODESTA
DOMICILIO:	C. ALLENDE No. 11, COL. CENTRO C.P. 39170 EN TIXTLA DE GUERRERO, GRO.

LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- El trabajador se obliga a presentar al patrón o a su representante, sus servicios como empleado de confianza para desarrollar los servicios que a continuación se indiquen: TOPOGRAFO, obligándose el trabajador en todo tiempo a desempeñar los servicios que se le consignan en este contrato, con la intensidad, cuidado y esmero apropiados en el domicilio principal del patrón en cualquiera de la sucursales que tienen o pudieran establecer, en cualquier parte de la Republica.

SEGUNDA. - Las partes convienen en que la relación de trabajo objeto de este contrato es por: TIEMPO INDETERMINADO.

TERCERA. - El trabajador declarara bajo protesta de decir verdad, que tiene la capacidad, experiencia y los conocimientos necesarios para desempeñar el trabajo señalado, en la cláusula PRIMERA, con la calidad que requiere el patrón.

CUARTA. - La duración de la jornada semanal de trabajo, será hasta de 48 horas, que el patrón podrá distribuir de acuerdo con lo que establece el Art. 59 de la Ley Federal del Trabajo, para que el trabajador pueda disponer del reposo del sábado en la tarde o cualquier otra modalidad equivalente.

QUINTA. - Las partes convienen en el que el trabajador recibirá por los servicios prestados en virtud de este contrato, la cantidad de $14,000.00 (CATORCE MIL PESOS 00/100 M.N.) como salario mensual, suma en la cual se incluye el sueldo del séptimo día de descanso obligatorio, cuyo pago será hecho en quincenas vencidas, el último día laborable del periodo correspondiente, en el local de patrón y dentro de las horas de trabajo.

SEXTA. - El trabajador expresa su conformidad y autoriza al patrón para que deduzca de su sueldo, los impuestos que sean a su cargo, las cuotas obreras del Instituto Mexicano del seguro Social, así como cualquier otra cantidad a cuyo pago pudiera estar obligada el trabajador, y en especial aquellos a que se refieren los artículos 97 y 100 de la Ley Federal del trabajo.

SEPTIMA. - El trabajador disfrutará de un día de descanso por cada seis días de trabajo en forma expresa, el trabajo devengado a que tuviera derecho hasta la fecha del mismo, conviniéndose en que su firma, implicará un finiquito total o de obligaciones del patrón hasta esa fecha.

OCTAVA. - En caso de que el trabajador tenga que laborar mayor tiempo del que fija la jornada legal, recabará del patrón por escrito, la orden para trabajar horas extra, sin cuyo requisito, no deberá presentar su servicio en jornadas extraordinarias.

NOVENA. - El trabajador disfrutará de un periodo semestral de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior al que señale el Art. 76 de la Ley Federal de Trabajo.

DECIMA. - El trabajador se obligará a sujetarse y cumplir con los planes y programas de capacitación y adiestramiento que el patrón establezca en el centro o centros de trabajo establecidos o que establezca y preste sus servicios a la trabajadora.

DECIMA PRIMERA. - El presente contrato se rescindirá o terminará por incumplimiento de las cláusulas del mismo o por los casos establecidos por La Ley Federal del trabajo.

DECIMA SEGUNDA. - El patrón y el trabajador convienen en forma expresa que todo lo no previsto en este contrato, se resolverá conforme a La Ley Federal del trabajo.

DECIMA TERCERA. - Debidamente enteradas las partes del contenido y alcance de las estipulaciones contenidas en las cláusulas de este contrato, lo firman de común acuerdo en Acapulco, Gro., a los 16 días del mes de enero del 2023.

IMEXA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Ing. Irina salgado Hernández
Representante Legal

Ing. Topógrafo Geodesta
José Francisco Andrés Sánchez
CED. PROF. N CED. PROF. NO. 86671540. 8667154

000293



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
SALGADO
HERNANDEZ
IRINA

SEXO M

DOMICILIO
C NUEVO LEON 23
COL PROGRESO 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE DE ELECTOR SLHRIR67082312M900
CURP
SAHI670823MGRLRR09
AÑO DE REGISTRO
1993 06
FECHA DE NACIMIENTO
23/08/1967
SECCIÓN
0057
VIGENCIA
2023 - 2033



INE

IDMEX2412998667<<0057054805632
6708238M3312315MEX<06<<00253<9
SALGADO<HERNANDEZ<<IRINA<<<<<<

IMEXA
Constructores, S.A. de C.V.
Calle Corregidora #4, Col. Morelos
C.P. 39530 Acapulco, Gro.
R.F.C.: ICO-091216-UUA
imexa@telmexmail.com

000294

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
ANDRES
SANCHEZ
JOSE FRANCISCO

SEXO H



DOMICILIO
C ALLENDE 11
COL CENTRO 39170
TIXTLA DE GUERRERO, GRO.

CLAVE DE ELECTOR ANSNFR84022512H600

CURP
AESF840225HGRNNR05

AÑO DE REGISTRO
2004 01

FECHA DE NACIMIENTO
25/02/1984

SECCIÓN
2483

VIGENCIA
2020 - 2030

IDMEX2064199542<<2483068316525
8402253H3012316MEX<01<<06866<0
ANDRES<SANCHEZ<<JOSE<FRANCISCO

ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO., A 03 DE AGOSTO DE 2023.

CARTA PODER

ING. LUZ MARÍA MERAZA RADILLA.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO
PRESENTE

YO **IRINA SALGADO HERNANDEZ**, REPRESENTANTE LEGAL DE **IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., OTORGO PODER AMPLIO** A LA **ARQ. GENOVEVA MORALES ROMAN** PARA QUE A MI NOMBRE Y REPRESENTACION SE PRESENTE A LA APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL No. **No. 41066004-016-2023**, REFERENTE A LA OBRA **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION

OTORGO EL PODER

IMEXA
Constructores, S.A. de C.V.
Calle Corregidora # 4, Col. Morelos
C.P. 39530 Acapulco, Gro.
R.F.C.: ICO-091216-UUA
imexa@telmexmail.com

RECIBO EL PODER

ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL-IMEXA CONSTRUCTORES

ARQ. GENOVEVA MORALES ROMAN



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
SALGADO
HERNANDEZ
IRINA

SEXO M

DOMICILIO
C NUEVO LEON 23
COL PROGRESO 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE DE ELECTOR SLHRIR67082312M900
CURP
SAHI670823MGRLRR09
AÑO DE REGISTRO
1993 06
FECHA DE NACIMIENTO
23/08/1967
SECCIÓN
0057
VIGENCIA
2023 - 2033



INE

IDMEX2412998667<<0057054805632
6708238M3312315MEX<06<<00253<9
SALGADO<HERNANDEZ<<IRINA<<<<<<



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
MORALES
ROMAN
GENOVEVA

EDAD 46
SEXO M

DOMICILIO
C CORREGIDORA 6
COL EL MIRADOR 39550
ACAPULCO DE JUAREZ ,GRO.

FOLIO 0000017429766 AÑO DE REGISTRO 1991 03
CLAVE DE ELECTOR MRRMGN67010312M900
CURP MORG670103MGRRMN05
ESTADO 12 MUNICIPIO 001
LOCALIDAD 0001 SECCION 0023
EMISIÓN 2013 VIGENCIA HASTA 2023

FIRMA



0023036729696

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE, NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

Cd. Valle Hermoso, Tamaulipas a 2 de Marzo de 2010

C. GENOVEVA MORALES ROMAN
PRESENTE.-

Por medio del presente Instrumento privado, en mi carácter de ***ADMINISTRADOR UNICO*** de la persona moral "***IMEXA CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE"*** *y con las facultades* conferidas en el acta constitutiva, para delegar los poderes ahí conferidos, le otorgo a Usted ***PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS*** con todas las facultades generales y las especiales que requieran poder o Clausula Especial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) primer párrafo y 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil Federal, estando facultada especialmente pero sin hacer limitación alguna para: ***UNO***. Para Representar a la sociedad ante personas físicas, morales y ante toda clase de autoridades Administrativas o Judiciales de cualquier fuero, sean estas Civiles, Penales, Administrativas o Autoridades del Trabajo, tanto en el orden Federal como Local, en toda la extensión de la Republica Mexicana o en el Extranjero, en Juicio o fuera de el.- ***DOS***.- Promover toda clase de Juicios, incluyendo los de amparo, seguirlos en todos sus trámites y desistirse de ellos. ***TRES.*** Interponer toda clase de recursos, en las instancias y ante los autoridades que procedan. ***CUATRO***. Contestar las demandas que se interpongan en contra de la Sociedad y seguir los, Juicios por sus demandas trámites legales. ***CINCO***. Reconocer firmas, documentos y redargüir de falsos los que se presenten por la contraria; ***SEIS***.- Presentar testigos, ver prote a los de la contraria, tacharlos y repreguntarlos; ***SIETE***. Articular y absolver posiciones; ***OCHO.-*** Transigir y comprometer en árbitros; ***NUEVE***. Recusar Funcionarios Judiciales, sin causa, con causa o bajo protesta de Ley; ***DIEZ***.-Solicitar el remate de bienes y nombrar peritos; ***ONCE***. Recibir valores, otorgar recibos y cartas de pago; ***DOCE.*** Formular y presentar denuncias querellas o acusaciones, coadyuvar con el Ministerio Publico en Procesos Penales, y otorgar perdones cuando a su juicio lo amerite y legalmente proceda; ***TRECE.*** Representar a la sociedad en los juicios, o procedimientos laborales con la calidad jurídica y las facultades prescritas en los artículos 11 (once), 692 (seiscientos noventa y dos), fracciones II (segunda) y III (tercera), 694 (seiscientos noventa y cuatro), 695 (seiscientos noventa y cinco), 786 (setecientos ochenta y seis), y 899 (ochocientos noventa y nueve), en relación a lo aplicable con las normas de los capítulos XII (Duodécimo) y XVII (Decimo Séptimo), así como el articulo 14 (catorce) y demás disposiciones relativas de la Ley Federal del Trabajo vigente en el País.- ***CATORCE.***- Acuda a las oficinas recaudadoras de impuestos federales, Servicio de Administración Tributaria "SAT", Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado, Presidencia Municipal, Tesoreria Municipal, Secretaria de Hacienda y Credito Publico, pague impuestos tramite, cobre y reciba devoluciones del

COPIA COTEJADA

impuesto al valor agregado "IVA", presente declaraciones fiscales o contables, haga inscripciones o modificaciones al registro federal de contribuyentes, haga apertura de cuentas bancarias y gire las instrucciones necesarias a las instituciones necesarias con el manejo de dichas cuentas. - ***PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACION,*** en términos del párrafo Segundo del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y en consecuencia todas las operaciones administrativas, de dirección, operación y corporativas de la empresa inherentes al objeto de la sociedad y autorizando por lo tanto, pero sin que constituya limitación alguna al mandato a que se refiere el presente punto, para: ***UNO.*** Nombrar y remover a director (es), gerente (s) secundario subgerente (s), apoderado(s), agente(s), empleado(s), de la sociedad determinando sus atribuciones, condiciones de Trabajo y remuneraciones, dejando a salvo el derecho que corresponda a la asamblea General para la designación de Administradores Generales o Especiales con las facultades y el otorgamiento de sus atribuciones; ***DOS***. Celebrar Contratos Colectivos e individuales Trabajo; ***TRES***. Convocar a asambleas generales, ordinarias, especiales o extraordinarias de socios, ejercitar sus acuerdos y en general llevar a cabo todos los actos y operaciones que fueren necesarias o convenientes para los fines y derechos de la Sociedad, con excepción de los expresamente reservados por la Ley o por estos Estatutos a la Asamblea General de Accionistas.-

- - -El presente poder se otorga en los terminos generales del articulo 2554 del código Civil Federal y su correlativo 1890 del codigo civil para el Estado de Tamaulipas. - - ----------

ARTICULO 1890. - En todos los Poderes Generales para Pleitos y Cobranzas bastara que se diga que se otorgan con todas las facultades generales y las especiales que requieran clausula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitacion alguna. En los Poderes Generales para Administrar Bienes bastara expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades Administrativas. En los Poderes Generales para ejercer Actos de Dominio, bastara que se diga que dichos Poderes Generales se dan con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos o administrarlos. Cuando se quieran limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignaran las limitaciones o se otorgaran al respecto poderes especiales. Los Notarios insertaran este artículo en los testimonios de los poderes que ante ellos se otorguen. Lo mismo haran al calce del poder y antes de las firmas de la ratificacion si es que en el texto del documento no lo hubieren insertado los interesados, los funcionarios ante quienes los otorgantes y los testigos ratifiquen sus firmas de conformidad con la fraccion ii del articulo 1887 en relacion con el 1891.- ----------

OTORGA EL PODER

ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ

TESTIGOS

LIC. MA GABRIELA CAMPOS ABUNDES LIC. JOANA LIZETH RIOS NARVAES

- - - LA C. LICENCIADA ROSA MA. ADAME GARCIA, NOTARIO PUBLICO NUMERO 212, CON EJERCICIO LEGAL EN ESTA CIUDAD:-

- - -**C E R T I F I C A:** Que con esta fecha comparecio personalmente ante mi la ***ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ*** quien se identifica con credencial para votar con fotografia expedida por el Instituto Federal Electoral con folio numero ***0000023346214, 1993,03*** documento en el cual consta su nombre, su firma su domicilio, su huella dactilar y su fotografia, la cual coincide con los rasgos fisicos del rostro de su presentante, quien me manifesto que comparece ante la suscrita Notaria Publica en su carácter de ***ADMINISTRADOR UNICO*** de la persona moral ***"IMEXA CONSTRUCTORES" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE*** *Y ACREDITA LA LEGAL EXISTENCIA DE SU REPRESENTADA Y LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECE CON LA* **POLIZA NUMERO UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO, Libro Primero de Registro de Sociedades Mercantiles,** otorgada el dia dieciséis de Diciembre del año Dos Mil Nueve, otorgada ante la fe y presencia de la ***Licenciada SHUNASHI JAZMIN ALTAMIRANO PINEDA, CORREDOR PUBLICO NUMERO CINCO EN EL ESTADO DE GUERRERO***, documento que en este acto exhibe y el cual literalmente se lee: POLIZA **NUMERO UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO.-Libro Primero de Registro de Sociedades Mercantiles**.-En Acapulco, Guerrero, a los dieciséis días del mes de diciembre del año dos mil nueve, Ante mi, ***Licenciada SHUNASHI JAZMIN ALTAMIRANO PINEDA, CORREDOR PUBLICO NUMERO CINCO EN EL ESTADO DE GUERRERO***, debidamente habilitado para el ejercicio de mis funciones por la Secretaria de Economía y actuando con el carácter de Federatario publico que la Ley me otorga, con fundamento en los ARTICULOS SEXTO, FRACCION SEXTA DE LA LEY FEDERAL DE CORREDURIA PUBLICA, ARTICULOS SEXTO, CINCUENTA Y TRES FRACCION QUINTA Y CINCUENTA Y CUATRO DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE CORREDURIA PLIBLICA, ARTICULOS SEGUNDO, TRESCIENTOS DIEZ DEL CODIGO DE COMERCIO,ARTICULOS SEXTO, DECIMO, OCHENTA Y NUEVE, NOVENTA, NOVENTA Y UNO, CIENTO CUARENTA Y CINCO, CIENTO CUARENTA Y SEIS Y CIENTO CUARENTA Y SIETE DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, hago constar. LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINIADA: **"IMEXA CONSTRUCTORES" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**. Qua otorgan las siguientes personas:-A.IRINA SALGADO HERNANDEZ.-B: MARCIAL MIGUEL VELASCO MARTINEZ. –De conformidad con las siguientes ANTECEDENTES, CLAUSULAS Y ESTATUTOS.-**ANTECEDENTES.-UNICO.**-PERMISO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.-Para la celebración del presente contrato de sociedad mercantil, se solicito y obtuvo el Permiso de la Secretaria de Relaciones Exteriores numero 1202934 (uno, dos, cero, dos, nueve, tres, cuatro) de fecha catorce de diciembre del dos mil nueve expediente 20091202775 (dos, cero, cero, nueve, uno, dos, cero, dos, siete, siete, cinco) folio 091211121002 (cero, nueve, uno, dos, uno, uno, uno, dos, uno, cero, cero, dos) de cuyo original se agrega una copia cotejada al presente instrumento, fielmente reproducida de su original, cuyo texto se tiene aquí por reproducido como si literalmente se transcribiera para todos los efectos legales, contractuales y estatutarios a que haya lugar. El original del permiso antes señalado se conserva en el archivo oficial de la correduría a mi cargo, correspondiente a la presente póliza, bajo la letra **"A".-CLAUSULAS.-PRIMERA.-TIPO DE SOCIEDAD:** Las personas mencionadas al principio de esta póliza, constituyen una sociedad Anónima de Capital Variable, mexicana, cuyo régimen jurídico aplicable será la Ley General de Sociedades Mercantiles y los siguientes:-**ESTATUTOS.-CAPITULO PRIMERO.-DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO, DURACION Y NACIONALIDAD.-ARTICULO PRIMERO: REGULACION:** La sociedad se requiera por los presentes estatutos, y en lo que no esté previsto en ellos, por las disposiciones aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-**ARTICULOS SEGUNDO.- DENOMINACION:** La denominación de la sociedad es:-

COPIA COTEJADA

"IMEXA CONSTRUCTORES" e ira siempre seguida de las palabras **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE" o de su abreviatura "S.A DE C.V.".-ARTICULO TERCERO.- DOMICILIO**: El domicilio de la sociedad es la Ciudad y Puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero, sin perjuicio de establecer agencias, sucursales o representaciones en cualesquiera otros lugares de la Republica Mexicana o del extranjero y someterse a domicilios convencionales, sin que por ello se entienda modificado su domicilio.**-ARTICULO CUARTO.- OBJETO SOCIAL**: El objeto de la sociedad será: -La sociedad tiene por objeto: a) Operar coma inmobiliaria, pudiendo adquirir, enajenar, explotar, o tomar en arrendamiento o Subarrendamiento, toda clase de bienes muebles e inmuebles, urbanos y suburbanos, y toda clase de derechos reales sobre los mismos.- b) Arrendar, subarrendar, tomar y dar en comodato, usar, poseer adquirir, comprar, vender, construir, reparar, enajenar y operar por cualquier titulo legal toda clase de equipos, bodegas, almacenes, plantas, oficinas, salones, locales y demás establecimientos necesarios o convenientes para la realización de los objetos de la Sociedad, incluyendo la adquisición y enajenación de muebles, inmuebles y derechos reales qua se consideren indispensables y que las leyes permitan.- c) El fraccionamiento, construcción, urbanización, subdivisión y fusión a cualquier títulos, de toda clase de bienes inmuebles por cuenta propia o de terceros y la realización de toda clase de obras públicas o privadas.-d).-La explotación de la ingenieria y la arquitectura en sus aspectos de investigación pura y aplicada a proyecto, construcción, supervisión, coordinación y la valuación de obras públicas y privadas.- e) Comercializar con toda clase de artículos, productos y materiales de construcción, incluyendo su fabricación, importación, exportación adquisición, negociación y enajenación por cualquier titulo de los bienes inmuebles y muebles necesarios o convenientes para su objeto, así coma la obtención de comisiones, consignaciones y representaciones relacionadas con dichas actividades.- f) Girar en el ramo de comisiones, mediaciones y aceptar el desempeño de representaciones de negociaciones de toda especie, prestar servicios de asesoría legal, fiscal, publicitaria y promocional, en relación con compraventa, construcción, arrendamiento subarrendamiento, y cualquier otro tipo de negociaciones permitidas por la ley, con bienes inmuebles, incluyendo enunciativa mas no limitativamente casas, edificios, condominios, fraccionamientos, parques industriales y desarrollos, turísticos, elaborar, diseñar y prestar servicios de asesoria en proyectos de construcción de casas, edificios, oficinas, condominios, clubes, en general, fraccionamientos, parques industriales y desarrollos turísticos, prestar servicios de asesoria, administración, cobranzas y tramitación respecto de cualquier aspecto que comprenda la construcción y desarrollo de condominios, oficinas, fraccionamientos, clubes, parques industriales y desarrollos turísticos.- g) Realizar, supervisar, coordinar o contratar por cuenta propia o de terceros, toda clase de construcciones, edificaciones, urbanizaciones, diseño arquitectónico, grafico, industrial, estructural de instalaciones, exposiciones y stands, así como fabricar, comprar y enajenar por cualquier titulo, toda clase de materiales de construcción.-h).- la prestación o contratación de servicios técnicos, consultivos y de asesoria, así como la celebración de los contratos o convenios para la realización de estos fines, especialmente lo relacionado con la arquitectura y la construcción.-i).- Dar y recibir en arrendamiento y por compra-venta o por cualquier medio permitido por la ley, maquinaria, equipo y transportación para la construcción,- j) Análisis de precios relacionados con la construcción, diseños y obras de arquitectura que la sociedad realice.- k) Dar y tomar a dinero en préstamo, así coma otorgar garantías de naturaleza hipotecaria prendaria, fiduciaria, cambiaria o de cualquier otra clase,- l) Promover, construir, organizar, explotar y tomar participación en el capital y patrimonio de todo género de sociedades mercantiles, civiles, asociaciones o empresas industriales, comerciales, de servicio de cualquier otra indole, tanto nacionales coma extranjeras, así como participar en su administración o liquidación.- m) La adquisición, enajenación y en general la negociación de todo tipo de acciones, partes sociales y de cualquier titulo, valores permitidos par la ley.- n) La emisión, suscripción, aceptación, endoso, aval o cualesquier títulos o valores mobiliarios que la ley permita.-ñ).- Obtener o conceder préstamos otorgando y recibiendo garantías especificas, emitir obligaciones, aceptar, girar, endosar o avalar toda clase de títulos de crédito y otorgar fianzas o garantías de cualquier clase respecto de las obligaciones propias o de terceros o de los títulos emitidos o aceptados por la sociedad o por terceros.- o) Adquirir, enajenar, tomar y otorgar el uso y goce por cualquier titulo permitido por la ley de bienes muebles e inmuebles.- p) Obtener y otorgar por cualquier titulo patentes, marcas, nombres comerciales, opciones y preferencias, derechos de autor y concesiones para todo tipo de actividades.- q) En general, la celebración de toda clase de actos juridicos, que sean necesarios o convenientes para la realización de los objetos indicados.-**ARTICULO QUINTO.- DURACION**.- La duración de la sociedad será de 99 (noventa y nueve) años, contados a partir de los objetos indicados.-**ARTICULO SEXTO.- EXCLUSION DE EXTRANJEROS**: Ninguna persona extranjera, física o moral, podrá tener participación social alguna o ser propietaria de acciones de la sociedad. Si por algún motivo alguna de las personas mencionadas anteriormente, por cualquier evento llegare a adquirir una participación o ser propietaria de una o más acciones, contraviniendo así lo establecido en el párrafo que antecede, se conviene desde ahora en que dicha adquisición será nula y por tanto cancelada y sin

ningún valor la participación social de que se trate y los titulos que la representen, teniéndose por reducido el capital social en una cantidad igual al valor de la participación cancelada.-**CAPITULO SEGUNDO. EL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ASOCIACIONES.-ARTICULO SEPTIMO.-CAPITAL.-** El capital social se integra con una porción fija y otra variable y será representado por dos series de acciones. La serie A será representativa del capital fijo, en tanto que la serie B será representativa del capital variable, el capital minimo o fijo sin derecho a retiro importa la cantidad de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL), representado por CINCUENTA acciones ordinarias, nominativas de la serie A, con valor nominal de $1,000.00 (UN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL) y podrán ser representadas por titulos nominativos que sirvan para acreditar los derechos de los accionistas y que podrán comprender una o más acciones. El capital variable será limitado, estará representado por acciones nominativas de la Serie "B", con valor nominal de $1,000.00 (UN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL) cada una y podrán estar representadas por títulos nominativos que servirán para acreditar los derechos de los accionistas y que podrán comprender una o más acciones. Las acciones de la serie "A" y de la Serie "B" confieren iguales derechos y obligaciones a sus tenedores.-ARTICULO OCTAVO.-TITULOS DE ACCIONES.-Los titulos que representen las acciones de la sociedad deberá contener en su texto los requisitos establecidos por el articulo 125 (ciento veinticinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, podrán amparar una o varias acciones y serán firmados por dos miembros del Consejo de Administración o por el Administrador Único, según sea el caso. Así mismo los títulos deberán llevar impreso el texto del articulo 6 (sexto) de los estatutos.-**ARTICULO NOVENO.- REGISTRO DE ACCIONES**: La sociedad llevara un Libro de Registro de Acciones que contendrá el nombre, nacionalidad y domicilio de los accionistas, indicando las acciones que les pertenezcan, con todas sus particularidades. Así mismo en dicho libro se harán constar las exhibiciones que los Accionistas efectúen y las transmisión que hicieren.-**ARTICULO DECIMO.- AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE CAPITAL:** El Capital Social podrá ser aumentado o disminuido, el fijo por resolución de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas y el variable por resolución de Asamblea General Ordinaria de Accionistas, sujeto a lo previsto por la Ley General de Sociedades Mercantiles. En caso de aumento de capital, los Accionistas tendrán derecho de preferencia para suscribir el aumento, en proporción al aumento de acciones de que sean propietarios, debiendo ejercer su derecho, dentro de un plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha de notificación que se realice de acuerdo con el articulo 132 (ciento treinta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles; sin embrago si en la asamblea al momento de la votación está representada la totalidad del capital social, dicho plazo de 15 (quince) dias hábiles empezara a correr a partir de la fecha de la asamblea y los accionistas se consideraran notificados del acuerdo respectivo en ese momento.-. **CAPITULO TERCERO. ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.- ARTICULO UNDECIMO.- ADMNISTRACION.-** La administración de la Sociedad estará a cargo de un administrador Único o de un Consejo de Administración compuesto de dos o más miembros según lo determine la Asamblea Ordinaria de Accionistas. Si la Asamblea lo estima necesario podia nombrar, según sea el caso, Administrador Único Suplente o Consejeros Suplentes. Los administradores según sea el caso, Administrador Único Suplente o Consejeros Suplentes. Los administradores ya sean Propietarios o Suplentes podrán ser a no Accionistas de la Sociedad y continuaran en funciones hasta que las personas designadas para sustituirlos tomen posesión de sus cargo. Podrán ser reelectos y recibirán las remuneraciones que determine la Asamblea Ordinaria de Accionistas. El Administrador Único o los Consejeros podrán ser removidos en cualquier tiempo por la Asamblea Ordinaria de Accionistas. **-ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- SESIONES DE CONSEJO:** El Consejo de Administración, celebrara sus sesiones en el domicilio social o en cualquier otro lugar de la Republica Mexicana o en el Extranjero, Para que las sesiones sean declaradas legalmente instaladas se requerirán de la comparecencia de cuando menos la mitad do sus miembros y sus resoluciones serán validas cuando se adopten por mayoria de los consejeros presentes. En caso de empate el Presidente del Consejo decidirá con voto de calidad. De cada sesión se levantara un Acta que será firmada por el Presidente y el Secretario y será asentada en el Libro que al efecto se lleve. Si el Presidente no asiste a la sesión estará presidida por el Consejero que siga en orden jerárquico y en su defecto por el Consejero que designe por mayoria de votos.-En los términos del Articulo 143 (ciento cuarenta y tres).-de la Ley General de Sociedades Mercantiles la resolución tomada por el Consejo de Administración fuera de sesión Consejo, para todos los efectos legales, tendrán la misma validez que si se hubieren adoptado en sesión de Consejo, siempre y cuando las mismas se tomen por unanimidad de votos de los miembros del Consejo y estas se confirmen por escrito.- **ARTICULO DECIMO TERCERO.- DERECHO DE MINORIAS**: Cuando la sociedad sea administrada por un Consejo de Administración, cualquier accionistas o grupo de accionistas que representen cuando menos el 25% (veinticinco por ciento) del capital social tendrá derecho a designar: Un Consejero y un Comisario.-**ARTICULO DECIMO CUARTO.- FACULTADES DE LOS ADMINISTRADORES:** El Administrador Único, o en su caso, el Consejo de Administración, tendrán la representación de la Sociedad, pudiendo realizar todas las operaciones inherentes al objeto social, en forma enunciativa y no limitativa, gozara (n): de las siguientes facultades:- A.- representar a la sociedad con facultades para Pleitos, y cobranzas con todas las facultades generales y las especiales que requieran poder o Clausula Especial, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) primer párrafo y 2587 (dos mil

COPIA COTEJADA

quinientos ochenta y siete) del Código Civil Federal, estando facultado especialmente pero sin hacer limitación alguna para: UNO. Representar a la sociedad ante personas físicas, morales y ante toda clase de autoridades Administrativas o Judiciales de cualquier fuero, sean estas Civiles, Penales, Administrativas o Autoridades del Trabajo, tanto en el orden Federal como Local, en toda la extensión de la Republica Mexicana o en el Extranjero, en Juicio o fuera de el.- DOS.-Promover toda clase de Juicios, incluyendo los de amparo, seguirlos en todos sus trámites y desistirse de ellos, TRES. Interponer toda clase de recursos, en las instancias y ante los autoridades que procedan; CUATRO. Contestar las demandas que se interpongan en contra de la Sociedad y seguir los, Juicios por sus demandas trámites legales; CINCO. Reconocer firmas, documentos y redargüir de falsos los que se presenten por la contraria; SEIS.- Presentar testigos, ver protestar a los de la contraria, tacharlos y repreguntarlos; SIETE. Articular y absolver posiciones; OCHO.- Transigir y comprometer en árbitros; NUEVE. Recusar Funcionarios Judiciales, sin causa, con causa o bajo protesta de Ley; DIEZ.-Solicitar el remate de bienes y nombrar peritos; ONCE. Recibir valores, otorgar recibos y cartas de pago; DOCE. Formular y presentar denuncias querellas o acusaciones, coadyuvar con el Ministerio Publico en Procesos Penales, y otorgar perdones cuando a su juicio lo amerite y legalmente proceda; TRECE. Representar a la sociedad en los juicios, o procedimientos laborales con la calidad jurídica y las facultades prescritas en los artículos 11 (once), 692 (seiscientos noventa y dos), fracciones II (segunda) y III (tercera), 694 (seiscientos noventa y cuatro), 695 (seiscientos noventa y cinco), 786 (setecientos ochenta y seis), y 899 (ochocientos noventa y nueve), en relación a lo aplicable con las normas de los capítulos XII (Duodécimo) y XVII (Decimo Séptimo), así como el articulo 14 (catorce) y demás disposiciones relativas de la Ley Federal del Trabajo vigente en el Pais.- B. Administrar los bienes y los negocios de la Sociedad con facultades para **Actos de Administración**, en términos del párrafo Segundo del articulo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y en consecuencia todas las operaciones administrativas, de dirección, operación y corporativas de la empresa inherentes al objeto de la sociedad y autorizando por lo tanto, pero sin que constituya limitación alguna al mandato a que se refiere el presente punto, para: UNO. Nombrar y remover a director (es), gerente (s) secundario subgerente (s), apoderado(s), agente(s), empleado(s), de la sociedad determinando sus atribuciones, condiciones de Trabajo y remuneraciones, dejando a salvo el derecho que corresponda a la asamblea General para la designación de Administradores Generales o Especiales con las facultades y el otorgamiento de sus atribuciones; DOS. Celebrar Contratos Colectivos e individualesTrabajo; TRES. Convocar a asambleas generales, ordinarias, especiales o extraordinarias de socios, ejercitar sus acuerdos y en general llevar a cabo todos los actos y operaciones que fueren necesarias o convenientes para los fines y derechos de la Sociedad, con excepción de los expresamente reservados por la Ley o por estos Estatutos a la Asamblea General de Accionistas.-C) Facultades para celebrar y ejecutar Actos de dominio respecto de los bienes y derechos de la sociedad, sin limitación alguna, en los términos del párrafo tercero del articulo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal. -D. Facultades cambiarias, en los términos de los articulos 9 (noveno) y 85 (ochenta y cinco) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pudiendo en consecuencia otorgar, suscribir, acepta, avalar, endosar y negociar toda clase de Títulos de Crédito a nombre de la sociedad y realizar en, o con los propios títulos las operaciones de crédito que regula la Ley de la Materia, abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de la sociedad, autorizar personas que giren a cargo de las mismas, revocar dichas autorizaciones y adquirir participaciones en el capital de otras sociedades; celebrar todc tipo de contratos y convenios de crédito ya sea con particulares o con instituciones bancarias tanto en la Republica Mexicana como en el Extranjero, estando facultado para comprometer los bienes de la sociedad como garantía de pago de dichos créditos. Las enumeraciones anteriores son de carácter enunciativo y por lo tanto no limitativo. El órgano de Administración para delegar sus facultades en una o varias personas, señalándoseles sus atribuciones para que las ejerciten en los términos correspondientes.-E. Facultades Generales pare **Delegar Total o Parcialmente** las Facultades anteriores por lo cual expresamente se le autoriza desde el otorgamiento de la presente póliza para llevar a cabo dichos actos, nombramientos y delegaciones en los términos más amplios que en derecho corresponda.- **ARTICULO DECIMO QUINTO.-RESPONSABILIDAD SOLIDARIA**: De conformidad con el articulo 158 (ciento cincuenta y Ocho) de la Ley General de Sociedades Mercantiles los Administradores son solidariamente responsables para con la sociedad: a) De la realidad de las aportaciones; hechas por los socios; b) Del cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios establecidos con respecto a los dividendos que se paguen a los accionistas.- c) De la existencia y mantenimiento de los Sistemas de contabilidad, control, registro, archivo o información que previene la ley; d) Del exacto cumplimiento de los acuerdos de las Asambleas de Accionistas. **ARTICULO DECIMO SEXTO.- FACULTADES DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION:** Cuando la Sociedad sea Administrada por un Consejo de Administración, su presidente será el representante legal del propio consejo y del ejecutor de sus resoluciones sin necesidad de acuerdo especial por el cual se le instruya sobre la ejecución de tales

resoluciones. Por el solo hecho de su nombramiento, el Presidente del Consejo de Administración tendrá respecto de la sociedad, toda clase de facultades de administración y para pleitos y cobranzas, ya sean generales o especiales, aun las que conforme a la ley requieran clausula especial en los términos de los primeros párrafos del articulo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal, inclusive las necesarias para suscribir Títulos de Crédito, para otorgar poderes generales o especiales dentro de las facultades y para desistirse aun del Juicio de Amparo.- **ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- GERENTES:** La Asamblea Ordinaria de Accionistas, el Consejo de Administración o el Administrador Único podrán nombrar uno o varios Gerentes Generales o Especiales, los que podrán ser o no Accionistas, y que tendrán las facultades y obligaciones que el propio Administrador Único, el Consejo de Administración o la Asamblea les señalen al hacer sus nombramientos y otorgarles los poderes necesarios. Dichos funcionarios duraran en su cargo hasta que se les revoquen sus nombramientos.-**ARTICULO DECIMO OCTAVO, GARANTIAS:** En los términos de los 152 (ciento cincuenta y dos) y 153 (ciento cincuenta y tres) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Administrador Único o el Consejo de Administración en su caso, los Gerentes y demás Funcionarios de la Sociedad, al entrar en funciones no tendrán la obligación de prestar garantía alguna para asegurar las responsabilidades que pudieran contraer en el desempeño de sus cargos a menos que la Asamblea General de Accionistas determine lo contrario. En este último supuesto los Consejeros y Comisarios podrán garantizar el desempeño de sus funciones con una fianza o deposito, en caso de que asi lo determinen expresamente los Accionistas debiendo depositarse la garantía correspondiente en la Tesorería de la Sociedad y no podrá ser cancelada hasta que la Asamblea de Accionistas haya aprobado, el desempeño de sus funciones durante su cargo.-**CAPITULO CUARTO. DE LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD.- ARTICULO DECIMO NOVENO. VIGILANCIA:** La vigilancia de la Sociedad estará a cargo de uno o más Comisarios designados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.-**ARTICULO VIGESIMO.- COMISARIOS:** Los Comisarios podrán ser o no Accionistas de la Sociedad, estarán en funciones hasta que sean removidos par la Asamblea Ordinaria de Accionistas y podrán ser reelectos, continuando en ejercicio de sus cargos hasta que tomen posesión las personas designadas para substituirlos.- **ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- IMPEDIMENTOS PARA SER COMISARIO:** No podrán ser comisarios: a) Los que conforme a la Ley estén inhabilitados para ejercer el comercio, los empleados de la sociedad, los empleados de aquellas sociedades que sean accionistas de esta sociedad por más de un 25 % (veinticinco por ciento) del capital social ni los empleados de aquellas sociedades de las que esta sea accionista en más de un 50 % (cincuenta por ciento). b) Los parientes consanguíneos de los Administradores en linea recta sin limitación de grado, los colaterales dentro del cuarto grado y los afines dentro del segundo.-**ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- FACULTADES Y OBLIGACIONES**: Son facultades y obligaciones de los comisarios:- A. Cerciorarse de la Constitución y subsistencia de la garantia a que se refiere el articulo Decimo Octavo de estos estatutos.-B.-Realizar un examen de las operaciones, documentación, registros y demás evidencias comprobatorias en el grado y extensión que sean necesarios para efectuar la vigilancia de las operaciones que la Ley les impone y para rendir el dictamen que se menciona en el siguiente apartado.- C.- Rendir anualmente a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas un informe respecto a la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la documentación presentada por los administradores a la propia Asamblea de Accionistas. Este informe deberá contener por lo menos:- UNO- La opinión del comisario sobre si las políticas y criterios contables y de información seguidos por la sociedad son adecuados y suficientes tomando en cuenta las circunstancias particulares de la sociedad.- DOS. La opinión del comisario respecto a la información presentada por los Administradores, en cuanto a la aplicación de criterios previamente establecidos.- TRES. La opinión del comisario sobre si, como consecuencia de lo anterior, la información presentada por los Administradores reflejada en forma veraz y suficiente la situación financiera y los resultados de la sociedad.- D.-Deberá cerciorase de la constitución y subsistencia de las garantías, en su caso, que pudiera decretar la asamblea de Accionistas al Administrador Único, a los miembros del Consejo de Administración en su caso, o a los Gerentes y demás funcionarios de la sociedad, para asegurar sus responsabilidades en el desempeño de sus cargos.- E. Las demás a que se refiere los párrafos quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno del articulo 166 (ciento sesenta y seis) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-**CAPITULO QUINTO. DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS.-ARTICULOS VIGESIMO TERCERO.-ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**: La asamblea General de Accionistas legalmente instalada es el órgano supremo de la sociedad y sus decisiones obligan aun a los ausentes y disidentes, salvo el derecho de oposición a que se refiere el articulo 201 (doscientos uno) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- Para que los accionistas tengan derecho de asistir a las Asambleas deberán presentar en ellas los títulos de sus acciones. También podrán depositarlos en la Secretaria de la Sociedad, en una institución de Crédito de la Republica o del Extranjero o ante Corredor Publico en términos del articulo 205 (doscientos cinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En estos casos, en lugar de los títulos de las acciones presentaran en la asamblea el certificado expedido por la Secretaria de la Sociedad, por la Institución de crédito o por el corredor publico que compruebe el depósito, documento en el cual deberán constar los números de las acciones.-**ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- CLASES DE ASAMBLEAS:** La Sociedad podria celebrar asambleas generales, espaciales o totalitarias. Las Asambleas Generales de Accionistas serán ordinarias y extraordinarias. todas serán ordinarias salvo las que se reúnan para

COPIA COTEJADA

tratar cualquier asunto de los comprendidos en el articulo 182 (ciento ochenta y dos) de la Lay General de Sociedades Mercantiles, las cuales serán extraordinarias.-**ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- ASAMBLEAS ORDINARIAS**: Las Asambleas Ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año dentro de los 4 (cuatro) meses siguientes a la clausura del ejercicio social y se ocuparan, además de los asuntos incluidos en la orden del día, de lo siguiente: A. Discutir, aprobar o modificar el Informe de los Administradores a que se refiere el artículo Trigésimo Cuarto de los Estatutos, tomando en cuenta el informe de los Comisarios y tomar las medidas que juzguen oportunas.-B. en su caso nombrar y/o remover al Administrado Único o Consejo de Administración y a los Comisarios.-C.Determinar los emolumentos correspondientes a los Administradores y Comisarios.-**ARTICULO VIGESIMO SEXTO.-CONVOCATORIA**: La convocatoria para los asambleistas deberá hacerse por el Administrador Único, por el Consejo de Administración o por los comisarios, sin embrago, los accionistas que representen por lo menos el 33 % (treinta y tres por ciento) del Capital Social, podrán pedir por escrito en cualquier tiempo al Consejo de Administración, al Administrador Único o a los Comisarios, que convoquen a una Asamblea General de Accionistas para tratar los asuntos que indiquen en su petición. El mismo derecho tendrá el titular de una acción en los casos a que se refiere el artículo 185 (ciento ochenta y cinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Si el Administrador único, el Consejo de Administración o los Comisarios no hacen la convocatoria dentro de los 15 (quince) días siguientes a la fecha de la solicitud, la hará el juez de lo civil o del Distrito del domicilio de la Sociedad a pedimento de los interesados, quienes al efecto deberán acreditar su calidad de Accionistas. La convocatoria para las asambleas deberá hacerse mediante una publicación en el periódico oficial o alguno de los de mayor circulación, del domicilio de la sociedad, por lo menos con una anticipación de 15 (quince) días a la fecha de la asamblea.-ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO. ASAMBLEAS TOTALITARIAS: Podrá celebrarse una Asamblea sin el requisito de la publicación de la convocatoria y serán validas las resoluciones que en ella se adopten, en los siguientes casos:-A. Cuando al momento de levantar la lista de asistencia de la Asamblea este representada la totalidad del capital social.-B. Cuando se reúna una Asamblea como continuación de otra anterior y en ellas se hayan señalado dia y hora para continuarla, siempre y cuando no se traten mas asuntos que los indicados en la primera convocatoria.-ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.-REPRESENTACION: Los accionistas tendrán derecho a hacerse representar en las asambleas por la persona o personas que designen mediante simple carta poder firmada por el interesado y dos testigos.- los accionistas no podrán ser representados por ninguno de los Administradores o Comisarios.-ARTICULO VIGESIMO NOVENO.-ACTAS DE ASAMBLEA: Las actas de asamblea se asentaran en el Libro respectivo y serán firmadas por el Presidente y el Secretario de la asamblea asi como por los Comisarios que asistan. Deberán de cumplir con los requisitos a que se refiere el artículo 41 (cuarenta y uno) del Código de Comercio en vigor.-**ARTICULO TRIGESIMO.- PRESIDENTE Y SECRETARIO DE ASAMBLEAS**: Las asamblea serán presididas por el Administrador Único o por el Presidente del Consejo de Administrador, según sea el caso y a falta de el por la persona que designen los asistentes por mayoría de votos. Fungirá como secretario el del propio Consejo y en su defecto, la persona que elijan los asistentes por mayoría de votos.-**ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO.- QUORUM**: Para que una asamblea Ordinaria de Accionistas que se celebre en virtud de primera convocatoria sea válida, será necesario que en ella esté representado por lo menos el 51% (cincuenta y uno por ciento) del capital social y las resoluciones serán validas cuando se tomen por el voto favorable de la mayoría de las acciones representadas.-Para que las Asambleas Extraordinarias reunidas en virtud de primera convocatoria sean validas, será necesario que esté representado por lo menos el setenta y cinco por ciento del capital social y que las resoluciones se tomen por el voto favorable de las acciones que representen por lo menos el cincuenta y uno por ciento del capital social.-**ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO.-RESOLUCIONES TOMADAS FUERA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS**: En los términos del segundo párrafo del artículo 178 (ciento setenta y ocho) de la Ley General de Sociedades Mercantiles las resoluciones tomadas por los Accionistas fuera de Asamblea de Accionistas, tendrán para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas reunidos en Asamblea General, Especial o Totalitaria, respectivamente, siempre y cuando las mismas sean tomadas por unanimidad de votos de los accionistas que representen la totalidad de las acciones con derecho a voto o de la categoría especial de las acciones de que se trate, y que dicha resolución se confirmen por escrito.-**ARTICULO TRIGESIMO TERCERO.- ASAMBLEA EN SEGUNDA CONVOCATORIA**:- Si las Asambleas no pudieren reunirse en la fecha señalada en la primera convocatoria, se repetirá la convocatoria y las Asambleas decidirá sobre los puntos contenidos en el orden del día, cualquiera que sea el número de acciones representadas, excepto en el caso de las Asambleas Extraordinarias, en las que siempre se requerirá el voto favorable de las Acciones que representen por lo menos el 51% (cincuenta y uno por ciento) del capital social.-**CAPITULO SEXTO. INFORMACION FINANCIERA.-ARTICULO TRIGESIMO CUARTO.-REQUISITOS DEL INFORME**.- La sociedad por conducto y bajo la responsabilidad de sus Administradores presentaran a la Asamblea de Accionistas anualmente un informe que incluirá por lo menos:-A. Información sobre la marcha de la sociedad en el ejercicio, asi como sobre las políticas seguidas por los administradores y, en su caso sobre los principales proyectos existentes.-B. Información sobre las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de los estados financieros.-C. Un estado que muestre la situación financiera de la

sociedad a la fecha de cierre del ejercicio.-D.-Un estado que muestre debidamente explicados y clasificados los estados de la sociedad durante el ejercicio.- E. Un estado que muestre los cambios en la situación financiera durante el ejercicio.-F.-Un estado que muestre los cambios en las partidas que integran el patrimonio social.- Las notas y comentarios que sean necesarias para completar o aclarar la información que suministren los estados anteriores.- a la información anterior se agregara el informe de los Comisarios a que se refiere el párrafo tercero del articulo vigésimo segundo de estos estatutos.-el informe a que se refiere este articulo, incluido el informe de los comisarios deberá quedar terminado y ponerse a disposición de los accionistas por lo menos 15 (quince) días antes de la fecha de la asamblea que haya de discutirlo.-Los accionistas tendrán derecho a que se les entregue una copia del informe correspondiente.- **ARTIC[illegible]RIGESIMO QUINTO.-UTILIDADES**: La utilidades que resulten se distribuirán en la siguiente forma: A. Se separara un 5% (cinco por ciento) cuando menos, para constituir el fondo de reserva legal, hasta que este alcance el 20% (veinte por ciento) del capital social.- B. Se separan las cantidades que determinen la asamblea para crear fondos especiales de reserva, de previsión o de reinversión.-C. Se separa la cantidad que corresponda a los empleados y trabajadores por reparto de utilidades en los términos de la Ley Federal del Trabajo.-D. El remanente se distribuirá entre todos los accionistas en proporción al monto de sus aportaciones o de acuerdo a lo que determine la asamblea.-la distribución de utilidades solo podrá hacerse después de que haya sido debidamente aprobados por la Asamblea General de Accionistas, los estados financieros que arrojen.-**ARTICULO TRIGESIMO SEXTO.-PERDIDAS:** Las perdidas si las hubiere, serán soportadas por la reserva y a falta de ellas por todas las acciones por partes iguales hasta la concurrencia de su valor nominal.- **ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO.-DISTRIBUCION DE UTILIDADES:** No podrá hacerse distribución de utilidades mientras no haya sido restituidas o absorbidas, mediante aplicación de otras partidas del patrimonio, las pérdidas sufridas en uno o varios ejercicios anteriores o haya sido reducido el capital social.-**ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO.-FUNDADORES**: Los socios fundadores no se reservaran ninguna participación especial en la sociedad por su carácter de fundadores.-**CAPITULO SEPTIMO. DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.-ARTICULO TRIGESIMO NOVENO.-DISOLUCION Y LIQUIDACION**: La sociedad se disolverá en cualquiera de los casos establecidos en el articulo 229 (doscientos veintinueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-**ARTICULO CUADRAGESIMO.- LIQUIDADORES**: Disuelta la sociedad, se pondrá en liquidación, la cual estará a cargo de uno o más liquidadores, nombrados por la asamblea Extraordinaria de Accionistas. Si la asamblea no hace la designación de liquidadores la hará un Juez de lo Civil o de Distrito del domicilio de la sociedad a pedimento de cualquier accionista.-ARTICULO CUADRAGESIMO PRIMERO.-BASES DE LIQUIDACION: Salvo las instrucciones expresas que la asamblea que decrete la disolución de a los liquidadores, la liquidación se practicara de conformidad con las siguientes bases generales:-A. Conclusión de los negocios pendientes en la forma menos perjudicial para los acreedores y los accionistas.-B. Formulación del balance e inventarios generales.- C. cobro de créditos y pago de deudas.-D. Enajenación de los bienes de la sociedad y aplicación del producto a los fines de la liquidación.-E. Distribución del rem[illegible]te, si lo hubiere entre los accionistas en proporción a sus acciones.-**ARTICULOS TRANSITORIOS.-PRIMERO**: Los ejercicios sociales correrán de primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año, sin embrago el primer ejercicio será irregular y correrá de la fecha de forma de este instrumento al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve.- **SEGUNDO**.- el capital social minimo fijo queda integramente suscrito y pagado de la siguiente forma: CINCUENTA ACCIONES CON VALOR DE UN MIL PESOS CADA UNA, QUE INTEGRA EL CAPITAL SOCIAL MINIMO EN CANTIDAD DE CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL. Los suscritos comparecientes manifiestan que han pagado en efectivo la totalidad de sus respectivas suscripciones y que dicho pago se encuentra en poder de la tesoreria de la sociedad, en cumplimiento a los artículos ochenta y nueve y noventa y uno fracción primera de la ley general de sociedades mercantiles, quedando distribuido el capital social minimo antes referido, de la siguiente manera: CAPITAL SOCIAL FIJO.-ACCIONISTA.-IRINA SALGADO HERNANDEZ.-ACCIONES.-VEINTICINCO ACCIONES DE LA SERIE A, CON VALOR DE MIL PESOS POR CADA ACCION.- VALOR TOTAL DE LAS ACCIONES.- $25,000.00 (VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) ACCIONISTA.-MARCIAL MIGUEL VELASCO MARTINEZ.- ACCIONES.- VEINTICINCO ACCIONES DE LA SERIE A, CON VALOR DE MIL PESOS POR CADA ACCION.- VALOR TOTAL DE LAS ACCIONES.- $25,000.00 (VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).-TOTAL DE CAPITAL SOCIAL FIJO.-CINCUENTA ACCIONES DE LA SERIE A, CON VALOR DE UN MIL PESOS MONEDA NACIONAL CADA UNA Y UN VALOR TOTAL DE $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL).- **TERCERO**: Los comparecientes constituidos en asamblea general constitutiva de accionistas acuerdan lo siguiente:- I.-Que la sociedad sea dirigida por un ADMINISTRADOR UNICO que será la señora **IRINA SALGADO HERNANDEZ**, quien gozara de las facultades enumeradas en los articulos decimo cuarto y decimo sexto de los Estatutos de la Sociedad, las cuales se tienen por reproducidas aquí como si se insertasen a la letra. EL ADMINISTRADOR UNICO designado

COPIA COTEJADA

se encuentra presente en este acto y acepta su nombramiento y las atribuciones inherentes a su cargo.-II.-Se designa comisarios de la sociedad al señor MARTIN LOPEZ PEÑA. Los comparecientes manifiestan bajo protesta de decir verdad que el COMISARIO, designado, ha aceptado el cargo que le fue conferido.- III.- La asamblea exonera a los funcionarios designados, de garantizados el fiel desempeño de su cargo, en términos de lo dispuesto por el articulo decimo octavo de los estatutos sociales.-**CUARTO**.- Los accionistas se someten a las leyes y tribunales del estado de Guerrero, para la interpretación y cumplimiento del contenido del presente instrumento y aceptan las restricciones que se contienen en el permiso a que se refiere los antecedentes del presente instrumento.-**QUINTO**: Los gastos, honorarios, impuestos y derechos que se causen con motivo del otorgamiento firma e inscripción en el Registro Público de Comercio de este instrumento serán por cuenta de la Sociedad mercantil, cuya constitución que en él se consigna. En virtud de lo anterior, se releva a la suscrita corredor publico de la realización de trámites, gestiones y demás obligaciones relacionadas con las inscripción del presente instrumento en el Registro Público de Comercio y/o cualesquiera otra dependencia gubernamental que corresponda al domicilio de la sociedad mercantil que en el presente instrumento se constituye.- ADVERTENCIAS.- La suscrita Corredor Publico advertí a los comparecientes.- Primera.- Que de acuerdo con el articulo veintisiete del Código Fiscal de la Federación, en el plazo de treinta días contados a partir de la firma del presente instrumento, deberá ser inscrita esta sociedad en el registro Federal de Contribuyentes y justificarlo así a la suscrita Corredor Publico, de otra forma, se dará aviso a que se refiere dicho precepto.- Primera.-Quede acuerdo con el articulo veintisiete del Código Fiscal de la Federación en el plazo de treinta días contados a partir de la firma del presente instrumento, deberá ser inscrita esta SOCIEDAD EN EL Registro Federal de Contribuyentes y justificarlo así a la suscrita Corredor Publico, de otra forma, se dará aviso a que se refiere dicho precepto. SEGUNDA: De la obligación de dar aviso del uso de permiso de denominación a la Secretaria de Relaciones Exteriores dentro de los seis mesas siguientes a la expedición del mismo, de conformidad con lo que establece el articulo 18 dieciocho del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.-TERCERA: Quo solicite a los comparecientes su cedula de identificación fiscal, quienes no la presentaron y les adverti que deberán acreditarme haber presentado la solicitud come socios accionistas de la sociedad ante el Registro Federal de Contribuyente, la clave de cada uno de ellos, dentro de los siguientes treinta días naturales a la fecha de firma del presente instrumento y que en caso de no exhibirme dicha solicitud, procederé a dar aviso correspondiente a las autoridades fiscales competentes.- CUARTA: Que deberá ser inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Guerrero el primer original que se levante de la presente póliza, para los efectos del articulo segundo de la Ley General de Sociedades mercantiles, previo pago de los derechos correspondientes.- Enterados los comparecientes de las anteriores advertencias y estando de acuerdo en firmar el presente instrumento en términos del articulo seis fracción sexta (romano) de la Ley Federal de Correduría Publica, artículos sexto, cincuenta y tres fracción quinta (romano) y cincuenta y cuatro del reglamento de la Ley Federal de Correduría Publica, de los artículos diez, ciento cuarenta y cinco, ciento cuarenta y seis y ciento cuarenta y siete de Ley General de Sociedades Mercantiles, del articulo dos del Código de Comercio y de los artículos primero, veintisiete. Veintiocho y Dos Mil Quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal por sus instrucciones expresas, copio en lo conducente lo que es del tenor literal siguiente: **INSERCION.-LEY FEDERAL DE CORREDURIA PUBLICA.-ARTICULO SEXTO.-** Al Corredor Publico le corresponde: ...VI.- Actuar como Fedatario en la constitución y en los demás actos previstos POR LA Ley General de Sociedades Mercantiles incluso aquellos en los que se haga constar la representación orgánica.- VIII.-. Las demás funciones que le señalen esta y otras leyes o reglamentos. Reglamento de la **CORREDURIA PUBLICA.-ARTICULO SEXTO**. Para los efectos de las fracciones quinta (romano), sexta (romano) y Séptima (romano) del artículo sexto de la Ley. Cuando en las leyes y Reglamentos se haga referencia a "Notario o fedatario Público" "escritura" "protocolo" y "protocolización" se entenderá que se refiere a "corredor Publico" a la "póliza expedida por corredor" a cualquier "libro de registro del corredor" respectivamente "ARTICULO CINCUENTA Y TRES".- El corredor en el ejercicio de sus funciones como fedatario Público, podrá intervenir.... V QUINTA ROMANO) En la constitución, modificación, transformación, fusión, escisión, disolución, liquidación y extinción de Sociedades Mercantiles, así como en la designación de sus representantes, legales y facultades de que estén investidos" ARTICULO CINCUENTA Y CUATRO, Las pólizas y actas expedidas por el corredor en el ejercicio de sus funciones, inclusive aquellas en que se haga constar la designación y facultades de presentación en las Sociedades Mercantiles de conformidad con la ley de la materia, se deberán admitir para su inscripción en el Registro de la Propiedad y del Comercio siempre que dichos instrumentos cumplan con los requisitos legales.-LEY GENERL, DE SOCIEDADES MERCANTILES.- articulo decimo.- La representación de toda sociedad mercantil corresponderá a su administrador o administradores, quienes podrán realizar todas las operaciones inherentes al objeto de loa sociedad, salvo lo que expresamente establezca la ley el contrato social. Para

que surtan efectos los poderes que otorgue la sociedad mediante acuerdo de la asamblea o del órgano colegiado de administración, en su caso, bastara con la protocolización ante notario de la parte del acta en que conste el acuerdo relativo a su otorgamiento, debidamente firmada por quienes actuaron como presidente y secretario de la asamblea o del órgano de administración según corresponda, quienes deberán firmar el instrumento notarial, o en su defecto lo podrán firmar el delegado especialmente designado para ello en sustitución de los anteriores.- El notario, hará constar en el instrumento correspondiente, mediante la relación, inserción o el agregado al apéndice de las certificaciones, en lo conducente, de los documentos que al efecto se exhiban, la denominación o razón social de la sociedad, su domicilio, duración, importe del capital social y objeto de la misma, así como las facultades que conforme a sus estatutos le correspondan al órgano de administración. Si la sociedad otorgare poder por conducto de una persona distinta a los órganos mencionados, en adición a la relación o inserción indicadas en el párrafo anterior, se deberá dejar acreditado que dicha persona tiene las facultades para ello.- ARTICULO CIENTO CUARENTA Y CINCO.- La Asamblea General de Accionistas, el Consejo de Administración o el Administrador, podrá nombrar uno o varios Gerentes Generales o Especiales, sean o no accionistas. Los nombramientos de los Gerentes serán revocables en cualquier tiempo por el Administrador o Consejo de Administración o por la Asamblea General de Accionistas.- ARTICULO CIENTO CUARENTA Y SEIS. - Los Gerentes tendrán las facultades que expresamente se les confieran, no necesitaran de autorización especial del Administrador o Consejo de Administración para los actos que ejecuten y gozaran, dentro de la órbita de las atribuciones que se les hayan asignado, de las más amplias facultades de representación y ejecución.- ARTICULO CIENTO CUARENTA Y SIETE.- Los cargos de Administrador o Consejero y de Gerente. Son personales y no podrán desempeñarse por medio de representante.- CODIGO DE COMERCIO.- ARTICULO SEGUNDO.- A falta de disposiciones de este ordenamiento Y LAS DEMAS Leyes Mercantiles serán aplicables a los actos de comercio las del derecho común contenidas en el Código Civil aplicable en materia federal.- CODIGO CIVIL FEDERAL.- ARTICULO PRIMERO.- Las disposiciones de este código regirán en toda la Republica en asuntos del orden federal".- ARTICULO 27.- las personas morales obran y se obligan por medio de los órganos que las representan, sea por disposición de la ley o conforme a las disposiciones relativas a sus escrituras constitutivas y de sus estatutos.- ARTICULO 28: las personas morales se regirán por las leyes correspondientes, por su escritura constitutiva y por sus estatutos.- ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO.- en todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastara que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran clausula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. En los poderes generales para administrar bienes, bastara expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastara se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo de los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados las facultades de los apoderados, se consignan las limitaciones, o los poderes serán especiales.- los notarios insertaran este articulo en los testimonios de los poderes que otorguen.- **GENERALES.-** los comparecientes manifestaron de manera expresa, bajo protesta de decir verdad y advertidos por el corredor actuante de las responsabilidades, sanciones y penas de carácter civil y penal en que incurren quienes declaran con falsedad y/o atentan contra la fe pública, en términos del artículo ciento treinta de la constitución política, por sus generales manifestaron ser: - LA **SRA. IRINA SALGADO HERNANDEZ,** de nacionalidad mexicana, originaria de Acapulco, guerrero, donde nació el día veintitrés de agosto de mil novecientos sesenta y siete, soltera, ingeniero en sistemas computacionales, con domicilio en calle nuevo león, numero veintitrés, colonia progreso, código postal treinta y nueve mil trescientos cincuenta, en Acapulco guerrero, y con clave del registro federal de contribuyentes sahi670823sn0 (s, a, h, i, seis, siete, cero, ocho, dos, tres, s, n, cero), se manifiesta al corriente en el pago de sus impuestos sobre la renta sin acreditarlo, quien se identifica con su credencial para votar con fotografía expedida por el instituto federal electoral con clave de elector slhrir67082312m900 (s, l, h, r, i, r, seis, siete, cero, ocho, dos, tres, uno, dos, m, nueve, cero, cero), que, previa verificación en la lista nominal sitio www.ife.org.mx, se agrega en copia autorizada a la relación de identidad del archivo oficial a mi cargo correspondiente al presente instrumento.- **EL SR. MARCIAL MIGUEL VELASCO MARTINEZ.-** de nacionalidad mexicana, originario de Acapulco guerrero, donde nació el día seis de abril del año mil novecientos sesenta y seis, soltero, arquitecto, con domicilio en calle quebrada, numero sesenta y siete "a", colonia centro, código postal treinta y nueve mil trescientos, en Acapulco, guerrero y con clave del registro federal de contribuyentes vemm660406119 (v, e, m, m, seis, seis, cero, cuatro, cero, seis, uno, uno, nueve), se manifiesta al corriente en el pago del impuesto sobre la renta sin acreditarlo, quien se identifica con credencial para votar con fotografía expedida por el instituto federal electoral con clave de elector vlmrmr66040612h301 (v, l, m, r, m, r, seis, seis, cero, cuatro, cero, seis, uno, dos, h, tres, cero, uno), que previa verificación en la lista nominal del sitio www.ife.org.mx, se agrega copia autorizada a la relación de identidad del archivo oficial a mi cargo correspondiente al presente instrumento.- **YO EL NOTARIO PUBLICO, CERTIFICO.- PRIMERO.-** que se solicito y obtuvo de la secretaria de relaciones exteriores el permiso que agrego al archivo correspondiente y que se relaciona en los antecedentes del presente instrumento.- **SEGUNDO**.- que lo relacionado o agregado en copia cotejada al archivo a

COPIA COTEJADA

mi cargo concuerda fielmente con los originales que tuve a mi vista y a los cuales me remito en términos de la fracción cuarta del articulo diecinueve de la ley federal de correduría publica.- **TERCERO**.- que me cerciore de la identidad de los comparecientes y señale el medio a través del cual se identificaron, quienes sin que me conste nada en contrario, tienen a mi juicio capacidad legal para controlar y obligarse toda vez que no encuentro en ellos manifestaciones evidentes de incapacidad natural y no tengo noticias de que estén sujetos a interdicción, en términos de la fracción cuarta del articulo quince y fracción sexta y segundo párrafo de la fracción novena del articulo treinta y dos del reglamento de la ley federal de correduría publica.- **CUARTO.**- que habiéndoles leído integro el presente instrumento y explicado el valor y efectos jurídicos de su contenido a los comparecientes, manifestando su conformidad con el mismo y firman en mi presencia, el día que se indica después de sus respectivos nombres, ante la suscrita corredor público, **QUIEN AUTORIZA Y DA FE.- FIRMAS.- IRINA SALGADO HERNANDEZ**, por su propio derecho. firma el día diecisiete de diciembre del dos mil nueve.- rubrica.- **MARCIAL MIGUEL VELASCO MARTINEZ**, por su propio derecho.- firma el dia dieciséis de diciembre de dos mil nueve.- rubrica.- PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES, CONTRACTUALES Y ESTATUTARIOS CORRESPONDIENTES, AUTORIZO Y EXPIDO LA PRESENTE POLIZA CONSTANTE DE DIEZ FOJAS UTILES, NUEVE DE ELLAS ESCRITAS POR AMBOS LADOS Y LA ULTIMA ESCRITA POR UN SOLO LADO. EN EL LUGAR Y FECHA DE SU OTORGAMIENTO, ACAPULCO, GUERRERO A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE.- DOY FE.- SHUNASHI JAZMIN ALTAMIRANO PINEDAD.- CORREDOR PUBLICO NUMERO CINCO DE LA PLAZA DEL ESTADO DE GUERRERO.- UNA FIRMA.- UN SELLO. y ME MANIFESTO BAJO PROTESTA LEGAL DE DECIR VERDAD SER LA PERSONA QUIEN DICE SER Y QUE NO TIENE INCAPACIDAD LEGAL PARA CELEBRAR LA PRESENTE, DE LO CUAL LA SUSCRITA NOTARIA DOY FE, Y QUE EL MOTIVO DE SU COMPARECENCIA ES PARA RATIFICAR EN TODAS Y CADA UNA SUS PARTES EL CONTENIDO DEL PRESENTE Y QUE SE REFIERE A UN PODER Y QUE JUNTAMENTE CON LOS TESTIGOS ***LIC. JOANA L. RIOS NARVAES QUIEN*** SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRACIA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ***0428030400017, 2004, 00*** DOCUMENTO QUE OSTENTA SU NOMBRE, SU DOMICILIO, SU FIRMA, SU HUELLA DACTILAR Y SU FOTOGRAFIA LA CUAL COINCIDE CON LOS RASGOS FISICOS DEL ROSTRO DE SU PRESENTANTE Y ***LIC. MA GABRIELA CAMPOS ABUNDES QUIEN*** SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRACIA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL **106036819, 1997, 100** DOCUMENTO QUE OSTENTA SU NOMBRE, SU DOMICILIO, SU FIRMA, SU HUELLA DACTILAR Y SU FOTOGRAFIA LA CUAL COINCIDE CON LOS RASGOS FISICOS DEL ROSTRO DE SU PRESENTANTE, RECONOCEN COMO SUYAS LAS FIRMAS QUE SOBRE SUS NOMBRES APARECEN POR SER PUESTAS DE SU PUÑO Y LETRA Y ES LA MISMA QUE USAN EN TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS EN QUE INTERVIENEN.- Y PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE COMPARECENCIA.- LO QUE CERTIFICO EN ESTA CIUDAD DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS, MEXICO SIENDO LAS **12.30** HORAS DEL DIA **2** DEL MES DE **MARZO** DEL AÑO **2010**, HABIENDO DEJADO ANOTADA LA PRESENTE CERYIFICACION BAJO EL NUMERO 32, 156 DEL LIBRO DE CERTIFICACIONES Y VERIFICACIONES DEL PROTOCOLO A MI CARGO.- DOY FE.----------

ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ

LIC. JOANA LIZETH RIOS NARVAES *LIC. MA. GABRIELA CAMPOS ABUNDES.*

LIC. ROSA MA. ADAME GARCIA
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 212
AAGR-560829-AQ2.

COPIA COTEJADA

SIN TEXTO

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
DE ACAPULCO, GUERRERO

Guerrero

Sirr1801

BOLETA DE INSCRIPCION

EL ACTO DESCRITO EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDO INSCRITO EN EL:

FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No. 10160 * 17

Control Interno	Fecha de Prelación
15 * 24	/ MARZO / 2010

Antecedentes Registrales:
PRIMERA INSCRIPCION

Denominación

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Afectaciones al:

Folio	ID	Acto	Descripción	Fecha Registro	Registro
10160	17	M10	*Poder*	09-06-2010	1

Caracteres de Autenticidad de Inscripción: 854b4cf54588bf18acc80ad69d4e9de29010b4cc

Derechos de Inscripción

Fecha 24 MARZO 2010

Importe $366.00 Boleta de Pago No.: A 0887877

COPIA COTEJADA

EL C. REGISTRADOR PUBLICO DE COMERCIO

LIC. JULIO ALEJANDRO GONZALEZ DE LA VEGA OTERO

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD, DEL COMERCIO Y CREDITO AGRICOLA
DEPARTAMENTO DE INSCRIPCION,
2005-2011


------ EL SUSCRITO, TITULAR EN EJERCICIO DE LA CORREDURIA PUBLICA NUMERO UNO DE LA PLAZA DEL ESTADO DE GUERRERO, ----------

---------- **CERTIFICA Y HACE CONSTAR** ----------

------ QUE A SOLICITUD DEL INTERESADO Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS SEXTO Y DIECIOCHO DE LA LEY FEDERAL DE CORREDURIA PUBLICA Y TREINTA Y OCHO Y TREINTA Y NUEVE DE SU REGLAMENTO, EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE OCHO HOJAS UTILES TAMAÑO OFICIO, EXCEPTO LA ULTIMA, ESCRITAS POR AMBOS LADOS SALVO LAS DOS ULTIMAS, CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE CON SU ORIGINAL, MISMA QUE TENGO A LA VISTA, ENTREGÁNDOLE AL SOLICITANTE UN EJEMPLAR DEBIDAMENTE COTEJADO Y CERTIFICADO DE DICHO DOCUMENTO, SEGÚN CONSTA EN EL ACTA NUMERO SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS, PASADA ANTE MI FE Y QUE OBRA EN ARCHIVO OFICIAL DE LA OFICINA A MI CARGO.- ACAPULCO, ESTADO DE GUERRERO A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE ENERO DE DOS MIL ONCE.----------

---------- **FE** ----------

LIC. LUIS ARÉVALO CONTRERAS
CORREDOR PUBLICO NUMERO UNO DE
LA PLAZA DEL ESTADO DE GUERRERO

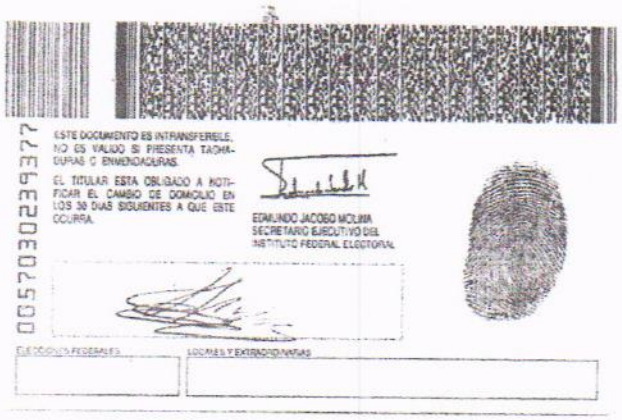

0057030239377

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE, NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
SALGADO
HERNANDEZ
IRINA

EDAD 41
SEXO M

DOMICILIO
C NUEVO LEON 23
COL PROGRESO 39350
ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

FOLIO 0000023346214 AÑO DE REGISTRO 1993 03
CLAVE DE ELECTOR SLHRIR67082312M900
CURP SAHI670823MGRLRR09
ESTADO 12 MUNICIPIO 001
LOCALIDAD 0001 SECCION 0057
EMISIÓN 2009 VIGENCIA HASTA 2019

FIRMA

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. **41066004-016-2023.**
REFERENTE A LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**

000295

AT-4 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS DE LA MISMA COMPLEJIDAD, MAGNITUD Y CARACTERÍSTICAS QUE LOS QUE SE ESTÁN CONVOCANDO MÍNIMA DE TRES AÑOS EFECTIVO **ANEXAR COPIA DE CONTRATOS, ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE CADA OBRA**, CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN EL CASO.

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01
CEL. 744 2354717 / 744 4490912 E-MAIL: [illegible], gno_0301@hotmail.com

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN N°: **41066004-016-2023**	ANEXO TÉCNICO AT-4

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	FIRMA DEL LICITANTE:	FECHA:	
REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.	**IMEXA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.**		**03 de agosto de 2023**	**HOJA:1 DE: 1**

IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL.

CONTRATANTE	OBJETO DE LOS TRABAJOS	NÚMERO DE CONTRATO	LUGAR	IMPORTES EN PESOS DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS			FECHA		ANTECEDENTES DE AFECTACIÓN DE FIANZAS	
				TOTAL	EJERCIDO	POR EJERCER	INICIO	TÉRMINO	SI	NO
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO.	PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE ACCESO A ESCUELA RURAL CAMPESINA	MAJ-FAISM/176-2020/A	POB. EL SALTO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO.	$ 1,099,999.97	$ 1,099,999.97	$ 0.00	23/oct/2020	13/dic/2020		X
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO.	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRIV. SANTA MARIA DEL MAR	MAJ-FAISM/263-2020/A	FRACC. LAS PLAYAS, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	$ 1,999,999.42	$ 1,999,999.42	$ 0.00	31/oct/2020	19/dic/2020		X
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO.	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 10.	MAJ-FAISM/244-2020/A	COL. CUMBRES DE LLANO LARGO, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO	$ 750,000.00	$ 750,000.00	$ 0.00	31/oct/2020	19/dic/2020		X
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO.	PAVIMENTACIÓN DE CALLE UNIVERSIDAD.	MAJ-FAISM/175-2020/A	COL. VALLE DE LAS FLORES, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	$ 1,349,726.65	$ 1,349,726.65	$ 0.00	23/oct/2020	19/dic/2020		X

000296

000297

Currículum vitae

IMEXA
Constructores, S.A. de C.V.

Calle Corregidora # 4, Col. Morelos
C.P. 39530 Acapulco, Gro.
R.F.C.: ICO-091216-UUA
imexa@telmexmail.com

Imexa Constructores, S.A. de C.V.

000298

Misión

"Ofrecer a nuestros clientes propuestas innovadoras y rentables, teniendo como prioridad el bienestar humano, con calidad en todos nuestros procesos de diseño, construcción y mantenimiento."

Visión

Seguir creando espacios que satisfagan las necesidades humanas pensando siempre en las premisas culturales, sociales, económicas, temporales y ecológicas, ser una empresa reconocida por su ética y valores, donde sus colaboradores se desarrollen en un ambiente de respeto, motivándolos día a día para lograr juntos la excelencia en calidad y servicio a nuestros clientes.

IMEXA
Constructores, S.A. de C.V.

Calle Corregidora # 4, Col. Morelos
C.P. 39530 Acapulco, Gro.
R.F.C.: ICO-091216-UUA
imexa@telmexmail.com


000299

imexa constructores sa de cv

Croquis de Localización

Oficina Imexa Constructores S.A. de C.V.

Calle Corregidora No 4, Col. Morelos

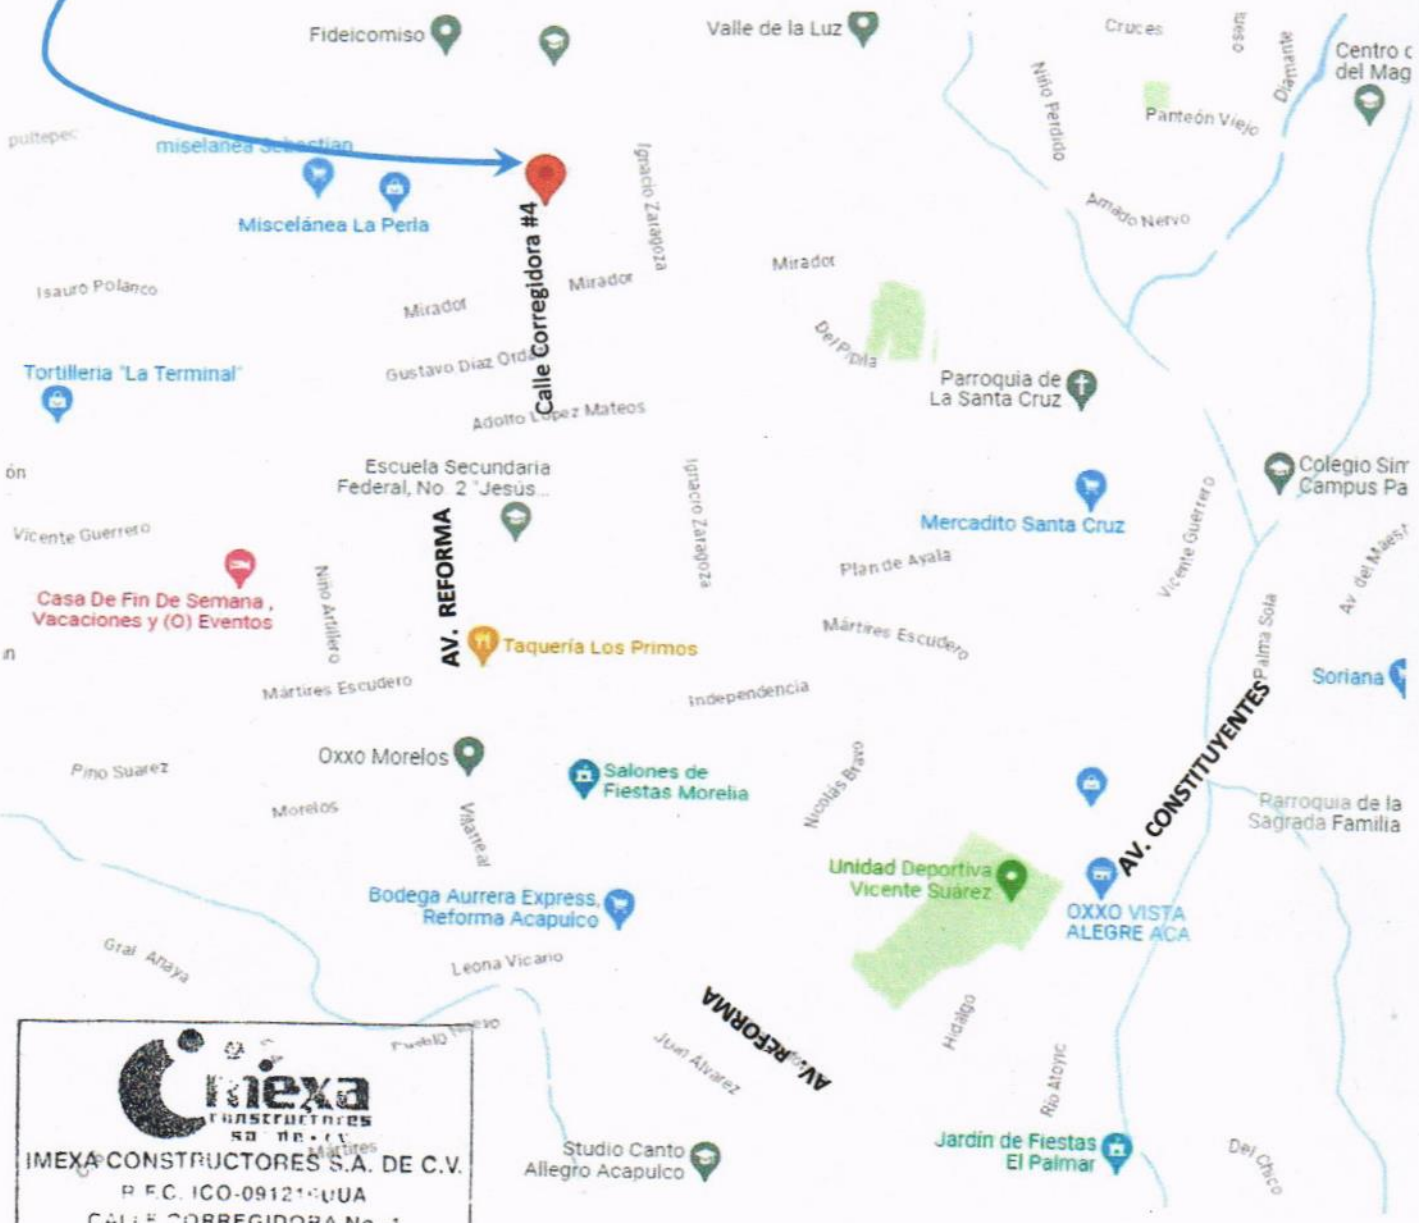


IMEXA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.
R.F.C. ICO-09121[illegible]UA
CALLE CORREGIDORA No. 4
COL. MORELOS C.P. 39530
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
imexa@prodigy.net.mx

Croquis de Macro Localización

Oficina de Imexa Constructores, S.A. de C.V.

IMEXA
Constructores, S.A. de C.V.
Calle Corregidora # 4, Col. Morelos
C.P. 39530 Acapulco, Gro.
R.F.C.: ICO-091216-UUA
imexa@telmexmail.com

000100

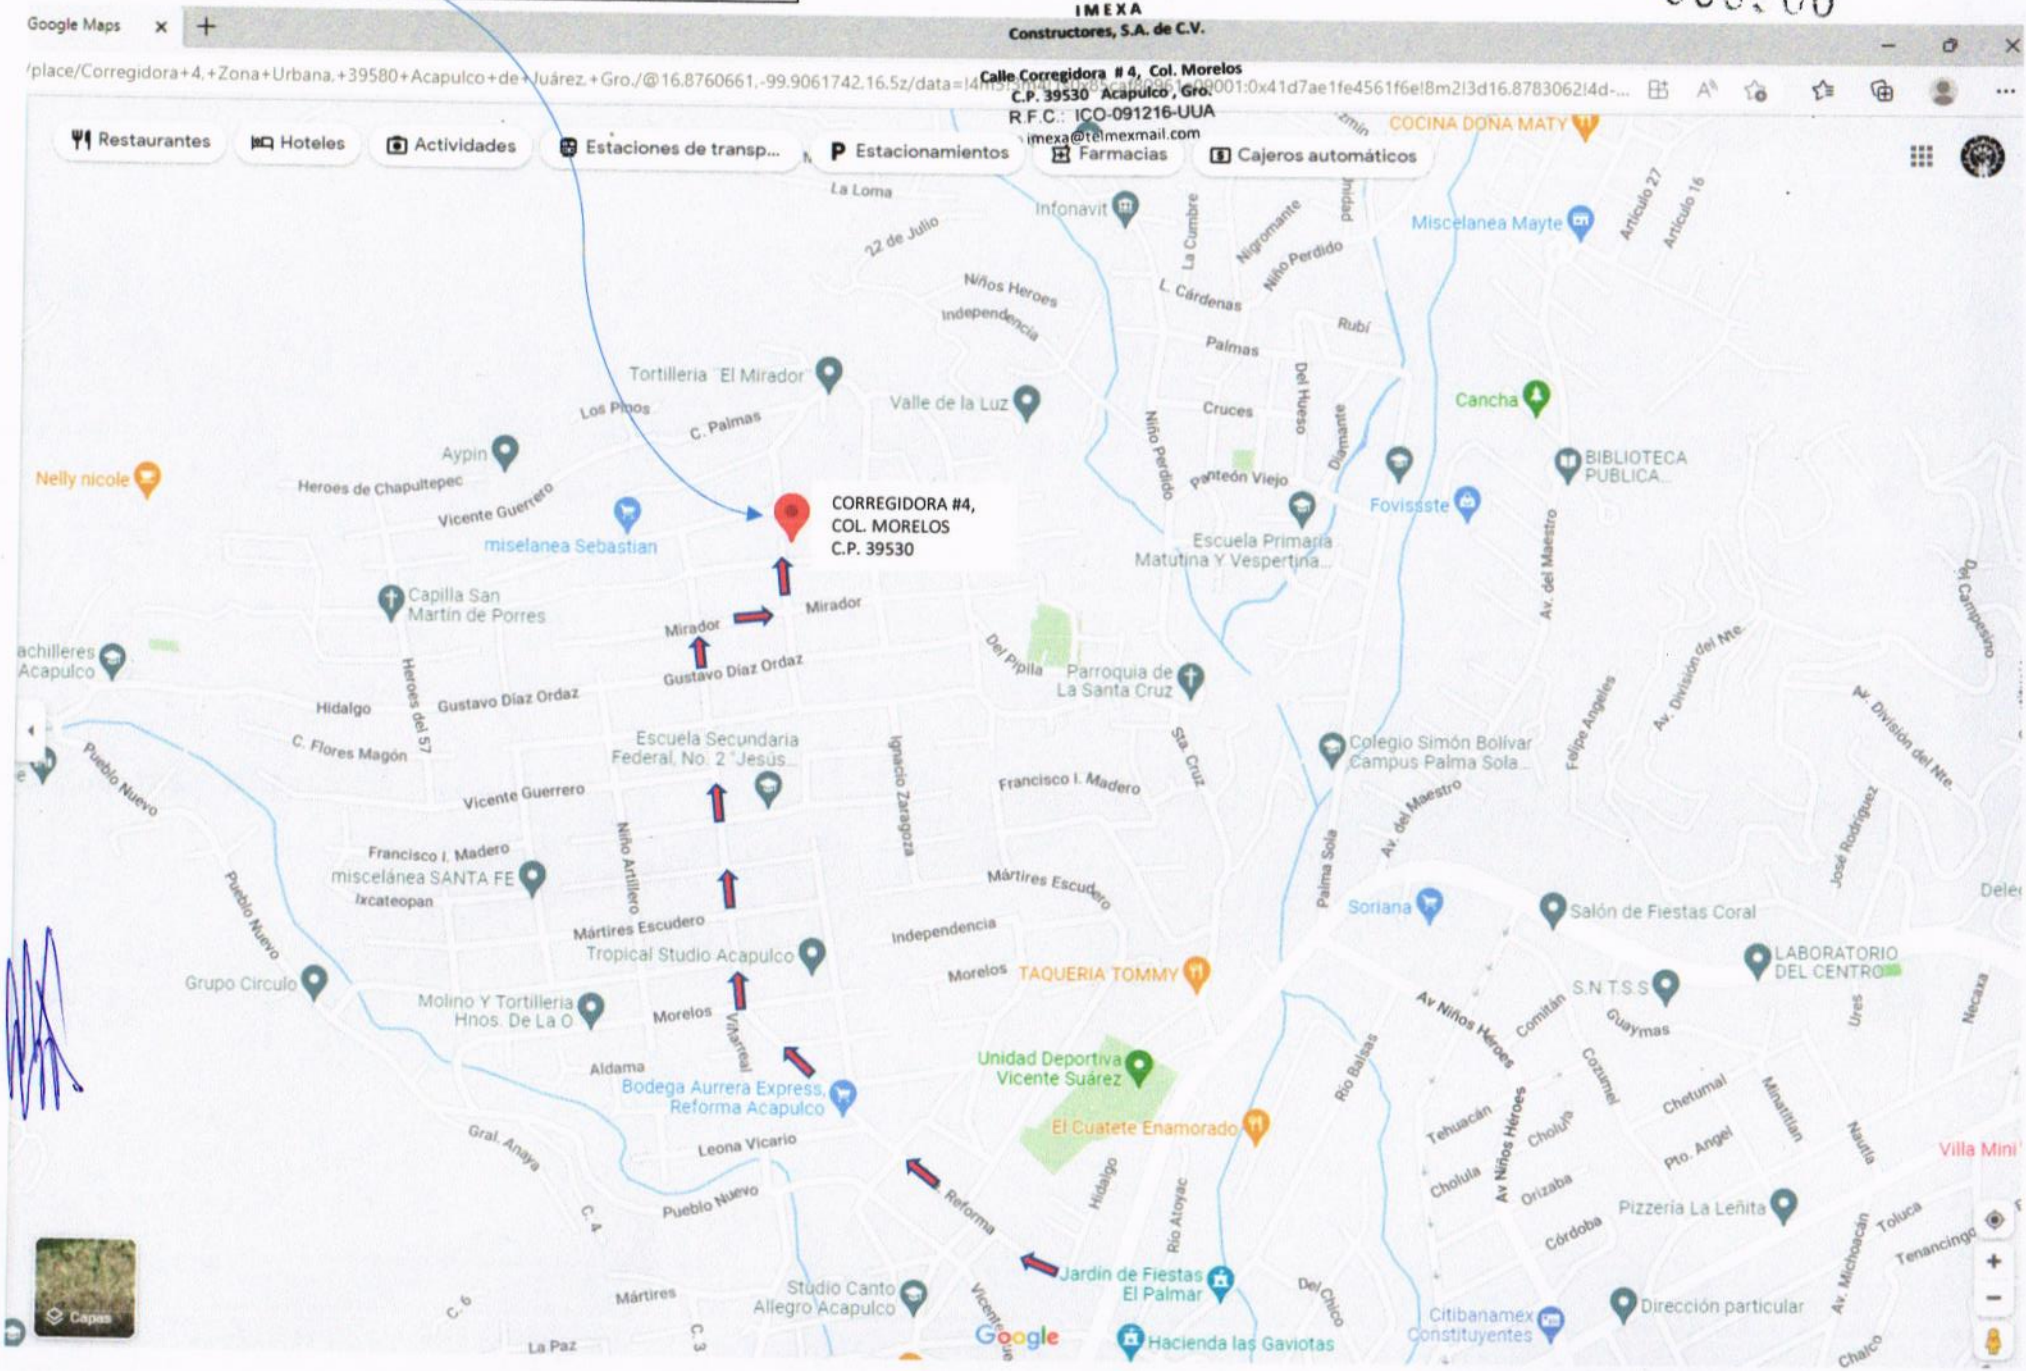

Croquis de Micro Localización
Oficina de Imexa Constructores, S.A. de C.V.

IMEXA
Constructores, S.A. de C.V.

Calle Corregidora # 4, Col. Morelos
C.P. 39530 Acapulco , Gro.

000301



Currículum vitae

PERMISO DE LA S.R.E.: **1202934**

R.F.C.: **ICO – 091216 – UUA**

REGISTRO PATRONAL DEL I.M.S.S.: **B61 59781 10 7**

ADMINISTRADOR UNICO: **ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ**

REPRESENTANTE TECNICO: **ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO**

IMEXA
Constructores, S.A. de C.V.

Calle Corregidora # 4, Col. Morelo
C.P. 39530 Acapulco, Gro
R.F.C. ICO-091216

TELEFONOS.: 74 44 49 09 12, 744 2 354717

Correo.: imexa@telmexmail.com; gno_0301@hotmail.com

MAQUINARIA Y EQUIPO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
01	RETROEXCAVADORA MCA CATERPILLAR MOD. 416 D 4X4
01	CAMION DE VOLTEO DODGE 6.00 M3 1987 MOTOR DIESEL.
02	REVOLVEDORA DE UN SACO MOTOR KHOLER A GASOLINA
01	COMPACTADORA A GASOLINA (BAILARINA)
02	VIBRADOR PARA CONCRETO A GASOLINA.
01	PLANTA ELECTRICA PARA SOLDAR.
02	BOMBA ELECTRICA Y A GASOLINA
01	RODILLO COMPACTADOR MARCA CIPSA MOD. 2006

IMEXA
Constructores, S.A. de C.V.

Calle Corregidora # 4, Col. Morelos
C.P. 39530 Acapulco, Gro.
R.F.C.: ICO-091216-UUA
imexa@telmexmail.com

RELACION DE CONTRATOS DE OBRA

2010 **SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE GUERRERO**

"CENTRO DE INTERPRETACION AMBIENTAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO", UBICADA EN EL CERRO EL MOGOTE, INTERIOR DEL PARQUE PAPAGAYO, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
CONTRATO No. SEMAREN-AD-003-2010
IMPORTE CONTRATO: $ 970, 423.40
IMPORTE CONVENIO ADICIONAL: $ 318, 988.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO
CONTRATO No. SDUOP-FAFEF-AD-041-2010
IMPORTE CONTRATO $ 487, 394.96
UBICACIÓN: COL.INFONAVIT, ALTA PROGRESO,
MPIO. DE ACAPULCO, GRO.

REMODELACION E IMAGEN URBANA DEL ENTORNO Y PLAZOLETA EN EL BARRIO DE LA "POCITA" POR LA CALLE "LERDO DE TEJADA" Y BARRIO DE LA "GUINEA"
CONTRATO No. SDUOP-FAFEF-AD-160-2010
IMPORTE CONTRATO $ 487, 394.96
UBICACIÓN: BARRIO DE LA POCITA, ACAPULCO,
MPIO. DE ACAPULCO, GRO.

HABILITACION COMO PARQUE RECREATIVO EL ANDADOR QUE COMUNICA LAS CALLES "HILARIO MALPICA" Y "NIÑOS HEROES DE VERACRUZ".
CONTRATO NO. SDUOP-FAFEF-AD-161-2010
IMPORTE CONTRATO $ 487, 394.96
UBICACIÓN: COL. COSTA AZUL, ACAPULCO,
MPIO. DE ACAPULCO, GRO.

IMEXA
Constructores, S.A. de C.V.
Calle Corregidora # 4, Col. Morelos
C.P. 39530 Acapulco, Gro.
R.F.C.: ICO-091216-UUA
imexa@telmexmail.com

ADAPTACIÓN DE AREAS VERDES COMO PARQUE INFANTIL EN LA ETAPA 44 DEL "COLOSO".
CONTRATO No. SDUOP-FAFEF-AD-167-2010
IMPORTE CONTRATO $ 487, 394.96
UBICACIÓN: COL. EL COLOSO, ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO, GRO.

CONTRATOS DE OBRA PRIVADA

2011

CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE 4 DEPARTAMENTOS
PROPIETARIO: SRA. ROSA ISELA VALVERDE QUEVEDO.
CONTRATO No. IMEX-003-2011
IMPORTE CONTRATO $ 2,396, 000.00
UBICACION: CALLE ZACATECAS #14, COL. PROGRESO,
MPIO. DE ACAPULCO, GRO.

REMODELACION DE CASA HABITACION
PROPIETARIO: SR. ISIDORO CARBAJAL
IMPORTE CONTRATO $ 389, 408.25
CONTRATO No. IMEX-005-2011
UBICACION: AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS #1385,
FRACC. LAS PLAYAS, MPIO. DE ACAPULCO, GRO

2012

CONSTRUCCION DE CASA HABITACION
PROPIETARIO: SR. FREDY MARTINEZ ARROYO
IMPORTE CONTRATO $ 1,123, 466.00
CONTRATO No. IMEX-004-2011
UBICACION: CALLE CORREGIDORA #2235,
COL. EL MIRADOR, MPIO. DE ACAPULCO, GRO

2013

CONSTRUCCION DE CASA HABITACION
CONTRATO No. IMEX-005-2013
IMPORTE CONTRATO $ 853, 564.00
UBICACIÓN: CALLE REFORMA,
COL. MORELOS EN ACAPULCO, GRO

IMEXA
Constructores, S.A. de C.V.

Calle Corregidora # 4, Col. Morelos
C.P. 39530 Acapulco, Gro.
R.F.C.: ICO-091216-UUA
imexa@telmexmail.com

CONTRATOS C.F.E.

2014 **SERVICIO DE INSTALACION DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE SERVICIO MONOFASICO EN BAJA TENSION EN TABLERO DE MEDICION.**
CONTRATO No. 800691625
IMPORTE CONTRATO $ 150, 000.00
UBICACIÓN: UNIDAD HAB COLOSO,
MPIO. DE ACAPULCO, GRO

SERVICIO DE INSTALACION DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE SERVICIO MONOFASICO EN BAJA TENSION EN TABLERO DE MEDICION.
CONTRATO No. 800698203
IMPORTE CONTRATO $ 149, 000.00
UBICACIÓN: COLONIA PROGRESO,
MPIO. DE ACAPULCO, GRO

2015 **GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO**
SECRETARIA DE CULTURA

CONTRATO DE SERVICIOS PARA:

CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA A BASE DE MADERA DE PINO DE 16.00 X 12.00 X 6.00 MT. DE SECCION, ASI COMO ELABORACION DE TEJIDO EN FORMA DE CAPULLO EN INTERIOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE SECCION SIMILAR A LA MISMA UBICADA DENTRO DE LA GRAN GALERIA DEL CENTRO CULTURAL ACAPULCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. **(EXPOSICION PRESENTADA "INEFABLE" POR EL ESCULTOR JORGE ALFARO)**

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL ÁREA, PARA EL PROYECTO DENOMINADO **"ROSA DE LOS VIENTOS"** EN EL POLIDEPORTIVO DE CD. RENACIMIENTO, ACAPULCO, DENTRO DEL PROGRAMA DE MÉXICO CULTURA PARA LA ARMONÍA.

IMEXA
Constructores, S.A. de C.V.

Calle Corregidora # 4, Col. Morelos
C.P. 39530 Acapulco, Gro.
R.F.C.: ICO-091216-UUA
imexa@telmexmail.com

2016 **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN ANDADOR 3
CONTRATO No. MAJ-FISM/238-2016/AD
IMPORTE CONTRATO $ 500,000.00
UBICACIÓN: COL. VILLA GUERRERO, ACAPULCO.

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANGOS
CONTRATO No. MAJ-FISM/268-2016/AD
IMPORTE CONTRATO $ 733,284.15
UBICACIÓN: COL. ANTORCHA REVOLUCIONARIA, ACAPULCO.

CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESC, PRIM. "VICENTE GUERRERO"
CONTRATO No. MAJ-FISM/326-2016/AD
IMPORTE CONTRATO $ 500,000.00
UBICACIÓN: POB. EL CERRITO

MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD
CONTRATO No. MAJ-FISM/530-2016/AD
IMPORTE CONTRATO $ 184,865.36
UBICACIÓN: POB. EL VELADERO

IMEXA
Constructores, S.A. de C.V.
Calle Corregidora # 4, Col. Morelos
C.P. 39530 Acapulco, Gro.
R.F.C.: ICO-091216-UUA
imexa@telmexmail.com

CONTRATOS DE OBRA PRIVADA

2017 **DEMOLICION DE VILLAS Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA.**
PROPIETARIO: PARQUE RESIDENCIAL EL SOL (EX CASA LUIS MIGUEL)
CONTRATO No. IMEX-006-2017
IMPORTE CONTRATO $ 450, 000.00
UBICACION: CARRETERA BARRA VIEJA, POB. BONFIL
MPIO. DE ACAPULCO, GRO.

2017 **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DEL CHORRITO
CONTRATO No. MAJ-FISM/130-2017/AD
IMPORTE CONTRATO $ 750,000.00
UBICACIÓN: COL. LOMA LARGA, ACAPULCO.

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
CONTRATO No. MAJ-FISM/135-2017/AD
IMPORTE CONTRATO $ 750,000.00
UBICACIÓN: COL. MIGUEL DE LA MADRID, ACAPULCO.

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AMISTAD
CONTRATO No. MAJ-FISM/136-2017/AD
IMPORTE CONTRATO $ 750,000.00
UBICACIÓN: COL. BOSQUES DE LA CAÑADA, ACAPULCO.

2017 **SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

CONSTRUCCION DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION DE ANDADOR CERRADA DE ZARAGOZA
CONTRATO No. SDUOPOT-IF-AD-1083-2017
IMPORTE CONTRATO $ 974,106.62 C/I.V.A.
UBICACIÓN: COL. CENTRO, ACAPULCO, GRO.

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION EN AV. DEL TANQUE.
CONTRATO No. SDUOPOT-IF-AD-1086-2017
IMPORTE CONTRATO $ 703,196.90 C/I.V.A.
UBICACIÓN: COL. 13 DE JUNIO, ACAPULCO, GRO.

IMEXA
Constructores, S.A. de C.V.
Calle Corregidora # 4, Col. Morelos
C.P. 39530 Acapulco, Gro.
R.F.C.: ICO-091216-UUA
imexa@telmexmail.com

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y PAVIMENTACION EN ANDADOR PLAN DE AYALA.
CONTRATO No. SDUOPOT-IF-AD-1090-2017
IMPORTE CONTRATO $ 1,254,368.19 C/I.V.A.
UBICACIÓN: COL. CHINAMECA, ACAPULCO, GRO.

CONSTRUCCION DE MUROS DE PROTECCION EN TELESECUNDARIA UNIDAD CIUDADANA, CLAVE: 2DTV0987N, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO.
CONTRATO No. SDUOPOT-IF-INV-1166-2017
IMPORTE CONTRATO $ 2,940,011.05 C/I.V.A.
UBICACIÓN: COL. UNIDAD CIUDADANA, ACAPULCO, GRO

INTRODUCCION DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION DE CALLE ALTAMIRANO, COL. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO.
CONTRATO No. SDUOPOT-IF-AD-1326-2017
IMPORTE CONTRATO $ 1,753,589.365 C/I.V.A.
UBICACIÓN: COL. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, ACAPULCO, GRO

2018 **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INSURGENTES
CONTRATO No. MAJ-FISM/110-2018/AD
IMPORTE CONTRATO $ 800,000.00
UBICACIÓN: COL. C.N.C., ACAPULCO.

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESC. TELESECUNDARIA UNIDAD CIUDADANA
CONTRATO No. MAJ-FISM/108-2018/AD
IMPORTE CONTRATO $ 800,000.00
UBICACIÓN: COL. UNIDAD CIUDADANA.

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO
CONTRATO No. MAJ-FISM/512-2018/AD
IMPORTE CONTRATO $ 1,083,654.09
UBICACIÓN: COL. AMPLIACION SAN ISIDRO, ACAPULCO

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR LAS TORRES
CONTRATO No. MAJ-FISM/511-2018/AD
IMPORTE CONTRATO $ 433,384.27
UBICACIÓN: COL. PASO LIMONERO, ACAPULCO

IMEXA
Constructores, S.A. de C.V.
Calle Corregidora # 4, Col. Morelos
C.P. 39530 Acapulco, Gro.
R.F.C.: ICO-091216-UUA
imexa@telmexmail.com

2018 **SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

CONSTRUCCION DE RED DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION EN CALLE MIMOSA EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
CONTRATO No. SDUOPOT-IF-AD-198-2018
IMPORTE CONTRATO $ 1,236,840.09
UBICACIÓN: COL. JARDIN, ACAPULCO

CONSTRUCCION DE ANDADOR CERRADA TROPICAL, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
CONTRATO No. SDUOPOT-IF-AD-198-2018
IMPORTE CONTRATO $ 1,236,840.09
UBICACIÓN: FRACC. LAS PLAYAS, ACAPULCO

CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL PARA LA CONEXIÓN DEL ANDADOR MANUEL AVILA CAMACHO Y JULIAN BLANCO, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
CONTRATO No. SDUOPOT-IF-AD-201-2018
IMPORTE CONTRATO $ 1,229,546.31
UBICACIÓN: COL. 20 DE NOVIEMBRE

CONSTRUCCION DE ANDADOR SIN NOMBRE ESQ. AV DEL TANQUE, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
CONTRATO No. SDUOPOT-IF-AD-160-2018
IMPORTE CONTRATO $ 547,362.71
UBICACIÓN: COL. 13 DE JUNIO, ACAPULCO

CONSTRUCCION DE CANCHA DE UTBOL RAPIDO EN TELESECUNDARIA UNIDAD CIUDADANA, CLAVE 12DTV0987, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
CONTRATO No. SDUOPOT-IF-INV-276-2018
IMPORTE CONTRATO $ 1,699,969.26
UBICACIÓN: COL. UNIDAD CIUDADANA, ACAPULCO

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION MEMBRILLO, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
CONTRATO No. SDUOPOT-IF-INV-273-2018
IMPORTE CONTRATO $2, 569,778.16
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS, ACAPULCO

IMEXA
Constructores, S.A. de C.V.
Calle Corregidora # 4, Col. More
C.P. 39530 Acapulco, Gro.
R.F.C.: ICO-091216-UUA
imexa@telmexmail.com

2019 **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. UNIVERSIDAD
CONTRATO No. MAJ-FISM/085-2019/AD
IMPORTE CONTRATO $ 710,003.52
UBICACIÓN: COL. VALLE DE AS LORES

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. LINDA VISTA
CONTRATO No. MAJ-FISM/084-2019/AD
IMPORTE CONTRATO $ 1,448,102.22
UBICACIÓN: COL. LINDA VISTA

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA TELESECUNDARIA
CONTRATO No. MAJ-FISM/571-2019/AD
IMPORTE CONTRATO $ 1,000,000.00
UBICACIÓN: POB. APANHUAC

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. LINDA VISTA
CONTRATO No. MAJ-FISM/084-2019/AD
IMPORTE CONTRATO $ 1,448,102.22
UBICACIÓN: COL. LINDA VISTA

2020 **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

PAVIMENTACION DE CALLE PRIV. SANTA MARIA DEL MAR
CONTRATO No. MAJ-FISM/263-2020/AD
IMPORTE CONTRATO $ 1,999,999.42
UBICACIÓN: FRACC. LAS PLAYAS

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. SEC. FEDERAL No 2"JESUS MASTACHE ROMAN"
CONTRATO No. MAJ-FISM/262-2020/AD
IMPORTE CONTRATO $ 2,000,000.00
UBICACIÓN: FRACC. LAS PLAYAS

PAVIMENTACION DE CALLE UNIVERSIDAD
CONTRATO No. MAJ-FISM/175-2020/AD
IMPORTE CONTRATO $ 1,349,726.65
UBICACIÓN: COL. VILLA DE LAS FLORES

PAVIMENTACION DE CALLE 10
CONTRATO No. MAJ-FISM/244-2020/AD
IMPORTE CONTRATO $ 750,000.00
UBICACIÓN: COL. CUMBRES DE LLANO LARGO

IMEXA
Constructores, S.A. de C.V.
Calle Corregidora # 4, Col. Morelos
C.P. 39530 Acapulco, Gro.
R.F.C.: ICO-091216-UUA
imexa@telmexmail.com

2021 **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

AMPLIACION DE TECHADO EN ESC. SEC. FED. No. 2 "JESUS MASTACHE ROMAN"
CONTRATO No. MAJ-FISM/290-2021/AD
IMPORTE CONTRATO $ 1,694,998.94
UBICACIÓN: COL. MORELOS

AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRIV. SANTA MARIA DEL MAR
CONTRATO No. MAJ-FISM/291-2021/AD
IMPORTE CONTRATO $ 634,000.00
UBICACIÓN: FRACC. LAS PLAYAS

AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CALLE CERRADA DE MONTE ALBAN
CONTRATO No. MAJ-FISM/293-2021/AD
IMPORTE CONTRATO $ 1,135,000.00
UBICACIÓN: FRACC. HORNOS INSURGENTES

2022 **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA
CONTRATO No. MAJ-FISM/242-2022/AD
IMPORTE CONTRATO $ 600,000.00
UBICACIÓN: COL. HERMENEGILDO GALEANA

IMEXA
Constructores, S.A. de C.V.

Calle Corregidora # 4, Col. Morelos
C.P. 39530 Acapulco, Gro.
R.F.C.: ICO-091216-UUA
imexa@telmexmail.com

000313

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CIRUELOS
CONTRATO No. MAJ-FISM/243-2022/AD
IMPORTE CONTRATO $ 800,000.00
UBICACIÓN: COL. SAN ISIDRO

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR 2
CONTRATO No. MAJ-FISM/247-2022/AD
IMPORTE CONTRATO $ 600,000.00
UBICACIÓN: COL. ALIANZA POPULAR

AMPLIACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO
CONTRATO No. MAJ-FISM/038-2022/AD
IMPORTE CONTRATO $ 447,011.13
UBICACIÓN: POB. EL SALTO

ATENTAMENTE

IMEXA
Constructores, S.A. de C.V.

Calle Corregidora # 4, Col. Mor
C.P. 39530 Acapulco, Gro
R.F.C.: ICO-0

ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR UNICO

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01
CEL. 744 4490912/744 2354717 E-MAIL: imexa@telmexmail.com, gno_0301@hotmail.com

ORGANIGRAMA



IMEXA
Constructores, S.A. de C.V.

Calle Corregidora # 4, Col. Morelos
C.P. 39530 Acapulco, Gro.
R.F.C.: ICO-091216-UUA
imexa@telmexmail.com

000315


MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
SALGADO
HERNANDEZ
IRINA

SEXO M

DOMICILIO
C NUEVO LEON 23
COL PROGRESO 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE DE ELECTOR SLHRIR67082312M900
CURP SAHI670823MGRLRR09
AÑO DE REGISTRO 1993 06
FECHA DE NACIMIENTO 23/08/1967
SECCIÓN 0057
VIGENCIA 2023 - 2033


INE

IDMEX2412998667<<0057054805632
6708238M3312315MEX<06<<00253<9
SALGADO<HERNANDEZ<<IRINA<<<<<<

IMEXA
Constructores, S.A. de C.V.

Calle Corregidora # 4, Col. Morelos
C.P. 39530 Acapulco, Gro.
R.F.C.: ICO-091216-UUA
imexa@telmexmail.com

CURRICULUM VITAE

Irina Salgado Hernández
Nuevo León #23
Colonia Progreso
Acapulco, Guerrero.
México.

000316

Teléfono particular: 744 4 86 16 41
Celular: 7441 21 97 43
Email: irisahe@hotmail.com

PERSONAL

Fecha de nacimiento: 23 de agosto de 1967.
Lugar de nacimiento: Acapulco, Gro., México.
Estado civil: Soltera
R.F.C.: SAHI-670823-SN0
CURP: SAHI670823MGRLRR09

ESTUDIOS

1982-1985 Preparatoria: Colegio América A.C.
1985-1990 Profesional: Universidad Autónoma de Guadalajara. Ingeniería en Computación. **Cédula profesional. 2026307**
1994-1996 Maestría en Estadística aplicada. Universidad Autónoma de Guerrero. (77%) de créditos.
Marzo – diciembre de 1999 Diplomado en Docencia universitaria. Universidad Loyola del Pacífico A.C.
2001-2002 Estudiante de la Maestría en Docencia Universitaria, habiendo cursado tres semestres. Universidad Iberoamericana Golfo Centro en las instalaciones de la ULP.
2003. Curso de 44. hrs. Modelo de Lenguaje Unificado, Modelo de Proceso Unificado, Power Designer y Power Builder. ULP.
2003. Curso de 40 hrs. Administración de Domino Lotus Notes. Training Center de Lotus Notes. México, DF.
Septiembre 2012-2013 Maestría en Estadística Aplicada. Universidad Autónoma de Guerrero. CRÉDITOS COMPLETOS, pendiente de titulación.

DESARROLLO PROFESIONAL:

- Septiembre de 1990 – Agosto de 1991.
Investigador tecnológico en el Centro Universitario de Procesamiento Electrónico de Datos(CUPED). Universidad Autónoma de Guadalajara.
Desarrollo de programas tutoriales (auto aprendizaje).

- Agosto de 1991- Septiembre 1992.
Profesor de asignatura en el Instituto tecnológico de Acapulco.

- Enero de 1991- Diciembre de 1994.
Venta de equipo de cómputo, asesoría y cursos.

000317

- Agosto de 1993- al 2001.
Profesor de asignatura en la Universidad Loyola del Pacífico.

- Agosto de 2001 a diciembre del 2008.
Profesor de medio tiempo en la Universidad Loyola del Pacífico.
Materias impartidas:
Teoría de la probabilidad
Probabilidad y estadística
Estadística inferencial
Álgebra
Cálculo
Matemáticas discretas
Diseño lógico I (sistemas digitales I)
Diseño lógico II (sistemas digitales II)
Introducción al razonamiento lógico
Investigación de operaciones
Metodología de la investigación
Teoría general de sistemas

Asesorías de tesis: en las licenciaturas: Administración de empresas, contaduría pública, Diseño gráfico, Ing. Industrial, Lic. En sistemas computacionales e informática.

Sinodal de exámenes profesionales: Enero 1994 a diciembre de 2008

- Enero de 2004 a diciembre de 2008
Analista y desarrollador de sistemas en Python, PostgreSQL y herramienta de desarrollo PowerBuilder.

- Mayo de 2005 - 2010
Asesor financiero. INBURSA

- Enero de 2008 a agosto de 2017
Diseño curricular, asesoría e impartición de cursos y consultoría en Arribant Capacitación Integral S.A. de C.V.

Diseño de los siguientes cursos e impartición de algunos de ellos:

Desarrollo humano y calidad de vida
Calidad en el servicio
Integración de equipos de trabajo
Motivación y asertividad
Comunicación efectiva

Técnicas de negociación
Administración del tiempo
Liderazgo
Planeación estratégica
Ética ecológica
Diplomado en administración de hospitales
Diplomado en constructivismo educativo

000318

- Enero 2009
Taller de "fundamentos de comportamiento organizacional"

- Febrero 2009 – Mayo 2009
Impartición de Seminario de investigación supervisada.

- Mayo de 2009
Impartición de los módulos de "Auditorias en sistemas de calidad" y "Elaboración de documentos" en el diplomado de IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN POR CALIDAD TOTAL ISO 9001-2000, SEMARNAT (Acapulco, Gro.)

- Julio del 2009
Diseño e impartición del "Curso de Sistemas de información logística (SIL). ERP (planificación de recursos empresariales), CRM (gestión de relaciones con clientes) , SCM (administración de redes de suministro)."

- Agosto del 2011- Febrero del 2012
Elaboración de perfiles y cédulas de puesto para el Instituto Mexicano del Transporte (IMT) basados en competencias (y su diccionario de competencias laborales) en San Fandila, Qro.

- Septiembre a Diciembre del 2016
Elaboración de diagnósticos participativos en materia de percepción de violencia y delincuencia. Municipio de San Luis de la Paz, Gto. (Polígono Misión de Chichimecas)

Cursos de perspectiva y violencia de género que he cursado y/o en los que he participado en diseño, impartición o co-impartición de algunos de ellos:

- CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. (Éste curso fue impartido bajo la norma 217, avalado por la SEP y EL CONOCER y diseñado bajo la norma 301).

* El impacto de la violencia en la salud mental de las mujeres

* Plan de intervención psicológica especializada para mujeres en situación de violencia

* Importancia del plan de seguridad para mujeres en situación de violencia

*Perspectiva de género

000319

*Género y sexualidad

- 2000 a la fecha
Asesoría en protocolos de investigación y análisis estadístico con SPSS
- Diseño de instrumentos de recolección, Muestreo y levantamiento de datos.
- Estimaciones y pruebas de hipótesis
- Prueba χ^2 (estudios epidemiológicos)
- Diseño de experimentos
- Análisis predictivo
    Regresión lineal simple y multivariada
    Regresión logística
    Series de tiempo

- 2008 a la fecha
Asesoría en:
- Sistemas de gestión de la calidad bajo la norma ISO 9001:2000
- Sistemas de información logística (SIL) y ERP (planificación de recursos empresariales)

2010 a la fecha
Socia Fundadora y Representante Legal de Imexa Constructores S.A. de C.V. (estando al frente aplicando mis conocimientos de planificación, estadística y control de calidad en todos los procesos de obra).

Atentamente

Ing. Irina Salgado Hernández

000320



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
SALGADO
HERNANDEZ
IRINA

SEXO M


DOMICILIO
C NUEVO LEON 23
COL PROGRESO 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE DE ELECTOR SLHRIR67082312M900
CURP
SAHI670823MGRLRR09
AÑO DE REGISTRO
1993 06
FECHA DE NACIMIENTO
23/08/1967
SECCIÓN
0057
VIGENCIA
2023 - 2033



INE

IDMEX241299867<<0057054805632
6708238M3312315MEX<06<<00253<9
SALGADO<HERNANDEZ<<IRINA<<<<<<

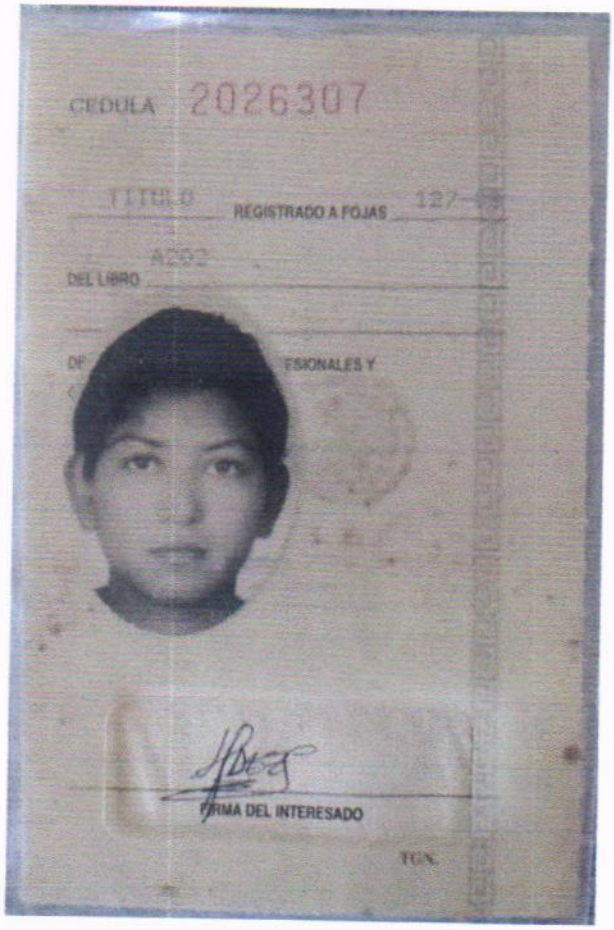

CEDULA 2026307


TITULO REGISTRADO A FOJAS 127-

DEL LIBRO A202

DE ESIONALES Y

FIRMA DEL INTERESADO

TGN

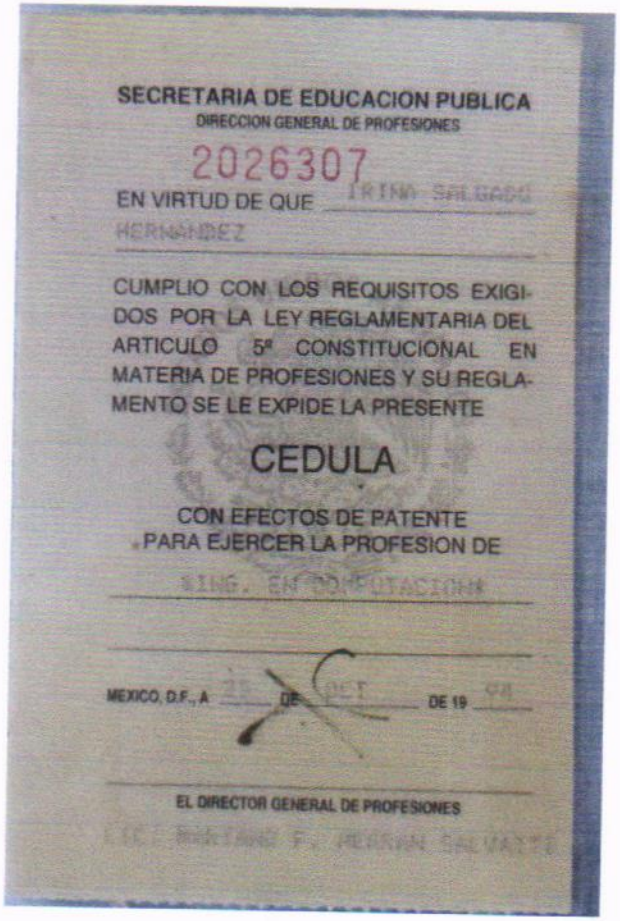

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES

2026307

EN VIRTUD DE QUE IRINA SALGADO HERNANDEZ

CUMPLIO CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 5º CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE PROFESIONES Y SU REGLAMENTO SE LE EXPIDE LA PRESENTE

CEDULA

CON EFECTOS DE PATENTE PARA EJERCER LA PROFESION DE

ING. EN COMPUTACION

MEXICO, D.F., A 28 DE OCT DE 19 94

EL DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

LIC. GUSTAVO FCO. MEDRAN SALVATTI

[redacted]

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

HACIENDA | SAT

SAHI670823SN0
Registro Federal de Contribuyentes

IRINA SALGADO HERNANDEZ
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 17110242361
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
ACAPULCO DE JUAREZ , GUERRERO A 29 DE JULIO DE 2023

SAHI670823SN0

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:	SAHI670823SN0
CURP:	SAHI670823MGRLRR09
Nombre (s):	IRINA
Primer Apellido:	SALGADO
Segundo Apellido:	HERNANDEZ
Fecha inicio de operaciones:	15 DE SEPTIEMBRE DE 1993
Estatus en el padrón:	REACTIVADO
Fecha de último cambio de estado:	15 DE NOVIEMBRE DE 2017
Nombre Comercial:	

Datos del domicilio registrado

Código Postal:39300

Nombre de Vialidad: JUAREZ

Número Interior:

Nombre de la Localidad: ACAPULCO

Nombre de la Entidad Federativa: GUERRERO

Tipo de Vialidad: CALLE

Número Exterior: 7

Nombre de la Colonia: ACAPULCO DE JUAREZ CENTRO

Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: ACAPULCO DE JUAREZ

Entre Calle: CALLE IGNACIO RAMIREZ

HACIENDA | SAT

Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

[redacted]

Y Calle: CALLE JOSE MARIA IGLESIAS

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Restaurantes de autoservicio	100	15/11/2017	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	01/01/2022	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/01/2022	
Pago provisional mensual de ISR por actividades empresariales. Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/01/2022	
Declaración anual de ISR. Personas Físicas.	A más tardar el 30 de abril del ejercicio siguiente.	01/01/2022	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/01/2022	

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección http://sat.gob.mx

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúnciala! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través de: www.sat.gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: (55) 8852 2222, desde el extranjero: + 55 8852 2222, SAT móvil o www.gob.mx/sfp".

Cadena Original Sello:
||2023/07/29|SAHI670823SN0|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888880000000031||

Sello Digital:
Gz0mYgF47olwgzz6JmR4t3X78kkSgMx+KPAaNZmrAQVIRdeOza6LrOVsrdDqsp6gSaAWKX3KlbVB3zODVV2
uz4q17SQhKc14q1vdOrMGKI+SyCNvrP3jWWbqUqF0v16luIO4UF++h2phwMjyHkMM0q6wR/VD6X3WmbRlUBs
1Mil=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

[redacted]



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

CONTRATO N°. MAJ-FAISM/176-2020/AD

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO **MAJ-FAISM/176-2020/AD,** RELATIVO A LA OBRA: **PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE ACCESO A ESCUELA RURAL CAMPESINA**, UBICADA EN **POB. EL SALTO,** EN ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, **LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO**, A QUIEN SE DENOMINARÁ **"LA SECRETARÍA", REPRESENTADA POR EL ING. ARQ. ARMANDO JAVIER SALINAS,** EN SU CARÁCTER DE **SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS**, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. Y POR LA OTRA **IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.** REPRESENTADA POR EL C. **IRINA SALGADO HERNANDEZ, CON NÚMERO DE REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS 2848,** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL** A QUIEN SE DENOMINARÁ **"EL CONTRATISTA"** DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

I.- DECLARA "LA SECRETARÍA" MEDIANTE SUS REPRESENTANTES.

1.- QUE EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR EL **ARTÍCULO 115, FRACCIONES I, II y III A), D), E), F), G), H), I), Y IV B), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS** Y ARTICULO 3 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO, ES UN MUNICIPIO GOBERNADO POR UN AYUNTAMIENTO DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA, INVESTIDO DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CON LIBRE ADMINISTRACIÓN DE SU HACIENDA RECURSOS Y SERVICIOS DESTINADOS A LA COMUNIDAD, SIN MÁS LÍMITES QUE LOS SEÑALADOS EXPRESAMENTE EN LAS LEYES APLICABLES.

1.1.- **QUE CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 170 NUMERAL 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO**; 26, 29, 30, 31 DEL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO, Y; 2 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, EL AYUNTAMIENTO ES EL ÓRGANO DE GOBIERNO A CUYA DECISIÓN SE SOMETEN LOS ASUNTOS DE LA VIDA PÚBLICA MUNICIPAL Y LOS DE SU PROPIA ADMINISTRACIÓN QUE LAS LEYES PREVÉN, ASÍ COMO LA DE EJERCER VIGILANCIA DIRECTA DE LOS ACTOS DE SUS MIEMBROS EN TODO MOMENTO, CUYAS FACULTADES DE EJECUCIÓN ESTÁN DEPOSITADAS EN EL PRESIDENTE MUNICIPAL.

1.2.- QUE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, EN EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 29 FRACCIONES I, V, Y VII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO EN VIGOR, TUVO A BIEN DESIGNAR COMO **SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS AL ING. ARQ. ARMANDO JAVIER SALINAS,** Y POR ENDE, LA FACULTAD Y REPRESENTACIÓN LEGAL PARA CELEBRAR CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SUS SERVICIOS A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 72 Y 73 FRACCIONES IX Y X DE LA LEY ORGÁNICA INVOCADA EN RELACIÓN CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO **27 FRACCIONES XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXVIII, Y 28 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA**

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Roberto Posada y Comonfort S/N Col. Centro, Acapulco, Gro., C.P. 39300
Tel (744) 440 70 00 Ext. 4223 y 4227
www.acapulco.gob.mx

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. EN VIRTUD DE QUE **"LA SECRETARÍA"**, ES LA ENTIDAD MUNICIPAL ENCARGADA DE ORDENAR LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS, REGULAR EL DESARROLLO URBANO, ASÍ COMO CONDUCIR, NORMAR, PROYECTAR Y EJECUTAR LAS OBRAS PÚBLICAS, INSERTAS EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES EN LA MATERIA.

1.3.- SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, EL UBICADO EN LA AV. CUAUHTÉMOC S/N INTERIOR PARQUE PAPAGAYO, COL. HORNOS INSURGENTES, ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. C. P. 39350.

1.4.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SE AUTORIZÓ LA INVERSIÓN MEDIANTE EL **RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2020. AUTORIZADO MEDIANTE EL OFICIO SEPLADE/354/2020, DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020.** CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE A SU VEZ SE HAYA INCLUIDO EN EL PROGRAMA DE OBRAS PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2020.

1.5.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICÓ A **"EL CONTRATISTA"** PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS A QUE SE DESTINA LA INVERSIÓN AUTORIZADA QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACIÓN 1.4, A TRAVÉS DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA**, TAL COMO LO SEÑALA LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 EN EL ARTÍCULO 39 FRACCIÓN III.

2. "EL CONTRATISTA" DECLARA:

2.1.- ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO **1585 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2009,** OTORGADA ANTE LA FE DEL **LIC. SHUNASHI ALTAMIRANO PINEDA CORREDOR PUBLICO NO. 5 EN EL ESTADO DE GUERRERO, ACAPULCO, GRO.** CON REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO **10160 * 17 DE FECHA 17 DE FEBRERO DEL 2010.**

2.2.- EL C. **IRINA SALGADO HERNANDEZ,** QUIEN SE IDENTIFICA CON **CREDENCIAL DE ELECTOR**, ACREDITA SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO **1585 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2009** OTORGADA ANTE LA FE DEL **LIC. SHUNASHI ALTAMIRANO PINEDA CORREDOR PUBLICO NO. 5 EN EL ESTADO DE GUERRERO, ACAPULCO, GRO.** INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, BAJO EL FOLIO **10160 * 17** DE FECHA **17 DE FEBRERO DEL 2010.** MANDATO QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO NI REVOCADO, LO QUE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

2.3.- TENER ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN **CALLE CORREGIDORA, NO. 4, COL. MORELOS, C.P. 39530, ACAPULCO, GRO,** MISMO QUE SEÑALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

2.4.- QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

2.5.- QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, SE OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

2.6.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE, CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO BAJO PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

2.7.- QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACIÓN, LOS CUALES ESTÁN VIGENTES.

- REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO N°. **ICO091216UUA.**

- REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ N°. **2848.**

- REGISTRO, ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL E INSTITUTO DEL FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES N°. **B61-59781-10-7.**

2.8.- QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NINGUNA DE LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE ESTA SOCIEDAD DESEMPEÑA ALGÚN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO, ASÍ COMO QUE NO TIENE IMPEDIMENTO LEGAL ALGUNO QUE LE IMPOSIBILITE A OBLIGARSE EN TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO.

2.9.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS APLICABLES.

2.10.- CONOCER EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, Y CONSECUENTEMENTE, HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN.

3. AMBAS PARTES DECLARAN:

3.1.- SUJETARSE ESTRICTAMENTE A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO; ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO EL MANUAL ÚNICO DE OPERACIÓN DEL RAMO XXXIII.

3.2.- QUE EL PRESENTE CONTRATO, SUS ANEXOS Y LA BITÁCORA DE LOS TRABAJOS, SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

3.3.- CONOCER EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE FUERON DEBIDAMENTE FIRMADOS POR **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** Y QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES Y DEFINICIONES ANTERIORES, SUSCRIBEN DE CONFORMIDAD LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

"LA SECRETARÍA" ENCOMIENDA A **"EL CONTRATISTA"** LA REALIZACIÓN DE LA OBRA CONSISTENTE EN: **PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO A ESCUELA RURAL CAMPESINA,** UBICADA EN **POB. EL SALTO**, DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN LA DECLARACIÓN 3.3 DE ESTE CONTRATO Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO; SIENDO **"EL CONTRATISTA"** RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y QUE ÉSTOS CUMPLAN CON TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR **"LA SECRETARÍA"**, COMO SON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO SI SE INSERTASEN A LA LETRA COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA CUYA EJECUCIÓN SE CONTRATA ES POR LA CANTIDAD DE: **$948,275.84 (NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N.)** MÁS IMPUESTO AL VALOR AGREGADO **$151,724.13 (CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 13/100 M.N.)** CONSECUENTEMENTE EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO RESULTA DE **$1,099,999.97 (UN MILLON NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.),** DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO DE OBRA PRESENTADO.

EL MONTO TOTAL DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO CUBRE A **"EL CONTRATISTA"** TODAS LAS PRESTACIONES, GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA MISMA, INCLUYENDO LOS IMPUESTOS O DERECHOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE SE CAUSEN, SIENDO IMPROCEDENTE EL INCREMENTO AL PRECIO DE OPERACIÓN ESTABLECIDO.

"LA SECRETARÍA" LLEVARÁ A CABO LAS RETENCIONES FISCALES CORRESPONDIENTES, QUE SE ORIGINEN POR CONCEPTO DE LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN.

EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ES DE **70 DIAS** NATURALES, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA **23 DE OCTUBRE DEL 2020** Y A TERMINARLOS A MÁS TARDAR EL DÍA **31 DE DICIEMBRE DEL 2020,** DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA PRESENTADO POR **"EL CONTRATISTA"**. TODOS LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN ESTE CONTRATO SE ENTENDERÁN COMO DÍAS CALENDARIO, COMPRENDIENDO AQUELLOS QUE SEGÚN LA LEY SEAN INHÁBILES PERO CUANDO UN PLAZO TERMINE EN UN DÍA INHÁBIL, CONCLUIRÁ A LAS 24 HORAS DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE.

ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO QUE EL DÍA DE INICIO DE LOS TRABAJOS LA **RESIDENCIA**, HAGA LA APERTURA A LA BITÁCORA DE OBRA, INSTRUMENTO EN EL QUE DEBERÁN REFERIRSE LOS ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y POR MEDIO DE EL, DAR INSTRUCCIONES Y RECIBIR SOLICITUDES QUE SE FORMULEN ENTRE **LA RESIDENCIA Y LA SUPERINTENDENCIA**, EL USO DE LA BITÁCORA SE REGIRÁ CONFORME AL CAPÍTULO IV, SECCIÓN II, ARTÍCULOS 122, 123, 124 Y 125 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

"LA SECRETARÍA" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE **"EL CONTRATISTA"**, PREVIAMENTE A LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO; EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. EL DIFERIMIENTO SE CONSIGNARÁ EN EL CONVENIO QUE PARA TAL EFECTO CELEBREN LAS PARTES.

ASÍ MISMO, **"EL CONTRATISTA"**, DEBERÁ TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS, ASÍ COMO LA PROPIEDAD O LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE VÍA Y EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES SOBRE LOS CUALES SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PREVISTAS POR LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERA PARA LA INICIACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS AMPARADOS POR EL PRESENTE CONTRATO.

QUINTA: ANTICIPO, PORCENTAJE, AMORTIZACIÓN Y COMPROBACIÓN.

PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, INICIO DE TRABAJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES, TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES DE INSTALACIÓN PERMANENTE Y DEMÁS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, **"LA SECRETARÍA"** OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL **50 % (CINCUENTA POR CIENTO)** DE LA ASIGNACIÓN APROBADA AL CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE **$474,137.92 (CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N.)** MAS EL I.V.A.

DICHOS ANTICIPOS SE OTORGARÁN EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA PARA SU CORRECTA APLICACIÓN, DEBIENDO SER ENTREGADO CONTRA LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE POR **"EL CONTRATISTA"** PARA TALES EFECTOS. REQUISITADA A LA PERSONA QUE ACREDITE ESTAR DEBIDAMENTE FACULTADA.

PARA EL CASO DE QUE **"LA SECRETARÍA"**, POR CAUSAS IMPUTABLES A LA MISMA, NO ENTREGASE A **"EL CONTRATISTA"** EL ANTICIPO EN LA FECHA PREVISTA, SE PODRÁ DIFERIR SIN MODIFICAR EL PLAZO PACTADO EN LA CLÁUSULA TERCERA, PARA CUYO EFECTO DEBERÁ SUSCRIBIRSE ENTRE LAS PARTES EL CONVENIO DE DIFERIMIENTO RESPECTIVO, EL QUE CONTENDRÁ LAS NUEVAS FECHAS DE INICIACIÓN Y CONCLUSIÓN DE LA OBRA.

LA FALTA DE EXHIBICIÓN OPORTUNA DE LA FIANZA O SU PRESENTACIÓN EN TÉRMINOS DIFERENTES A LOS ESTABLECIDOS, ACARREARAN AUTOMÁTICAMENTE EL ATRASO EN LA FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO Y EN TAL EVENTO NO SERÁ PROCEDENTE EL OTORGAMIENTO DEL CONVENIO DE DIFERIMIENTO, POR LO TANTO **"EL CONTRATISTA"** DEBERÁ INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA CLÁUSULA TERCERA.

"LA SECRETARÍA", PODRÁ PRACTICAR REVISIONES Y AUDITORIAS EN CUALQUIER TIEMPO PARA COMPROBAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO, PARA TAL EFECTO, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A DAR LAS FACILIDADES NECESARIAS Y ACREDITAR FEHACIENTEMENTE LA APLICACIÓN DEL MISMO, EXHIBIENDO LAS FACTURAS DE LOS PAGOS EFECTUADOS A SUS PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

SI **"EL CONTRATISTA"** DESTINA EL IMPORTE DEL ANTICIPO A FINES DISTINTOS A LOS CONSIGNADOS, **"LA SECRETARÍA"**, PODRÁ OPTAR POR EXIGIR DE INMEDIATO A **"EL CONTRATISTA"** LA DEVOLUCIÓN DEL MISMO, Y ADEMÁS, OPTAR POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO QUE SE ESTABLECE EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.

EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL REMANENTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL.

EN EL SUPUESTO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS, CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, COMO SI SE TRATARÁ DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL TÉRMINO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"LA SECRETARÍA"**,

EN CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A REINTEGRAR A **"LA SECRETARÍA"**, EL SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA QUE SE DA POR RESCINDIDO ESTE CONTRATO, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS A SATISFACCIÓN DE **"LA RESIDENCIA"**, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADO, A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LOS TRABAJOS Y **"EL CONTRATISTA"** SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

EN EL SUPUESTO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL TÉRMINO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, ÉSTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES; DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"LA SECRETARÍA"**

LA PÓLIZA DE FIANZA DEL ANTICIPO, QUE GARANTICE LA CORRECTA INVERSIÓN Y EXACTA AMORTIZACIÓN Y EN SU CASO, DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS QUE:

a) LA FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD Y ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, PARA GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSIÓN DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO DE LA CONTRATANTE OTORGA A LA EMPRESA **IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.** Y SE COMPROMETE A PAGAR HASTA LA CANTIDAD QUE IMPORTE ESTA FIANZA, EN CASO DE QUE SU FIADO NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN O SEA RESCINDIDO EL CONTRATO.

b) EN EL CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA Y PARA EL CASO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN O EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE;

c) CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA Y ESTE EFECTUÉ LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, **"LA SECRETARÍA"**, DEBERÁ LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA SIEMPRE Y CUANDO SEA PROCEDENTE EN LOS TÉRMINOS AQUÍ ESTIPULADOS

d) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO, **"LA SECRETARÍA"**, QUE LA PRODUCIRÁ CUANDO EL IMPORTE DEL ANTICIPO HAYA SIDO AMORTIZADO O DEVUELTO EN SU TOTALIDAD Y SE HAYAN PAGADO EN SU CASO LOS ACCESORIOS.

e) QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

f) LA COMPAÑÍA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 178, 279, 280 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR, OTORGANDO LA AFIANZADORA EL CONSENTIMIENTO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 179 DEL CITADO ORDENAMIENTO.

g) QUE PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO SE SOMETE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO GUERRERO, RENUNCIANDO CUALQUIER OTRA QUE TUVIERE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO OFICIAL, EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. FIN DEL TEXTO

SEXTA: FORMA DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, QUE ABARCARÁN PERIODOS NO MAYOR DE UN MES CALENDARIO Y SERÁN PRESENTADAS POR **"EL CONTRATISTA"** A **LA RESIDENCIA**, DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE CORRESPONDIENTE, CONTANDO CON UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN A LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN PARA QUE **"LA SECRETARÍA"**, INICIE SU TRÁMITE DE PAGO.

EL RESIDENTE DE OBRA EFECTUARA LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE 15 DÍAS NATURALES CONTADOS APARTIR DE LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTE DE COSTOS POR PARTE DE **"LA SECRETARÍA"**, ÉSTA A SOLICITUD DE **"EL CONTRATISTA"** Y DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266, PAGARÁ GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"EL CONTRATISTA".**

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO **"EL CONTRATISTA"**, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "LA DEPENDENCIA".

NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DEL CONTRATISTA SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁN COMO ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE **"LA SECRETARÍA."** TENDRÁ EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

SI **"EL CONTRATISTA"** REALIZA TRABAJOS EXCEDENTES O EXTRAORDINARIOS, SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE PARTE DEL **"RESIDENTE Y DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS"**, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI LA MODIFICACIÓN ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ÉSTOS O POR SU PRESENTACIÓN INCORRECTA O EXTEMPORÁNEA, NO SERÁ MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS. PARA QUE **"EL CONTRATISTA"** PUEDA CANCELAR SU(S) FACTURA(S) UNA VEZ QUE SE HA(N) VALIDADO LA(S) MISMA(S), SERÁ NECESARIO CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE **"LA SECRETARIA".** LA CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS SIN ESTE REQUISITO, LIBERA AL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DE LA OBLIGATORIEDAD DEL PAGO. SE GIRARA OFICIO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE DICHA CANCELACIÓN PARA LO CONDUCENTE.

SÉPTIMA: LUGAR DE PAGO:

VÍA ELECTRÓNICA MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA.

OCTAVA: GARANTÍAS.

A) GARANTÍA DE LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA CARTA DE ADJUDICACIÓN, DEBERÁ PRESENTAR A FAVOR Y A SATISFACCIÓN DEL **MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ**, FIANZA POR EL TOTAL DEL IMPORTE DEL ANTICIPO MAS I.V.A., OTORGADA POR INSTITUCIONES DE FIANZAS, DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

LA GARANTÍA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DE LOS ANTICIPOS, SE CANCELARÁ CUANDO **"EL CONTRATISTA"** HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DE LOS MISMOS, PREVIA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE **"LA SECRETARÍA"** EN EL CASO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** NO HAYA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO EN LA FECHA SEÑALADA EN LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE, SE HARÁ EFECTIVA LA FIANZA Y SE LE PENALIZARÁ CON LOS GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICIÓN DE **"LA SECRETARÍA"**

ESTA GARANTÍA SOLAMENTE SE LIBERARÁ CUANDO SE HAYA AMORTIZADO TOTALMENTE EL ANTICIPO CONCEDIDO.

B) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE HABER RECIBIDO LA CARTA DE ADJUDICACIÓN A CONSTITUIR UNA FIANZA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, MISMA QUE ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"**, Y ÉSTE HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FINIQUITO, **"LA SECRETARÍA"** DEBERÁ LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA; EN CASO CONTRARIO, **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS.

C) GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, **"EL CONTRATISTA"** MEDIANTE FIANZA EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO MAS I.V.A. EXPEDIDA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN CONTRAVENCIÓN AL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS DATOS DEL PROYECTO ANEXO A ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 77 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, ASÍ COMO LOS NUMERALES 89, 94, 95, 96, 97 Y 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LA PÓLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS QUE.

a) LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD;

b) LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS;

c) CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN MÁS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ÉSTA FIANZA SE SUBSTITUIRÁ EN EL O LOS SIGUIENTES EJERCICIOS POR OTRO U OTRAS EQUIVALENTES AL IMPORTE DE LOS TRABAJOS FALTANTES POR EJECUTAR, ACTUALIZANDO LOS IMPORTES DE ACUERDO CON LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS Y MODIFICACIONES CONVENIDAS SI LAS HUBIERE;

d) EN EL CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA Y PARA EL CASO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN O EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE

e) LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACIÓN DE **"LA SECRETARÍA"**

f) ÉSTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O DE **"LA SECRETARÍA"**, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA;

g) QUE LA FIANZA SE OTORGA TAMBIÉN PARA GARANTIZAR LA CORRECCIÓN DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN QUE RESULTEN, DE LOS VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

h) LA FIANZA SE CANCELARÁ CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE **"LA SECRETARÍA"**, SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERÁ LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ÉSTA CONTINUARÁ VIGENTE; Y,

i) CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA Y ESTE EFECTUÉ LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, **"LA SECRETARÍA"**, DEBERÁ LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA, SIEMPRE Y CUANDO SEA PROCEDENTE EN LOS TÉRMINOS AQUÍ ESTIPULADOS

j) LA FIANZA CONTINUARA EN VIGOR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO ALGUNA RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA POR DEFECTOS DE LA OBRA,

VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, **"EL CONTRATISTA"** GARANTIZA LOS MISMOS EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 77 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266 Y 95 DEL REGLAMENTO, POR LO QUE TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE) MESES, SIN QUE EXISTA RECLAMACIÓN ALGUNA POR PARTE DE **"LA SECRETARÍA"**, LA FIANZA QUEDARÁ CANCELADA, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE **"LA SECRETARÍA"**, PARA CANCELAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE.

k) EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS POR PARTE DE **"EL CONTRATISTA"**, **"LA SECRETARÍA"** LO COMUNICARÁ DE INMEDIATO Y POR ESCRITO A LA AFIANZADORA A EFECTO DE QUE ÉSTA NO SEA CANCELADA Y NOTIFICARA POR ESCRITO AL **"CONTRATISTA"** PARA QUE ÉSTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, TRANSCURRIDO ÉSTE TÉRMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO, **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA ESTA FIANZA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO A **"EL CONTRATISTA"** LA RESOLUCIÓN DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. SI LA CORRECCIÓN O REPOSICIÓN REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, **"EL CONTRATISTA"** Y **"LA SECRETARÍA"**, PODRÁN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE ESTA PÓLIZA DE FIANZA;

l) LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 178, 279, 280 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR; OTORGANDO LA AFIANZADORA EL CONSENTIMIENTO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTICULO 179 DEL CITADO ORDENAMIENTO.

m) LA FIANZA SE HARÁ EFECTIVA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA A **"EL CONTRATISTA"** LA RESOLUCIÓN DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO;

SI **"EL CONTRATISTA"** NO PRESENTARA LAS GARANTÍAS EN LA FORMA Y TÉRMINOS SEÑALADOS, **"LA SECRETARÍA"** PODRÁ DETERMINAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

NOVENA: AJUSTE DE COSTOS.

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO Y AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE.

PARA OBTENER EL AJUSTE DE LOS PRECIOS UNITARIOS SE CONSIDERARAN LOS TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS SIGUIENTES:

I.- LA REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE;

II.- LA REVISIÓN POR GRUPO DE PRECIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN CUANDO MENOS EL OCHENTA POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO; Y

III.- EN CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE SE TENGA ESTABLECIDA LA PROPORCIÓN EN QUE INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO PODRÁ DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN DICHAS PROPORCIONES.

LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DESCRITOS SE SUJETARÁ A LO SIGUIENTE:

A) LOS AJUSTES SE CALCULARÁN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL "PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO" EN EL CONTRATO O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A "**EL CONTRATISTA**", CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

CUANDO POR CAUSA IMPUTABLE AL **"CONTRATISTA"** EXISTIERA ATRASO, PROCEDERÁ EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA PRESENTADO EN SU PROPUESTA.

B) LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERÁN CALCULADOS CON BASE EN LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIO PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO. CUANDO LOS ÍNDICES QUE REQUIERA **"EL CONTRATISTA"** Y **"LA SECRETARÍA"** NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO **"LA SECRETARÍA"** POR CONDUCTO DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS PROCEDERÁ A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE EXPIDA EL BANCO DE MÉXICO;

C) LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS QUE **"EL CONTRATISTA"** HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA; Y

D) A LOS DEMÁS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO EMITA LA CONTRALORÍA.

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DEBERÁ CUBRIRSE POR PARTE DE "**LA SECRETARÍA**" A SOLICITUD DE **"EL CONTRATISTA"** A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE "**LA SECRETARÍA**" RESUELVA POR ESCRITO SOBRE LA PROCEDENCIA DE SU PETICIÓN. APLICANDO AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIÉNDOSE APLICAR LOS ÚLTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERÁN ACUMULARSE. EN CASO DE PRESENTARSE REDUCCIÓN EN LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SE PRACTICARÁ UNA REVISIÓN, Y DE SER PROCEDENTE, SE EFECTUARÁ EL AJUSTE CORRESPONDIENTE.

DECIMA: SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.

"LA SECRETARÍA" A TRAVÉS DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRÁ EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A **"EL CONTRATISTA"** POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCIÓN EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE SEAN ORDENADAS.

POR SU PARTE **"LA SECRETARÍA"** EN APEGO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 Y 112 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DESIGNA COMO SU REPRESENTANTE DIRECTO EN LA OBRA PARA PODER TRATAR LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON, O DERIVADOS DE, LOS TRABAJOS A **EL C. ING. ISMAEL ANGUIANO LEMUS, "LA SECRETARÍA"** DESIGNARA POR ESCRITO AL **RESIDENTE** RESPONSABLE DE LA OBRA, CON LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES MENCIONADAS EN EL ARTÍCULO 113 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

"LA SECRETARÍA" PODRÁ ORDENAR LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA DE LOS TRABAJOS CUANDO **"EL CONTRATISTA"** NO CUMPLA LAS ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO O EN SU CASO, A LAS INSTRUCCIONES RECIBIDAS POR ESCRITO O EN LA BITÁCORA DE OBRA POR PARTE DEL **RESIDENTE**, DEBIENDO **"EL CONTRATISTA"** REALIZARLAS POR SU CUENTA Y SIN DERECHO A RETRIBUCIÓN ALGUNA. ASÍ MISMO **"LA SECRETARÍA"** PODRÁ ORDENAR LA **SUSPENSIÓN** TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA CONTRATADA, EN TANTO SE LLEVEN A CABO LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN O REPOSICIÓN, SIN QUE SEA MOTIVO DE AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS.

"LA CONTRATISTA" DEBERA CONTAR CON LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES PARA LAS PRUEBAS DE SUS OBRAS, EL CUAL DEBERÁ ESTAR ACREDITADO ANTE **"LA SECRETARIA"**. NO SE ACEPTARÁN PRUEBAS DE LABORATORIOS QUE NO ESTEN ACREDITADOS.

PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS CONTRATADAS, **"LA SECRETARIA"** CONTARÁ CON LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES EXTERNO, EL CUAL ELABORARÁ LAS PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, REVENIMIENTO, RESISTENCIA DE LOS CONCRETOS Y CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LAS OBRAS CONTRATADAS.

DÉCIMA PRIMERA: REPRESENTANTE DEL "CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER LA RESIDENCIA DE OBRA DEBIENDO ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE SERA EL **SUPERINTENDENTE** DE CONSTRUCCIÓN Y PARA TAL EFECTO **"EL CONTRATISTA"** DESIGNA AL **ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO** CON CÉDULA PROFESIONAL No. **2220846** EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES EL **22 DE NOVIEMBRE DEL 1995,** REGISTRADO COMO RESPONSABLE TÉCNICO, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES TÉCNICAS EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

QUE DEBERÁ CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, CATÁLOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCIÓN Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN Y NORMAS DE CALIDAD, BITÁCORA, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL **SUPERINTENDENTE** DE CONSTRUCCIÓN DESIGNADO POR **"EL CONTRATISTA"**, TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE CONOCER EL CONTRATO, EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEBERÁ ESTAR FACULTADO PARA DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA ACEPTAR U OBJETAR LAS ESTIMACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN Y, EN GENERAL, PARA ACTUAR A NOMBRE DEL **"CONTRATISTA"** CON LAS FACULTADES LEGALES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

EL **SUPERINTENDENTE** DE CONSTRUCCIÓN DEBE ESTAR FACULTADO POR **"EL CONTRATISTA"**, PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, ASÍ COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"LA SECRETARÍA" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, Y DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCIÓN DEL MISMO, Y **"EL CONTRATISTA"** EN UN PLAZO DE CINCO DÍAS NATURALES TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOMBRAR A OTRO QUE REÚNA LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DE ESTA CLÁUSULA.

DÉCIMA SEGUNDA: RELACIONES LABORALES.

"EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL.

"EL CONTRATISTA" CONVIENE, POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE **"LA SECRETARÍA"**, QUIEN QUEDA EXCLUIDO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD ANTE RECLAMACIONES JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES.

DE IGUAL FORMA, **"EL CONTRATISTA"** RESPONDERÁ POR CUALQUIER RELACIÓN JURÍDICA QUE SE ORIGINE POR ACTOS JURÍDICOS CONTRAÍDOS CON PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS Y DEMÁS OPERARIOS QUE CONTRATE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, MATERIA DE ESTE CONTRATO.

DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DEL "CONTRATISTA".

CON EL OBJETO DE LLEVAR UNA PERMANENTE VIGILANCIA DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN **"EL CONTRATISTA"** DEBERÁ RESPONDER POR LA DEBIDA CAPACIDAD Y PROFESIONALISMO DE SUS TÉCNICOS Y TRABAJADORES QUE EJECUTEN LA OBRA, PERMITIENDO EN TODO MOMENTO Y OTORGANDO TODAS LAS FACILIDADES NECESARIAS AL PERSONAL TÉCNICO DE **"LA SECRETARÍA"** PARA REALIZAR LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN, PROPORCIONANDO TODA LA INFORMACIÓN QUE SEA REQUERIDA DE IGUAL FORMA.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS, Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE **"LA SECRETARÍA"**; ASÍ, COMO A RESPONDER, POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, SE LLEGUEN A CAUSAR A **"LA SECRETARÍA"**, O A TERCEROS; EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO HASTA POR SU MONTO TOTAL.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Roberto Posada y Comonfort S/N Col. Centro, Acapulco, Gro., C.P. 39300
Tel (744) 440 70 00 Ext. 4223 y 4227
www.acapulco.gob.mx

IGUALMENTE, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES Y TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARAN ESTE CONTRATO (ESTIMACIONES DE OBRA, FACTURAS O CONTRA RECIBOS) SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "**LA SECRETARÍA**".

"EL CONTRATISTA" NO PODRÁ SUBCONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA O PARTE DE LA MISMA.

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CUANDO ÉSTOS NO SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE POR ESCRITO LE PROPORCIONE "**LA SECRETARÍA**" ÉSTE ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA Y SERÁN POR CUENTA DE **"EL CONTRATISTA"**.

"EL CONTRATISTA" DEBERÁ SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD QUE "**LA SECRETARÍA**" TENGA ESTABLECIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, A LOS DEMÁS REGLAMENTOS U ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA, ASI COMO, LOS LINEAMIENTOS DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA SALUD QUE DEBERÁ CUMPLIR EL SECTOR DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL **COVID-19** CON EL OBJETIVO DE EVITAR EL CONTAGIO Y CONTENER LA PROPAGACIÓN.

"EL CONTRATISTA" SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A "**LA SECRETARÍA**" O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS POR NO AJUSTARSE AL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES. LOS RIESGOS Y LA CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA DEFINITIVA A "**LA SECRETARÍA**", SERÁN A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"**.

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE TODOS LOS ADEUDOS QUE FRENTE AL FISCO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL TENGA, CON MOTIVO DE CONTRIBUCIONES QUE SE CAUSEN COMO CONSECUENCIA Y EN EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE CONTRATAN (IMPUESTOS, DERECHOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL)

DÉCIMA CUARTA: MODIFICACIONES AL CONTRATO.

"LA SECRETARÍA" PODRÁ DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, MODIFICAR ESTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NÚMERO 266.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARÍAN EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRÁN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERÁN SER SUSCRITOS BAJO RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE HAYAN FIRMADO EL CONTRATO O QUIENES LOS SUSTITUYAN EN EL CARGO. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRÁN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NÚMERO 266.

LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRÁN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE EN REDUCCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN O MONTO DEL MISMO. SI SE MODIFICA EL PLAZO, LOS PERIODOS SE EXPRESARÁN EN DÍAS NATURALES, Y LA DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE VARIACIÓN SE HARÁ CON RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO; EN TANTO QUE SI ES AL MONTO, LA COMPARACIÓN SERÁ CON BASE EN EL MONTO CONVENIDO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SERÁN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AÚN CUANDO PARA FINES DE SU FORMALIZACIÓN PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.

LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO LAS PARTES CONVIENEN EN QUE **"EL CONTRATISTA"** PODRÁ SOLICITAR POR ESCRITO UNA AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, SIEMPRE QUE POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR, CASOS FORTUITOS O CUALESQUIERA OTRA CAUSA NO IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA"**, LE FUERE IMPOSIBLE CUMPLIR CABALMENTE EN EL PLAZO ESTABLECIDO.

LAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN QUE **"LA SECRETARÍA"** TIENE LA FACULTAD DE AUTORIZAR O DENEGAR LA SOLICITUD, CUANDO A SU JUICIO EXISTAN LOS ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEN FEHACIENTEMENTE O NO LA PROCEDENCIA.

SE DEBERÁ SUSTENTAR EL DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, SEGÚN SEA EL CASO, CONSIDERÁNDOSE ÉSTOS PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA **"EL CONTRATISTA"** Y **"LA SECRETARÍA"** LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN.

DÉCIMA QUINTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.

"LA SECRETARÍA" EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA, PARA LO CUAL SE ELABORARÁ UN DICTAMEN QUE JUSTIFIQUE LAS CAUSAS QUE MOTIVAN LA SUSPENSIÓN, ESTABLECIENDO EL PLAZO DE LA SUSPENSIÓN, QUE PODRÁ PRORROGARSE SI LAS CIRCUNSTANCIAS QUE DIERON ORIGEN A LA INTERRUPCIÓN PERSISTEN, DEBIENDO INFORMAR EL CONTENIDO DE ESTA RESOLUCIÓN A **"EL CONTRATISTA"**; EN ESTE CASO SE INTERRUMPIRÁ EL CALENDARIO ORIGINALMENTE PREVISTO PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, SIN QUE ESTO IMPLIQUE LA CANCELACIÓN, EXTINCIÓN O DISMINUCIÓN DE LAS GARANTÍAS OTORGADAS.

CUANDO OCURRA LA SUSPENSIÓN, EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR **"LA SECRETARÍA"** NOTIFICARÁ POR ESCRITO A **"EL CONTRATISTA"**, SEÑALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

EN CASO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** HAYA SUSPENDIDO LOS TRABAJOS, CON BASE A LA INSTRUCCIÓN RECIBIDA POR ESCRITO, LA FECHA DE TERMINACIÓN SE PRORROGARÁ EN IGUAL PROPORCIÓN AL PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSIÓN, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIDO, FORMALIZÁNDOLA MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN, LA QUE CONTENDRÁ COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL

ARTÍCULO 147 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA SUSPENSIÓN SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"**, DEBIENDO ÚNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE SUSPENSIÓN Y LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAJOS RESULTEN DAÑADOS O DESTRUIDOS Y ÉSTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERÁN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRÉ EL CONVENIO PARA CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA"**.

NO SERÁ MOTIVO DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE **"EL CONTRATISTA"**.

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS O SI LA SUSPENSIÓN EXCEDE SEIS MESES **"EL CONTRATISTA"** TENDRÁ DERECHO A SOLICITAR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO, ATENDIENDO A LAS CIRCUNSTANCIAS DE CADA CASO EN CONCRETO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN.

DÉCIMA SEXTA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

"LA SECRETARÍA" PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL MUNICIPIO; O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS. DE PRESENTARSE ESTA SITUACIÓN, **"LA SECRETARÍA"** PAGARÁ A **"EL CONTRATISTA"** LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

DE IGUAL FORMA, CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, **"EL CONTRATISTA"** PODRÁ SUSPENDER LAS OBRAS EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR SU SOLICITUD A **"LA SECRETARÍA"**, QUIEN RESOLVERÁ DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA MISMA, EN CASO DE NEGATIVA, SERÁ NECESARIO QUE **"EL CONTRATISTA"** OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL CORRESPONDIENTE LA DECLARATORIA RESPECTIVA.

SE ENTIENDE POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, AQUELLOS FENÓMENOS DE LA NATURALEZA O HECHOS DE PERSONAS CON AUTORIDAD PÚBLICA, GENERAL, INSUPERABLE, IMPREVISIBLE, O QUE PREVIÉNDOSE NO SE PUEDAN EVITAR, Y QUE ORIGINEN QUE UNA PERSONA REALICE UNA CONDUCTA DAÑOSA, CONTRARIA A UN DEBER JURÍDICO O A UNA OBLIGACIÓN. FENÓMENOS DE LA NATURALEZA O HECHOS DEL HOMBRE, TALES COMO

(ENUNCIATIVAMENTE MAS NO LIMITATIVA) MOTINES, ACTOS DE TERRORISMO, CUARENTENAS, EPIDEMIAS, GUERRAS (DECLARADAS O NO), DISTURBIOS CIVILES, INSURRECCIONES, INCENDIOS (CUANDO NO SE HAYA DADO CAUSA O CONTRIBUIDOS A ELLOS), TORMENTAS, IMPIDIÉNDOLE TEMPORALMENTE O DEFINITIVAMENTE EN FORMA ABSOLUTA EL CUMPLIMIENTO PARCIAL O TOTAL DE LA OBLIGACIÓN, SIN QUE TALES HECHOS LE SEAN IMPUTABLES DIRECTA O INDIRECTAMENTE Y CUYA AFECTACIÓN NO PUEDE EVITARSE CON LOS INSTRUMENTOS DE QUE NORMALMENTE SE DISPONGA, YA PARA PREVENIR EL ACONTECIMIENTO O PARA OPONERSE A EL Y RESISTIRLO.

ASÍ MISMO, LA EXTINCIÓN O PÉRDIDA DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE **"EL CONTRATISTA"** DARÁ LUGAR A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, ACORDÁNDOSE PAGAR A SUS SUCESORES O BENEFICIARIOS LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERÁN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITÁCORA, DEBIENDO "**LA SECRETARÍA**" LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS INDICADOS POR EL ARTÍCULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO A **"EL CONTRATISTA"** POR "**LA SECRETARÍA**" ÉSTA PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE **"EL CONTRATISTA"**, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A "**LA SECRETARÍA**" EN UN TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

CUANDO SE DÉ POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, DEBERÁ ELABORARSE EL FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 168,169, 170, 171 y 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DÉCIMA SÉPTIMA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

LA SECRETARÍA" PODRÁ, EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA"** POR LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS, CONFORME A LO QUE ESTABLECE EL ART. 72 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, Y 154, 155, Y 157 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO, SUS ANEXOS Y EN SU CASO, DE SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS.

DARÁN LUGAR A DETERMINAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN LOS SUPUESTOS SIGUIENTES:

I. POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266 Y EL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS;

II. INTERRUMPA INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O SE NIEGUE A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS QUE SE HAYA DETECTADO COMO DEFECTUOSA POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD;

III. NO EJECUTE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATE LAS ÓRDENES DADAS POR EL RESIDENTE;

IV. NO DÉ CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN CONVENIDOS POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y, A JUICIO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO. NO IMPLICARÁ RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO Y, POR TANTO, NO SE CONSIDERARÁ COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISIÓN, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR LA FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES O LA FALTA DE INFORMACIÓN REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FÍSICA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, DE LICENCIAS Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR LA CONTRATANTE, ASÍ COMO CUANDO LA DEPENDENCIA O ENTIDAD HAYA ORDENADO LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS;

V. SEA DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANÁLOGA;

VI. SUBCONTRATE PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD;

VII. TRANSFIERA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD;

VIII. NO DÉ A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS;

IX. CAMBIE SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD;

X. SI SIENDO EXTRANJERO, INVOQUE LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL CONTRATO;

XI. INCUMPLA CON EL COMPROMISO QUE, EN SU CASO, HAYA ADQUIRIDO AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, RELATIVO A LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, Y

XII. EN GENERAL, INCUMPLA CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO.

LAS CAUSALES REFERIDAS DAN LUGAR A LA RESCISIÓN INMEDIATA DE ESTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA **"LA SECRETARÍA"**, ADEMÁS DE QUE SE LE APLIQUEN A **"EL CONTRATISTA"** LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE

CONTRATO O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISIÓN, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACIÓN DE UNO O DE OTRO, INDEPENDIENTEMENTE DE HACER EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y APLICARSE EN SU CASO A **"EL CONTRATISTA"** LOS DEMÁS CARGOS QUE PROCEDAN.

"LAS PARTES "CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** SE ENCUENTRE EN ALGUNA DE LAS CAUSALES INDICADAS EN LA CLÁUSULA ANTERIOR, EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA SE SUJETARÁ A LO SIGUIENTE:

1. EL PROCEDIMIENTO INICIARÁ A PARTIR DE QUE **"LA SECRETARÍA"** LE NOTIFIQUE A "**EL CONTRATISTA"** POR OFICIO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, SEÑALANDO LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVARON SU DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, RELACIONÁNDOLO CON LAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

2. TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE EL NUMERAL ANTERIOR, **"LA SECRETARÍA"** RESOLVERÁ CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER **"EL CONTRATISTA".**

3. LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO POR PARTE DE **"LA SECRETARÍA",** DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 1(UNO) DE ESTA CLÁUSULA.

UNA VEZ NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, **"LA SECRETARÍA"** SE ABSTENDRÁ, COMO MEDIDA PRECAUTORIA, DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA COMUNICACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS.

EN EL FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME EL PROGRAMA VIGENTE, ATENDIENDO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 162 Y 163 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO **"LA SECRETARÍA"** LE HAYA ENTREGADO A **"EL CONTRATISTA"**, ASÍ COMO CONSIDERAR EN SU INTEGRACIÓN LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE HAYA REALIZADO **"EL CONTRATISTA"** HASTA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO LOS EQUIPOS, MATERIALES QUE SE HUBIERAN INSTALADO EN LA OBRA O SE ENCUENTREN EN PROCESO DE FABRICACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SEAN SUSCEPTIBLES DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266 Y 161 DEL REGLAMENTO.

EL SOBRECOSTO QUE SE DETERMINE AL ELABORAR EL FINIQUITO, SERÁ INDEPENDIENTE DE LAS GARANTÍAS, PENAS CONVENCIONALES Y DEMÁS CARGOS QUE DEBAN CONSIDERARSE EN LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.

COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL

INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO PROCEDERÁ A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE **"EL CONTRATISTA"**, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN Y ANTES DE SU CONCLUSIÓN, **"LA SECRETARÍA"** PODRÁ A SU JUICIO, SUSPENDER EL TRÁMITE DEL CITADO PROCEDIMIENTO, CUANDO SE HUBIERE INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO. EN EL CASO DE QUE SE DETERMINE NO RESCINDIR EL CONTRATO, SE REPROGRAMARÁN LOS TRABAJOS UNA VEZ NOTIFICADA LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE POR **"LA SECRETARÍA"** A **"EL CONTRATISTA"**.

"LA SECRETARÍA" PODRÁ OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISIÓN, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACIÓN DE UNAS O DE OTRO.

DECIMA OCTAVA: PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE ESTE CONTRATO, **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** CONVIENEN LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES RETENCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES:

A).-"LA SECRETARÍA" TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR MENSUALMENTE SI LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR **"EL CONTRATISTA"** DE ACUERDO CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO; PARA LO CUAL, **"LA SECRETARÍA"** COMPARARÁ EL AVANCE MES A MES CONTRA EL PROGRAMA, Y LOS TRABAJOS EFECTIVOS EJECUTADOS.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE, **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A HACER LAS RETENCIONES ECONÓMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN QUE SE DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA, HASTA LA DE REVISIÓN. LAS RETENCIONES SERÁN DETERMINADAS ÚNICAMENTE EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO OPORTUNAMENTE CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

CUANDO **"EL CONTRATISTA"** REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO SEÑALADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN, PODRÁ RECUPERAR LAS RETENCIONES ECONÓMICAS QUE SE LE HAYAN EFECTUADO, POR LO QUE **"LA SECRETARÍA"** LE REINTEGRARÁ EL IMPORTE DE LAS MISMAS QUE AL MOMENTO DE LA REVISIÓN TUVIERA ACUMULADAS.

LA APLICACIÓN DE ESTAS RETENCIONES TENDRÁ EL CARÁCTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, ÉSTOS NO SE HAN CONCLUIDO.

B).- SI **"EL CONTRATISTA"** NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO Y EN EL PROGRAMA DE TRABAJO, **"LA SECRETARÍA"** LE APLICARÁ LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO

SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR CADA MES O FRACCIÓN QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACIÓN PACTADA EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO HASTA EL MOMENTO DE SU TERMINACIÓN. DICHAS PENAS NO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES SE DESCONTARÁN ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN Y EL DE LAS PENAS CONVENCIONALES EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, Y SE APLICARÁN, SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA"** Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL QUE A JUICIO DE **"LA SECRETARÍA"** NO SE ATRIBUYA A CULPA DE **"EL CONTRATISTA"**.

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN, **"LA SECRETARÍA"** PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, O BIEN, LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA GARANTÍA DEL ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGÚN PROCEDA EN LA RESCISIÓN, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

SI **"LA SECRETARÍA"** OPTA POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, SE APEGARÁ A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA DE ESTE CONTRATO.

DECIMA NOVENA: TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARÁ A TRAVÉS DE LA BITÁCORA O POR ESCRITO A **"LA SECRETARÍA"** SOBRE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS ANEXANDO LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRÁ UNA RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA, Y ÉSTA VERIFICARÁ DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, SALVO QUE SE PACTE EXPRESAMENTE OTRO PLAZO, QUE LOS MISMOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS.

SI DURANTE LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, **"LA SECRETARÍA"** ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, DEBERÁ SOLICITAR A **"EL CONTRATISTA"** SU REPARACIÓN, A EFECTO DE QUE ÉSTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS. EN TAL CASO, EL PLAZO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE PODRÁ PRORROGAR POR EL PERIODO QUE ACUERDEN **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** PARA LA REPARACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE **"LA SECRETARÍA"** OPTE POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO.

UNA VEZ QUE SE HAYA CONSTATADO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A LA RECEPCIÓN FORMAL DE LOS MISMOS, EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, SUSCRIBIENDO EL **"ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN"** EN LA QUE CONSTE ESTE HECHO, DEBIENDO CONTENER COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 166 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR **A "LA SECRETARÍA"** DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE **A "LA SECRETARÍA"** HAYA CONSTATADO LA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Roberto Posada y Comonfort S/N Col. Centro, Acapulco, Gro., C.P. 39300
Tel (744) 440 70 00 Ext. 4223 y 4227
www.acapulco.gob.mx

TERMINACIÓN REAL DE LOS TRABAJOS, TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL **FINIQUITO DEL CONTRATO**, INCLUYENDO ESTIMACIONES POR CONCEPTO DE OBRA EJECUTADA, CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA FUERA DE CATÁLOGO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, SOLICITUD DE AJUSTE A LOS COSTOS POR CONCEPTO DE IMPACTO INFLACIONARIO (EN CASO DE EXISTIR) Y **PLANO DE OBRA TERMINADA** EN EL QUE SE PLASMEN TODAS LAS MODIFICACIONES Y ADECUACIONES AL PROYECTO ORIGINAL PROPORCIONADO **"EL CONTRATISTA"** PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, TODO DEBIDAMENTE JUSTIFICADO Y CON LOS APOYOS NECESARIOS PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN POR PARTE DE **A "LA SECRETARÍA".**

"LA SECRETARÍA" NO ESTARÁ OBLIGADA A DAR TRÁMITE A LAS SOLICITUDES O DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTE SI **"EL CONTRATISTA"** NO CUMPLIESE CON LA ENTREGA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN ESTA CLÁUSULA.

VIGÉSIMA: FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** EN ESTE CONTRATO, SE DEBERÁ ELABORAR EL **FINIQUITO DE OBRA** CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS.

"LA SECRETARÍA" DEBERÁ NOTIFICAR POR OFICIO A **"EL CONTRATISTA"** LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL FINIQUITO; **"EL CONTRATISTA"** TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE ACUDIR AL LLAMADO QUE SE LE HAGA MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO. EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERÁ REUNIR COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTÍCULO 170 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS EL FINIQUITO DEBERÁ SER ELABORADO POR **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, HACIÉNDOSE CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE, DEBIENDO EXPONER, EN SU CASO, LAS RAZONES DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, **"EL CONTRATISTA"** NO ACUDA CON **"LA SECRETARÍA"** PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL TÉRMINO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR POR OFICIO SU RESULTADO A **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DEL TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A **"EL CONTRATISTA"**, ÉSTE TENDRÁ EL TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA; SI TRANSCURRIDO ESTE TÉRMINO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO.

SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE **"EL CONTRATISTA"**, **"LA SECRETARÍA"** DEBERÁ LIQUIDARLOS DENTRO DEL TÉRMINO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES. SI RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE **"LA SECRETARÍA"** EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRÁ DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES ÉSTOS, DEBERÁ EXIGIRSE POR OFICIO SU REINTEGRO, MÁS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA

QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"LA SECRETARÍA",** EN CASO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO, **"LA SECRETARÍA"** PODRÁ HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES. EN FORMA SIMULTÁNEA, SE LEVANTARÁ EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DÉ POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** EN ESTE CONTRATO, LA QUE DEBERÁ REUNIR COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS SEÑALADOS POR EL ARTÍCULO 172 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA LIQUIDACIÓN DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO PODRÁ UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** EN ESTE CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR ÚNICAMENTE UNA MANIFESTACIÓN DE **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE TENDRÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN. AL NO SER FACTIBLE EL PAGO EN EL TÉRMINO INDICADO, SE PROCEDERÁ A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** EN ESTE CONTRATO.

VIGÉSIMA PRIMERA: OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS.

"EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

- **EL 0.005** (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN PARA CUMPLIR CON EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, LO ANTERIOR, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

- **EL 0.002** (DOS AL MILLAR) PARA LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES AFILIADAS A LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO DE FECHA **06 DE MARZO DE 2019**, CELEBRADO POR LA MENCIONADA CÁMARA Y EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN CON **"LA SECRETARÍA"**, CON EL OBJETO DE APOYAR LA CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

- **EL 1.0%** (UNO PUNTO CERO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN POR CONCEPTO DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEPENDIENTE DE **"LA SECRETARÍA"**, CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

VIGÉSIMA SEGUNDA: JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES.

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CON SEDE EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, POR LO TANTO, **"EL CONTRATISTA"** RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LEÍDO POR LAS PARTES QUE EN ÉL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS FOJAS ÚTILES EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO; EL DÍA **13 DE OCTUBRE DEL 2020.**

POR "LA SECRETARÍA"

C. ING. ARQ. ARMANDO JAVIER SALINAS.
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"EL CONTRATISTA"

IRINA SALGADO HERNANDEZ
IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

000350 SPD-20

223

H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez 2018 - 2021

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

BIENESTAR 0000220

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020
FISMDF
ACTA DE ENTREGA – RECEPCION DE OBRAS 2020

EN LA LOCALIDAD DE POB. EL SALTO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ DEL ESTADO DE GUERRERO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020 SE REUNIERON LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
LIC. ADELA ROMAN OCAMPO	PRESIDENTA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO
	PRESIDENTE	COMITÉ LOCAL DESARROLLO COMUNITARIO

QUIEN ASISTE COMO REPRESENTANTE DE LAS DEPENDENCIAS AL ACTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DE LA OBRA DENÓMINADA: **PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO A ESCUELA RURAL CAMPESINA**
EJECUTADA POR: **IMEXA CONSTRUCCIONES, SA. DE C.V.**
PERIODO DE EJECUCIÓN: **DEL 23 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2020**
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA OBRA: **PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO A ESCUELA RURAL CAMPESINA**

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN SE REALIZÓ CON RECURSOS DEL RAMO XXXIII.-

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020

NO. DEANEXO REMISION	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTROS
		$1,099,999.97		$1,099,999.97	

UNA VEZ VERIFICADA LA TERMINACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA – RECEPCIÓN AL

COMITÉ DE DESARROLLO COMUNITARIO

QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO; RECIBE DE CONFORMIDAD:

ENTREGA		RECIBE EL COMITÉ DE DESARROLLO COMUNITARIO	
Cargo:	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Cargo:	JULIAN BAILON TORRES
Nombre y Firma	LIC. ADELA ROMAN OCAMPO	Nombre y firma	PRESIDENTE
		Cargo: Nombre y Firma	KEVIN JULIAN BAILON TORRES K.J.B.T SECRETARIO
		Cargo. Nombre y Firma	JUANA TORRES PELAEZ VOCAL
		Cargo: Nombre y Firma	EVARISTO CRUZ ANTONIO ECA VOCAL
		Cargo. Nombre y Firma	FLORIBERTO BAILON TORNEZ VOCAL

COMISARIA MUNICIPAL EL SALTO

JULIAN BAILON TORRES

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Gro.

H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez 2018 - 2021

BIENESTAR

"2020, Año Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ROBERTO POSADA Y COMONFORT S/N COL. CENTRO C.P.39300 ACAPULCO DE JUAREZ

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

CON FUNDAMENTO EN EL PARRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTICULO 172 DE SU REGLAMENTO; SE PROCEDE A LEVANTAR ESTA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA CUAL SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA No. **MAJ-FAISM/176-2020/AD**, Y CONVENIO No._____ RELATIVO A LA OBRA: **PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO A ESCUELA RURAL CAMPESINA**, UBICADA EN: **POB. EL SALTO.**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
INFORMACION BASICA INICIAL

ÁREA ENCARGADA DE LA OBRA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

OBJETO DEL CONTRATO: " EL ORGANISMO " encomienda a **" EL CONTRATISTA"** la realización de una obra consistente en la **PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO A ESCUELA RURAL CAMPESINA** en el: **POB. EL SALTO** . y este se obliga a realizar hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en la declaración II.8 del apartado de Declaraciones de **" EL CONTRATISTA "**, apegándose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, así como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos.

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS: GUERRERO.

ANTECEDENTES:

NÚMERO DEL OFICIO DE AUTORIZACION:

FECHA DE ADJUDICACION: 13 DE OCTUBRE DE 2020.

NUMERO DE CONTRATO: MAJ-FAISM/176-2020/AD

FECHA INICIACIÓN SEGÚN BITÁCORA DE OBRA: 23 DE OCTUBRE DE 2020

FECHA TERMINACIÓN SEGÚN BITÁCORA DE OBRA: 19 DE DICIEMBRE DE 2020.

I.- EN LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **31 DE DICIEMBRE DE 2020**, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA RESIDENCIA DE OBRA, CITA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, EN ROBERTO POSADA Y COMONFORT S/N COL. CENTRO C.P. 39300, ACAPULCO,GRO.

II.- QUE PARA REALIZAR EL ACTO SEÑALADO SE ENCUENTRA REUNIDAS LAS PERSONAS ADSCRITAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, LOS SERVIDORES PUBLICOS DEBIDAMENTE ACREDITADOS EN SU PERSONALIDAD Y ACTUANDO CONFORME A LA DELEGACION DE FACULTADES EN PRESENTACION DE LA SECRETARIA ", **LOS CC. ING. ARMANDO JAVIER SALINAS, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, ARQ. FRANCISCO JAVIER CHAVARRIA PEÑALOZA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, C. ING. ARQ. MELECIO VAZQUEZ PELAEZ**, JEFE DE SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y/O **ING. GERARDO CATALAN** QUIROZ, ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA ZONA RURAL. **Y VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS Y POR LA OTRA PARTE PERSONA FISICA O MORAL IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. REPRESSENTADA POR EL C. ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ** SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL.

000352

0000205

H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez 2018 - 2021

BIENESTAR

"2020, Año Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ROBERTO POSADA Y COMONFORT S/N COL. CENTRO C.P.39300 ACAPULCO DE JUAREZ

III.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN.

INFRAESTRUCTURA:

SUB-ESTRUCTURA:

SUPERESTRUCTURA:

TERRACERIAS: APERTURA DE CAJA POR MEDIOS MECANICOS, AFINE Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE, FORMACION DE BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR, AFINE Y COMPACTACION EN BANQUETAS.

PAVIMENTOS: GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, SUM. Y COLOCACION DE MEMBRANA DE POLIETILENO, PAVIMENTO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, CORTE EN JUNTAS, CALAFATEO, DENTELLON, PINTURA ESMALTE AMARILLO TRAFICO

OBRAS COMPLEMENTARIAS: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

IV.- DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES.

MEDIANTE ESCRITO DE FECHA_____, LA EMPRESA CONTRATISTA SOLICITA MEDIANTE OFICIO, SE LE AUTORICE LA EJECUCION DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, NO CONTEMPLADOS EN EL CATALAGO DE CONCEPTOS ORIGINAL DEL CUAL SE AUTORIZO MEDIANTE NOTA DE BITACORA _____., REFERENTE.: _____ ,ASI COMO TAMBIEN, OBRA ADICIONAL EN LOS CONCEPTOS _____.

RELACION DE OBLIGACIONES Y FECHA EN QUE SE CUMPLIERON.

FIRMA DE CONTRATO:
FIRMA DE CONVENIO_____.

ANTICIPO:
FIANZAS:

CONTRATO

- DE CUMPLIMIENTO: **20A56787** DE FECHA **21 DE OCTUBRE DE 2020**
- DE ANTICIPO: **20A56784** DE FECHA **21 DE OCTUBRE DE 2020.**
- DE VICIOS OCULTOS: **20A56787** DE FECHA **21 DE OCTUBRE DE 2020 .**

CONVENIO

- DE CUMPLIMIENTO: _____ DE FECHA _____
- DE ANTICIPO: _____ DE FECHA _____
- DE VICIOS OCULTOS: _____ DE FECHA _____

000353 0000204

H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez 2018 - 2021

BIENESTAR

"2020, Año Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ROBERTO POSADA Y COMONFORT S/N COL. CENTRO C.P.39300 ACAPULCO DE JUAREZ

TERMINACION DE TRABAJOS: 19 DE DICIEMBRE DEL 2020
FINIQUITO: 19 DE DICIEMBRE DEL 2020
ENTREGA - RECEPCION: 19 DE DICIEMBRE DEL 2020

MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL: $ 1,099,999.97 I.V.A INCLUIDO.

MONTO DE LAS AMPLIACIONES:

MONTOS DE LAS AMPLIACIONES:

MONTO TOTAL CONTRATADO: $ 1,099,999.97 I.V.A INCLUIDO.
SANCIONES: NO SE PRESENTARON

V.- **LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS** DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR CUANTO A LAS FIANZAS No. **20A56787** DE FECHA **13 DE OCTUBRE DEL 2020** POR CONCEPTO DE VICIOS OCULTOS POR SU PARTE LA PERSONA FISICA O MORAL **IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.** , **REPRESENTADA POR LA C. IRINA SALGADO HERANDEZ** , EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, MANIFIESTA QUE NO SE RESERVA ACCION NI TIENE RECLAMACION ALGUNA CON POSTERIORIDAD A LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA, POR LO CUAL SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA No. **MAJ-FAISM/176-2020/AD** Y CONVENIO No._____.

SIN OTRO ASUNTO EN PARTICULAR QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, SIENDO LAS **10:30** HORAS DEL DIA **31 DE DICIEMBRE DEL 2020** FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

SRIO. DE DES.URB. Y OBRAS PÚBLICAS

_____
ING. ARQ. ARMANDO JAVIER SALINAS.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 2018-2021

POR LA EMPRESA

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
C. IRINA SALGADO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL.

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

_____
ARQ. FRANCISCO JAVIER CHAVARRIA PEÑALOZA

ENCARGADO DE SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA RURAL.

_____
ING.GERARDO CATALAN QUIROZ

H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez 2018 - 2021

000354

0000203

BIENESTAR

"2020, Año Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN Y FINIQUITO DE OBRA PÚBLICA

SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA **19 DE DICIEMBRE DE 2020** Y HABIÉNDOSE VERIFICADO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: **MAJ-FAISM/176-2020/AD,** CONSISTENTES EN **PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO A ESCUELA RURAL CAMPESINA** UBICADA EN **POB. EL SALTO,** DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.

SE PROCEDE A LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRA BAJO LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES: LOS TRABAJOS, OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ANTES CITADO, FUERON REALIZADOS POR LA EMPRESA DENOMINADA: **IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.,** HABIENDO ESTADO COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA Y RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS MISMOS POR PARTE DE DICHA EMPRESA, EL (LA): **C. ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO ,** POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, ESTUVO COMO RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN Y VERIFICIACIÓN DE LA CORRECTA REALIZACIÓN DE LA OBRA EL (LA): **ING. ISMAEL ANGUIANO LEMUS,** EL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO FUE DE **$ 1,099,999.97 (UN MILLON NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.)** I.V.A INCLUIDO SIN HABER EXISTIDO NINGUN CONVENIO ADICIONAL.

EL PERIODO ORIGINAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ESPECIFICADO EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA FUE EL SIGUIENTE: FECHA DE INICIO: **23 DE OCTUBRE DE 2020**
FECHA DE TERMINACION: **31 DE DICIEMBRE DE 2020.**

EL PERIODO REAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL CONVENIO ADICIONAL FUE DE EL SIGUIENTE : FECHA DE INICIO: **23 DE OCTUBRE DE 2020.**
FECHA DE TERMINACION : **19 DE DICIEMBRE DE 2020**

LAS ESTIMACIONES DE OBRA QUE SE REALIZARON A LA FECHA DE ESTA ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION SON LOS SIGUIENTES:

ESTIMACION No.: 01 **(UNO)** FECHA DE INICIO: **23/10/2020**
FECHA DE TERMINACIÓN: 30/11/2020
$ 769,999.97 IVA INCLUIDO

ESTIMACION No.: 02 **(DOS)** Y FINIQUITO
FECHA DE INICIO: 01/12/2020
FECHA DE TERMINACIÓN: 19/12/2020
$ 330,000.00 IVA INCLUIDO

0000202

000355

H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez 2018 - 2021

BIENESTAR

"2020, Año Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN Y FINIQUITO DE OBRA PÚBLICA

SE HACE CONSTAR EN ESTA ACTA POR AMBAS PARTES, QUE TODOS LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SE ENCUENTRAN EN PODER DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ.

ASÍ TAMBIÉN, SE MANIFIESTA QUE CON ESTA FECHA, INICIA EL PLAZO DE DOCE MESES EN EL QUE LA EMPRESA: **IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.** QUEDA OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO NUM.: **MAJ-FAISM/176-2020/AD** DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE, QUEDANDO COMO GARANTÍA DE LO ANTES SEÑALADO, LA FIANZA NUM. **20A56787** EXPEDIDA POR LA AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA, APERTURA DE CAJA POR MEDIOS MECANICOS, AFINE Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE, FORMACION DE BASE DE 20 CM. DE ESPESOR, EXCAVACION EN MAT. TIPO II PARA COLOCACION DE TUBO Y BIODIGESTORES, GUARNICION Y BANQUETA DE CONFCRETO HIDRAULICO F'C= 200 KG/CM2, SUM. Y COLOCACION DE MEMBRANA DE POLIETILENO, PAVIMENTO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, CORTE DE JUNTAS EN PISO DE CONCRETO, CALAFATEO EN LOSAS Y GUARNICIONES, PINTURA ESMALTE AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, CORTE Y/O DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL MÁRGEN Y AL CALCE LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
IRINA SALGADO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

POR EL H. AYUNTAMIENTO:

ING. ISMAEL ANGUIANO LEMUS
RESIDENTE DE OBRA

ING. GERARDO CATALAN QUIROZ
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA ZONA RURAL.

ARQ. FRANCISCO JAVIER CHAVARRIA PEÑALOZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

CONTRATO N°. MAJ-FAISM/263-2020/AD

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO **MAJ-FAISM/263-2020/AD,** RELATIVO A LA OBRA: **PAVIMENTACION DE CALLE PRIV. SANTA MARIA DEL MAR**, UBICADA EN **FRACC. LAS PLAYAS,** EN ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, **LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO**, A QUIEN SE DENOMINARÁ **"LA SECRETARÍA", REPRESENTADA POR EL ING. ARQ. ARMANDO JAVIER SALINAS,** EN SU CARÁCTER DE **SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS**, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. Y POR LA OTRA **IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL C. **IRINA SALGADO HERNANDEZ, CON NÚMERO DE REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS 2848,** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL** A QUIEN SE DENOMINARÁ **"EL CONTRATISTA"** DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

OPERADO
FISM-2020

D E C L A R A C I O N E S

I.- DECLARA "LA SECRETARÍA" MEDIANTE SUS REPRESENTANTES.

1.- QUE EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR EL **ARTÍCULO 115, FRACCIONES I, II y III A), D), E), F), G), H), I), Y IV B), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS** Y ARTICULO 3 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO, ES UN MUNICIPIO GOBERNADO POR UN AYUNTAMIENTO DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA, INVESTIDO DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CON LIBRE ADMINISTRACIÓN DE SU HACIENDA RECURSOS Y SERVICIOS DESTINADOS A LA COMUNIDAD, SIN MÁS LÍMITES QUE LOS SEÑALADOS EXPRESAMENTE EN LAS LEYES APLICABLES.

1.1.- **QUE CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 170 NUMERAL 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO**; 26, 29, 30, 31 DEL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO, Y; 2 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, EL AYUNTAMIENTO ES EL ÓRGANO DE GOBIERNO A CUYA DECISIÓN SE SOMETEN LOS ASUNTOS DE LA VIDA PÚBLICA MUNICIPAL Y LOS DE SU PROPIA ADMINISTRACIÓN QUE LAS LEYES PREVÉN, ASÍ COMO LA DE EJERCER VIGILANCIA DIRECTA DE LOS ACTOS DE SUS MIEMBROS EN TODO MOMENTO, CUYAS FACULTADES DE EJECUCIÓN ESTÁN DEPOSITADAS EN EL PRESIDENTE MUNICIPAL.

1.2.- QUE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, EN EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 29 FRACCIONES I, V, Y VII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO EN VIGOR, TUVO A BIEN DESIGNAR COMO **SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS AL ING. ARQ. ARMANDO JAVIER SALINAS,** Y POR ENDE, LA FACULTAD Y REPRESENTACIÓN LEGAL PARA CELEBRAR CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SUS SERVICIOS A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 72 Y 73 FRACCIONES IX Y X DE LA LEY ORGÁNICA INVOCADA EN RELACIÓN CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO **27 FRACCIONES XIV,**

XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXVIII, Y 28 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ,

GUERRERO. EN VIRTUD DE QUE **"LA SECRETARÍA"**, ES LA ENTIDAD MUNICIPAL ENCARGADA DE ORDENAR LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS, REGULAR EL DESARROLLO URBANO, ASÍ COMO CONDUCIR, NORMAR, PROYECTAR Y EJECUTAR LAS OBRAS PÚBLICAS, INSERTAS EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES EN LA MATERIA.

1.3.- SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, EL UBICADO EN LA AV. CUAUHTÉMOC S/N INTERIOR PARQUE PAPAGAYO, COL. HORNOS INSURGENTES, ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. C. P. 39350.

1.4.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SE AUTORIZÓ LA INVERSIÓN MEDIANTE EL **RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2020. AUTORIZADO MEDIANTE EL OFICIO SEPLADE/354/2020, DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020.** CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE A SU VEZ SE HAYA INCLUIDO EN EL PROGRAMA DE OBRAS PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2020.

OPERADO FISM-2020

1.5.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICÓ A **"EL CONTRATISTA"** PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS A QUE SE DESTINA LA INVERSIÓN AUTORIZADA QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACIÓN 1.4, A TRAVÉS DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA**, TAL COMO LO SEÑALA LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 EN EL ARTÍCULO 39 FRACCIÓN III.

2. "EL CONTRATISTA" DECLARA:

2.1.- ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO **1585 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2009,** OTORGADA ANTE LA FE DEL **LIC. SHUNASHI ALTAMIRANO PINEDA CORREDOR PUBLICO NO. 5 EN EL ESTADO DE GUERRERO, ACAPULCO, GRO.** CON REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO **10160 * 17 DE FECHA 17 DE FEBRERO DEL 2010.**

2.2.- EL C. **IRINA SALGADO HERNANDEZ,** QUIEN SE IDENTIFICA CON **CREDENCIAL DE ELECTOR**, ACREDITA SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO **1585 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2009** OTORGADA ANTE LA FE DEL **LIC. SHUNASHI ALTAMIRANO PINEDA CORREDOR PUBLICO NO. 5 EN EL ESTADO DE GUERRERO, ACAPULCO, GRO.** INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, BAJO EL FOLIO **10160 * 17** DE FECHA **17 DE FEBRERO DEL 2010**, MANDATO QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO NI REVOCADO, LO QUE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

2.3.- TENER ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN **CALLE CORREGIDORA, NO. 4, COL. MORELOS, C.P. 39530, ACAPULCO, GRO,** MISMO QUE SEÑALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

2.4.- QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

2.5.- QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, SE OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

2.6.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE, CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO BAJO PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

2.7.- QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACIÓN, LOS CUALES ESTÁN VIGENTES.

- REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO N°. **ICO091216UUA.**

- REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ N°. **2848.**

- REGISTRO, ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL E INSTITUTO DEL FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES N°. **B61-59781-10-7.**

2.8.- QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NINGUNA DE LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE ESTA SOCIEDAD DESEMPEÑA ALGÚN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO, ASÍ COMO QUE NO TIENE IMPEDIMENTO LEGAL ALGUNO QUE LE IMPOSIBILITE A OBLIGARSE EN TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO.

2.9.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS APLICABLES.

2.10.- CONOCER EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, Y CONSECUENTEMENTE, HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN.

3. AMBAS PARTES DECLARAN:

3.1.- SUJETARSE ESTRICTAMENTE A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO; ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO EL MANUAL ÚNICO DE OPERACIÓN DEL RAMO XXXIII.

3.2.- QUE EL PRESENTE CONTRATO, SUS ANEXOS Y LA BITÁCORA DE LOS TRABAJOS, SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

3.3.- CONOCER EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL CONTENIDO DE

OPERADO FISM-2020

LOS ANEXOS QUE FUERON DEBIDAMENTE FIRMADOS POR **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** Y QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES Y DEFINICIONES ANTERIORES, SUSCRIBEN DE CONFORMIDAD LAS SIGUIENTES:

OPERADO FISM-2020

C L Á U S U L A S

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

"LA SECRETARÍA" ENCOMIENDA A **"EL CONTRATISTA"** LA REALIZACIÓN DE LA OBRA CONSISTENTE EN: **PAVIMENTACION DE CALLE PRIV. SANTA MARIA DEL MAR,** UBICADA EN **FRACC. LAS PLAYAS,** DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN LA DECLARACIÓN 3.3 DE ESTE CONTRATO Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO; SIENDO **"EL CONTRATISTA"** RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y QUE ÉSTOS CUMPLAN CON TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR **"LA SECRETARÍA"**, COMO SON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO SI SE INSERTASEN A LA LETRA COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO. FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA **(ANEXO I)** EL CUAL CONTIENE: EL CATALOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMA DE OBRA, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMA DE OBRA Y PLANOS DEL PROYECTO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA CUYA EJECUCIÓN SE CONTRATA ES POR LA CANTIDAD DE: **$1,724,137.43 (UN MILLON SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 43/100 M.N.)** MÁS IMPUESTO AL VALOR AGREGADO **$275,861.99 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS 99/100 M.N.)** CONSECUENTEMENTE EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO RESULTA DE **$1,999,999.42 (UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 42/100 M.N.),** DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO DE OBRA PRESENTADO.

EL MONTO TOTAL DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO CUBRE A **"EL CONTRATISTA"** TODAS LAS PRESTACIONES, GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA MISMA, INCLUYENDO LOS IMPUESTOS O DERECHOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE SE CAUSEN, SIENDO IMPROCEDENTE EL INCREMENTO AL PRECIO DE OPERACIÓN ESTABLECIDO.

"LA SECRETARÍA" LLEVARÁ A CABO LAS RETENCIONES FISCALES CORRESPONDIENTES, QUE SE ORIGINEN POR CONCEPTO DE LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN.

EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ES DE **62 DIAS** NATURALES, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA

31 DE OCTUBRE DEL 2020 Y A TERMINARLOS A MÁS TARDAR EL DÍA **31 DE DICIEMBRE DEL 2020,** DE CONFORMIDAD CON EL

PROGRAMA DE OBRA PRESENTADO POR **"EL CONTRATISTA"**. TODOS LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN ESTE CONTRATO SE ENTENDERÁN COMO DÍAS CALENDARIO, COMPRENDIENDO AQUELLOS QUE SEGÚN LA LEY SEAN INHÁBILES PERO CUANDO UN PLAZO TERMINE EN UN DÍA INHÁBIL, CONCLUIRÁ A LAS 24 HORAS DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE.

ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO QUE EL DÍA DE INICIO DE LOS TRABAJOS LA **RESIDENCIA**, HAGA LA APERTURA A LA BITÁCORA DE OBRA, INSTRUMENTO EN EL QUE DEBERÁN REFERIRSE LOS ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y POR MEDIO DE EL, DAR INSTRUCCIONES Y RECIBIR SOLICITUDES QUE SE FORMULEN ENTRE **LA RESIDENCIA Y LA SUPERINTENDENCIA**, EL USO DE LA BITÁCORA SE REGIRÁ CONFORME AL CAPÍTULO IV, SECCIÓN II, ARTÍCULOS 122, 123, 124 Y 125 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

OPERADO
FISM-2020

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

"**LA SECRETARÍA**" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE **"EL CONTRATISTA",** PREVIAMENTE A LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO; EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. EL DIFERIMIENTO SE CONSIGNARÁ EN EL CONVENIO QUE PARA TAL EFECTO CELEBREN LAS PARTES.

ASÍ MISMO, **"EL CONTRATISTA",** DEBERÁ TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS, ASÍ COMO LA PROPIEDAD O LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE VÍA Y EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES SOBRE LOS CUALES SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PREVISTAS POR LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERA PARA LA INICIACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS AMPARADOS POR EL PRESENTE CONTRATO.

QUINTA: ANTICIPO, PORCENTAJE, AMORTIZACIÓN Y COMPROBACIÓN.

PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, INICIO DE TRABAJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES, TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES DE INSTALACIÓN PERMANENTE Y DEMÁS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, **"LA SECRETARÍA"** OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL **50 % (CINCUENTA POR CIENTO)** DE LA ASIGNACIÓN APROBADA AL CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE **$862,068.71 (OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SESENTA Y OCHO PESOS 71/100 M.N.)** MAS EL I.V.A.

DICHOS ANTICIPOS SE OTORGARÁN EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA PARA SU CORRECTA APLICACIÓN, DEBIENDO SER ENTREGADO CONTRA LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE POR **"EL CONTRATISTA"** PARA TALES EFECTOS. REQUISITADA A LA PERSONA QUE ACREDITE ESTAR DEBIDAMENTE FACULTADA.

PARA EL CASO DE QUE **"LA SECRETARÍA"**, POR CAUSAS IMPUTABLES A LA MISMA, NO ENTREGASE A **"EL CONTRATISTA"** EL ANTICIPO EN LA FECHA PREVISTA, SE PODRÁ DIFERIR SIN MODIFICAR EL PLAZO PACTADO EN LA CLÁUSULA TERCERA, PARA CUYO EFECTO DEBERÁ

SUSCRIBIRSE ENTRE LAS PARTES EL CONVENIO DE DIFERIMIENTO RESPECTIVO, EL QUE CONTENDRÁ LAS NUEVAS FECHAS DE INICIACIÓN Y CONCLUSIÓN DE LA OBRA.

LA FALTA DE EXHIBICIÓN OPORTUNA DE LA FIANZA O SU PRESENTACIÓN EN TÉRMINOS DIFERENTES A LOS ESTABLECIDOS, ACARREARAN AUTOMÁTICAMENTE EL ATRASO EN LA FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO Y EN TAL EVENTO NO SERÁ PROCEDENTE EL OTORGAMIENTO DEL CONVENIO DE DIFERIMIENTO, POR LO TANTO **"EL CONTRATISTA"** DEBERÁ INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA CLÁUSULA TERCERA.

"LA SECRETARÍA", PODRÁ PRACTICAR REVISIONES Y AUDITORIAS EN CUALQUIER TIEMPO PARA COMPROBAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO, PARA TAL EFECTO, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A DAR LAS FACILIDADES NECESARIAS Y ACREDITAR FEHACIENTEMENTE LA APLICACIÓN DEL MISMO, EXHIBIENDO LAS FACTURAS DE LOS PAGOS EFECTUADOS A SUS PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

SI **"EL CONTRATISTA"** DESTINA EL IMPORTE DEL ANTICIPO A FINES DISTINTOS A LOS CONSIGNADOS, **"LA SECRETARÍA"**, PODRÁ OPTAR POR EXIGIR DE INMEDIATO A **"EL CONTRATISTA"** LA DEVOLUCIÓN DEL MISMO, Y ADEMÁS, OPTAR POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO QUE SE ESTABLECE EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.

EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL REMANENTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL.

EN EL SUPUESTO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS, CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, COMO SI SE TRATARÁ DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL TÉRMINO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"LA SECRETARÍA"**,

EN CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A REINTEGRAR A **"LA SECRETARÍA"**, EL SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA QUE SE DA POR RESCINDIDO ESTE CONTRATO, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS A SATISFACCIÓN DE **"LA RESIDENCIA"**, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADO, A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LOS TRABAJOS Y **"EL CONTRATISTA"** SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

EN EL SUPUESTO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL TÉRMINO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, ÉSTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS

OPERADO FISM-2020

FISCALES; DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"LA SECRETARÍA"**

LA PÓLIZA DE FIANZA DEL ANTICIPO, QUE GARANTICE LA CORRECTA INVERSIÓN Y EXACTA AMORTIZACIÓN Y EN SU CASO, DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS QUE:

a) LA FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD Y ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, PARA GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSIÓN DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO DE LA CONTRATANTE OTORGA A LA EMPRESA **IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.** Y SE COMPROMETE A PAGAR HASTA LA CANTIDAD QUE IMPORTE ESTA FIANZA, EN CASO DE QUE SU FIADO NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN O SEA RESCINDIDO EL CONTRATO.

b) EN EL CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA Y PARA EL CASO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN O EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE;

c) CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA Y ESTE EFECTUÉ LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, **"LA SECRETARÍA"**, DEBERÁ LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA SIEMPRE Y CUANDO SEA PROCEDENTE EN LOS TÉRMINOS AQUÍ ESTIPULADOS

d) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO, **"LA SECRETARÍA"**, QUE LA PRODUCIRÁ CUANDO EL IMPORTE DEL ANTICIPO HAYA SIDO AMORTIZADO O DEVUELTO EN SU TOTALIDAD Y SE HAYAN PAGADO EN SU CASO LOS ACCESORIOS.

e) QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

f) LA COMPAÑÍA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 178, 279, 280 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR, OTORGANDO LA AFIANZADORA EL CONSENTIMIENTO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 179 DEL CITADO ORDENAMIENTO.

g) QUE PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO SE SOMETE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO GUERRERO, RENUNCIANDO CUALQUIER OTRA QUE TUVIERE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO OFICIAL, EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. FIN DEL TEXTO

SEXTA: FORMA DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACIÓN

OPERADO
FISM-2020

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Roberto Posada y Comonfort S/N Col. Centro, Acapulco, Gro., C.P. 39300
Tel (744) 440 70 00 Ext. 4223 y 4227
www.acapulco.gob.mx

DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, QUE ABARCARÁN PERIODOS NO MAYOR DE UN MES CALENDARIO Y SERÁN PRESENTADAS POR **"EL CONTRATISTA"** A **LA RESIDENCIA**, DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE CORRESPONDIENTE, CONTANDO CON UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN A LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN PARA QUE **"LA SECRETARÍA"**, INICIE SU TRÁMITE DE PAGO.

OPERADO FISM-2020

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERÁN DE PAGARSE POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA, SIEMPRE Y CUANDO EL CONTRATISTA HAYA PRESENTADO LAS CORRECCIONES OBSERVADAS Y SE VALIDE LA FACTURA CORRESPONDIENTE POR EL AREA DE CONTROL ADMINISTRATIVO. EL PERIODO DE VEINTE DIAS PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES, SE CONTABILIZARA A PARTIR QUE EL CONTRATISTA ENTREGUE LAS CORRECCIONES AL ÁREA CORRESPONDIENTE.

EL RESIDENTE DE OBRA EFECTUARA LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE 15 DÍAS NATURALES CONTADOS APARTIR DE LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTE DE COSTOS POR PARTE DE **"LA SECRETARÍA"**, ÉSTA A SOLICITUD DE **"EL CONTRATISTA"** Y DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266, PAGARÁ GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"EL CONTRATISTA"**.

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO **"EL CONTRATISTA"**, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "LA DEPENDENCIA".

NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DEL CONTRATISTA SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁN COMO ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE **"LA SECRETARÍA."** TENDRÁ EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

SI **"EL CONTRATISTA"** REALIZA TRABAJOS EXCEDENTES O EXTRAORDINARIOS, SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE PARTE DEL "**RESIDENTE Y DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**", INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI LA MODIFICACIÓN ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ÉSTOS O POR SU PRESENTACIÓN INCORRECTA O EXTEMPORÁNEA, NO SERÁ MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS. PARA QUE **"EL CONTRATISTA"** PUEDA CANCELAR SU(S) FACTURA(S) UNA VEZ QUE SE HA(N) VALIDADO LA(S) MISMA(S), SERÁ NECESARIO CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE **"LA SECRETARIA".** LA CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS SIN ESTE REQUISITO, LIBERA AL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DE LA OBLIGATORIEDAD DEL PAGO. SE GIRARA OFICIO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE DICHA CANCELACIÓN PARA LO CONDUCENTE.

OPERADO
FISM-2020

SÉPTIMA: LUGAR DE PAGO:

EL PAGO POR CONCEPTO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS, LOS EFECTUARÁ LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, UBICADA EN COSTERA MIGUEL ALEMÁN No. 315 COL. CENTRO. C.P. 39300 EN ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO A TRAVÉS DE LA FORMA: TRANSFERENCIA BANCARIA MEDIANTE VÍA ELECTRÓNICA. EL PLAZO PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE RIGE POR EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266.

OCTAVA: GARANTÍAS.

A) GARANTÍA DE LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA CARTA DE ADJUDICACIÓN, DEBERÁ PRESENTAR A FAVOR Y A SATISFACCIÓN DEL **MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ**, FIANZA POR EL TOTAL DEL IMPORTE DEL ANTICIPO MAS I.V.A., OTORGADA POR INSTITUCIONES DE FIANZAS, DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

LA GARANTÍA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DE LOS ANTICIPOS, SE CANCELARÁ CUANDO **"EL CONTRATISTA"** HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DE LOS MISMOS, PREVIA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE "**LA SECRETARÍA**" EN EL CASO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** NO HAYA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO EN LA FECHA SEÑALADA EN LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE, SE HARÁ EFECTIVA LA FIANZA Y SE LE PENALIZARÁ CON LOS GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICIÓN DE "**LA SECRETARÍA**"

ESTA GARANTÍA SOLAMENTE SE LIBERARÁ CUANDO SE HAYA AMORTIZADO TOTALMENTE EL ANTICIPO CONCEDIDO.

B) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE HABER RECIBIDO LA CARTA DE ADJUDICACIÓN A CONSTITUIR UNA FIANZA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, MISMA QUE ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"**, Y ÉSTE HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FINIQUITO, **"LA SECRETARÍA"** DEBERÁ LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA; EN CASO CONTRARIO, **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS.

OPERADO FISM-2020

C) GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, **"EL CONTRATISTA"** MEDIANTE FIANZA EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO MAS I.V.A. EXPEDIDA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN CONTRAVENCIÓN AL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS DATOS DEL PROYECTO ANEXO A ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 77 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, ASÍ COMO LOS NUMERALES 89, 94, 95, 96, 97 Y 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LA PÓLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS QUE.

a) LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD;

b) LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS;

c) CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN MÁS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ÉSTA FIANZA SE SUBSTITUIRÁ EN EL O LOS SIGUIENTES EJERCICIOS POR OTRO U OTRAS EQUIVALENTES AL IMPORTE DE LOS TRABAJOS FALTANTES POR EJECUTAR, ACTUALIZANDO LOS IMPORTES DE ACUERDO CON LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS Y MODIFICACIONES CONVENIDAS SI LAS HUBIERE;

d) EN EL CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA Y PARA EL CASO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN O EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE

e) LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACIÓN DE **"LA SECRETARÍA"**

f) ÉSTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O DE **"LA SECRETARÍA"**, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA;

g) QUE LA FIANZA SE OTORGA TAMBIÉN PARA GARANTIZAR LA CORRECCIÓN DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN QUE RESULTEN, DE LOS VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

h) LA FIANZA SE CANCELARÁ CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE **"LA SECRETARÍA"**, SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERÁ LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ÉSTA CONTINUARÁ VIGENTE; Y,

i) CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA Y ESTE EFECTUÉ LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, **"LA SECRETARÍA"**, DEBERÁ LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA, SIEMPRE Y CUANDO SEA PROCEDENTE EN LOS TÉRMINOS AQUÍ ESTIPULADOS

j) LA FIANZA CONTINUARA EN VIGOR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO ALGUNA RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA POR DEFECTOS DE LA OBRA, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, **"EL CONTRATISTA"** GARANTIZA LOS MISMOS EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 77 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266 Y 95 DEL REGLAMENTO, POR LO QUE TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE) MESES, SIN QUE EXISTA RECLAMACIÓN ALGUNA POR PARTE DE **"LA SECRETARÍA"**, LA FIANZA QUEDARÁ CANCELADA, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE **"LA SECRETARÍA"**, PARA CANCELAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE.

k) EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS POR PARTE DE **"EL CONTRATISTA"**, **"LA SECRETARÍA"** LO COMUNICARÁ DE INMEDIATO Y POR ESCRITO A LA AFIANZADORA A EFECTO DE QUE ÉSTA NO SEA CANCELADA Y NOTIFICARA POR ESCRITO AL **"CONTRATISTA"** PARA QUE ÉSTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, TRANSCURRIDO ÉSTE TÉRMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO, **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA ESTA FIANZA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO A **"EL CONTRATISTA"** LA RESOLUCIÓN DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. SI LA CORRECCIÓN O REPOSICIÓN REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, **"EL CONTRATISTA"** Y **"LA SECRETARÍA"**, PODRÁN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE ESTA PÓLIZA DE FIANZA;

OPERADO FISM-2020

l) LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 178, 279, 280 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR; OTORGANDO LA AFIANZADORA EL CONSENTIMIENTO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTICULO 179 DEL CITADO ORDENAMIENTO.

m) LA FIANZA SE HARÁ EFECTIVA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA A **"EL CONTRATISTA"** LA RESOLUCIÓN DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO;

SI **"EL CONTRATISTA"** NO PRESENTARA LAS GARANTÍAS EN LA FORMA Y TÉRMINOS SEÑALADOS, **"LA SECRETARÍA"** PODRÁ DETERMINAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

NOVENA: AJUSTE DE COSTOS.

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO Y AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE.

PARA OBTENER EL AJUSTE DE LOS PRECIOS UNITARIOS SE CONSIDERARAN LOS TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS SIGUIENTES:

I.- LA REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE;

II.- LA REVISIÓN POR GRUPO DE PRECIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN CUANDO MENOS EL OCHENTA POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO; Y

III.- EN CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE SE TENGA ESTABLECIDA LA PROPORCIÓN EN QUE INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO PODRÁ DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN DICHAS PROPORCIONES.

LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DESCRITOS SE SUJETARÁ A LO SIGUIENTE:

A) LOS AJUSTES SE CALCULARÁN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL "PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO" EN EL CONTRATO O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A **"EL CONTRATISTA"**, CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

CUANDO POR CAUSA IMPUTABLE AL **"CONTRATISTA"** EXISTIERA ATRASO, PROCEDERÁ EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA PRESENTADO EN SU PROPUESTA.

B) LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERÁN CALCULADOS CON BASE EN LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIO PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO. CUANDO LOS ÍNDICES QUE REQUIERA **"EL CONTRATISTA"** Y **"LA SECRETARÍA"** NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO

OPERADO
FISM-2020

"LA SECRETARÍA" POR CONDUCTO DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS PROCEDERÁ A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE EXPIDA EL BANCO DE MÉXICO;

C) LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS QUE **"EL CONTRATISTA"** HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA; Y

D) A LOS DEMÁS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO EMITA LA CONTRALORÍA.

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DEBERÁ CUBRIRSE POR PARTE DE **"LA SECRETARÍA"** A SOLICITUD DE **"EL CONTRATISTA"** A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE **"LA SECRETARÍA"** RESUELVA POR ESCRITO SOBRE LA PROCEDENCIA DE SU PETICIÓN. APLICANDO AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIÉNDOSE APLICAR LOS ÚLTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERÁN ACUMULARSE. EN CASO DE PRESENTARSE REDUCCIÓN EN LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SE PRACTICARÁ UNA REVISIÓN, Y DE SER PROCEDENTE, SE EFECTUARÁ EL AJUSTE CORRESPONDIENTE.

OPERADO FISM-2020

DECIMA: SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.

"LA SECRETARÍA" A TRAVÉS DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRÁ EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A **"EL CONTRATISTA"** POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCIÓN EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE SEAN ORDENADAS.

POR SU PARTE **"LA SECRETARÍA"** EN APEGO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 Y 112 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DESIGNA COMO SU REPRESENTANTE DIRECTO EN LA OBRA PARA PODER TRATAR LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON, O DERIVADOS DE, LOS TRABAJOS A **EL C. ING. FELIPE LUNA MEDINA, "LA SECRETARÍA"** DESIGNARA POR ESCRITO AL **RESIDENTE** RESPONSABLE DE LA OBRA, CON LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES MENCIONADAS EN EL ARTÍCULO 113 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

"LA SECRETARÍA" PODRÁ ORDENAR LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA DE LOS TRABAJOS CUANDO **"EL CONTRATISTA"** NO CUMPLA LAS ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO O EN SU CASO, A LAS INSTRUCCIONES RECIBIDAS POR ESCRITO O EN LA BITÁCORA DE OBRA POR PARTE DEL **RESIDENTE**, DEBIENDO **"EL CONTRATISTA"** REALIZARLAS POR SU CUENTA Y SIN DERECHO A RETRIBUCIÓN ALGUNA. ASÍ MISMO **"LA SECRETARÍA"** PODRÁ ORDENAR LA **SUSPENSIÓN** TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA CONTRATADA, EN TANTO SE LLEVEN A CABO LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN O REPOSICIÓN, SIN QUE SEA MOTIVO DE AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS.

"LA CONTRATISTA" DEBERA CONTAR CON LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES PARA LAS PRUEBAS DE SUS OBRAS, EL CUAL DEBERÁ ESTAR ACREDITADO ANTE **"LA SECRETARIA"**. NO SE ACEPTARÁN PRUEBAS DE LABORATORIOS QUE NO ESTEN ACREDITADOS.

PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS CONTRATADAS, **"LA SECRETARIA"** CONTARÁ CON LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES EXTERNO, EL CUAL ELABORARÁ LAS PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, REVENIMIENTO, RESISTENCIA DE LOS CONCRETOS Y CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LAS OBRAS CONTRATADAS.

DÉCIMA PRIMERA: REPRESENTANTE DEL "CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER LA RESIDENCIA DE OBRA DEBIENDO ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE SERA EL **SUPERINTENDENTE** DE CONSTRUCCIÓN Y PARA TAL EFECTO **"EL CONTRATISTA"** DESIGNA AL **ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO** CON CÉDULA PROFESIONAL No. **2220846** EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES EL **22 DE NOVIEMBRE DEL 1995,** REGISTRADO COMO RESPONSABLE TÉCNICO, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES TÉCNICAS EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

QUE DEBERÁ CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, CATÁLOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCIÓN Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN Y NORMAS DE CALIDAD, BITÁCORA, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL **SUPERINTENDENTE** DE CONSTRUCCIÓN DESIGNADO POR **"EL CONTRATISTA"**, TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE CONOCER EL CONTRATO, EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEBERÁ ESTAR FACULTADO PARA DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA ACEPTAR U OBJETAR LAS ESTIMACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN Y, EN GENERAL, PARA ACTUAR A NOMBRE DEL **"CONTRATISTA"** CON LAS FACULTADES LEGALES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

EL **SUPERINTENDENTE** DE CONSTRUCCIÓN DEBE ESTAR FACULTADO POR **"EL CONTRATISTA"**, PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, ASÍ COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"LA SECRETARÍA" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, Y DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCIÓN DEL MISMO, Y **"EL CONTRATISTA"** EN UN PLAZO DE CINCO DÍAS NATURALES TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOMBRAR A OTRO QUE REÚNA LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DE ESTA CLÁUSULA.

DÉCIMA SEGUNDA: RELACIONES LABORALES.

"EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL.

ERADO
FISM-2020

"EL CONTRATISTA" CONVIENE, POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE **"LA SECRETARÍA"**, QUIEN QUEDA EXCLUIDO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD ANTE RECLAMACIONES JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES.

DE IGUAL FORMA, **"EL CONTRATISTA"** RESPONDERÁ POR CUALQUIER RELACIÓN JURÍDICA QUE SE ORIGINE POR ACTOS JURÍDICOS CONTRAÍDOS CON PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS Y DEMÁS OPERARIOS QUE CONTRATE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, MATERIA DE ESTE CONTRATO.

DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DEL "CONTRATISTA".

CON EL OBJETO DE LLEVAR UNA PERMANENTE VIGILANCIA DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN **"EL CONTRATISTA"** DEBERÁ RESPONDER POR LA DEBIDA CAPACIDAD Y PROFESIONALISMO DE SUS TÉCNICOS Y TRABAJADORES QUE EJECUTEN LA OBRA, PERMITIENDO EN TODO MOMENTO Y OTORGANDO TODAS LAS FACILIDADES NECESARIAS AL PERSONAL TÉCNICO DE **"LA SECRETARÍA"** PARA REALIZAR LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN, PROPORCIONANDO TODA LA INFORMACIÓN QUE SEA REQUERIDA DE IGUAL FORMA.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS, Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE **"LA SECRETARÍA"**; ASÍ, COMO A RESPONDER, POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, SE LLEGUEN A CAUSAR A **"LA SECRETARÍA"**, O A TERCEROS; EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO HASTA POR SU MONTO TOTAL.

IGUALMENTE, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES Y TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARAN ESTE CONTRATO (ESTIMACIONES DE OBRA, FACTURAS O CONTRA RECIBOS) SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE **"LA SECRETARÍA"**.

"EL CONTRATISTA" NO PODRÁ SUBCONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA O PARTE DE LA MISMA.

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CUANDO ÉSTOS NO SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE POR ESCRITO LE PROPORCIONE **"LA SECRETARÍA"** ÉSTE ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA Y SERÁN POR CUENTA DE **"EL CONTRATISTA"**.

"EL CONTRATISTA" DEBERÁ SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD QUE **"LA SECRETARÍA"** TENGA ESTABLECIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, A LOS DEMÁS REGLAMENTOS U ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA, ASI COMO, LOS LINEAMIENTOS DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA SALUD QUE DEBERÁ CUMPLIR EL SECTOR DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL **COVID-19** CON EL OBJETIVO DE EVITAR EL CONTAGIO Y CONTENER LA PROPAGACIÓN.

OPERADO
FISM-2020

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Roberto Posada y Comonfort S/N Col. Centro, Acapulco, Gro., C.P. 39300
Tel (744) 440 70 00 Ext. 4223 y 4227
www.acapulco.gob.mx

"EL CONTRATISTA" SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A **"LA SECRETARÍA"** O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS POR NO AJUSTARSE AL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES. LOS RIESGOS Y LA CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA DEFINITIVA A **"LA SECRETARÍA"**, SERÁN A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"**.

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE TODOS LOS ADEUDOS QUE FRENTE AL FISCO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL TENGA, CON MOTIVO DE CONTRIBUCIONES QUE SE CAUSEN COMO CONSECUENCIA Y EN EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE CONTRATAN (IMPUESTOS, DERECHOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL)

OPERADO
FISM-2020

DÉCIMA CUARTA: MODIFICACIONES AL CONTRATO.

"LA SECRETARÍA" PODRÁ DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, MODIFICAR ESTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NÚMERO 266.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARÍAN EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRÁN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERÁN SER SUSCRITOS BAJO RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE HAYAN FIRMADO EL CONTRATO O QUIENES LOS SUSTITUYAN EN EL CARGO. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRÁN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NÚMERO 266.

LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRÁN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE EN REDUCCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN O MONTO DEL MISMO. SI SE MODIFICA EL PLAZO, LOS PERIODOS SE EXPRESARÁN EN DÍAS NATURALES, Y LA DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE VARIACIÓN SE HARÁ CON RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO; EN TANTO QUE SI ES AL MONTO, LA COMPARACIÓN SERÁ CON BASE EN EL MONTO CONVENIDO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SERÁN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AÚN CUANDO PARA FINES DE SU FORMALIZACIÓN PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.

LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO LAS PARTES CONVIENEN EN QUE **"EL CONTRATISTA"** PODRÁ SOLICITAR POR ESCRITO UNA AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, SIEMPRE QUE POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR, CASOS FORTUITOS O CUALESQUIERA OTRA CAUSA NO IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA"**, LE FUERE IMPOSIBLE CUMPLIR CABALMENTE EN EL PLAZO ESTABLECIDO.

LAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN QUE **"LA SECRETARÍA"** TIENE LA FACULTAD DE AUTORIZAR O DENEGAR LA SOLICITUD, CUANDO A SU JUICIO EXISTAN LOS ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEN FEHACIENTEMENTE O NO LA PROCEDENCIA.

SE DEBERÁ SUSTENTAR EL DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, SEGÚN SEA EL CASO, CONSIDERÁNDOSE ÉSTOS PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA **"EL CONTRATISTA"** Y **"LA SECRETARÍA"** LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN.

DÉCIMA QUINTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.

"LA SECRETARÍA" EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA, PARA LO CUAL SE ELABORARÁ UN DICTAMEN QUE JUSTIFIQUE LAS CAUSAS QUE MOTIVAN LA SUSPENSIÓN, ESTABLECIENDO EL PLAZO DE LA SUSPENSIÓN, QUE PODRÁ PRORROGARSE SI LAS CIRCUNSTANCIAS QUE DIERON ORIGEN A LA INTERRUPCIÓN PERSISTEN, DEBIENDO INFORMAR EL CONTENIDO DE ESTA RESOLUCIÓN A **"EL CONTRATISTA"**; EN ESTE CASO SE INTERRUMPIRÁ EL CALENDARIO ORIGINALMENTE PREVISTO PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, SIN QUE ESTO IMPLIQUE LA CANCELACIÓN, EXTINCIÓN O DISMINUCIÓN DE LAS GARANTÍAS OTORGADAS.

CUANDO OCURRA LA SUSPENSIÓN, EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR **"LA SECRETARÍA"** NOTIFICARÁ POR ESCRITO A **"EL CONTRATISTA"**, SEÑALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

EN CASO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** HAYA SUSPENDIDO LOS TRABAJOS, CON BASE A LA INSTRUCCIÓN RECIBIDA POR ESCRITO, LA FECHA DE TERMINACIÓN SE PRORROGARÁ EN IGUAL PROPORCIÓN AL PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSIÓN, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIDO, FORMALIZÁNDOLA MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN, LA QUE CONTENDRÁ COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ARTÍCULO 147 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA SUSPENSIÓN SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"**, DEBIENDO ÚNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE SUSPENSIÓN Y LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAJOS RESULTEN DAÑADOS O DESTRUIDOS Y ÉSTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERÁN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRÉ EL CONVENIO PARA CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA"**.

NO SERÁ MOTIVO DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE **"EL CONTRATISTA"**.

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS O SI LA SUSPENSIÓN EXCEDE SEIS MESES **"EL CONTRATISTA"** TENDRÁ DERECHO A SOLICITAR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO, ATENDIENDO A LAS CIRCUNSTANCIAS DE CADA CASO EN CONCRETO.

OPERADO
FISM-2020

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN.

DÉCIMA SEXTA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

"LA SECRETARÍA" PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL MUNICIPIO; O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS. DE PRESENTARSE ESTA SITUACIÓN, **"LA SECRETARÍA"** PAGARÁ A **"EL CONTRATISTA"** LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

DE IGUAL FORMA, CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, **"EL CONTRATISTA"** PODRÁ SUSPENDER LAS OBRAS EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR SU SOLICITUD A **"LA SECRETARÍA"**, QUIEN RESOLVERÁ DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA MISMA, EN CASO DE NEGATIVA, SERÁ NECESARIO QUE **"EL CONTRATISTA"** OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL CORRESPONDIENTE LA DECLARATORIA RESPECTIVA.

SE ENTIENDE POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, AQUELLOS FENÓMENOS DE LA NATURALEZA O HECHOS DE PERSONAS CON AUTORIDAD PÚBLICA, GENERAL, INSUPERABLE, IMPREVISIBLE, O QUE PREVIÉNDOSE NO SE PUEDAN EVITAR, Y QUE ORIGINEN QUE UNA PERSONA REALICE UNA CONDUCTA DAÑOSA, CONTRARIA A UN DEBER JURÍDICO O A UNA OBLIGACIÓN. FENÓMENOS DE LA NATURALEZA O HECHOS DEL HOMBRE, TALES COMO (ENUNCIATIVAMENTE MAS NO LIMITATIVA) MOTINES, ACTOS DE TERRORISMO, CUARENTENAS, EPIDEMIAS, GUERRAS (DECLARADAS O NO), DISTURBIOS CIVILES, INSURRECCIONES, INCENDIOS (CUANDO NO SE HAYA DADO CAUSA O CONTRIBUIDOS A ELLOS), TORMENTAS, IMPIDIÉNDOLE TEMPORALMENTE O DEFINITIVAMENTE EN FORMA ABSOLUTA EL CUMPLIMIENTO PARCIAL O TOTAL DE LA OBLIGACIÓN, SIN QUE TALES HECHOS LE SEAN IMPUTABLES DIRECTA O INDIRECTAMENTE Y CUYA AFECTACIÓN NO PUEDE EVITARSE CON LOS INSTRUMENTOS DE QUE NORMALMENTE SE DISPONGA, YA PARA PREVENIR EL ACONTECIMIENTO O PARA OPONERSE A EL Y RESISTIRLO.

ASÍ MISMO, LA EXTINCIÓN O PÉRDIDA DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE **"EL CONTRATISTA"** DARÁ LUGAR A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, ACORDÁNDOSE PAGAR A SUS SUCESORES O BENEFICIARIOS LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERÁN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITÁCORA, DEBIENDO **"LA SECRETARÍA"** LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS INDICADOS POR EL ARTÍCULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO A **"EL CONTRATISTA"** POR **"LA SECRETARÍA"** ÉSTA PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES

OPERADO
FISM-2020

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Roberto Posada y Comonfort S/N Col. Centro, Acapulco, Gro., C.P. 39300
Tel (744) 440 70 00 Ext. 4223 y 4227
www.acapulco.gob.mx

RESPECTIVAS Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE **"EL CONTRATISTA"**, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A **"LA SECRETARÍA"** EN UN TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

CUANDO SE DÉ POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, DEBERÁ ELABORARSE EL FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 168,169, 170, 171 y 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DÉCIMA SÉPTIMA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

LA SECRETARÍA" PODRÁ, EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA"** POR LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS, CONFORME A LO QUE ESTABLECE EL ART. 72 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, Y 154, 155, Y 157 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO, SUS ANEXOS Y EN SU CASO, DE SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS.

DARÁN LUGAR A DETERMINAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN LOS SUPUESTOS SIGUIENTES:

I. POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266 Y EL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS;

II. INTERRUMPA INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O SE NIEGUE A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS QUE SE HAYA DETECTADO COMO DEFECTUOSA POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD;

III. NO EJECUTE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATE LAS ÓRDENES DADAS POR EL RESIDENTE;

IV. NO DÉ CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN CONVENIDOS POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y, A JUICIO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO. NO IMPLICARÁ RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO Y, POR TANTO, NO SE CONSIDERARÁ COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISIÓN, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR LA FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES O LA FALTA DE INFORMACIÓN REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FÍSICA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, DE LICENCIAS Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR LA CONTRATANTE, ASÍ COMO CUANDO LA DEPENDENCIA O ENTIDAD HAYA ORDENADO LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS;

OPERADO
FISM-2020

V. SEA DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANÁLOGA;

VI. SUBCONTRATE PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD;

VII. TRANSFIERA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD;

VIII. NO DÉ A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS;

IX. CAMBIE SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD;

X. SI SIENDO EXTRANJERO, INVOQUE LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL CONTRATO;

XI. INCUMPLA CON EL COMPROMISO QUE, EN SU CASO, HAYA ADQUIRIDO AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, RELATIVO A LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, Y

XII. EN GENERAL, INCUMPLA CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO.

LAS CAUSALES REFERIDAS DAN LUGAR A LA RESCISIÓN INMEDIATA DE ESTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA **"LA SECRETARÍA"**, ADEMÁS DE QUE SE LE APLIQUEN A **"EL CONTRATISTA"** LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISIÓN, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACIÓN DE UNO O DE OTRO, INDEPENDIENTEMENTE DE HACER EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y APLICARSE EN SU CASO A **"EL CONTRATISTA"** LOS DEMÁS CARGOS QUE PROCEDAN.

"LAS PARTES "CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** SE ENCUENTRE EN ALGUNA DE LAS CAUSALES INDICADAS EN LA CLÁUSULA ANTERIOR, EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA SE SUJETARÁ A LO SIGUIENTE:

1. EL PROCEDIMIENTO INICIARÁ A PARTIR DE QUE **"LA SECRETARÍA"** LE NOTIFIQUE A "**EL CONTRATISTA"** POR OFICIO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, SEÑALANDO LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVARON SU DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, RELACIONÁNDOLO CON LAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

2. TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE EL NUMERAL ANTERIOR, **"LA SECRETARÍA"** RESOLVERÁ CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER **"EL CONTRATISTA".**

3. LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO POR PARTE DE **"LA SECRETARÍA"**, DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A **"EL**

OPERADO
FISM-2020

CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 1(UNO) DE ESTA CLÁUSULA.

UNA VEZ NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, **"LA SECRETARÍA"** SE ABSTENDRÁ, COMO MEDIDA PRECAUTORIA, DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA COMUNICACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS.

EN EL FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME EL PROGRAMA VIGENTE, ATENDIENDO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 162 Y 163 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO **"LA SECRETARÍA"** LE HAYA ENTREGADO A **"EL CONTRATISTA"**, ASÍ COMO CONSIDERAR EN SU INTEGRACIÓN LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE HAYA REALIZADO **"EL CONTRATISTA"** HASTA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO LOS EQUIPOS, MATERIALES QUE SE HUBIERAN INSTALADO EN LA OBRA O SE ENCUENTREN EN PROCESO DE FABRICACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SEAN SUSCEPTIBLES DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266 Y 161 DEL REGLAMENTO.

EL SOBRECOSTO QUE SE DETERMINE AL ELABORAR EL FINIQUITO, SERÁ INDEPENDIENTE DE LAS GARANTÍAS, PENAS CONVENCIONALES Y DEMÁS CARGOS QUE DEBAN CONSIDERARSE EN LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.

COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO PROCEDERÁ A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE **"EL CONTRATISTA"**, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN Y ANTES DE SU CONCLUSIÓN, **"LA SECRETARÍA"** PODRÁ A SU JUICIO, SUSPENDER EL TRÁMITE DEL CITADO PROCEDIMIENTO, CUANDO SE HUBIERE INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO. EN EL CASO DE QUE SE DETERMINE NO RESCINDIR EL CONTRATO, SE REPROGRAMARÁN LOS TRABAJOS UNA VEZ NOTIFICADA LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE POR **"LA SECRETARÍA"** A **"EL CONTRATISTA".**

"LA SECRETARÍA" PODRÁ OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISIÓN, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACIÓN DE UNAS O DE OTRO.

DECIMA OCTAVA: PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE ESTE CONTRATO, **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** CONVIENEN LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES RETENCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES:

A).-"LA SECRETARÍA" TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR MENSUALMENTE SI LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR **"EL CONTRATISTA"** DE ACUERDO

OPERADO
FISM-2020

OPERADO FISM-2020

CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO; PARA LO CUAL, "**LA SECRETARÍA**" COMPARARÁ EL AVANCE MES A MES CONTRA EL PROGRAMA, Y LOS TRABAJOS EFECTIVOS EJECUTADOS.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE, "**LA SECRETARÍA**" PROCEDERÁ A HACER LAS RETENCIONES ECONÓMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN QUE SE DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA, HASTA LA DE REVISIÓN. LAS RETENCIONES SERÁN DETERMINADAS ÚNICAMENTE EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO OPORTUNAMENTE CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

CUANDO **"EL CONTRATISTA"** REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO SEÑALADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN, PODRÁ RECUPERAR LAS RETENCIONES ECONÓMICAS QUE SE LE HAYAN EFECTUADO, POR LO QUE "**LA SECRETARÍA**" LE REINTEGRARÁ EL IMPORTE DE LAS MISMAS QUE AL MOMENTO DE LA REVISIÓN TUVIERA ACUMULADAS.

LA APLICACIÓN DE ESTAS RETENCIONES TENDRÁ EL CARÁCTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, ÉSTOS NO SE HAN CONCLUIDO.

B).- SI **"EL CONTRATISTA"** NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO Y EN EL PROGRAMA DE TRABAJO, "**LA SECRETARÍA**" LE APLICARÁ LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR CADA MES O FRACCIÓN QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACIÓN PACTADA EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO HASTA EL MOMENTO DE SU TERMINACIÓN. DICHAS PENAS NO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES SE DESCONTARÁN ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN Y EL DE LAS PENAS CONVENCIONALES EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, Y SE APLICARÁN, SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA"** Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL QUE A JUICIO DE "**LA SECRETARÍA**" NO SE ATRIBUYA A CULPA DE **"EL CONTRATISTA"**.

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN, "**LA SECRETARÍA**" PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, O BIEN, LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA GARANTÍA DEL ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGÚN PROCEDA EN LA RESCISIÓN, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

SI "**LA SECRETARÍA**" OPTA POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, SE APEGARÁ A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA DE ESTE CONTRATO.

DECIMA NOVENA: TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARÁ A TRAVÉS DE LA BITÁCORA O POR ESCRITO A "**LA SECRETARÍA**" SOBRE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS ANEXANDO LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRÁ UNA RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA, Y ÉSTA VERIFICARÁ DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, SALVO QUE SE PACTE EXPRESAMENTE OTRO PLAZO, QUE LOS MISMOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS.

OPERADO FISM-2020

SI DURANTE LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, "**LA SECRETARÍA**" ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, DEBERÁ SOLICITAR A **"EL CONTRATISTA"** SU REPARACIÓN, A EFECTO DE QUE ÉSTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS. EN TAL CASO, EL PLAZO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE PODRÁ PRORROGAR POR EL PERIODO QUE ACUERDEN "**LA SECRETARÍA**" Y **"EL CONTRATISTA"** PARA LA REPARACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE **"LA SECRETARÍA"** OPTE POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO.

UNA VEZ QUE SE HAYA CONSTATADO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR "**LA SECRETARÍA**" PROCEDERÁ A LA RECEPCIÓN FORMAL DE LOS MISMOS, EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, SUSCRIBIENDO EL **"ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN"** EN LA QUE CONSTE ESTE HECHO, DEBIENDO CONTENER COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 166 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR **A** "**LA SECRETARÍA**" DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE **A** "**LA SECRETARÍA**" HAYA CONSTATADO LA TERMINACIÓN REAL DE LOS TRABAJOS, TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL **FINIQUITO DEL CONTRATO**, INCLUYENDO ESTIMACIONES POR CONCEPTO DE OBRA EJECUTADA, CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA FUERA DE CATÁLOGO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, SOLICITUD DE AJUSTE A LOS COSTOS POR CONCEPTO DE IMPACTO INFLACIONARIO (EN CASO DE EXISTIR) Y **PLANO DE OBRA TERMINADA** EN EL QUE SE PLASMEN TODAS LAS MODIFICACIONES Y ADECUACIONES AL PROYECTO ORIGINAL PROPORCIONADO **"EL CONTRATISTA"** PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, TODO DEBIDAMENTE JUSTIFICADO Y CON LOS APOYOS NECESARIOS PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN POR PARTE DE **A** "**LA SECRETARÍA**".

"**LA SECRETARÍA**" NO ESTARÁ OBLIGADA A DAR TRÁMITE A LAS SOLICITUDES O DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTE SI **"EL CONTRATISTA"** NO CUMPLIESE CON LA ENTREGA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN ESTA CLÁUSULA.

VIGÉSIMA: FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR "**LA SECRETARÍA**" Y **"EL CONTRATISTA"** EN ESTE CONTRATO, SE DEBERÁ ELABORAR EL **FINIQUITO DE OBRA** CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Roberto Posada y Comonfort S/N Col. Centro, Acapulco, Gro., C.P. 39300
Tel (744) 440 70 00 Ext. 4223 y 4227
www.acapulco.gob.mx

"LA SECRETARÍA" DEBERÁ NOTIFICAR POR OFICIO A **"EL CONTRATISTA"** LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL FINIQUITO; **"EL CONTRATISTA"** TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE ACUDIR AL LLAMADO QUE SE LE HAGA MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO. EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERÁ REUNIR COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTÍCULO 170 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS EL FINIQUITO DEBERÁ SER ELABORADO POR **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, HACIÉNDOSE CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE, DEBIENDO EXPONER, EN SU CASO, LAS RAZONES DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, **"EL CONTRATISTA"** NO ACUDA CON **"LA SECRETARÍA"** PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL TÉRMINO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR POR OFICIO SU RESULTADO A **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DEL TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A **"EL CONTRATISTA"**, ÉSTE TENDRÁ EL TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA; SI TRANSCURRIDO ESTE TÉRMINO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO.

SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE **"EL CONTRATISTA"**, **"LA SECRETARÍA"** DEBERÁ LIQUIDARLOS DENTRO DEL TÉRMINO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES. SI RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE **"LA SECRETARÍA"** EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRÁ DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES ÉSTOS, DEBERÁ EXIGIRSE POR OFICIO SU REINTEGRO, MÁS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"LA SECRETARÍA"**, EN CASO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO, **"LA SECRETARÍA"** PODRÁ HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES. EN FORMA SIMULTÁNEA, SE LEVANTARÁ EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DÉ POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** EN ESTE CONTRATO, LA QUE DEBERÁ REUNIR COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS SEÑALADOS POR EL ARTÍCULO 172 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA LIQUIDACIÓN DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO PODRÁ UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** EN ESTE CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR ÚNICAMENTE UNA MANIFESTACIÓN DE **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE TENDRÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE CONTRATO, SIN DERECHO A

OPERADO
FISM-2020

RECLAMACIÓN. AL NO SER FACTIBLE EL PAGO EN EL TÉRMINO INDICADO, SE PROCEDERÁ A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** EN ESTE CONTRATO.

VIGÉSIMA PRIMERA: OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS.

"EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

- **EL 0.005** (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN PARA CUMPLIR CON EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, LO ANTERIOR, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

- **EL 0.002** (DOS AL MILLAR) PARA LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES AFILIADAS A LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO DE FECHA **06 DE MARZO DE 2019**, CELEBRADO POR LA MENCIONADA CÁMARA Y EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN CON **"LA SECRETARÍA"**, CON EL OBJETO DE APOYAR LA CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

- **EL 1.0%** (UNO PUNTO CERO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION POR CONCEPTO DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEPENDIENTE DE **"LA SECRETARÍA"**, CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. ASI COMO, PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS NECESARIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.

OPERADO
FISM-2020

VIGÉSIMA SEGUNDA: PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO.

"LAS PARTES" CONVIENEN, QUE EN EL CASO DE QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SURJAN DISCREPANCIAS RELATIVAS A CONCEPTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ÉSTAS DEBERÁN REGISTRARSE E INFORMARSE POR **"LAS PARTES"** MEDIANTE NOTA EN BITÁCORA, ACORDANDO QUE RESOLVERÁN LA DISCREPANCIA EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE DICHO REGISTRO, EN CONSECUENCIA, LA SOLUCIÓN Y LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR, DE IGUAL FORMA SE ASENTARÁN POR **"LAS PARTES"** EN LA BITÁCORA. SI NO SE RESOLVIERA LA CONTROVERSIA EN EL PERIODO SEÑALADO, SE TURNARÁ AL DIRECTOR DE OBRA PARA QUE RESUELVA LA CONTROVERSIA EN EL MOMENTO.

VIGÉSIMA TERCERA: JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES.

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CON SEDE EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, POR LO TANTO, **"EL CONTRATISTA"** RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

LEÍDO POR LAS PARTES QUE EN ÉL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS FOJAS ÚTILES EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO; EL DÍA **21 DE OCTUBRE DEL 2020.**

POR "LA SECRETARÍA"

C. ING. ARQ. ARMANDO JAVIER SALINAS.
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"EL CONTRATISTA"

IRINA SALGADO HERNANDEZ
IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

OPERADO
FISM-2020

H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez 2018 - 2021

000382

BIENESTAR

"2020, Año Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN Y FINIQUITO DE OBRA PÚBLICA

LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE, QUEDANDO COMO GARANTÍA DE LO ANTES SEÑALADO, LA FIANZA NUM. **012621-000000,** EXPEDIDA POR LA AFIANZADORA: TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO, DEMOLICION A MAQUINA DE CONCRETO ASFALTICO, DEMOLICION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN MAL ESTADO DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA INSTALACION DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 12", RELLENO EN CEPAS DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC., APERTURA DE CAJA POR MEDIOS MECANICOS, AFINE Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE, EXCAVACION A MANO PARA TUB. DE 4" DE PVC HIDRAULICO, COLOCACION DE TOMAS DOMICILIARIAS Y DESCARGAS SANITARIAS, RELLENO DE CEPAS, AFINE Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE, SUM. Y COLOCACION DE BOMBAS SUMERGIBLES TRITURADORAS DE 2", DE TABLERO DUPLEX EN GABINETE CON INTERRUPTORES Y CONTACTOS, ELABORACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, FORMACION DE BASE AL 90% PROCTOR, SUM. Y COLOC. DE MEMBRANA DE POLIETILENO, COLOCACION DE PAVIMENTO PREMEZCLADO F´C=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESP. DENTELLON DE CONCRETO, CORTE EN LOSAS Y CALAFATEO EN LAS MISMAS, MACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, DEMOLICIONES Y EXCAVACION, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL MÁRGEN Y AL CALCE LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
IRINA SALGADO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

POR EL H. AYUNTAMIENTO:

ING. FELIPE LUNA MEDINA
RESIDENTE DE OBRA

ING. ARQ. MELECIO VAZQUEZ PELAEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA.

ARQ. FRANCISCO JAVIER CHAVARRIA PEÑALOZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez 2018 - 2021

BIENESTAR

"2020, Año Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN Y FINIQUITO DE OBRA PÚBLICA

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA **19 DE DICIEMBRE DE 2020** Y HABIÉNDOSE VERIFICADO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: **MAJ-FAISM/263-2020/AD,** CONSISTENTES EN **PAVIMENTACION DE CALLE PRIV. SANTA MARIA DEL MAR** UBICADA EN **FRACC. LAS PLAYAS** , DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.

SE PROCEDE A LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRA BAJO LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES: LOS TRABAJOS, OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ANTES CITADO, FUERON REALIZADOS POR LA EMPRESA DENOMINADA: **IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.,** HABIENDO ESTADO COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA Y RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS MISMOS POR PARTE DE DICHA EMPRESA, EL (LA): **C. ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO** , POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, ESTUVO COMO RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN Y VERIFICIACIÓN DE LA CORRECTA REALIZACIÓN DE LA OBRA EL (LA): **ING. FELIPE LUNA MEDINA,** EL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO FUE DE **$ 1,999,999.42 (UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 42/100 M.N.)** I.V.A INCLUIDO SIN HABER EXISTIDO NINGUN CONVENIO ADICIONAL.

EL PERIODO ORIGINAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ESPECIFICADO EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA FUE EL SIGUIENTE: FECHA DE INICIO: **31 DE OCTUBRE DE 2020**
FECHA DE TERMINACION: **31 DE DICIEMBRE DE 2020.**

EL PERIODO REAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL CONVENIO ADICIONAL FUE DE EL SIGUIENTE : FECHA DE INICIO: **31 DE OCTUBRE DE 2020.**
FECHA DE TER,MINACION : **19 DE DICIEMBRE DE 2020**

LAS ESTIMACIONES DE OBRA QUE SE REALIZARON A LA FECHA DE ESTA ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION ON LOS SIGUIENTES:

ESTIMACION No.: **01 (UNO)** FECHA DE INICIO: **31/10/2020**
FECHA DE TERMINACIÓN: 30/11/2020
$ 1,399,999.59 IVA INCLUIDO

ESTIMACION No.: **02 (DOS)** FECHA DE INICIO: 01/12/2020
Y FINIQUITO FECHA DE TERMINACIÓN: 19/12/2020
$ 599,999.82 IVA INCLUIDO

SE HACE CONSTAR EN ESTA ACTA POR AMBAS PARTES, QUE TODOS LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SE ENCUENTRAN EN PODER DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ.

ASÍ TAMBIÉN, SE MANIFIESTA QUE CON ESTA FECHA, INICIA EL PLAZO DE DOCE MESES EN EL QUE LA EMPRESA: **IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.** QUEDA OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO NUM.: **MAJ-FAISM/263-2020/AD** _____ DE

000384

H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez 2018 - 2021

BIENESTAR

"2020, Año Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ROBERTO POSADA Y COMONFORT S/N COL. CENTRO C.P.39300 ACAPULCO DE JUAREZ

TERMINACION DE TRABAJOS: 19 DE DICIEMBRE DEL 2020

FINIQUITO: 19 DE DICIEMBRE DEL 2020
ENTREGA - RECEPCION: 19 DE DICIEMBRE DEL 2020

MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL: $ 1,999,999.42 I.V.A INCLUIDO.

MONTO DE LAS AMPLIACIONES:

MONTOS DE LAS AMPLIACIONES:

MONTO TOTAL CONTRATADO: $ 1,999,999.42 I.V.A INCLUIDO.
SANCIONES: NO SE PRESENTARON

V.- **LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS** DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR CUANTO A LAS FIANZAS No. **012621-00000** DE FECHA **21 DE OCTUBRE DEL 2020** POR CONCEPTO DE VICIOS OCULTOS POR SU PARTE LA PERSONA FISICA O MORAL **IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. , REPRESENTADA POR LA C. IRINA SALGADO HERANDEZ** , EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, MANIFIESTA QUE NO SE RESERVA ACCION NI TIENE RECLAMACION ALGUNA CON POSTERIORIDAD A LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA, POR LO CUAL SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA No. **MAJ-FAISM/263-2020/AD** Y CONVENIO No._____.

SIN OTRO ASUNTO EN PARTICULAR QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, SIENDO LAS **12:30** HORAS DEL DIA **31 DE DICIEMBRE DEL 2020** FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

SRIO. DE DES.URB. Y OBRAS PÚBLICAS

ING. ARQ. ARMANDO JAVIER SALINAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 2018-2021

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. FRANCISCO JAVIER CHAVARRIA PEÑALOZA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA.

ING. ARQ. MELECIO VAZQUEZ PELAEZ

POR LA EMPRESA

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. .
C. IRINA SALGADO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL.

CONTRATO N°. MAJ-FAISM/244-2020/AD

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO **MAJ-FAISM/244-2020/AD,** RELATIVO A LA OBRA: **PAVIMENTACION DE CALLE 10**, UBICADA EN **COL. CUMBRES DE LLANO LARGO,** EN ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, **LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO**, A QUIEN SE DENOMINARÁ **"LA SECRETARÍA", REPRESENTADA POR EL ING. ARQ. ARMANDO JAVIER SALINAS,** EN SU CARÁCTER DE **SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS**, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. Y POR LA OTRA **IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL C. **IRINA SALGADO HERNANDEZ, CON NÚMERO DE REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS 2848,** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL** A QUIEN SE DENOMINARÁ **"EL CONTRATISTA"** DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

I.- DECLARA "LA SECRETARÍA" MEDIANTE SUS REPRESENTANTES.

1.- QUE EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR EL **ARTÍCULO 115, FRACCIONES I, II y III A), D), E), F), G), H), I), Y IV B), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS** Y ARTICULO 3 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO, ES UN MUNICIPIO GOBERNADO POR UN AYUNTAMIENTO DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA, INVESTIDO DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CON LIBRE ADMINISTRACIÓN DE SU HACIENDA RECURSOS Y SERVICIOS DESTINADOS A LA COMUNIDAD, SIN MÁS LÍMITES QUE LOS SEÑALADOS EXPRESAMENTE EN LAS LEYES APLICABLES.

1.1.- **QUE CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 170 NUMERAL 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO**; 26, 29, 30, 31 DEL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO, Y; 2 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, EL AYUNTAMIENTO ES EL ÓRGANO DE GOBIERNO A CUYA DECISIÓN SE SOMETEN LOS ASUNTOS DE LA VIDA PÚBLICA MUNICIPAL Y LOS DE SU PROPIA ADMINISTRACIÓN QUE LAS LEYES PREVÉN, ASÍ COMO LA DE EJERCER VIGILANCIA DIRECTA DE LOS ACTOS DE SUS MIEMBROS EN TODO MOMENTO, CUYAS FACULTADES DE EJECUCIÓN ESTÁN DEPOSITADAS EN EL PRESIDENTE MUNICIPAL.

1.2.- QUE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, EN EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 29 FRACCIONES I, V, Y VII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO EN VIGOR, TUVO A BIEN DESIGNAR COMO **SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS AL ING. ARQ. ARMANDO JAVIER SALINAS,** Y POR ENDE, LA FACULTAD Y REPRESENTACIÓN LEGAL PARA CELEBRAR CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SUS SERVICIOS A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 72 Y 73 FRACCIONES IX Y X DE LA LEY ORGÁNICA INVOCADA EN RELACIÓN CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO **27 FRACCIONES XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXVIII, Y 28 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO**. EN VIRTUD DE QUE **"LA SECRETARÍA"**, ES LA ENTIDAD MUNICIPAL ENCARGADA DE ORDENAR LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS, REGULAR EL DESARROLLO URBANO, ASÍ COMO

CONDUCIR, NORMAR, PROYECTAR Y EJECUTAR LAS OBRAS PÚBLICAS, INSERTAS EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES EN LA MATERIA.

1.3.- SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, EL UBICADO EN LA AV. CUAUHTÉMOC S/N INTERIOR PARQUE PAPAGAYO, COL. HORNOS INSURGENTES, ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. C. P. 39350.

1.4.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SE AUTORIZÓ LA INVERSIÓN MEDIANTE EL **RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2020. AUTORIZADO MEDIANTE EL OFICIO SEPLADE/354/2020, DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020.** CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE A SU VEZ SE HAYA INCLUIDO EN EL PROGRAMA DE OBRAS PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2020.

1.5.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICÓ A **"EL CONTRATISTA"** PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS A QUE SE DESTINA LA INVERSIÓN AUTORIZADA QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACIÓN 1.4, A TRAVÉS DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA**, TAL COMO LO SEÑALA LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 EN EL ARTÍCULO 39 FRACCIÓN III.

2. "EL CONTRATISTA" DECLARA:

2.1.- ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO **1585 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2009,** OTORGADA ANTE LA FE DEL **LIC. SHUNASHI ALTAMIRANO PINEDA CORREDOR PUBLICO NO. 5 EN EL ESTADO DE GUERRERO, ACAPULCO, GRO.** CON REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO **10160 * 17 DE FECHA 17 DE FEBRERO DEL 2010.**

2.2.- EL C. **IRINA SALGADO HERNANDEZ,** QUIEN SE IDENTIFICA CON **CREDENCIAL DE ELECTOR**, ACREDITA SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO **1585 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2009** OTORGADA ANTE LA FE DEL **LIC. SHUNASHI ALTAMIRANO PINEDA CORREDOR PUBLICO NO. 5 EN EL ESTADO DE GUERRERO, ACAPULCO, GRO.** INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, BAJO EL FOLIO **10160 * 17** DE FECHA **17 DE FEBRERO DEL 2010.** MANDATO QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO NI REVOCADO, LO QUE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

2.3.- TENER ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN **CALLE CORREGIDORA, NO. 4, COL. MORELOS, C.P. 39530, ACAPULCO, GRO,** MISMO QUE SEÑALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

2.4.- QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

2.5.- QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, SE OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

2.6.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE, CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR

CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO BAJO PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

2.7.- QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACIÓN, LOS CUALES ESTÁN VIGENTES.

- REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO N°. **ICO091216UUA.**

- REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ N°. **2848.**

- REGISTRO, ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL E INSTITUTO DEL FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES N°. **B61-59781-10-7.**

2.8.- QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NINGUNA DE LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE ESTA SOCIEDAD DESEMPEÑA ALGÚN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO, ASÍ COMO QUE NO TIENE IMPEDIMENTO LEGAL ALGUNO QUE LE IMPOSIBILITE A OBLIGARSE EN TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO.

2.9.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS APLICABLES.

2.10.- CONOCER EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, Y CONSECUENTEMENTE, HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN.

3. AMBAS PARTES DECLARAN:

3.1.- SUJETARSE ESTRICTAMENTE A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO; ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO EL MANUAL ÚNICO DE OPERACIÓN DEL RAMO XXXIII.

3.2.- QUE EL PRESENTE CONTRATO, SUS ANEXOS Y LA BITÁCORA DE LOS TRABAJOS, SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

3.3.- CONOCER EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE FUERON DEBIDAMENTE FIRMADOS POR **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** Y QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES Y DEFINICIONES ANTERIORES, SUSCRIBEN DE CONFORMIDAD LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

"LA SECRETARÍA" ENCOMIENDA A **"EL CONTRATISTA"** LA REALIZACIÓN DE LA OBRA CONSISTENTE EN: **PAVIMENTACION DE CALLE 10,** UBICADA EN **COL. CUMBRES DE LLANO LARGO**, DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN LA DECLARACIÓN 3.3 DE ESTE CONTRATO Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO; SIENDO **"EL CONTRATISTA"** RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y QUE ÉSTOS CUMPLAN CON TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR **"LA SECRETARÍA"**, COMO SON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO SI SE INSERTASEN A LA LETRA COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO. FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA **(ANEXO I)** EL CUAL CONTIENE EL CATALOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMA DE OBRA, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMA DE OBRA Y PLANOS DEL PROYECTO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA CUYA EJECUCIÓN SE CONTRATA ES POR LA CANTIDAD DE: **$646,551.72 (SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 72/100 M.N.)** MÁS IMPUESTO AL VALOR AGREGADO **$103,448.28 (CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 28/100 M.N.)** CONSECUENTEMENTE EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO RESULTA DE **$750,000.00 (SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.),** DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO DE OBRA PRESENTADO.

EL MONTO TOTAL DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO CUBRE A **"EL CONTRATISTA"** TODAS LAS PRESTACIONES, GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA MISMA, INCLUYENDO LOS IMPUESTOS O DERECHOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE SE CAUSEN, SIENDO IMPROCEDENTE EL INCREMENTO AL PRECIO DE OPERACIÓN ESTABLECIDO.

"LA SECRETARÍA" LLEVARÁ A CABO LAS RETENCIONES FISCALES CORRESPONDIENTES, QUE SE ORIGINEN POR CONCEPTO DE LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN.

EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ES DE **62 DIAS** NATURALES, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA **31 DE OCTUBRE DEL 2020** Y A TERMINARLOS A MÁS TARDAR EL DÍA **31 DE DICIEMBRE DEL 2020,** DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA PRESENTADO POR **"EL CONTRATISTA"**. TODOS LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN ESTE CONTRATO SE ENTENDERÁN COMO DÍAS CALENDARIO, COMPRENDIENDO AQUELLOS QUE SEGÚN LA LEY SEAN INHÁBILES PERO CUANDO UN PLAZO TERMINE EN UN DÍA INHÁBIL, CONCLUIRÁ A LAS 24 HORAS DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE.

ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO QUE EL DÍA DE INICIO DE LOS TRABAJOS LA **RESIDENCIA**, HAGA LA APERTURA A LA BITÁCORA DE OBRA, INSTRUMENTO EN EL QUE DEBERÁN REFERIRSE LOS ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y POR

MEDIO DE EL, DAR INSTRUCCIONES Y RECIBIR SOLICITUDES QUE SE FORMULEN ENTRE **LA RESIDENCIA Y LA SUPERINTENDENCIA**, EL USO DE LA BITÁCORA SE REGIRÁ CONFORME AL CAPÍTULO IV, SECCIÓN II, ARTÍCULOS 122, 123, 124 Y 125 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

"LA SECRETARÍA" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE **"EL CONTRATISTA"**, PREVIAMENTE A LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO; EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. EL DIFERIMIENTO SE CONSIGNARÁ EN EL CONVENIO QUE PARA TAL EFECTO CELEBREN LAS PARTES.

ASÍ MISMO, **"EL CONTRATISTA"**, DEBERÁ TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS, ASÍ COMO LA PROPIEDAD O LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE VÍA Y EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES SOBRE LOS CUALES SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PREVISTAS POR LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERA PARA LA INICIACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS AMPARADOS POR EL PRESENTE CONTRATO.

QUINTA: ANTICIPO, PORCENTAJE, AMORTIZACIÓN Y COMPROBACIÓN.

PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, INICIO DE TRABAJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES, TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES DE INSTALACIÓN PERMANENTE Y DEMÁS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, **"LA SECRETARÍA"** OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL **50 % (CINCUENTA POR CIENTO)** DE LA ASIGNACIÓN APROBADA AL CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE **$323,275.86 (TRESCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N.)** MAS EL I.V.A.

DICHOS ANTICIPOS SE OTORGARÁN EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA PARA SU CORRECTA APLICACIÓN, DEBIENDO SER ENTREGADO CONTRA LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE POR **"EL CONTRATISTA"** PARA TALES EFECTOS. REQUISITADA A LA PERSONA QUE ACREDITE ESTAR DEBIDAMENTE FACULTADA.

PARA EL CASO DE QUE **"LA SECRETARÍA"**, POR CAUSAS IMPUTABLES A LA MISMA, NO ENTREGASE A **"EL CONTRATISTA"** EL ANTICIPO EN LA FECHA PREVISTA, SE PODRÁ DIFERIR SIN MODIFICAR EL PLAZO PACTADO EN LA CLÁUSULA TERCERA, PARA CUYO EFECTO DEBERÁ SUSCRIBIRSE ENTRE LAS PARTES EL CONVENIO DE DIFERIMIENTO RESPECTIVO, EL QUE CONTENDRÁ LAS NUEVAS FECHAS DE INICIACIÓN Y CONCLUSIÓN DE LA OBRA.

LA FALTA DE EXHIBICIÓN OPORTUNA DE LA FIANZA O SU PRESENTACIÓN EN TÉRMINOS DIFERENTES A LOS ESTABLECIDOS, ACARREARAN AUTOMÁTICAMENTE EL ATRASO EN LA FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO Y EN TAL EVENTO NO SERÁ PROCEDENTE EL OTORGAMIENTO DEL CONVENIO DE DIFERIMIENTO, POR LO TANTO **"EL CONTRATISTA"** DEBERÁ INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA CLÁUSULA TERCERA.

"LA SECRETARÍA", PODRÁ PRACTICAR REVISIONES Y AUDITORIAS EN CUALQUIER TIEMPO PARA COMPROBAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO, PARA TAL EFECTO, **"EL CONTRATISTA"**

SE OBLIGA A DAR LAS FACILIDADES NECESARIAS Y ACREDITAR FEHACIENTEMENTE LA APLICACIÓN DEL MISMO, EXHIBIENDO LAS FACTURAS DE LOS PAGOS EFECTUADOS A SUS PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

SI **"EL CONTRATISTA"** DESTINA EL IMPORTE DEL ANTICIPO A FINES DISTINTOS A LOS CONSIGNADOS, **"LA SECRETARÍA"**, PODRÁ OPTAR POR EXIGIR DE INMEDIATO A **"EL CONTRATISTA"** LA DEVOLUCIÓN DEL MISMO, Y ADEMÁS, OPTAR POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO QUE SE ESTABLECE EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.

EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL REMANENTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL.

EN EL SUPUESTO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS, CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, COMO SI SE TRATARÁ DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL TÉRMINO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"LA SECRETARÍA"**.

EN CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A REINTEGRAR A **"LA SECRETARÍA"**, EL SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA QUE SE DA POR RESCINDIDO ESTE CONTRATO, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS A SATISFACCIÓN DE **"LA RESIDENCIA"**, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADO, A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LOS TRABAJOS Y **"EL CONTRATISTA"** SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

EN EL SUPUESTO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL TÉRMINO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, ÉSTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES; DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"LA SECRETARÍA"**

LA PÓLIZA DE FIANZA DEL ANTICIPO, QUE GARANTICE LA CORRECTA INVERSIÓN Y EXACTA AMORTIZACIÓN Y EN SU CASO, DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS QUE:

a) LA FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD Y ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, PARA GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSIÓN DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO DE LA CONTRATANTE OTORGA A LA EMPRESA **IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.** Y SE COMPROMETE A PAGAR HASTA LA CANTIDAD QUE IMPORTE ESTA FIANZA, EN CASO DE

QUE SU FIADO NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN O SEA RESCINDIDO EL CONTRATO.

b) EN EL CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA Y PARA EL CASO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN O EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE;

c) CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA Y ESTE EFECTUÉ LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, **"LA SECRETARÍA"**, DEBERÁ LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA SIEMPRE Y CUANDO SEA PROCEDENTE EN LOS TÉRMINOS AQUÍ ESTIPULADOS

d) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO, **"LA SECRETARÍA"**, QUE LA PRODUCIRÁ CUANDO EL IMPORTE DEL ANTICIPO HAYA SIDO AMORTIZADO O DEVUELTO EN SU TOTALIDAD Y SE HAYAN PAGADO EN SU CASO LOS ACCESORIOS.

e) QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

f) LA COMPAÑÍA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 178, 279, 280 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR, OTORGANDO LA AFIANZADORA EL CONSENTIMIENTO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 179 DEL CITADO ORDENAMIENTO.

g) QUE PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO SE SOMETE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO GUERRERO, RENUNCIANDO CUALQUIER OTRA QUE TUVIERE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO OFICIAL, EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. FIN DEL TEXTO

SEXTA: FORMA DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, QUE ABARCARÁN PERIODOS NO MAYOR DE UN MES CALENDARIO Y SERÁN PRESENTADAS POR **"EL CONTRATISTA"** A **LA RESIDENCIA**, DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE CORRESPONDIENTE, CONTANDO CON UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN A LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN PARA QUE **"LA SECRETARÍA"**, INICIE SU TRÁMITE DE PAGO.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERAN DE PAGARSE POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA, SIEMPRE Y CUANDO EL CONTRATISTA HAYA PRESENTADO LAS CORRECCIONES OBSERVADAS Y SE VALIDE LA FACTURA CORRESPONDIENTE POR EL AREA DE

CONTROL ADMINISTRATIVO, EL PERIODO DE VEINTE DIAS PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES, SE CONTABILIZARA A PARTIR QUE EL CONTRATISTA ENTREGUE LAS CORRECCIONES AL ÁREA CORRESPONDIENTE.

EL RESIDENTE DE OBRA EFECTUARA LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE 15 DÍAS NATURALES CONTADOS APARTIR DE LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTE DE COSTOS POR PARTE DE **"LA SECRETARÍA"**, ÉSTA A SOLICITUD DE **"EL CONTRATISTA"** Y DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266, PAGARÁ GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"EL CONTRATISTA".**

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO **"EL CONTRATISTA",** ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "LA DEPENDENCIA".

NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DEL CONTRATISTA SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁN COMO ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE **"LA SECRETARÍA."** TENDRÁ EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

SI **"EL CONTRATISTA"** REALIZA TRABAJOS EXCEDENTES O EXTRAORDINARIOS, SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE PARTE DEL "**RESIDENTE Y DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**", INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI LA MODIFICACIÓN ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ÉSTOS O POR SU PRESENTACIÓN INCORRECTA O EXTEMPORÁNEA, NO SERÁ MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS. PARA QUE **"EL CONTRATISTA"** PUEDA CANCELAR SU(S) FACTURA(S) UNA VEZ QUE SE HA(N) VALIDADO LA(S) MISMA(S), SERÁ NECESARIO CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE **"LA SECRETARIA".** LA CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS SIN ESTE REQUISITO, LIBERA AL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DE LA OBLIGATORIEDAD DEL PAGO. SE GIRARA OFICIO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE DICHA CANCELACIÓN PARA LO CONDUCENTE.

SÉPTIMA: LUGAR DE PAGO:

EL PAGO POR CONCEPTO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS, LOS EFECTUARÁ LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, UBICADA EN COSTERA MIGUEL ALEMÁN No. 315 COL. CENTRO, C.P. 39300 EN ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, A TRAVÉS DE LA FORMA: TRANSFERENCIA BANCARIA MEDIANTE VIA ELECTRÓNICA. EL PLAZO PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE RIGE POR EL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266

OCTAVA: GARANTÍAS.

A) GARANTÍA DE LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA CARTA DE ADJUDICACIÓN, DEBERÁ PRESENTAR A FAVOR Y A SATISFACCIÓN DEL **MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ**, FIANZA POR EL TOTAL DEL IMPORTE DEL ANTICIPO MAS I.V.A., OTORGADA POR INSTITUCIONES DE FIANZAS, DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

LA GARANTÍA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DE LOS ANTICIPOS, SE CANCELARÁ CUANDO **"EL CONTRATISTA"** HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DE LOS MISMOS, PREVIA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE "**LA SECRETARÍA**" EN EL CASO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** NO HAYA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO EN LA FECHA SEÑALADA EN LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE, SE HARÁ EFECTIVA LA FIANZA Y SE LE PENALIZARÁ CON LOS GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICIÓN DE "**LA SECRETARÍA**"

ESTA GARANTÍA SOLAMENTE SE LIBERARÁ CUANDO SE HAYA AMORTIZADO TOTALMENTE EL ANTICIPO CONCEDIDO.

B) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE HABER RECIBIDO LA CARTA DE ADJUDICACIÓN A CONSTITUIR UNA FIANZA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, MISMA QUE ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"**, Y ÉSTE HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FINIQUITO, "**LA SECRETARÍA**" DEBERÁ LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA; EN CASO CONTRARIO, "**LA SECRETARÍA**" PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS.

C) GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, **"EL CONTRATISTA"** MEDIANTE FIANZA EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO MAS I.V.A. EXPEDIDA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN CONTRAVENCIÓN AL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS DATOS DEL PROYECTO ANEXO A ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 77 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, ASÍ COMO LOS NUMERALES 89, 94, 95, 96, 97 Y 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LA PÓLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS QUE.

a) LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD;

b) LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS;

c) CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN MÁS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ÉSTA FIANZA SE SUBSTITUIRÁ EN EL O LOS SIGUIENTES EJERCICIOS POR OTRO U OTRAS EQUIVALENTES AL IMPORTE DE LOS TRABAJOS FALTANTES POR EJECUTAR, ACTUALIZANDO LOS IMPORTES DE ACUERDO CON LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS Y MODIFICACIONES CONVENIDAS SI LAS HUBIERE;

d) EN EL CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA Y PARA EL CASO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN O EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE

e) LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACIÓN DE **"LA SECRETARÍA"**

f) ÉSTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O DE **"LA SECRETARÍA"**, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA;

g) QUE LA FIANZA SE OTORGA TAMBIÉN PARA GARANTIZAR LA CORRECCIÓN DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN QUE RESULTEN, DE LOS VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

h) LA FIANZA SE CANCELARÁ CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE **"LA SECRETARÍA"**, SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERÁ LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ÉSTA CONTINUARÁ VIGENTE; Y,

i) CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA Y ESTE EFECTUÉ LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, **"LA SECRETARÍA"**, DEBERÁ LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA, SIEMPRE Y CUANDO SEA PROCEDENTE EN LOS TÉRMINOS AQUÍ ESTIPULADOS

j) LA FIANZA CONTINUARA EN VIGOR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO ALGUNA RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA POR DEFECTOS DE LA OBRA, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, **"EL CONTRATISTA"** GARANTIZA LOS MISMOS EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 77 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266 Y 95 DEL REGLAMENTO, POR LO QUE TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE) MESES, SIN QUE EXISTA RECLAMACIÓN ALGUNA POR PARTE DE **"LA SECRETARÍA"**, LA FIANZA QUEDARÁ CANCELADA, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE **"LA SECRETARÍA"**, PARA CANCELAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE.

k) EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS POR PARTE DE **"EL CONTRATISTA"**, **"LA SECRETARÍA"** LO COMUNICARÁ DE INMEDIATO Y POR ESCRITO A LA AFIANZADORA A EFECTO DE QUE ÉSTA NO SEA CANCELADA Y NOTIFICARA POR ESCRITO AL **"CONTRATISTA"** PARA QUE ÉSTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, TRANSCURRIDO ÉSTE TÉRMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO, **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA ESTA FIANZA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO A **"EL CONTRATISTA"** LA RESOLUCIÓN DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. SI LA CORRECCIÓN O REPOSICIÓN REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, **"EL CONTRATISTA"** Y **"LA SECRETARÍA"**, PODRÁN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE ESTA PÓLIZA DE FIANZA;

l) LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 178, 279, 280 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR; OTORGANDO LA AFIANZADORA EL CONSENTIMIENTO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTICULO 179 DEL CITADO ORDENAMIENTO.

m) LA FIANZA SE HARÁ EFECTIVA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA A **"EL CONTRATISTA"** LA RESOLUCIÓN DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO;

SI **"EL CONTRATISTA"** NO PRESENTARA LAS GARANTÍAS EN LA FORMA Y TÉRMINOS SEÑALADOS, **"LA SECRETARÍA"** PODRÁ DETERMINAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

NOVENA: AJUSTE DE COSTOS.

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA

PROPUESTA, OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO Y AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE.

PARA OBTENER EL AJUSTE DE LOS PRECIOS UNITARIOS SE CONSIDERARAN LOS TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS SIGUIENTES:

I.- LA REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE;

II.- LA REVISIÓN POR GRUPO DE PRECIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN CUANDO MENOS EL OCHENTA POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO; Y

III.- EN CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE SE TENGA ESTABLECIDA LA PROPORCIÓN EN QUE INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO PODRÁ DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN DICHAS PROPORCIONES.

LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DESCRITOS SE SUJETARÁ A LO SIGUIENTE:

A) LOS AJUSTES SE CALCULARÁN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL "PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO" EN EL CONTRATO O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A **"EL CONTRATISTA"**, CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

CUANDO POR CAUSA IMPUTABLE AL **"CONTRATISTA"** EXISTIERA ATRASO, PROCEDERÁ EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA PRESENTADO EN SU PROPUESTA.

B) LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERÁN CALCULADOS CON BASE EN LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIO PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO. CUANDO LOS ÍNDICES QUE REQUIERA **"EL CONTRATISTA"** Y **"LA SECRETARÍA"** NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO **"LA SECRETARÍA"** POR CONDUCTO DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS PROCEDERÁ A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE EXPIDA EL BANCO DE MÉXICO;

C) LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS QUE **"EL CONTRATISTA"** HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA; Y

D) A LOS DEMÁS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO EMITA LA CONTRALORÍA.

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DEBERÁ CUBRIRSE POR PARTE DE **"LA SECRETARÍA"** A SOLICITUD DE **"EL CONTRATISTA"** A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES

SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE **"LA SECRETARÍA"** RESUELVA POR ESCRITO SOBRE LA PROCEDENCIA DE SU PETICIÓN. APLICANDO AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIÉNDOSE APLICAR LOS ÚLTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERÁN ACUMULARSE. EN CASO DE PRESENTARSE REDUCCIÓN EN LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SE PRACTICARÁ UNA REVISIÓN, Y DE SER PROCEDENTE, SE EFECTUARÁ EL AJUSTE CORRESPONDIENTE.

DECIMA: SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.

"LA SECRETARÍA" A TRAVÉS DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRÁ EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A **"EL CONTRATISTA"** POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCIÓN EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE SEAN ORDENADAS.

POR SU PARTE **"LA SECRETARÍA"** EN APEGO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 Y 112 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DESIGNA COMO SU REPRESENTANTE DIRECTO EN LA OBRA PARA PODER TRATAR LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON, O DERIVADOS DE, LOS TRABAJOS A **EL C. ING. FELIPE LUNA MEDINA, "LA SECRETARÍA"** DESIGNARA POR ESCRITO AL **RESIDENTE** RESPONSABLE DE LA OBRA, CON LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES MENCIONADAS EN EL ARTÍCULO 113 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

"LA SECRETARÍA" PODRÁ ORDENAR LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA DE LOS TRABAJOS CUANDO **"EL CONTRATISTA"** NO CUMPLA LAS ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO O EN SU CASO, A LAS INSTRUCCIONES RECIBIDAS POR ESCRITO O EN LA BITÁCORA DE OBRA POR PARTE DEL **RESIDENTE**, DEBIENDO **"EL CONTRATISTA"** REALIZARLAS POR SU CUENTA Y SIN DERECHO A RETRIBUCIÓN ALGUNA. ASÍ MISMO **"LA SECRETARÍA"** PODRÁ ORDENAR LA **SUSPENSIÓN** TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA CONTRATADA, EN TANTO SE LLEVEN A CABO LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN O REPOSICIÓN, SIN QUE SEA MOTIVO DE AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS.

"LA CONTRATISTA" DEBERA CONTAR CON LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES PARA LAS PRUEBAS DE SUS OBRAS, EL CUAL DEBERÁ ESTAR ACREDITADO ANTE **"LA SECRETARIA"**. NO SE ACEPTARÁN PRUEBAS DE LABORATORIOS QUE NO ESTEN ACREDITADOS.

PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS CONTRATADAS, **"LA SECRETARIA"** CONTARÁ CON LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES EXTERNO, EL CUAL ELABORARÁ LAS PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, REVENIMIENTO, RESISTENCIA DE LOS CONCRETOS Y CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LAS OBRAS CONTRATADAS.

DÉCIMA PRIMERA: REPRESENTANTE DEL "CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER LA RESIDENCIA DE OBRA DEBIENDO ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE SERA EL **SUPERINTENDENTE** DE CONSTRUCCIÓN Y PARA TAL EFECTO **"EL CONTRATISTA"** DESIGNA AL **ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO** CON CÉDULA PROFESIONAL No. **2220846** EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES EL **22 DE NOVIEMBRE DEL 1995**, REGISTRADO COMO RESPONSABLE TÉCNICO, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y

SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES TÉCNICAS EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

QUE DEBERÁ CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, CATÁLOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCIÓN Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN Y NORMAS DE CALIDAD, BITÁCORA, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL **SUPERINTENDENTE** DE CONSTRUCCIÓN DESIGNADO POR **"EL CONTRATISTA"**, TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE CONOCER EL CONTRATO, EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEBERÁ ESTAR FACULTADO PARA DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA ACEPTAR U OBJETAR LAS ESTIMACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN Y, EN GENERAL, PARA ACTUAR A NOMBRE DEL **"CONTRATISTA"** CON LAS FACULTADES LEGALES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

EL **SUPERINTENDENTE** DE CONSTRUCCIÓN DEBE ESTAR FACULTADO POR **"EL CONTRATISTA"**, PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, ASÍ COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"**LA SECRETARÍA**" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, Y DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCIÓN DEL MISMO, Y **"EL CONTRATISTA"** EN UN PLAZO DE CINCO DÍAS NATURALES TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOMBRAR A OTRO QUE REÚNA LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DE ESTA CLÁUSULA.

DÉCIMA SEGUNDA: RELACIONES LABORALES.

"EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL.

"EL CONTRATISTA" CONVIENE, POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "**LA SECRETARÍA**", QUIEN QUEDA EXCLUIDO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD ANTE RECLAMACIONES JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES.

DE IGUAL FORMA, **"EL CONTRATISTA"** RESPONDERÁ POR CUALQUIER RELACIÓN JURÍDICA QUE SE ORIGINE POR ACTOS JURÍDICOS CONTRAÍDOS CON PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS Y DEMÁS OPERARIOS QUE CONTRATE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, MATERIA DE ESTE CONTRATO.

DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DEL "CONTRATISTA".

CON EL OBJETO DE LLEVAR UNA PERMANENTE VIGILANCIA DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN **"EL CONTRATISTA"** DEBERÁ RESPONDER POR LA DEBIDA CAPACIDAD Y PROFESIONALISMO DE SUS TÉCNICOS Y TRABAJADORES QUE EJECUTEN LA OBRA, PERMITIENDO EN TODO MOMENTO Y OTORGANDO TODAS LAS FACILIDADES NECESARIAS AL PERSONAL TÉCNICO DE "**LA SECRETARÍA**" PARA REALIZAR LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN, PROPORCIONANDO TODA LA INFORMACIÓN QUE SEA REQUERIDA DE IGUAL FORMA.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS, Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE **"LA SECRETARÍA"**; ASÍ, COMO A RESPONDER, POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, SE LLEGUEN A CAUSAR A **"LA SECRETARÍA"**, O A TERCEROS; EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO HASTA POR SU MONTO TOTAL.

IGUALMENTE, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES Y TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARAN ESTE CONTRATO (ESTIMACIONES DE OBRA, FACTURAS O CONTRA RECIBOS) SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE **"LA SECRETARÍA"**.

"EL CONTRATISTA" NO PODRÁ SUBCONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA O PARTE DE LA MISMA.

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CUANDO ÉSTOS NO SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE POR ESCRITO LE PROPORCIONE **"LA SECRETARÍA"** ÉSTE ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA Y SERÁN POR CUENTA DE **"EL CONTRATISTA"**.

"EL CONTRATISTA" DEBERÁ SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD QUE **"LA SECRETARÍA"** TENGA ESTABLECIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, A LOS DEMÁS REGLAMENTOS U ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA, ASI COMO, LOS LINEAMIENTOS DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA SALUD QUE DEBERÁ CUMPLIR EL SECTOR DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL **COVID-19** CON EL OBJETIVO DE EVITAR EL CONTAGIO Y CONTENER LA PROPAGACIÓN.

"EL CONTRATISTA" SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A **"LA SECRETARÍA"** O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS POR NO AJUSTARSE AL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES. LOS RIESGOS Y LA CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA DEFINITIVA A **"LA SECRETARÍA"**, SERÁN A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"**.

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE TODOS LOS ADEUDOS QUE FRENTE AL FISCO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL TENGA, CON MOTIVO DE CONTRIBUCIONES QUE SE CAUSEN COMO CONSECUENCIA Y EN EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE CONTRATAN (IMPUESTOS, DERECHOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL)

DÉCIMA CUARTA: MODIFICACIONES AL CONTRATO.

"LA SECRETARÍA" PODRÁ DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, MODIFICAR ESTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NÚMERO 266.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARÍAN EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRÁN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERÁN SER SUSCRITOS BAJO RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE HAYAN FIRMADO EL CONTRATO O QUIENES LOS SUSTITUYAN EN EL CARGO. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRÁN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NÚMERO 266.

LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRÁN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE EN REDUCCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN O MONTO DEL MISMO. SI SE MODIFICA EL PLAZO, LOS PERIODOS SE EXPRESARÁN EN DÍAS NATURALES, Y LA DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE VARIACIÓN SE HARÁ CON RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO; EN TANTO QUE SI ES AL MONTO, LA COMPARACIÓN SERÁ CON BASE EN EL MONTO CONVENIDO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SERÁN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AÚN CUANDO PARA FINES DE SU FORMALIZACIÓN PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.

LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO LAS PARTES CONVIENEN EN QUE **"EL CONTRATISTA"** PODRÁ SOLICITAR POR ESCRITO UNA AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, SIEMPRE QUE POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR, CASOS FORTUITOS O CUALESQUIERA OTRA CAUSA NO IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA",** LE FUERE IMPOSIBLE CUMPLIR CABALMENTE EN EL PLAZO ESTABLECIDO.

LAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN QUE **"LA SECRETARÍA"** TIENE LA FACULTAD DE AUTORIZAR O DENEGAR LA SOLICITUD, CUANDO A SU JUICIO EXISTAN LOS ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEN FEHACIENTEMENTE O NO LA PROCEDENCIA.

SE DEBERÁ SUSTENTAR EL DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, SEGÚN SEA EL CASO, CONSIDERÁNDOSE ÉSTOS PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA **"EL CONTRATISTA"** Y **"LA SECRETARÍA"** LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN.

DÉCIMA QUINTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.

"LA SECRETARÍA" EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA, PARA LO CUAL SE ELABORARÁ UN DICTAMEN QUE JUSTIFIQUE LAS CAUSAS QUE MOTIVAN LA SUSPENSIÓN, ESTABLECIENDO EL PLAZO DE LA SUSPENSIÓN, QUE PODRÁ PRORROGARSE SI LAS CIRCUNSTANCIAS QUE DIERON ORIGEN A LA INTERRUPCIÓN PERSISTEN, DEBIENDO INFORMAR EL CONTENIDO DE ESTA RESOLUCIÓN A **"EL CONTRATISTA"**; EN ESTE CASO SE INTERRUMPIRÁ EL CALENDARIO ORIGINALMENTE PREVISTO PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, SIN QUE ESTO IMPLIQUE LA CANCELACIÓN, EXTINCIÓN O DISMINUCIÓN DE LAS GARANTÍAS OTORGADAS.

CUANDO OCURRA LA SUSPENSIÓN, EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR **"LA SECRETARÍA"** NOTIFICARÁ POR ESCRITO A **"EL CONTRATISTA"**, SEÑALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LAS

ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

EN CASO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** HAYA SUSPENDIDO LOS TRABAJOS, CON BASE A LA INSTRUCCIÓN RECIBIDA POR ESCRITO, LA FECHA DE TERMINACIÓN SE PRORROGARÁ EN IGUAL PROPORCIÓN AL PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSIÓN, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIDO, FORMALIZÁNDOLA MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN, LA QUE CONTENDRÁ COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ARTÍCULO 147 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA SUSPENSIÓN SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA "**LA SECRETARÍA**" Y **"EL CONTRATISTA"**, DEBIENDO ÚNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE SUSPENSIÓN Y LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAJOS RESULTEN DAÑADOS O DESTRUIDOS Y ÉSTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERÁN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRÉ EL CONVENIO PARA CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA"**.

NO SERÁ MOTIVO DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE **"EL CONTRATISTA"**.

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS O SI LA SUSPENSIÓN EXCEDE SEIS MESES **"EL CONTRATISTA"** TENDRÁ DERECHO A SOLICITAR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO, ATENDIENDO A LAS CIRCUNSTANCIAS DE CADA CASO EN CONCRETO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN.

DÉCIMA SEXTA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

"**LA SECRETARÍA**" PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL MUNICIPIO; O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS. DE PRESENTARSE ESTA SITUACIÓN, "**LA SECRETARÍA**" PAGARÁ A **"EL CONTRATISTA"** LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

DE IGUAL FORMA, CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, **"EL CONTRATISTA"** PODRÁ SUSPENDER LAS OBRAS EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR SU SOLICITUD A "**LA SECRETARÍA**", QUIEN RESOLVERÁ DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA MISMA, EN CASO DE NEGATIVA, SERÁ NECESARIO QUE **"EL**

CONTRATISTA" OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL CORRESPONDIENTE LA DECLARATORIA RESPECTIVA.

SE ENTIENDE POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, AQUELLOS FENÓMENOS DE LA NATURALEZA O HECHOS DE PERSONAS CON AUTORIDAD PÚBLICA, GENERAL, INSUPERABLE, IMPREVISIBLE, O QUE PREVIÉNDOSE NO SE PUEDAN EVITAR, Y QUE ORIGINEN QUE UNA PERSONA REALICE UNA CONDUCTA DAÑOSA, CONTRARIA A UN DEBER JURÍDICO O A UNA OBLIGACIÓN. FENÓMENOS DE LA NATURALEZA O HECHOS DEL HOMBRE, TALES COMO (ENUNCIATIVAMENTE MAS NO LIMITATIVA) MOTINES, ACTOS DE TERRORISMO, CUARENTENAS, EPIDEMIAS, GUERRAS (DECLARADAS O NO), DISTURBIOS CIVILES, INSURRECCIONES, INCENDIOS (CUANDO NO SE HAYA DADO CAUSA O CONTRIBUIDOS A ELLOS), TORMENTAS, IMPIDIÉNDOLE TEMPORALMENTE O DEFINITIVAMENTE EN FORMA ABSOLUTA EL CUMPLIMIENTO PARCIAL O TOTAL DE LA OBLIGACIÓN, SIN QUE TALES HECHOS LE SEAN IMPUTABLES DIRECTA O INDIRECTAMENTE Y CUYA AFECTACIÓN NO PUEDE EVITARSE CON LOS INSTRUMENTOS DE QUE NORMALMENTE SE DISPONGA, YA PARA PREVENIR EL ACONTECIMIENTO O PARA OPONERSE A EL Y RESISTIRLO.

ASÍ MISMO, LA EXTINCIÓN O PÉRDIDA DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE **"EL CONTRATISTA"** DARÁ LUGAR A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, ACORDÁNDOSE PAGAR A SUS SUCESORES O BENEFICIARIOS LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERÁN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITÁCORA, DEBIENDO **"LA SECRETARÍA"** LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS INDICADOS POR EL ARTÍCULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO A **"EL CONTRATISTA"** POR **"LA SECRETARÍA"** ÉSTA PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE **"EL CONTRATISTA"**, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A **"LA SECRETARÍA"** EN UN TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

CUANDO SE DÉ POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, DEBERÁ ELABORARSE EL FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 168,169, 170, 171 y 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DÉCIMA SÉPTIMA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

LA SECRETARÍA" PODRÁ, EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA"** POR LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS, CONFORME A LO QUE ESTABLECE EL ART. 72 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, Y 154, 155, Y 157 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO, SUS ANEXOS Y EN SU CASO, DE SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS.

DARÁN LUGAR A DETERMINAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN LOS SUPUESTOS SIGUIENTES:

I. POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266 Y EL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS;

II. INTERRUMPA INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O SE NIEGUE A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS QUE SE HAYA DETECTADO COMO DEFECTUOSA POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD;

III. NO EJECUTE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATE LAS ÓRDENES DADAS POR EL RESIDENTE;

IV. NO DÉ CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN CONVENIDOS POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y, A JUICIO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO. NO IMPLICARÁ RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO Y, POR TANTO, NO SE CONSIDERARÁ COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISIÓN, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR LA FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES O LA FALTA DE INFORMACIÓN REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FÍSICA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, DE LICENCIAS Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR LA CONTRATANTE, ASÍ COMO CUANDO LA DEPENDENCIA O ENTIDAD HAYA ORDENADO LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS;

V. SEA DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANÁLOGA;

VI. SUBCONTRATE PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD;

VII. TRANSFIERA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD;

VIII. NO DÉ A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS;

IX. CAMBIE SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD;

X. SI SIENDO EXTRANJERO, INVOQUE LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL CONTRATO;

XI. INCUMPLA CON EL COMPROMISO QUE, EN SU CASO, HAYA ADQUIRIDO AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, RELATIVO A LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA

INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, Y

XII. EN GENERAL, INCUMPLA CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO.

LAS CAUSALES REFERIDAS DAN LUGAR A LA RESCISIÓN INMEDIATA DE ESTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA **"LA SECRETARÍA"**, ADEMÁS DE QUE SE LE APLIQUEN A **"EL CONTRATISTA"** LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISIÓN, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACIÓN DE UNO O DE OTRO, INDEPENDIENTEMENTE DE HACER EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y APLICARSE EN SU CASO A **"EL CONTRATISTA"** LOS DEMÁS CARGOS QUE PROCEDAN.

"LAS PARTES "CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** SE ENCUENTRE EN ALGUNA DE LAS CAUSALES INDICADAS EN LA CLÁUSULA ANTERIOR, EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA SE SUJETARÁ A LO SIGUIENTE:

1. EL PROCEDIMIENTO INICIARÁ A PARTIR DE QUE **"LA SECRETARÍA"** LE NOTIFIQUE A "**EL CONTRATISTA"** POR OFICIO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, SEÑALANDO LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVARON SU DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, RELACIONÁNDOLO CON LAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

2. TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE EL NUMERAL ANTERIOR, **"LA SECRETARÍA"** RESOLVERÁ CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER **"EL CONTRATISTA".**

3. LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO POR PARTE DE **"LA SECRETARÍA",** DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 1(UNO) DE ESTA CLÁUSULA.

UNA VEZ NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, **"LA SECRETARÍA"** SE ABSTENDRÁ, COMO MEDIDA PRECAUTORIA, DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA COMUNICACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS.

EN EL FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME EL PROGRAMA VIGENTE, ATENDIENDO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 162 Y 163 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO **"LA SECRETARÍA"** LE HAYA ENTREGADO A **"EL CONTRATISTA"**, ASÍ COMO CONSIDERAR EN SU INTEGRACIÓN LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE HAYA REALIZADO **"EL CONTRATISTA"** HASTA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO LOS EQUIPOS, MATERIALES QUE SE HUBIERAN INSTALADO EN LA OBRA O SE ENCUENTREN EN PROCESO DE FABRICACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SEAN SUSCEPTIBLES DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO

73 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266 Y 161 DEL REGLAMENTO.

EL SOBRECOSTO QUE SE DETERMINE AL ELABORAR EL FINIQUITO, SERÁ INDEPENDIENTE DE LAS GARANTÍAS, PENAS CONVENCIONALES Y DEMÁS CARGOS QUE DEBAN CONSIDERARSE EN LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.

COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO PROCEDERÁ A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE **"EL CONTRATISTA"**, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN Y ANTES DE SU CONCLUSIÓN, **"LA SECRETARÍA"** PODRÁ A SU JUICIO, SUSPENDER EL TRÁMITE DEL CITADO PROCEDIMIENTO, CUANDO SE HUBIERE INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO. EN EL CASO DE QUE SE DETERMINE NO RESCINDIR EL CONTRATO, SE REPROGRAMARÁN LOS TRABAJOS UNA VEZ NOTIFICADA LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE POR **"LA SECRETARÍA"** A **"EL CONTRATISTA".**

"LA SECRETARÍA" PODRÁ OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISIÓN, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACIÓN DE UNAS O DE OTRO.

DECIMA OCTAVA: PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE ESTE CONTRATO, **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** CONVIENEN LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES RETENCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES:

A).-"LA SECRETARÍA" TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR MENSUALMENTE SI LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR **"EL CONTRATISTA"** DE ACUERDO CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO; PARA LO CUAL, **"LA SECRETARÍA"** COMPARARÁ EL AVANCE MES A MES CONTRA EL PROGRAMA, Y LOS TRABAJOS EFECTIVOS EJECUTADOS.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE, **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A HACER LAS RETENCIONES ECONÓMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN QUE SE DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA, HASTA LA DE REVISIÓN. LAS RETENCIONES SERÁN DETERMINADAS ÚNICAMENTE EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO OPORTUNAMENTE CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

CUANDO **"EL CONTRATISTA"** REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO SEÑALADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN, PODRÁ RECUPERAR LAS RETENCIONES ECONÓMICAS QUE SE LE HAYAN EFECTUADO, POR LO QUE **"LA SECRETARÍA"** LE REINTEGRARÁ EL IMPORTE DE LAS MISMAS QUE AL MOMENTO DE LA REVISIÓN TUVIERA ACUMULADAS.

LA APLICACIÓN DE ESTAS RETENCIONES TENDRÁ EL CARÁCTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, ÉSTOS NO SE HAN CONCLUIDO.

B).- SI **"EL CONTRATISTA"** NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO Y EN EL PROGRAMA DE TRABAJO, **"LA SECRETARÍA"** LE APLICARÁ LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR CADA MES O FRACCIÓN QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACIÓN PACTADA EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO HASTA EL MOMENTO DE SU TERMINACIÓN. DICHAS PENAS NO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES SE DESCONTARÁN ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN Y EL DE LAS PENAS CONVENCIONALES EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, Y SE APLICARÁN, SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA"** Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL QUE A JUICIO DE **"LA SECRETARÍA"** NO SE ATRIBUYA A CULPA DE **"EL CONTRATISTA"**.

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN, **"LA SECRETARÍA"** PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, O BIEN, LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA GARANTÍA DEL ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGÚN PROCEDA EN LA RESCISIÓN, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

SI **"LA SECRETARÍA"** OPTA POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, SE APEGARÁ A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA DE ESTE CONTRATO.

DECIMA NOVENA: TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARÁ A TRAVÉS DE LA BITÁCORA O POR ESCRITO A **"LA SECRETARÍA"** SOBRE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS ANEXANDO LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRÁ UNA RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA, Y ÉSTA VERIFICARÁ DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, SALVO QUE SE PACTE EXPRESAMENTE OTRO PLAZO, QUE LOS MISMOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS.

SI DURANTE LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, **"LA SECRETARÍA"** ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, DEBERÁ SOLICITAR A **"EL CONTRATISTA"** SU REPARACIÓN, A EFECTO DE QUE ÉSTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS. EN TAL CASO, EL PLAZO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE PODRÁ PRORROGAR POR EL PERIODO QUE ACUERDEN **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** PARA LA REPARACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE **"LA SECRETARÍA"** OPTE POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO.

UNA VEZ QUE SE HAYA CONSTATADO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A LA RECEPCIÓN FORMAL DE LOS MISMOS, EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, SUSCRIBIENDO EL **"ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN"** EN LA QUE CONSTE ESTE HECHO, DEBIENDO CONTENER COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 166 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR **A "LA SECRETARÍA"** DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE **A "LA SECRETARÍA"** HAYA CONSTATADO LA TERMINACIÓN REAL DE LOS TRABAJOS, TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL **FINIQUITO DEL CONTRATO**, INCLUYENDO ESTIMACIONES POR CONCEPTO DE OBRA EJECUTADA, CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA FUERA DE CATÁLOGO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, SOLICITUD DE AJUSTE A LOS COSTOS POR CONCEPTO DE IMPACTO INFLACIONARIO (EN CASO DE EXISTIR) Y **PLANO DE OBRA TERMINADA** EN EL QUE SE PLASMEN TODAS LAS MODIFICACIONES Y ADECUACIONES AL PROYECTO ORIGINAL PROPORCIONADO **"EL CONTRATISTA"** PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, TODO DEBIDAMENTE JUSTIFICADO Y CON LOS APOYOS NECESARIOS PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN POR PARTE DE **A "LA SECRETARÍA".**

"LA SECRETARÍA" NO ESTARÁ OBLIGADA A DAR TRÁMITE A LAS SOLICITUDES O DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTE SI **"EL CONTRATISTA"** NO CUMPLIESE CON LA ENTREGA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN ESTA CLÁUSULA.

VIGÉSIMA: FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** EN ESTE CONTRATO, SE DEBERÁ ELABORAR EL **FINIQUITO DE OBRA** CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS.

"LA SECRETARÍA" DEBERÁ NOTIFICAR POR OFICIO A **"EL CONTRATISTA"** LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL FINIQUITO; **"EL CONTRATISTA"** TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE ACUDIR AL LLAMADO QUE SE LE HAGA MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO. EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERÁ REUNIR COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTÍCULO 170 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS EL FINIQUITO DEBERÁ SER ELABORADO POR **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, HACIÉNDOSE CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE, DEBIENDO EXPONER, EN SU CASO, LAS RAZONES DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, **"EL CONTRATISTA"** NO ACUDA CON **"LA SECRETARÍA"** PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL TÉRMINO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR POR OFICIO SU RESULTADO A **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DEL TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A **"EL CONTRATISTA"**, ÉSTE TENDRÁ EL

TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA; SI TRANSCURRIDO ESTE TÉRMINO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO.

SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE **"EL CONTRATISTA"**, **"LA SECRETARÍA"** DEBERÁ LIQUIDARLOS DENTRO DEL TÉRMINO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES. SI RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE **"LA SECRETARÍA"** EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRÁ DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES ÉSTOS, DEBERÁ EXIGIRSE POR OFICIO SU REINTEGRO, MÁS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"LA SECRETARÍA"**, EN CASO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO, **"LA SECRETARÍA"** PODRÁ HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES. EN FORMA SIMULTÁNEA, SE LEVANTARÁ EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DÉ POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** EN ESTE CONTRATO, LA QUE DEBERÁ REUNIR COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS SEÑALADOS POR EL ARTÍCULO 172 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA LIQUIDACIÓN DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO PODRÁ UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** EN ESTE CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR ÚNICAMENTE UNA MANIFESTACIÓN DE **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE TENDRÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN. AL NO SER FACTIBLE EL PAGO EN EL TÉRMINO INDICADO, SE PROCEDERÁ A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** EN ESTE CONTRATO.

VIGÉSIMA PRIMERA: OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS.

"EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

- **EL 0.005** (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN PARA CUMPLIR CON EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, LO ANTERIOR, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

- **EL 0.002** (DOS AL MILLAR) PARA LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES AFILIADAS A LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO DE FECHA **06 DE MARZO DE 2019**, CELEBRADO POR LA MENCIONADA CÁMARA Y EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN CON **"LA SECRETARÍA"**, CON EL OBJETO DE APOYAR LA CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

EL 1.0% (UNO PUNTO CERO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN POR CONCEPTO DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEPENDIENTE DE **"LA SECRETARÍA"**, CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO, PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS NECESARIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.

VIGÉSIMA SEGUNDA: PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

"LAS PARTES" CONVIENEN, QUE EN EL CASO DE QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SURJAN DISCREPANCIAS RELATIVAS A CONCEPTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ÉSTAS DEBERÁN REGISTRARSE E INFORMARSE POR **"LAS PARTES"** MEDIANTE NOTA EN BITÁCORA, ACORDANDO QUE RESOLVERÁN LA DISCREPANCIA EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE DICHO REGISTRO EN CONSECUENCIA, LA SOLUCIÓN Y LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR, DE IGUAL FORMA SE ASENTARÁN POR **"LAS PARTES"** EN LA BITÁCORA. SI NO SE RESOLVIERA LA CONTROVERSIA EN EL PERIODO SEÑALADO, SE TURNARÁ AL DIRECTOR DE OBRA PARA QUE RESUELVA LA CONTROVERSIA EN EL MOMENTO.

VIGÉSIMA TERCERA: JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES.

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CON SEDE EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, POR LO TANTO, **"EL CONTRATISTA"** RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LEÍDO POR LAS PARTES QUE EN ÉL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS FOJAS ÚTILES EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO; EL DÍA **21 DE OCTUBRE DEL 2020.**

POR "LA SECRETARÍA"

C. ING. ARQ. ARMANDO JAVIER SALINAS.
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"EL CONTRATISTA"

IRINA SALGADO HERNANDEZ
IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

000410 SPD-20

H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez 2018 - 2021

BIENESTAR

BIENESTAR 0000268

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020
FISMDF
ACTA DE ENTREGA – RECEPCION DE OBRAS 2020

EN LA LOCALIDAD DE COL. CUMBRES DE LLANO LARGO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ DEL ESTADO DE GUERRERO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020 SE REUNIERON LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
LIC. ADELA ROMAN OCAMPO	PRESIDENTA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO
	PRESIDENTE	COMITÉ LOCAL DESARROLLO COMUNITARIO

QUIEN ASISTE COMO REPRESENTANTE DE LAS DEPENDENCIAS AL ACTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DE LA OBRA DENÓMINADA: **PAVIMENTACION DE CALLE 10**
EJECUTADA POR: **IMEXA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**
PERIODO DE EJECUCIÓN: **DEL 31 DE OCTUBRE AL 19 DE DIECIEMBRE DEL 2020**
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA OBRA: **PAVIMENTACION DE CALLE 10**

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN SE REALIZÓ CON RECURSOS DEL RAMO XXXIII.-

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020

NO. DEANEXO REMISION	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTROS
		$750,000.00		$780,000.00	

UNA VEZ VERIFICADA LA TERMINACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA – RECEPCION AL

COMITÉ DE DESARROLLO COMUNITARIO

QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO; RECIBE DE CONFORMIDAD:

ENTREGA		RECIBE EL COMITÉ DE DESARROLLO COMUNITARIO
Cargo:	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Cargo: RAFAEL DIAZ SANDOVAL
Nombre y Firma	LIC. ADELA ROMAN OCAMPO	Nombre y firma: PRESIDENTE
		Cargo: Nombre y Firma: LAMBERTO SERRANO SILVA — SECRETARIO
		Cargo. Nombre y Firma: RAFAEL ALVAREZ PEREZ — VOCAL
		Cargo: Nombre y Firma: JUAN GARCIA CALDERON — VOCAL
		Cargo. Nombre y Firma: LUIS ALFONSO GARCIA QUINTERO — VOCAL

000411 0000247

"2020, Año Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN Y FINIQUITO DE OBRA PÚBLICA

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA **19 DE DICIEMBRE DE 2020** Y HABIÉNDOSE VERIFICADO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: **MAJ-FAISM/244-2020/AD**, CONSISTENTES EN **PAVIMENTACION DE CALLE 10,** UBICADA EN: **COL. CUMBRES DE LLANO LARGO,** DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.

SE PROCEDE A LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRA BAJO LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES: LOS TRABAJOS, OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ANTES CITADO, FUERON REALIZADOS POR LA EMPRESA DENOMINADA: **IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.,** HABIENDO ESTADO COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA Y RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS MISMOS POR PARTE DE DICHA EMPRESA, EL (LA): **C. ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO** , POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, ESTUVO COMO RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN Y VERIFICIACIÓN DE LA CORRECTA REALIZACIÓN DE LA OBRA EL (LA): **ING. FELIPE LUNA MEDINA,** EL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO FUE DE **$ 750,000.00 (SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)** I.V.A INCLUIDO SIN HABER EXISTIDO NINGUN CONVENIO ADICIONAL.

EL PERIODO ORIGINAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ESPECIFICADO EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA FUE EL SIGUIENTE: FECHA DE INICIO: **31 DE OCTUBRE DE 2020**
FECHA DE TERMINACION: **31 DE DICIEMBRE DE 2020.**

EL PERIODO REAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL CONVENIO ADICIONAL FUE DE EL SIGUIENTE : FECHA DE INICIO: **31 DE OCTUBRE DE 2020.**
FECHA DE TER,MINACION : **19 DE DICIEMBRE DE 2020**

LAS ESTIMACIONES DE OBRA QUE SE REALIZARON A LA FECHA DE ESTA ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION SON LOS SIGUIENTES:

ESTIMACION No.: 01 **(UNO)** FECHA DE INICIO: **31/10/2020**
FECHA DE TERMINACIÓN: 30/11/2020
$ 525,000.00 IVA INCLUIDO

ESTIMACION No.: 02 **(DOS)** Y FINIQUITO FECHA DE INICIO: 01/12/2020
FECHA DE TERMINACIÓN: 19/12/2020
$ 225,000.00 IVA INCLUIDO

SE HACE CONSTAR EN ESTA ACTA POR AMBAS PARTES, QUE TODOS LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SE ENCUENTRAN EN PODER DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ.

ASÍ TAMBIÉN, SE MANIFIESTA QUE CON ESTA FECHA, INICIA EL PLAZO DE DOCE MESES EN EL QUE LA EMPRESA: **IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.** QUEDA OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE

H. Ayuntamiento Constitucional de
Acapulco de Juárez
2018 - 2021

000412

0000246

BIENESTAR

"2020, Año Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN Y FINIQUITO DE OBRA PÚBLICA

RESULTAREN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO NUM.: **MAJ-FAISM/244-2020/AD** DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE, QUEDANDO COMO GARANTÍA DE LO ANTES SEÑALADO, LA FIANZA NUM. 20A57991 EXPEDIDA POR LA AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA, DEMOLICION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MAL ESTADO, EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO II PARA COLOCACION DE TUBERIA DE 3", RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS, AFINE Y COMPACTACION DE SUBRASANTE, FORMACION DE BASE DE 20 CMS DE ESPESOR, SUM. Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 3" CED. RD-26, PARA LINEA DE AGUA POTABLE, TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE, CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA, MARCO Y TAPA DE FoFo DE 50X50 CMS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA BRIDADA DE 6", SUM. Y COLOCACION DE VALVULA REGULADORA DE PRESION DE 6", GUARNICION Y BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, SUM. Y COLOCACION DE MEMBRANA DE POLIETILENO, PAVIMENTO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, CORTE EN JUNTAS EN PISO DE CONCRETO, CALAFATEO EN LOSAS Y GUARNICIONES, DENTELLON DE CONCRETO, PINTURA ESMALTE AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES, CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, CORTE Y EXCAVACIONES FUERA DE LA OBRA.

SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL MÁRGEN Y AL CALCE LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
IRINA SALGADO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

POR EL H. AYUNTAMIENTO:

ING. FELIPE LUNA MEDINA

RESIDENTE DE OBRA

ING. ARQ. MELECIO VAZQUEZ PELAEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION
DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA

ARQ. FRANCISCO JAVIER CHAVARRIA PEÑALOZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

000413

0000245

BIENESTAR

"2020, Año Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ROBERTO POSADA Y COMONFORT S/N COL. CENTRO C.P.39300 ACAPULCO DE JUAREZ

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

CON FUNDAMENTO EN EL PARRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTICULO 172 DE SU REGLAMENTO; SE PROCEDE A LEVANTAR ESTA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA CUAL SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA No. **MAJ-FAISM/244-2020/AD**, Y CONVENIO No._____ RELATIVO A LA OBRA: **PAVIMENTACION DE CALLE 10,** UBICADA EN: **COL. CUMBRES DE LLANO LARGO.**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
INFORMACION BASICA INICIAL

ÁREA ENCARGADA DE LA OBRA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

OBJETO DEL CONTRATO: " EL ORGANISMO " encomienda a **" EL CONTRATISTA"** la realización de una obra consistente en la **PAVIMENTACION DE CALLE 10** en el: **COL. CUMBRES DE LLANO LARGO** . y este se obliga a realizar hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en la declaración II.8 del apartado de Declaraciones de **" EL CONTRATISTA "**, apegándose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, así como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos.

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS: GUERRERO.

ANTECEDENTES:

NÚMERO DEL OFICIO DE AUTORIZACION:

FECHA DE ADJUDICACION: 21 DE OCTUBRE DE 2020.

NUMERO DE CONTRATO: MAJ-FAISM/244-2020/AD

FECHA INICIACIÓN SEGÚN BITÁCORA DE OBRA: 31 DE OCTUBRE DE 2020

FECHA TERMINACIÓN SEGÚN BITÁCORA DE OBRA: 19 DE DICIEMBRE DE 2020.

I.- EN LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **31 DE DICIEMBRE DE 2020**, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA RESIDENCIA DE OBRA, CITA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, EN ROBERTO POSADA Y COMONFORT S/N COL. CENTRO C.P. 39300, ACAPULCO,GRO.

II.- QUE PARA REALIZAR EL ACTO SEÑALADO SE ENCUENTRA REUNIDAS LAS PERSONAS ADSCRITAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, LOS SERVIDORES PUBLICOS DEBIDAMENTE ACREDITADOS EN SU PERSONALIDAD Y ACTUANDO CONFORME A LA DELEGACION DE FACULTADES EN PRESENTACION DE LA SECRETARIA ", **LOS CC. ING. ARMANDO JAVIER SALINAS, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, ARQ. FRANCISCO JAVIER CHAVARRIA PEÑALOZA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, C. ING. ARQ. MELECIO VAZQUEZ PELAEZ**, JEFE DE SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y/O **ING. GERARDO CATALAN** QUIROZ, ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA ZONA RURAL. Y **VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS Y POR LA OTRA PARTE PERSONA FISICA O MORAL IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. REPRESSENTADA POR EL (LA) C. IRINA SALGADO HERNANDEZ** EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL.

0000244

000414

H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez 2018 - 2021

BIENESTAR

"2020, Año Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ROBERTO POSADA Y COMONFORT S/N COL. CENTRO C.P.39300 ACAPULCO DE JUAREZ

III.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN.

INFRAESTRUCTURA: EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II

SUB-ESTRUCTURA:

SUPERESTRUCTURA:

TERRACERIAS: APERTURA DE CAJA POR MEDIOS MECANICOS, AFINE Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE, FORMACION DE BASE DE 20 CMS DE ESPESOR, AFINE Y COMPACTACION EN AREA DE BANQUETAS.

PAVIMENTOS: GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR, BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR, SUM. Y COLOC. DE MEMBRANA DE POLIETILENO, DENTELLON DE CONCRETO, PINTURA ESMALTE AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES.

OBRAS COMPLEMENTARIAS: VALVULA BRIDADA DE 6" Y VALVULA REGULADORA DE PRESION DE 6"

IV.- DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES.

MEDIANTE ESCRITO DE FECHA_____, LA EMPRESA CONTRATISTA SOLICITA MEDIANTE OFICIO, SE LE AUTORICE LA EJECUCION DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, NO CONTEMPLADOS EN EL CATALAGO DE CONCEPTOS ORIGINAL DEL CUAL SE AUTORIZO MEDIANTE NOTA DE BITACORA _____., REFERENTE.: _____ ,ASI COMO TAMBIEN, OBRA ADICIONAL EN LOS CONCEPTOS _____.

RELACION DE OBLIGACIONES Y FECHA EN QUE SE CUMPLIERON.

FIRMA DE CONTRATO:
FIRMA DE CONVENIO_____.

ANTICIPO:
FIANZAS:

CONTRATO
- DE CUMPLIMIENTO: 20A57991 DE FECHA **21 DE OCTUBRE DE 2020**
- DE ANTICIPO: **20A57988** DE FECHA **21 DE OCTUBRE DE 2020.**
- DE VICIOS OCULTOS: **20A57991** DE FECHA **21 DE OCTUBRE DE 2020 .**

CONVENIO
- DE CUMPLIMIENTO: _____ DE FECHA _____
- DE ANTICIPO: _____ DE FECHA _____
- DE VICIOS OCULTOS: _____ DE FECHA _____

TERMINACION DE TRABAJOS: 19 DE DICIEMBRE DEL 2020

000415 0000243

H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez 2018 - 2021

BIENESTAR

"2020, Año Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ROBERTO POSADA Y COMONFORT S/N COL. CENTRO C.P.39300 ACAPULCO DE JUAREZ

FINIQUITO: **19 DE DICIEMBRE DEL 2020**
ENTREGA - RECEPCION: **19 DE DICIEMBRE DEL 2020**

MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL: $ 750,000.00 I.V.A INCLUIDO.

MONTO DE LAS AMPLIACIONES:

MONTOS DE LAS AMPLIACIONES:

MONTO TOTAL CONTRATADO: $ 750,000.00 I.V.A INCLUIDO.
SANCIONES: NO SE PRESENTARON

V.- **LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS** DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR CUANTO A LAS FIANZAS No. **20A57991** DE FECHA **21 DE OCTUBRE DEL 2020** POR CONCEPTO DE VICIOS OCULTOS POR SU PARTE LA PERSONA FISICA O MORAL **IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.** , **REPRESENTADA POR LA C. IRINA SALGADO HERANDEZ** , EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, MANIFIESTA QUE NO SE RESERVA ACCION NI TIENE RECLAMACION ALGUNA CON POSTERIORIDAD A LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA, POR LO CUAL SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA No. **MAJ-FAISM/244-2020/AD** Y CONVENIO No._____.

SIN OTRO ASUNTO EN PARTICULAR QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, SIENDO LAS **11:30** HORAS DEL DIA **31 DE DICIEMBRE DEL 2020** FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

SRIO. DE DES.URB. Y OBRAS PÚBLICAS

ING. ARQ. ARMANDO JAVIER SALINAS.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ... GRO. SECRETARÍA DE ... URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 2018-2021

POR LA EMPRESA

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. .
C. IRINA SALGADO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL.

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. FRANCISCO JAVIER CHAVARRIA PEÑALOZA

JEFE DE DEPARTAM,ENTO DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA.

ING. ARQ. MELECIO VAZQUEZ PELAEZ

CONTRATO N°. MAJ-FAISM/175-2020/AD

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO **MAJ-FAISM/175-2020/AD,** RELATIVO A LA OBRA: **PAVIMENTACION DE CALLE UNIVERSIDAD**, UBICADA EN **COL. VALLE DE LAS FLORES,** EN ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, **LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO**, A QUIEN SE DENOMINARÁ **"LA SECRETARÍA", REPRESENTADA POR EL ING. ARQ. ARMANDO JAVIER SALINAS,** EN SU CARÁCTER DE **SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS**, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. Y POR LA OTRA **IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.,** REPRESENTADA POR EL C. **IRINA SALGADO HERNANDEZ, CON NÚMERO DE REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS 2848,** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL** A QUIEN SE DENOMINARÁ **"EL CONTRATISTA"** DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

I.- DECLARA "LA SECRETARÍA" MEDIANTE SUS REPRESENTANTES.

1.- QUE EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR EL **ARTÍCULO 115, FRACCIONES I, II y III A), D), E), F), G), H), I), Y IV B), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS** Y ARTICULO 3 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO, ES UN MUNICIPIO GOBERNADO POR UN AYUNTAMIENTO DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA, INVESTIDO DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CON LIBRE ADMINISTRACIÓN DE SU HACIENDA RECURSOS Y SERVICIOS DESTINADOS A LA COMUNIDAD, SIN MÁS LÍMITES QUE LOS SEÑALADOS EXPRESAMENTE EN LAS LEYES APLICABLES.

1.1.- **QUE CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 170 NUMERAL 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO**; 26, 29, 30, 31 DEL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO, Y; 2 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, EL AYUNTAMIENTO ES EL ÓRGANO DE GOBIERNO A CUYA DECISIÓN SE SOMETEN LOS ASUNTOS DE LA VIDA PÚBLICA MUNICIPAL Y LOS DE SU PROPIA ADMINISTRACIÓN QUE LAS LEYES PREVÉN, ASÍ COMO LA DE EJERCER VIGILANCIA DIRECTA DE LOS ACTOS DE SUS MIEMBROS EN TODO MOMENTO, CUYAS FACULTADES DE EJECUCIÓN ESTÁN DEPOSITADAS EN EL PRESIDENTE MUNICIPAL.

1.2.- QUE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, EN EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 29 FRACCIONES I, V, Y VII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO EN VIGOR, TUVO A BIEN DESIGNAR COMO **SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS AL ING. ARQ. ARMANDO JAVIER SALINAS,** Y POR ENDE, LA FACULTAD Y REPRESENTACIÓN LEGAL PARA CELEBRAR CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SUS SERVICIOS A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 72 Y 73 FRACCIONES IX Y X DE LA LEY ORGÁNICA INVOCADA EN RELACIÓN CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO **27 FRACCIONES XIV,**

XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXVIII, Y 28 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. EN VIRTUD DE QUE **"LA SECRETARÍA"**, ES LA ENTIDAD MUNICIPAL ENCARGADA DE ORDENAR LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS, REGULAR EL DESARROLLO URBANO, ASÍ COMO CONDUCIR, NORMAR, PROYECTAR Y EJECUTAR LAS OBRAS PÚBLICAS, INSERTAS EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES EN LA MATERIA.

1.3.- SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, EL UBICADO EN LA AV. CUAUHTÉMOC S/N INTERIOR PARQUE PAPAGAYO, COL. HORNOS INSURGENTES, ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. C. P. 39350.

1.4.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SE AUTORIZÓ LA INVERSIÓN MEDIANTE EL **RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2020. AUTORIZADO MEDIANTE EL OFICIO SEPLADE/354/2020, DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020.** CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE A SU VEZ SE HAYA INCLUIDO EN EL PROGRAMA DE OBRAS PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2020.

1.5.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICÓ A **"EL CONTRATISTA"** PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS A QUE SE DESTINA LA INVERSIÓN AUTORIZADA QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACIÓN 1.4, A TRAVÉS DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA**, TAL COMO LO SEÑALA LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 EN EL ARTÍCULO 39 FRACCIÓN III.

2. "EL CONTRATISTA" DECLARA:

2.1.- ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO **1585 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2009,** OTORGADA ANTE LA FE DEL **LIC. SHUNASHI ALTAMIRANO PINEDA CORREDOR PUBLICO NO. 5 EN EL ESTADO DE GUERRERO, ACAPULCO, GRO.** CON REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO **10160 * 17 DE FECHA 17 DE FEBRERO DEL 2010.**

2.2.- EL C. **IRINA SALGADO HERNANDEZ,** QUIEN SE IDENTIFICA CON **CREDENCIAL DE ELECTOR**, ACREDITA SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO **1585 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2009** OTORGADA ANTE LA FE DEL **LIC. SHUNASHI ALTAMIRANO PINEDA CORREDOR PUBLICO NO. 5 EN EL ESTADO DE GUERRERO, ACAPULCO, GRO.** INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, BAJO EL FOLIO **10160 * 17** DE FECHA **17 DE FEBRERO DEL 2010.** MANDATO QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO NI REVOCADO, LO QUE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

2.3.- TENER ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN **CALLE CORREGIDORA, NO. 4, COL. MORELOS, C.P. 39530, ACAPULCO, GRO,** MISMO QUE SEÑALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

2.4.- QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

2.5.- QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, SE OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

2.6.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE, CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO BAJO PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

2.7.- QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACIÓN, LOS CUALES ESTÁN VIGENTES.

- REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO N°. **ICO091216UUA.**

- REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ N°. **2848.**

- REGISTRO, ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL E INSTITUTO DEL FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES N°. **B61-59781-10-7.**

2.8.- QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NINGUNA DE LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE ESTA SOCIEDAD DESEMPEÑA ALGÚN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO, ASÍ COMO QUE NO TIENE IMPEDIMENTO LEGAL ALGUNO QUE LE IMPOSIBILITE A OBLIGARSE EN TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO.

2.9.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS APLICABLES.

2.10.- CONOCER EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, Y CONSECUENTEMENTE, HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN.

3. AMBAS PARTES DECLARAN:

3.1.- SUJETARSE ESTRICTAMENTE A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO; ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. ASÍ COMO EL MANUAL ÚNICO DE OPERACIÓN DEL RAMO XXXIII.

3.2.- QUE EL PRESENTE CONTRATO, SUS ANEXOS Y LA BITÁCORA DE LOS TRABAJOS, SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

3.3.- CONOCER EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL CONTENIDO DE LOS

ANEXOS QUE FUERON DEBIDAMENTE FIRMADOS POR **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** Y QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES Y DEFINICIONES ANTERIORES, SUSCRIBEN DE CONFORMIDAD LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

"LA SECRETARÍA" ENCOMIENDA A **"EL CONTRATISTA"** LA REALIZACIÓN DE LA OBRA CONSISTENTE EN: **PAVIMENTACION DE CALLE UNIVERSIDAD,** UBICADA EN **COL. VALLE DE LAS FLORES,** DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN LA DECLARACIÓN 3.3 DE ESTE CONTRATO Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO; SIENDO **"EL CONTRATISTA"** RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y QUE ÉSTOS CUMPLAN CON TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR **"LA SECRETARÍA"**, COMO SON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO SI SE INSERTASEN A LA LETRA COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA CUYA EJECUCIÓN SE CONTRATA ES POR LA CANTIDAD DE: **$1,163,557.46 (UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 46/100 M.N.)** MÁS IMPUESTO AL VALOR AGREGADO **$186,169.19 (CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 19/100 M.N.)** CONSECUENTEMENTE EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO RESULTA DE **$1,349,726.65 (UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 65/100 M.N.),** DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO DE OBRA PRESENTADO.

EL MONTO TOTAL DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO CUBRE A **"EL CONTRATISTA"** TODAS LAS PRESTACIONES, GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA MISMA, INCLUYENDO LOS IMPUESTOS O DERECHOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE SE CAUSEN, SIENDO IMPROCEDENTE EL INCREMENTO AL PRECIO DE OPERACIÓN ESTABLECIDO.

"LA SECRETARÍA" LLEVARÁ A CABO LAS RETENCIONES FISCALES CORRESPONDIENTES, QUE SE ORIGINEN POR CONCEPTO DE LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN.

EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ES DE **70 DIAS** NATURALES, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA **23 DE OCTUBRE DEL 2020** Y A TERMINARLOS A MÁS TARDAR EL DÍA **31 DE DICIEMBRE DEL 2020,** DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA PRESENTADO POR **"EL CONTRATISTA"**. TODOS LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN ESTE CONTRATO SE ENTENDERÁN COMO DÍAS CALENDARIO, COMPRENDIENDO AQUELLOS QUE SEGÚN LA LEY SEAN INHÁBILES PERO

CUANDO UN PLAZO TERMINE EN UN DÍA INHÁBIL, CONCLUIRÁ A LAS 24 HORAS DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE.

ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO QUE EL DÍA DE INICIO DE LOS TRABAJOS LA **RESIDENCIA**, HAGA LA APERTURA A LA BITÁCORA DE OBRA, INSTRUMENTO EN EL QUE DEBERÁN REFERIRSE LOS ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y POR MEDIO DE EL, DAR INSTRUCCIONES Y RECIBIR SOLICITUDES QUE SE FORMULEN ENTRE **LA RESIDENCIA Y LA SUPERINTENDENCIA**, EL USO DE LA BITÁCORA SE REGIRÁ CONFORME AL CAPÍTULO IV, SECCIÓN II, ARTÍCULOS 122, 123, 124 Y 125 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

"LA SECRETARÍA" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE **"EL CONTRATISTA"**, PREVIAMENTE A LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO; EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. EL DIFERIMIENTO SE CONSIGNARÁ EN EL CONVENIO QUE PARA TAL EFECTO CELEBREN LAS PARTES.

ASÍ MISMO, **"EL CONTRATISTA"**, DEBERÁ TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS, ASÍ COMO LA PROPIEDAD O LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE VÍA Y EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES SOBRE LOS CUALES SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PREVISTAS POR LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERA PARA LA INICIACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS AMPARADOS POR EL PRESENTE CONTRATO.

QUINTA: ANTICIPO, PORCENTAJE, AMORTIZACIÓN Y COMPROBACIÓN.

PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, INICIO DE TRABAJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES, TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES DE INSTALACIÓN PERMANENTE Y DEMÁS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, **"LA SECRETARÍA"** OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL **50 % (CINCUENTA POR CIENTO)** DE LA ASIGNACIÓN APROBADA AL CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE **$581,778.73 (QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 73/100 M.N.)** MAS EL I.V.A.

DICHOS ANTICIPOS SE OTORGARÁN EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA PARA SU CORRECTA APLICACIÓN, DEBIENDO SER ENTREGADO CONTRA LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE POR **"EL CONTRATISTA"** PARA TALES EFECTOS. REQUISITADA A LA PERSONA QUE ACREDITE ESTAR DEBIDAMENTE FACULTADA.

PARA EL CASO DE QUE **"LA SECRETARÍA"**, POR CAUSAS IMPUTABLES A LA MISMA, NO ENTREGASE A **"EL CONTRATISTA"** EL ANTICIPO EN LA FECHA PREVISTA, SE PODRÁ DIFERIR SIN MODIFICAR EL PLAZO PACTADO EN LA CLÁUSULA TERCERA, PARA CUYO EFECTO DEBERÁ SUSCRIBIRSE ENTRE LAS PARTES EL CONVENIO DE DIFERIMIENTO RESPECTIVO, EL QUE CONTENDRÁ LAS NUEVAS FECHAS DE INICIACIÓN Y CONCLUSIÓN DE LA OBRA.

LA FALTA DE EXHIBICIÓN OPORTUNA DE LA FIANZA O SU PRESENTACIÓN EN TÉRMINOS DIFERENTES A LOS ESTABLECIDOS, ACARREARAN AUTOMÁTICAMENTE EL ATRASO EN LA FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO Y EN TAL EVENTO NO SERÁ PROCEDENTE EL OTORGAMIENTO DEL CONVENIO DE DIFERIMIENTO, POR LO TANTO **"EL CONTRATISTA"** DEBERÁ INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA CLÁUSULA TERCERA.

"LA SECRETARÍA", PODRÁ PRACTICAR REVISIONES Y AUDITORIAS EN CUALQUIER TIEMPO PARA COMPROBAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO, PARA TAL EFECTO, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A DAR LAS FACILIDADES NECESARIAS Y ACREDITAR FEHACIENTEMENTE LA APLICACIÓN DEL MISMO, EXHIBIENDO LAS FACTURAS DE LOS PAGOS EFECTUADOS A SUS PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

SI **"EL CONTRATISTA"** DESTINA EL IMPORTE DEL ANTICIPO A FINES DISTINTOS A LOS CONSIGNADOS, **"LA SECRETARÍA"**, PODRÁ OPTAR POR EXIGIR DE INMEDIATO A **"EL CONTRATISTA"** LA DEVOLUCIÓN DEL MISMO, Y ADEMÁS, OPTAR POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO QUE SE ESTABLECE EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.

EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL REMANENTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL.

EN EL SUPUESTO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS, CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, COMO SI SE TRATARÁ DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL TÉRMINO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"LA SECRETARÍA"**,

EN CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A REINTEGRAR A **"LA SECRETARÍA"**, EL SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA QUE SE DA POR RESCINDIDO ESTE CONTRATO, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS A SATISFACCIÓN DE **"LA RESIDENCIA"**, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADO, A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LOS TRABAJOS Y **"EL CONTRATISTA"** SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

EN EL SUPUESTO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL TÉRMINO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, ÉSTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES; DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"LA SECRETARÍA"**

LA PÓLIZA DE FIANZA DEL ANTICIPO, QUE GARANTICE LA CORRECTA INVERSIÓN Y EXACTA AMORTIZACIÓN Y EN SU CASO, DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS QUE:

a) LA FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD Y ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, PARA GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSIÓN DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO DE LA CONTRATANTE OTORGA A LA EMPRESA **IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.** Y SE COMPROMETE A PAGAR HASTA LA CANTIDAD QUE IMPORTE ESTA FIANZA, EN CASO DE QUE SU FIADO NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN O SEA RESCINDIDO EL CONTRATO.

b) EN EL CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA Y PARA EL CASO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN O EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE;

c) CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA Y ESTE EFECTUÉ LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, **"LA SECRETARÍA"**, DEBERÁ LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA SIEMPRE Y CUANDO SEA PROCEDENTE EN LOS TÉRMINOS AQUÍ ESTIPULADOS

d) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO, **"LA SECRETARÍA"**, QUE LA PRODUCIRÁ CUANDO EL IMPORTE DEL ANTICIPO HAYA SIDO AMORTIZADO O DEVUELTO EN SU TOTALIDAD Y SE HAYAN PAGADO EN SU CASO LOS ACCESORIOS.

e) QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

f) LA COMPAÑÍA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 178, 279, 280 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR, OTORGANDO LA AFIANZADORA EL CONSENTIMIENTO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 179 DEL CITADO ORDENAMIENTO.

g) QUE PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO SE SOMETE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO GUERRERO, RENUNCIANDO CUALQUIER OTRA QUE TUVIERE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO OFICIAL, EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. FIN DEL TEXTO

SEXTA: FORMA DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, QUE ABARCARÁN PERIODOS NO MAYOR DE UN MES CALENDARIO Y SERÁN PRESENTADAS POR **"EL CONTRATISTA"** A **LA RESIDENCIA**, DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE CORRESPONDIENTE, CONTANDO CON UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS PARA SU REVISIÓN Y

AUTORIZACIÓN. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN A LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN PARA QUE **"LA SECRETARÍA"**, INICIE SU TRÁMITE DE PAGO.

EL RESIDENTE DE OBRA EFECTUARA LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE 15 DÍAS NATURALES CONTADOS APARTIR DE LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTE DE COSTOS POR PARTE DE **"LA SECRETARÍA"**, ÉSTA A SOLICITUD DE **"EL CONTRATISTA"** Y DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266, PAGARÁ GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"EL CONTRATISTA"**.

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO **"EL CONTRATISTA"**, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "LA DEPENDENCIA".

NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DEL CONTRATISTA SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁN COMO ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE **"LA SECRETARÍA."** TENDRÁ EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

SI **"EL CONTRATISTA"** REALIZA TRABAJOS EXCEDENTES O EXTRAORDINARIOS, SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE PARTE DEL **"RESIDENTE Y DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS"**, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI LA MODIFICACIÓN ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ÉSTOS O POR SU PRESENTACIÓN INCORRECTA O EXTEMPORÁNEA, NO SERÁ MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS. PARA QUE **"EL CONTRATISTA"** PUEDA CANCELAR SU(S) FACTURA(S) UNA VEZ QUE SE HA(N) VALIDADO LA(S) MISMA(S), SERÁ NECESARIO CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE **"LA SECRETARIA"**. LA CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS SIN ESTE REQUISITO, LIBERA AL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DE LA OBLIGATORIEDAD DEL PAGO. SE GIRARA OFICIO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE DICHA CANCELACIÓN PARA LO CONDUCENTE.

SÉPTIMA: LUGAR DE PAGO:

VÍA ELECTRÓNICA MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA.

OCTAVA: GARANTÍAS.

A) GARANTÍA DE LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA CARTA DE ADJUDICACIÓN, DEBERÁ PRESENTAR A FAVOR Y A SATISFACCIÓN DEL **MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ**, FIANZA POR EL TOTAL DEL IMPORTE DEL ANTICIPO MAS I.V.A., OTORGADA POR INSTITUCIONES DE FIANZAS, DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

LA GARANTÍA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DE LOS ANTICIPOS, SE CANCELARÁ CUANDO **"EL CONTRATISTA"** HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DE LOS MISMOS, PREVIA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE **"LA SECRETARÍA"** EN EL CASO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** NO HAYA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO EN LA FECHA SEÑALADA EN LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE, SE HARÁ EFECTIVA LA FIANZA Y SE LE PENALIZARÁ CON LOS GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICIÓN DE **"LA SECRETARÍA"**

ESTA GARANTÍA SOLAMENTE SE LIBERARÁ CUANDO SE HAYA AMORTIZADO TOTALMENTE EL ANTICIPO CONCEDIDO.

B) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE HABER RECIBIDO LA CARTA DE ADJUDICACIÓN A CONSTITUIR UNA FIANZA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, MISMA QUE ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"**, Y ÉSTE HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FINIQUITO, **"LA SECRETARÍA"** DEBERÁ LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA; EN CASO CONTRARIO, **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS.

C) GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, **"EL CONTRATISTA"** MEDIANTE FIANZA EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO MAS I.V.A. EXPEDIDA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA

RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN CONTRAVENCIÓN AL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS DATOS DEL PROYECTO ANEXO A ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 77 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, ASÍ COMO LOS NUMERALES 89, 94, 95, 96, 97 Y 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LA PÓLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS QUE.

a) LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD;

b) LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS;

c) CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN MÁS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ÉSTA FIANZA SE SUBSTITUIRÁ EN EL O LOS SIGUIENTES EJERCICIOS POR OTRO U OTRAS EQUIVALENTES AL IMPORTE DE LOS TRABAJOS FALTANTES POR EJECUTAR, ACTUALIZANDO LOS IMPORTES DE ACUERDO CON LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS Y MODIFICACIONES CONVENIDAS SI LAS HUBIERE;

d) EN EL CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA Y PARA EL CASO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN O EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE

e) LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACIÓN DE **"LA SECRETARÍA"**

f) ÉSTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O DE **"LA SECRETARÍA"**, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA;

g) QUE LA FIANZA SE OTORGA TAMBIÉN PARA GARANTIZAR LA CORRECCIÓN DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN QUE RESULTEN, DE LOS VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

h) LA FIANZA SE CANCELARÁ CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE **"LA SECRETARÍA"**, SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERÁ LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ÉSTA CONTINUARÁ VIGENTE; Y,

i) CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA Y ESTE EFECTUÉ LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, **"LA SECRETARÍA"**, DEBERÁ LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA, SIEMPRE Y CUANDO SEA PROCEDENTE EN LOS TÉRMINOS AQUÍ ESTIPULADOS

j) LA FIANZA CONTINUARA EN VIGOR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO ALGUNA RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA POR DEFECTOS DE LA OBRA, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, **"EL CONTRATISTA"** GARANTIZA LOS MISMOS EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 77 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266 Y 95 DEL REGLAMENTO, POR LO QUE TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE) MESES, SIN QUE EXISTA RECLAMACIÓN ALGUNA POR PARTE DE **"LA SECRETARÍA"**, LA FIANZA QUEDARÁ CANCELADA, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE **"LA SECRETARÍA"**, PARA CANCELAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE.

k) EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS POR PARTE DE **"EL CONTRATISTA"**, **"LA SECRETARÍA"** LO COMUNICARÁ DE INMEDIATO Y POR ESCRITO A LA AFIANZADORA A EFECTO DE QUE ÉSTA NO SEA CANCELADA Y NOTIFICARA POR ESCRITO AL **"CONTRATISTA"** PARA QUE ÉSTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, TRANSCURRIDO ÉSTE TÉRMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO, **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA ESTA FIANZA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO A **"EL CONTRATISTA"** LA RESOLUCIÓN DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. SI LA CORRECCIÓN O REPOSICIÓN REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, **"EL CONTRATISTA"** Y **"LA SECRETARÍA"**, PODRÁN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE ESTA PÓLIZA DE FIANZA;

l) LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 178, 279, 280 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR; OTORGANDO LA AFIANZADORA EL CONSENTIMIENTO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTICULO 179 DEL CITADO ORDENAMIENTO.

m) LA FIANZA SE HARÁ EFECTIVA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA A **"EL CONTRATISTA"** LA RESOLUCIÓN DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO;

SI **"EL CONTRATISTA"** NO PRESENTARA LAS GARANTÍAS EN LA FORMA Y TÉRMINOS SEÑALADOS, **"LA SECRETARÍA"** PODRÁ DETERMINAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

NOVENA: AJUSTE DE COSTOS.

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO Y AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE.

PARA OBTENER EL AJUSTE DE LOS PRECIOS UNITARIOS SE CONSIDERARAN LOS TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS SIGUIENTES:

I.- LA REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE;

II.- LA REVISIÓN POR GRUPO DE PRECIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN CUANDO MENOS EL OCHENTA POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO; Y

III.- EN CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE SE TENGA ESTABLECIDA LA PROPORCIÓN EN QUE INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO PODRÁ DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN DICHAS PROPORCIONES.

LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DESCRITOS SE SUJETARÁ A LO SIGUIENTE:

A) LOS AJUSTES SE CALCULARÁN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL "PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO" EN EL CONTRATO O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A "**EL CONTRATISTA**", CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

CUANDO POR CAUSA IMPUTABLE AL **"CONTRATISTA"** EXISTIERA ATRASO, PROCEDERÁ EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA PRESENTADO EN SU PROPUESTA.

B) LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERÁN CALCULADOS CON BASE EN LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIO PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO. CUANDO LOS ÍNDICES QUE REQUIERA **"EL CONTRATISTA"** Y **"LA SECRETARÍA"** NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO **"LA SECRETARÍA"** POR CONDUCTO DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS PROCEDERÁ A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE EXPIDA EL BANCO DE MÉXICO;

C) LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS QUE **"EL CONTRATISTA"** HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA; Y

D) A LOS DEMÁS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO EMITA LA CONTRALORÍA.

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DEBERÁ CUBRIRSE POR PARTE DE **"LA SECRETARÍA"** A SOLICITUD DE **"EL CONTRATISTA"** A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE **"LA SECRETARÍA"** RESUELVA POR ESCRITO SOBRE LA PROCEDENCIA DE SU PETICIÓN. APLICANDO AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIÉNDOSE APLICAR LOS ÚLTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERÁN ACUMULARSE. EN CASO DE PRESENTARSE REDUCCIÓN EN LOS COSTOS

DE LOS INSUMOS, SE PRACTICARÁ UNA REVISIÓN, Y DE SER PROCEDENTE, SE EFECTUARÁ EL AJUSTE CORRESPONDIENTE.

DECIMA: SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.

"LA SECRETARÍA" A TRAVÉS DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRÁ EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A **"EL CONTRATISTA"** POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCIÓN EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE SEAN ORDENADAS.

POR SU PARTE **"LA SECRETARÍA"** EN APEGO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 Y 112 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DESIGNA COMO SU REPRESENTANTE DIRECTO EN LA OBRA PARA PODER TRATAR LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON, O DERIVADOS DE, LOS TRABAJOS A **EL C. ARQ. JAHAZIEL NOE VELAZQUEZ SONORA, "LA SECRETARÍA"** DESIGNARA POR ESCRITO AL **RESIDENTE** RESPONSABLE DE LA OBRA, CON LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES MENCIONADAS EN EL ARTÍCULO 113 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

"LA SECRETARÍA" PODRÁ ORDENAR LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA DE LOS TRABAJOS CUANDO **"EL CONTRATISTA"** NO CUMPLA LAS ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO O EN SU CASO, A LAS INSTRUCCIONES RECIBIDAS POR ESCRITO O EN LA BITÁCORA DE OBRA POR PARTE DEL **RESIDENTE**, DEBIENDO **"EL CONTRATISTA"** REALIZARLAS POR SU CUENTA Y SIN DERECHO A RETRIBUCIÓN ALGUNA. ASÍ MISMO **"LA SECRETARÍA"** PODRÁ ORDENAR LA **SUSPENSIÓN** TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA CONTRATADA, EN TANTO SE LLEVEN A CABO LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN O REPOSICIÓN, SIN QUE SEA MOTIVO DE AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS.

"LA CONTRATISTA" DEBERA CONTAR CON LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES PARA LAS PRUEBAS DE SUS OBRAS, EL CUAL DEBERÁ ESTAR ACREDITADO ANTE **"LA SECRETARIA"**. NO SE ACEPTARÁN PRUEBAS DE LABORATORIOS QUE NO ESTEN ACREDITADOS.

PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS CONTRATADAS, **"LA SECRETARIA"** CONTARÁ CON LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES EXTERNO, EL CUAL ELABORARÁ LAS PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, REVENIMIENTO, RESISTENCIA DE LOS CONCRETOS Y CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LAS OBRAS CONTRATADAS.

DÉCIMA PRIMERA: REPRESENTANTE DEL "CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER LA RESIDENCIA DE OBRA DEBIENDO ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE SERA EL **SUPERINTENDENTE** DE CONSTRUCCIÓN Y PARA TAL EFECTO **"EL CONTRATISTA"** DESIGNA AL **ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO** CON CÉDULA PROFESIONAL No. **2220846** EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES EL **22 DE NOVIEMBRE DEL 1995**, REGISTRADO COMO RESPONSABLE TÉCNICO, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES TÉCNICAS EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

QUE DEBERÁ CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, CATÁLOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCIÓN Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN Y NORMAS DE CALIDAD, BITÁCORA, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL **SUPERINTENDENTE** DE CONSTRUCCIÓN DESIGNADO POR **"EL CONTRATISTA"**, TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE CONOCER EL CONTRATO, EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEBERÁ ESTAR FACULTADO PARA DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA ACEPTAR U OBJETAR LAS ESTIMACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN Y, EN GENERAL, PARA ACTUAR A NOMBRE DEL **"CONTRATISTA"** CON LAS FACULTADES LEGALES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

EL **SUPERINTENDENTE** DE CONSTRUCCIÓN DEBE ESTAR FACULTADO POR **"EL CONTRATISTA"**, PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, ASÍ COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"LA SECRETARÍA" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, Y DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCIÓN DEL MISMO, Y **"EL CONTRATISTA"** EN UN PLAZO DE CINCO DÍAS NATURALES TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOMBRAR A OTRO QUE REÚNA LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DE ESTA CLÁUSULA.

DÉCIMA SEGUNDA: RELACIONES LABORALES.

"EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL.

"EL CONTRATISTA" CONVIENE, POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE **"LA SECRETARÍA"**, QUIEN QUEDA EXCLUIDO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD ANTE RECLAMACIONES JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES.

DE IGUAL FORMA, **"EL CONTRATISTA"** RESPONDERÁ POR CUALQUIER RELACIÓN JURÍDICA QUE SE ORIGINE POR ACTOS JURÍDICOS CONTRAÍDOS CON PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS Y DEMÁS OPERARIOS QUE CONTRATE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, MATERIA DE ESTE CONTRATO.

DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DEL "CONTRATISTA".

CON EL OBJETO DE LLEVAR UNA PERMANENTE VIGILANCIA DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN **"EL CONTRATISTA"** DEBERÁ RESPONDER POR LA DEBIDA CAPACIDAD Y PROFESIONALISMO DE SUS TÉCNICOS Y TRABAJADORES QUE EJECUTEN LA OBRA, PERMITIENDO EN TODO MOMENTO Y OTORGANDO TODAS LAS FACILIDADES NECESARIAS AL PERSONAL TÉCNICO DE **"LA SECRETARÍA"** PARA REALIZAR LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN, PROPORCIONANDO TODA LA INFORMACIÓN QUE SEA REQUERIDA DE IGUAL FORMA.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS, Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE **"LA SECRETARÍA"**; ASÍ, COMO A RESPONDER, POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, SE LLEGUEN A CAUSAR A **"LA SECRETARÍA"**, O A TERCEROS; EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO HASTA POR SU MONTO TOTAL.

IGUALMENTE, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES Y TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARAN ESTE CONTRATO (ESTIMACIONES DE OBRA, FACTURAS O CONTRA RECIBOS) SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE **"LA SECRETARÍA"**.

"EL CONTRATISTA" NO PODRÁ SUBCONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA O PARTE DE LA MISMA.

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CUANDO ÉSTOS NO SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE POR ESCRITO LE PROPORCIONE **"LA SECRETARÍA"** ÉSTE ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA Y SERÁN POR CUENTA DE **"EL CONTRATISTA"**.

"EL CONTRATISTA" DEBERÁ SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD QUE **"LA SECRETARÍA"** TENGA ESTABLECIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, A LOS DEMÁS REGLAMENTOS U ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA, ASI COMO, LOS LINEAMIENTOS DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA SALUD QUE DEBERÁ CUMPLIR EL SECTOR DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL **COVID-19** CON EL OBJETIVO DE EVITAR EL CONTAGIO Y CONTENER LA PROPAGACIÓN.

"EL CONTRATISTA" SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A **"LA SECRETARÍA"** O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS POR NO AJUSTARSE AL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES. LOS RIESGOS Y LA CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA DEFINITIVA A **"LA SECRETARÍA"**, SERÁN A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"**.

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE TODOS LOS ADEUDOS QUE FRENTE AL FISCO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL TENGA, CON MOTIVO DE CONTRIBUCIONES QUE SE CAUSEN COMO CONSECUENCIA Y EN EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE CONTRATAN (IMPUESTOS, DERECHOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL)

DÉCIMA CUARTA: MODIFICACIONES AL CONTRATO.

"LA SECRETARÍA" PODRÁ DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, MODIFICAR ESTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NÚMERO 266.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARÍAN EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRÁN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERÁN SER SUSCRITOS BAJO RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE HAYAN FIRMADO EL CONTRATO O QUIENES LOS SUSTITUYAN EN EL CARGO. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRÁN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NÚMERO 266.

LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRÁN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE EN REDUCCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN O MONTO DEL MISMO. SI SE MODIFICA EL PLAZO, LOS PERIODOS SE EXPRESARÁN EN DÍAS NATURALES, Y LA DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE VARIACIÓN SE HARÁ CON RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO; EN TANTO QUE SI ES AL MONTO, LA COMPARACIÓN SERÁ CON BASE EN EL MONTO CONVENIDO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SERÁN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AÚN CUANDO PARA FINES DE SU FORMALIZACIÓN PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.

LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO LAS PARTES CONVIENEN EN QUE **"EL CONTRATISTA"** PODRÁ SOLICITAR POR ESCRITO UNA AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, SIEMPRE QUE POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR, CASOS FORTUITOS O CUALESQUIERA OTRA CAUSA NO IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA"**, LE FUERE IMPOSIBLE CUMPLIR CABALMENTE EN EL PLAZO ESTABLECIDO.

LAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN QUE **"LA SECRETARÍA"** TIENE LA FACULTAD DE AUTORIZAR O DENEGAR LA SOLICITUD, CUANDO A SU JUICIO EXISTAN LOS ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEN FEHACIENTEMENTE O NO LA PROCEDENCIA.

SE DEBERÁ SUSTENTAR EL DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, SEGÚN SEA EL CASO, CONSIDERÁNDOSE ÉSTOS PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA **"EL CONTRATISTA"** Y **"LA SECRETARÍA"** LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN.

DÉCIMA QUINTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.

"LA SECRETARÍA" EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA, PARA LO CUAL SE ELABORARÁ UN DICTAMEN QUE JUSTIFIQUE LAS CAUSAS QUE MOTIVAN LA SUSPENSIÓN, ESTABLECIENDO EL PLAZO DE LA SUSPENSIÓN, QUE PODRÁ PRORROGARSE SI LAS CIRCUNSTANCIAS QUE DIERON ORIGEN A LA INTERRUPCIÓN PERSISTEN, DEBIENDO INFORMAR EL CONTENIDO DE ESTA RESOLUCIÓN A **"EL CONTRATISTA"**; EN ESTE CASO SE INTERRUMPIRÁ EL CALENDARIO ORIGINALMENTE PREVISTO PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, SIN QUE ESTO IMPLIQUE LA CANCELACIÓN, EXTINCIÓN O DISMINUCIÓN DE LAS GARANTÍAS OTORGADAS.

CUANDO OCURRA LA SUSPENSIÓN, EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR **"LA SECRETARÍA"** NOTIFICARÁ POR ESCRITO A **"EL CONTRATISTA"**, SEÑALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LAS

ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

EN CASO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** HAYA SUSPENDIDO LOS TRABAJOS, CON BASE A LA INSTRUCCIÓN RECIBIDA POR ESCRITO, LA FECHA DE TERMINACIÓN SE PRORROGARÁ EN IGUAL PROPORCIÓN AL PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSIÓN, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIDO, FORMALIZÁNDOLA MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN, LA QUE CONTENDRÁ COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ARTÍCULO 147 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA SUSPENSIÓN SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"**, DEBIENDO ÚNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE SUSPENSIÓN Y LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAJOS RESULTEN DAÑADOS O DESTRUIDOS Y ÉSTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERÁN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRÉ EL CONVENIO PARA CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA"**.

NO SERÁ MOTIVO DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE **"EL CONTRATISTA"**.

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS O SI LA SUSPENSIÓN EXCEDE SEIS MESES **"EL CONTRATISTA"** TENDRÁ DERECHO A SOLICITAR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO, ATENDIENDO A LAS CIRCUNSTANCIAS DE CADA CASO EN CONCRETO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN.

DÉCIMA SEXTA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

"LA SECRETARÍA" PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL MUNICIPIO; O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS. DE PRESENTARSE ESTA SITUACIÓN, **"LA SECRETARÍA"** PAGARÁ A **"EL CONTRATISTA"** LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

DE IGUAL FORMA, CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, **"EL CONTRATISTA"** PODRÁ SUSPENDER LAS OBRAS EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR SU SOLICITUD A **"LA SECRETARÍA"**, QUIEN RESOLVERÁ DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA MISMA, EN CASO DE NEGATIVA, SERÁ NECESARIO QUE **"EL**

CONTRATISTA" OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL CORRESPONDIENTE LA DECLARATORIA RESPECTIVA.

SE ENTIENDE POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, AQUELLOS FENÓMENOS DE LA NATURALEZA O HECHOS DE PERSONAS CON AUTORIDAD PÚBLICA, GENERAL, INSUPERABLE, IMPREVISIBLE, O QUE PREVIÉNDOSE NO SE PUEDAN EVITAR, Y QUE ORIGINEN QUE UNA PERSONA REALICE UNA CONDUCTA DAÑOSA, CONTRARIA A UN DEBER JURÍDICO O A UNA OBLIGACIÓN. FENÓMENOS DE LA NATURALEZA O HECHOS DEL HOMBRE, TALES COMO (ENUNCIATIVAMENTE MAS NO LIMITATIVA) MOTINES, ACTOS DE TERRORISMO, CUARENTENAS, EPIDEMIAS, GUERRAS (DECLARADAS O NO), DISTURBIOS CIVILES, INSURRECCIONES, INCENDIOS (CUANDO NO SE HAYA DADO CAUSA O CONTRIBUIDOS A ELLOS), TORMENTAS, IMPIDIÉNDOLE TEMPORALMENTE O DEFINITIVAMENTE EN FORMA ABSOLUTA EL CUMPLIMIENTO PARCIAL O TOTAL DE LA OBLIGACIÓN, SIN QUE TALES HECHOS LE SEAN IMPUTABLES DIRECTA O INDIRECTAMENTE Y CUYA AFECTACIÓN NO PUEDE EVITARSE CON LOS INSTRUMENTOS DE QUE NORMALMENTE SE DISPONGA, YA PARA PREVENIR EL ACONTECIMIENTO O PARA OPONERSE A EL Y RESISTIRLO.

ASÍ MISMO, LA EXTINCIÓN O PÉRDIDA DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE **"EL CONTRATISTA"** DARÁ LUGAR A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, ACORDÁNDOSE PAGAR A SUS SUCESORES O BENEFICIARIOS LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERÁN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITÁCORA, DEBIENDO **"LA SECRETARÍA"** LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS INDICADOS POR EL ARTÍCULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO A **"EL CONTRATISTA"** POR **"LA SECRETARÍA"** ÉSTA PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE **"EL CONTRATISTA"**, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A **"LA SECRETARÍA"** EN UN TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

CUANDO SE DÉ POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, DEBERÁ ELABORARSE EL FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 168,169. 170, 171 y 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DÉCIMA SÉPTIMA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

LA SECRETARÍA" PODRÁ, EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA"** POR LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS, CONFORME A LO QUE ESTABLECE EL ART. 72 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, Y 154, 155, Y 157 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO, SUS ANEXOS Y EN SU CASO, DE SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS.

DARÁN LUGAR A DETERMINAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN LOS SUPUESTOS SIGUIENTES:

I. POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266 Y EL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS;

II. INTERRUMPA INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O SE NIEGUE A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS QUE SE HAYA DETECTADO COMO DEFECTUOSA POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD;

III. NO EJECUTE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATE LAS ÓRDENES DADAS POR EL RESIDENTE;

IV. NO DÉ CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN CONVENIDOS POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y, A JUICIO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO. NO IMPLICARÁ RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO Y, POR TANTO, NO SE CONSIDERARÁ COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISIÓN, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR LA FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES O LA FALTA DE INFORMACIÓN REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FÍSICA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, DE LICENCIAS Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR LA CONTRATANTE, ASÍ COMO CUANDO LA DEPENDENCIA O ENTIDAD HAYA ORDENADO LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS;

V. SEA DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANÁLOGA;

VI. SUBCONTRATE PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD;

VII. TRANSFIERA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD;

VIII. NO DÉ A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS;

IX. CAMBIE SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD;

X. SI SIENDO EXTRANJERO, INVOQUE LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL CONTRATO;

XI. INCUMPLA CON EL COMPROMISO QUE, EN SU CASO, HAYA ADQUIRIDO AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, RELATIVO A LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA

INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, Y

XII. EN GENERAL, INCUMPLA CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO.

LAS CAUSALES REFERIDAS DAN LUGAR A LA RESCISIÓN INMEDIATA DE ESTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA **"LA SECRETARÍA"**, ADEMÁS DE QUE SE LE APLIQUEN A **"EL CONTRATISTA"** LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISIÓN, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACIÓN DE UNO O DE OTRO, INDEPENDIENTEMENTE DE HACER EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y APLICARSE EN SU CASO A **"EL CONTRATISTA"** LOS DEMÁS CARGOS QUE PROCEDAN.

"LAS PARTES "CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** SE ENCUENTRE EN ALGUNA DE LAS CAUSALES INDICADAS EN LA CLÁUSULA ANTERIOR, EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA SE SUJETARÁ A LO SIGUIENTE:

1. EL PROCEDIMIENTO INICIARÁ A PARTIR DE QUE **"LA SECRETARÍA"** LE NOTIFIQUE A **"EL CONTRATISTA"** POR OFICIO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, SEÑALANDO LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVARON SU DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, RELACIONÁNDOLO CON LAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

2. TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE EL NUMERAL ANTERIOR, **"LA SECRETARÍA"** RESOLVERÁ CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER **"EL CONTRATISTA".**

3. LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO POR PARTE DE **"LA SECRETARÍA",** DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 1(UNO) DE ESTA CLÁUSULA.

UNA VEZ NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, **"LA SECRETARÍA"** SE ABSTENDRÁ, COMO MEDIDA PRECAUTORIA, DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA COMUNICACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS.

EN EL FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME EL PROGRAMA VIGENTE, ATENDIENDO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 162 Y 163 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO **"LA SECRETARÍA"** LE HAYA ENTREGADO A **"EL CONTRATISTA"**, ASÍ COMO CONSIDERAR EN SU INTEGRACIÓN LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE HAYA REALIZADO **"EL CONTRATISTA"** HASTA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO LOS EQUIPOS, MATERIALES QUE SE HUBIERAN INSTALADO EN LA OBRA O SE ENCUENTREN EN PROCESO DE FABRICACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SEAN SUSCEPTIBLES DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO

73 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266 Y 161 DEL REGLAMENTO.

EL SOBRECOSTO QUE SE DETERMINE AL ELABORAR EL FINIQUITO, SERÁ INDEPENDIENTE DE LAS GARANTÍAS, PENAS CONVENCIONALES Y DEMÁS CARGOS QUE DEBAN CONSIDERARSE EN LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.

COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO PROCEDERÁ A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE **"EL CONTRATISTA"**, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN Y ANTES DE SU CONCLUSIÓN, **"LA SECRETARÍA"** PODRÁ A SU JUICIO, SUSPENDER EL TRÁMITE DEL CITADO PROCEDIMIENTO, CUANDO SE HUBIERE INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO. EN EL CASO DE QUE SE DETERMINE NO RESCINDIR EL CONTRATO, SE REPROGRAMARÁN LOS TRABAJOS UNA VEZ NOTIFICADA LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE POR **"LA SECRETARÍA"** A **"EL CONTRATISTA"**.

"LA SECRETARÍA" PODRÁ OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISIÓN, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACIÓN DE UNAS O DE OTRO.

DECIMA OCTAVA: PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE ESTE CONTRATO, **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** CONVIENEN LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES RETENCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES:

A).-"LA SECRETARÍA" TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR MENSUALMENTE SI LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR **"EL CONTRATISTA"** DE ACUERDO CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO; PARA LO CUAL, **"LA SECRETARÍA"** COMPARARÁ EL AVANCE MES A MES CONTRA EL PROGRAMA, Y LOS TRABAJOS EFECTIVOS EJECUTADOS.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE, **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A HACER LAS RETENCIONES ECONÓMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN QUE SE DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA, HASTA LA DE REVISIÓN. LAS RETENCIONES SERÁN DETERMINADAS ÚNICAMENTE EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO OPORTUNAMENTE CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

CUANDO **"EL CONTRATISTA"** REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO SEÑALADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN, PODRÁ RECUPERAR LAS RETENCIONES ECONÓMICAS QUE SE LE HAYAN EFECTUADO, POR LO QUE **"LA SECRETARÍA"** LE REINTEGRARÁ EL IMPORTE DE LAS MISMAS QUE AL MOMENTO DE LA REVISIÓN TUVIERA ACUMULADAS.

LA APLICACIÓN DE ESTAS RETENCIONES TENDRÁ EL CARÁCTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, ÉSTOS NO SE HAN CONCLUIDO.

B).- SI **"EL CONTRATISTA"** NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO Y EN EL PROGRAMA DE TRABAJO, **"LA SECRETARÍA"** LE APLICARÁ LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR CADA MES O FRACCIÓN QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACIÓN PACTADA EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO HASTA EL MOMENTO DE SU TERMINACIÓN. DICHAS PENAS NO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES SE DESCONTARÁN ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN Y EL DE LAS PENAS CONVENCIONALES EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, Y SE APLICARÁN, SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA"** Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL QUE A JUICIO DE **"LA SECRETARÍA"** NO SE ATRIBUYA A CULPA DE **"EL CONTRATISTA"**.

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN, **"LA SECRETARÍA"** PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, O BIEN, LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA GARANTÍA DEL ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGÚN PROCEDA EN LA RESCISIÓN, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

SI **"LA SECRETARÍA"** OPTA POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, SE APEGARÁ A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA DE ESTE CONTRATO.

DECIMA NOVENA: TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARÁ A TRAVÉS DE LA BITÁCORA O POR ESCRITO A **"LA SECRETARÍA"** SOBRE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS ANEXANDO LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRÁ UNA RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA, Y ÉSTA VERIFICARÁ DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, SALVO QUE SE PACTE EXPRESAMENTE OTRO PLAZO, QUE LOS MISMOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS.

SI DURANTE LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, **"LA SECRETARÍA"** ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, DEBERÁ SOLICITAR A **"EL CONTRATISTA"** SU REPARACIÓN, A EFECTO DE QUE ÉSTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS. EN TAL CASO, EL PLAZO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE PODRÁ PRORROGAR POR EL PERIODO QUE ACUERDEN **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** PARA LA REPARACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE **"LA SECRETARÍA"** OPTE POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO.

UNA VEZ QUE SE HAYA CONSTATADO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A LA RECEPCIÓN FORMAL DE LOS MISMOS, EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, SUSCRIBIENDO EL **"ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN"** EN LA QUE CONSTE ESTE HECHO, DEBIENDO CONTENER COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 166 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR **A "LA SECRETARÍA"** DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE **A "LA SECRETARÍA"** HAYA CONSTATADO LA TERMINACIÓN REAL DE LOS TRABAJOS, TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL **FINIQUITO DEL CONTRATO**, INCLUYENDO ESTIMACIONES POR CONCEPTO DE OBRA EJECUTADA, CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA FUERA DE CATÁLOGO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, SOLICITUD DE AJUSTE A LOS COSTOS POR CONCEPTO DE IMPACTO INFLACIONARIO (EN CASO DE EXISTIR) Y **PLANO DE OBRA TERMINADA** EN EL QUE SE PLASMEN TODAS LAS MODIFICACIONES Y ADECUACIONES AL PROYECTO ORIGINAL PROPORCIONADO **"EL CONTRATISTA"** PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, TODO DEBIDAMENTE JUSTIFICADO Y CON LOS APOYOS NECESARIOS PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN POR PARTE DE **A "LA SECRETARÍA".**

"LA SECRETARÍA" NO ESTARÁ OBLIGADA A DAR TRÁMITE A LAS SOLICITUDES O DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTE SI **"EL CONTRATISTA"** NO CUMPLIESE CON LA ENTREGA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN ESTA CLÁUSULA.

VIGÉSIMA: FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** EN ESTE CONTRATO, SE DEBERÁ ELABORAR EL **FINIQUITO DE OBRA** CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS.

"LA SECRETARÍA" DEBERÁ NOTIFICAR POR OFICIO A **"EL CONTRATISTA"** LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL FINIQUITO; **"EL CONTRATISTA"** TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE ACUDIR AL LLAMADO QUE SE LE HAGA MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO. EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERÁ REUNIR COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTÍCULO 170 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS EL FINIQUITO DEBERÁ SER ELABORADO POR **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, HACIÉNDOSE CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE, DEBIENDO EXPONER, EN SU CASO, LAS RAZONES DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, **"EL CONTRATISTA"** NO ACUDA CON **"LA SECRETARÍA"** PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL TÉRMINO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR POR OFICIO SU RESULTADO A **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DEL TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A **"EL CONTRATISTA"**, ÉSTE TENDRÁ EL

TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA; SI TRANSCURRIDO ESTE TÉRMINO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO.

SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE **"EL CONTRATISTA"**, **"LA SECRETARÍA"** DEBERÁ LIQUIDARLOS DENTRO DEL TÉRMINO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES. SI RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE **"LA SECRETARÍA"** EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRÁ DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES ÉSTOS, DEBERÁ EXIGIRSE POR OFICIO SU REINTEGRO, MÁS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"LA SECRETARÍA"**, EN CASO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO, **"LA SECRETARÍA"** PODRÁ HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES. EN FORMA SIMULTÁNEA, SE LEVANTARÁ EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DÉ POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** EN ESTE CONTRATO, LA QUE DEBERÁ REUNIR COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS SEÑALADOS POR EL ARTÍCULO 172 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA LIQUIDACIÓN DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO PODRÁ UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** EN ESTE CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR ÚNICAMENTE UNA MANIFESTACIÓN DE **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE TENDRÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN. AL NO SER FACTIBLE EL PAGO EN EL TÉRMINO INDICADO, SE PROCEDERÁ A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** EN ESTE CONTRATO.

VIGÉSIMA PRIMERA: OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS.

"EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

- **EL 0.005** (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN PARA CUMPLIR CON EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, LO ANTERIOR, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

- **EL 0.002** (DOS AL MILLAR) PARA LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES AFILIADAS A LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO DE FECHA **06 DE MARZO DE 2019**, CELEBRADO POR LA MENCIONADA CÁMARA Y EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN CON **"LA SECRETARÍA"**, CON EL OBJETO DE APOYAR LA CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

➢ **EL 1.0%** (UNO PUNTO CERO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN POR CONCEPTO DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEPENDIENTE DE **"LA SECRETARÍA"**, CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

VIGÉSIMA SEGUNDA: JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES.

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CON SEDE EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, POR LO TANTO, **"EL CONTRATISTA"** RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LEÍDO POR LAS PARTES QUE EN ÉL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS FOJAS ÚTILES EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO; EL DÍA **13 DE OCTUBRE DEL 2020.**

POR "LA SECRETARÍA"

C. ING. ARQ. ARMANDO JAVIER SALINAS.
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"EL CONTRATISTA"

IRINA SALGADO HERNANDEZ
IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

000441

SPD-20

H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez 2018 - 2021

BIENESTAR

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020
FISMDF
ACTA DE ENTREGA – RECEPCION DE OBRAS 2020

EN LA LOCALIDAD DE COL. VALLE DE LAS FLORES MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ DEL ESTADO DE GUERRERO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020 SE REUNIERON LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
LIC. ADELA ROMAN OCAMPO	PRESIDENTA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO
	PRESIDENTE	COMITÉ LOCAL DESARROLLO COMUNITARIO

QUIEN ASISTE COMO REPRESENTANTE DE LAS DEPENDENCIAS AL ACTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DE LA OBRA DENÓMINADA: PAVIMENTACION DE CALLE UNIVERSIDAD
EJECUTADA POR: IMEXA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 23 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE UNIVERSIDAD

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN SE REALIZÓ CON RECURSOS DEL RAMO XXXIII.-

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020

NO. DEANEXO REMISION	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTROS
		$1,349,726.65		$1,349,726.65	

UNA VEZ VERIFICADA LA TERMINACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA – RECEPCIÓN AL

COMITÉ DE DESARROLLO COMUNITARIO

QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO; RECIBE DE CONFORMIDAD:

ENTREGA		RECIBE EL COMITÉ DE DESARROLLO COMUNITARIO	
Cargo:	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Cargo:	DAMARIS JESUS MARCIAL VAZQUEZ PRESIDENTE
Nombre y Firma	LIC. ADELA ROMAN OCAMPO	Nombre y firma	
		Cargo: Nombre y Firma	PAUL RESENDIZ FIERRO SECRETARIO
			ANABEL NAVARRETE CRUZ VOCAL
		Cargo. Nombre y Firma	TERESA RESENDIZ ROSENDIZ VOCAL
		Cargo: Nombre y Firma	MAURO MORALES BARRERA VOCAL
		Cargo. Nombre y Firma	

H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez 2018 - 2021

000442

BIENESTAR

"2020, Año Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN Y FINIQUITO DE OBRA PÚBLICA

SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA **19 DE DICIEMBRE DE 2020** Y HABIÉNDOSE VERIFICADO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: **MAJ-FAISM/175-2020/AD,** CONSISTENTES EN **PAVIMENTACION DE CALLE UNIVERSIDAD,** UBICADA EN: COL. VALLE DE LAS FLORES, DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.

SE PROCEDE A LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRA BAJO LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES: LOS TRABAJOS, OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ANTES CITADO, FUERON REALIZADOS POR LA EMPRESA DENOMINADA: **IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.,** HABIENDO ESTADO COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA Y RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS MISMOS POR PARTE DE DICHA EMPRESA, EL (LA): **C. ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO ,** POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, ESTUVO COMO RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN Y VERIFICIACIÓN DE LA CORRECTA REALIZACIÓN DE LA OBRA EL (LA): **ARQ. JAHAZIEL VELAZQUEZ SONORA,** EL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO FUE DE **$ 1,349,726.65 (UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 65/100 M.N.)** I.V.A INCLUIDO SIN HABER EXISTIDO NINGUN CONVENIO ADICIONAL.

EL PERIODO ORIGINAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ESPECIFICADO EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA FUE EL SIGUIENTE: FECHA DE INICIO: **23 DE OCTUBRE DE 2020**
FECHA DE TERMINACION: **31 DE DICIEMBRE DE 2020.**

EL PERIODO REAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL CONVENIO ADICIONAL FUE EL SIGUIENTE : FECHA DE INICIO: **23 DE OCTUBRE DE 2020.**
FECHA DE TER,MINACION : **19 DE DICIEMBRE DE 2020**

LAS ESTIMACIONES DE OBRA QUE SE REALIZARON A LA FECHA DE ESTA ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION SON LOS SIGUIENTES:

ESTIMACION No.: **01 (UNO)** FECHA DE INICIO: **23/10/2020**
FECHA DE TERMINACIÓN: 30/11/2020
$ 944,808.66 IVA INCLUIDO

ESTIMACION No.: **02 (DOS)** Y FINIQUITO FECHA DE INICIO: 01/12/2020
FECHA DE TERMINACIÓN: 19/12/2020
$ 404,917.99 IVA INCLUIDO

SE HACE CONSTAR EN ESTA ACTA POR AMBAS PARTES, QUE TODOS LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SE ENCUENTRAN EN PODER DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ.

H. Ayuntamiento Constitucional de
Acapulco de Juárez
2018 - 2021

000443

BIENESTAR

"2020, Año Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN Y FINIQUITO DE OBRA PÚBLICA

ASÍ TAMBIÉN, SE MANIFIESTA QUE CON ESTA FECHA, INICIA EL PLAZO DE DOCE MESES EN EL QUE LA EMPRESA: **IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.** QUEDA OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO NUM.: **MAJ-FAISM/175-2020/AD** DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE, QUEDANDO COMO GARANTÍA DE LO ANTES SEÑALADO, LA FIANZA NUM. EXPEDIDA POR LA AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA, EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS PARA COLOCACION DE TUBERIA DE 12", RELLENO DE MATERIAL PROD. DE EXCAVACION, APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS, AFINE Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE, FORMACION DE BASE DE 20 CMS DE ESPESOR, AFINE Y COMPACTACION EN AREA DE BANQUETAS, EXCAVACION A MANO PARA CIMENTACION DE MURO, MURO DE PIEDRA BRAZA DE LA REGION, DREN PARA MURO, CAMA DE ARENA PARA TUBERIA DE P.V.C. DE 2"1/2" HIDRAULICA Y PARA TUBERIA DE 12" SANITARIA, TENDIDO DE TIUBERIA DE P.V.C. DE 2"1/2", TOMA DOMICILIARIA, CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA, CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE FORMA CONICA, SUM. Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO, DESCARGA DOMICILIARIA, REGISTRO SANITARIO, SUM. E INSTALACION DE TUBERIA ANULAR CORRUGADA DE 12", GUARNICION Y BANQUETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, SUM. Y COLOC. DE MEMBRANA DE POLIETILENO, PAVIMENTO PREMEZCLADO DE 15 CMS DE ESP. DE F'C=250 KG/CM2, ZAMPEADO DE PIEDRA BRAZA DE LA REGION, ACERO DE REFUERZO DEL #4, 6 Y 8 F'Y= 4,200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA, CIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA, LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 20 CMS DE ESPESOR, F'C= 250 KG/CM2, LOSA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VAR. DEL No 4 A CADA 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, F'C=250 KG/CM2, CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y/O CORTE FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA PARA SU ENTREGA.

SIENDO LAS 14:30 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL MÁRGEN Y AL CALCE LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

ARQ. VICENTE ALARCON SEVERIANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
IRINA SALGADO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

POR EL H. AYUNTAMIENTO:

ARQ. JAHAZIEL VELAZQUEZ SONORA

RESIDENTE DE OBRA

ING. GERARDO CATALAN QUIROZ
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE UPERVISION DE OBRA PUBLICA ZONA RURAL.

ARQ. FRANCISCO JAVIER CHAVARRIA PEÑALOZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

000444

"2020, Año Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ROBERTO POSADA Y COMONFORT S/N COL. CENTRO C.P.39300 ACAPULCO DE JUAREZ

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

CON FUNDAMENTO EN EL PARRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTICULO 172 DE SU REGLAMENTO; SE PROCEDE A LEVANTAR ESTA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA CUAL SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA No. **MAJ-FAISM/175-2020/AD**, Y CONVENIO No._____ RELATIVO A LA OBRA: **PAVIMENTACION DE CALLE UNIVERSIDAD,** UBICADA EN: **COL. VALLE DE LAS FLORES.**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
INFORMACION BASICA INICIAL

ÁREA ENCARGADA DE LA OBRA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

OBJETO DEL CONTRATO: " EL ORGANISMO " encomienda a **" EL CONTRATISTA"** la realización de una obra consistente en la **PAVIMENTACION DE CALLE UNIVERSIDAD,** en la: **COL. VALLE DE LAS FLORES,** y este se obliga a realizar hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en la declaración II.8 del apartado de Declaraciones de **" EL CONTRATISTA "**, apegándose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, así como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos.

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS: GUERRERO.

ANTECEDENTES:

NÚMERO DEL OFICIO DE AUTORIZACION:

FECHA DE ADJUDICACION: 13 DE OCTUBRE DE 2020.

NUMERO DE CONTRATO: MAJ-FAISM/175-2020/AD

FECHA INICIACIÓN SEGÚN BITÁCORA DE OBRA: 23 DE OCTUBRE DE 2020

FECHA TERMINACIÓN SEGÚN BITÁCORA DE OBRA: 19 DE DICIEMBRE DE 2020.

I.- EN LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **31 DE DICIEMBRE DE 2020**, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA RESIDENCIA DE OBRA, CITA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, EN ROBERTO POSADA Y COMONFORT S/N COL. CENTRO C.P. 39300, ACAPULCO,GRO.

II.- QUE PARA REALIZAR EL ACTO SEÑALADO SE ENCUENTRA REUNIDAS LAS PERSONAS ADSCRITAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, LOS SERVIDORES PUBLICOS DEBIDAMENTE ACREDITADOS EN SU PERSONALIDAD Y ACTUANDO CONFORME A LA DELEGACION DE FACULTADES EN PRESENTACION DE LA SECRETARIA ", **LOS CC. ING. ARMANDO JAVIER SALINAS, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, ARQ. FRANCISCO JAVIER CHAVARRIA PEÑALOZA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, C. ING. ARQ. MELECIO VAZQUEZ PELAEZ,** JEFE DE SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y/O **ING. GERARDO CATALAN** QUIROZ, ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA ZONA RURAL. **Y VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS Y POR LA OTRA PARTE PERSONA FISICA O MORAL IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. REPRESSENTADA POR EL C. ING. IRINA SALGADO** HERNANDEZ SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL.

"2020, Año Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ROBERTO POSADA Y COMONFORT S/N COL. CENTRO C.P.39300 ACAPULCO DE JUAREZ

III.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN.

INFRAESTRUCTURA: EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS, CIMENTACION PARA PUENTE Y MUROS A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS DE PIEDRA BRAZA

SUB-ESTRUCTURA: MUROS DE PIEDRA BRAZA DE LA REGION, CIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA

SUPERESTRUCTURA: CABEZAL A BASE DE TRABES DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DEL No. 4, 6 Y 8, Y LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 20 CMS. DE ESPESOR F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL No. 4, 6 Y 8, Llosa DE 10 CMS. DE ESPESOR F'C= 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL N° 4 A CADA 15 CMS.

TERRACERIAS: APERTURA DE CAJA POR MEDIOS MECANICOS, AFINE Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE, FORMACION DE BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR, AFINE Y COMPACTACION EN AREA DE BANQUETAS.

PAVIMENTOS: GUARNICION Y BANQUETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, SUM. Y COLOC. DE MEMBRANA DE POLIETILENO, PAVIMENTO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CMS, DE ESPESOR, CORTE EN JUNTAS DE PISO, CALAFATEO EN LOSAS Y GUARNICIONES, PINTURA ESMALTE AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES, DENTELLON DE CONCRETO.

OBRAS COMPLEMENTARIAS: ZAMPEADO DE PIEDRA BRAZA, ACARREOS DE MATERIAL Y LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.

IV.- DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES.

MEDIANTE ESCRITO DE FECHA_____, LA EMPRESA CONTRATISTA SOLICITA MEDIANTE OFICIO, SE LE AUTORICE LA EJECUCION DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, NO CONTEMPLADOS EN EL CATALAGO DE CONCEPTOS ORIGINAL DEL CUAL SE AUTORIZO MEDIANTE NOTA DE BITACORA _____., REFERENTE.. _____ ,ASI COMO TAMBIEN, OBRA ADICIONAL EN LOS CONCEPTOS _____.

RELACION DE OBLIGACIONES Y FECHA EN QUE SE CUMPLIERON.

FIRMA DE CONTRATO:
FIRMA DE CONVENIO_____.

ANTICIPO:
FIANZAS:
CONTRATO

- DE CUMPLIMIENTO: _____DE FECHA **13 DE OCTUBRE DE 2020**
- DE ANTICIPO: _____DE FECHA **13 DE OCTUBRE DE 2020.**
- DE VICIOS OCULTOS: _____DE FECHA **13 DE OCTUBRE DE 2020 .**

CONVENIO

- DE CUMPLIMIENTO: _____ DE FECHA _____
- DE ANTICIPO: _____ DE FECHA _____
- DE VICIOS OCULTOS: _____ DE FECHA _____

000446

"2020, Año Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ROBERTO POSADA Y COMONFORT S/N COL. CENTRO C.P.39300 ACAPULCO DE JUAREZ

TERMINACION DE TRABAJOS: **19 DE DICIEMBRE DEL 2020**
FINIQUITO: **19 DE DICIEMBRE DEL 2020**
ENTREGA - RECEPCION: **19 DE DICIEMBRE DEL 2020**

MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL: **$ 1,349,726.65** **I.V.A INCLUIDO.**

MONTO DE LAS AMPLIACIONES:

MONTOS DE LAS AMPLIACIONES:

MONTO TOTAL CONTRATADO: **$ 1,349,726.65** **I.V.A INCLUIDO.**
SANCIONES: NO SE PRESENTARON

V.- **LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS** DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR CUANTO A LAS FIANZAS No. DE FECHA **13 DE OCTUBRE DEL 2020** POR CONCEPTO DE VICIOS OCULTOS POR SU PARTE LA PERSONA FISICA O MORAL **IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.** , **REPRESENTADA POR LA C. IRINA SALGADO HERANDEZ** , EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, MANIFIESTA QUE NO SE RESERVA ACCION NI TIENE RECLAMACION ALGUNA CON POSTERIORIDAD A LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA, POR LO CUAL SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA No. **MAJ-FAISM/175-2020/AD** Y CONVENIO No._____.

SIN OTRO ASUNTO EN PARTICULAR QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, SIENDO LAS **12:30** HORAS DEL DIA **31 DE DICIEMBRE DEL 2020** FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

SRIO. DE DES.URB. Y OBRAS PÚBLICAS

ING. ARQ. ARMANDO JAVIER SALINAS

POR LA EMPRESA

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
C. IRINA SALGADO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 2018-2021

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. FRANCISCO JAVIER CHAVARRIA PEÑALOZA

ENCARGADO DE SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO
DE OBRA PUBLICA ZONA RURAL.

ING.GERARDO CATALAN QUIROZ

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. **41066004-016-2023.**
REFERENTE A LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**

000447

AT-5 MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LA OBRA QUE SUBCONTRATARÁ, EN CASO DE HABERSE PREVISTO EN LA CONVOCATORIA ALA LICITACIÓN PÚBLICA. LA S. D. U. O. P. DEBERÁ SOLICITAR LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN.

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01
CEL. 744 2354717 / 744 4490912 E-MAIL: mexa@telmexmail.com, gno_0301@hotmail.com

ANEXO AT-5 MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LA OBRA QUE SUBCONTRATARÁ, EN CASO DE HABERSE PREVISTO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL, NÚMERO, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ DEBERÁ SOLICITAR LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN.

Acapulco de Juárez, Gro., a 03 de agosto de 2023.

Ing. Luz María Meraza Radilla.
Secretaría De Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
del Municipio De Acapulco De Juárez, Guerrero
Presente

Que en mi carácter de **Administrador Único**, de la empresa **IMEXA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.**, lo que se acredita en los términos del testimonio de la póliza número **1585**, de fecha **16 de diciembre de 2009**, otorgada ante la fe del Licenciado **SHUNASHI JAZMÍN ALTAMIRANO PINEDA** Corredor Público número 5, de la Ciudad de Acapulco, Gro., inscrita en el Registro Público de la Ciudad de Acapulco, Guerrero, en el folio número **10160*17**, con fecha **17 de febrero de 2010**, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal, número **41066004-016-2023**, de fecha **18 de julio de 2023**, relativa a los trabajos consistentes en **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 44, fracción XX de la Ley de Obras Públicas y Servicios Estado de Guerrero No. 266, y a lo solicitado en el anexo AT 5 de la convocatoria a la licitación, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la parte de los trabajos que se subcontratarán serán los siguientes:

A). -_____;

No aplica

La subcontratación de la parte de los trabajos antes mencionados serán encomendados a las empresas _____ y _____, mismas que cuentan con la con la experiencia y capacidad técnica y económica para ejecutarlos, anexando la documentación que lo acredita y, asimismo mi representada será la única responsable de las obligaciones que adquieran las subcontratistas en la parte de los trabajos subcontratados y no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 83, segundo párrafo, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

ATENTAMENTE

ING. IRINA SALGADO HERNÁNDEZ.
ADMINISTRADOR ÚNICO.

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. **41066004-016-2023.**
REFERENTE A LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**

000449

AT-6 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, LOS CUALES DEBERÁN INTEGRARSE POR COPIA SIMPLE DE LA DECLARACIÓN FISCAL DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS.
DECLARACIONES PARCIALES DEL 2023
Y BALANCE GENERAL CON ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS ANTERIORES Y EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS.

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01 CEL. 744 2354717 / 744 4490912 E-MAIL: [illegible], gno_0301@hotmail.com

gob.mx

Servicio de Administración Tributaria

000450

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
23NC4660441	ICO091216UUA

Nombre, Denominación o Razón social

IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 01 de agosto de 2023, a las 11:11 horas

Notas

1.-Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.28. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023.

2.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

3.-La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

4.-Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

Cadena Original

||ICO091216UUA|23NC4660441|01-08-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital

k4H+0kHZ64raqgtxra3lmMZsZHqMG1c/atjtLrKId/7ARGA7J+L4ndTO2XhsX3xI7qA6U32p9UIA8W8p9m1e6gXLS
Xi997f2bqCwBtR8m0I0u8TQ5YHe5mNqquFErsrVyfBWM9Uuu3VwgmYbIVJJmxbfShYas+07Y1wExRTZn03x3kBnyf
9esZaiGgUwGLHEvhq+urOcSzIWas8J26KVoSXTM0WWlvr0orY8yiUD9+TrlR5GYbmd1VhbQWhmtd9PZVwknP1MzCk
kPtU+A3s2I9La3oHK33rTFRutlRQz+6ZrWbXv0EHauOXMECH7MdRSLTpQidZpWhgv/9BuKYA==

GOBIERNO DE MÉXICO | HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | SAT SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Contacto:
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México. Atención telefónica 01 55 627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá 01 877 44 88 728.

Notas

5.-La opinión que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública

6.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Cadena Original

||ICO091216UUA|23NC4660441|01-08-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital

k4H+0kHZ64raqgtxra3lmMZsZHqMG1c/atjtLrKld/7ARGA7J+L4ndTO2XhsX3xI7qA6U32p9UIA8W8p9m1e6gXLS
Xi997f2bqCwBtR8m0l0u8TQ5YHe5mNqquFErsrVyfBWM9Uuu3VwgmYbIVJJmxbfShYas+07Y1wExRTZn03x3kBnyf
9esZaiGgUwGLHEvhq+urOcSzIWas8J26KVoSXTM0WWlvr0orY8yiUD9+TrlR5GYbmd1VhbQWhmtd9PZVwknP1MzCk
kPtU+A3s2I9La3oHK33rTFRutlRQz+6ZrWbXv0EHauOXMECH7MdRSLTpQidZpWhgv/9BuKYA==

Contacto:
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México. Atención telefónica 01 55 627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá 01 877 44 88 728.

000452

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
Declaración Anual de Personas Morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: ICO091216UUA

Hoja 1 de 1

Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Período de la declaración:	Del Ejercicio	**Ejercicio:**	2022
Fecha y hora de presentación:	07/04/2023 21:07	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	230080156925	**Vencimiento obligación:**	03/04/2023

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR PERSONAS MORALES
Impuesto a cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto presentado 2:	ESTADOS FINANCIEROS

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

Sello digital :

qAeYCFYTkfA5RFxMEhLzn3xErqEoNWVkcL5EQEa3RmVT4I1+wLP8WesNz+HiSCd4nfEwSjzKACz7O5RcjbdQwjRFqYMg6kefUrLY
IR1lFgBDVW/NhGQV5MEwtmac8oWCrFSMdyGGq5jEWoPaNd4XKY2PFg9opYqcDyNhhFjMY/xISsncHtPbOPEO3FsGiVwvyztMxvUC
dPq+T0B8l2pEw9g9QtgOjHiXoAPJrZS+VkuulqnXfc1kq6PBZkkD2dm0BUyeYbwzMY6QJhngPIAm5E4579b7YlquA/dqBGv8UnGt
UomOPLcYYe60x41Zojx4GVVF30GbkEPG6g3FkOQoWg==

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV
Tipo de declaración:	Normal
Período de la declaración:	Del Ejercicio
Ejercicio:	2022
Número de operación:	230080156925
Fecha y hora de presentación:	07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación:	03/04/2023

DATOS ADICIONALES

¿ESTÁS OBLIGADO A DICTAMINAR ESTADOS FINANCIEROS EN TÉRMINOS DEL 32-A DEL CFF?	No
¿ESTÁS OBLIGADO A PRESENTAR LA INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN FISCAL, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 32-H DEL CFF?	No

INGRESOS

INGRESOS EXENTOS O NO ACUMULABLES	0

INGRESOS EXENTOS

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
SIN INGRESOS EXENTOS	0
Total	**0**

INGRESOS NO ACUMULABLES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
SIN INGRESOS NO ACUMULABLES.	0
Total	**0**

TOTAL DE INGRESOS EXENTOS O NO ACUMULABLES	0
INGRESOS NOMINALES	10,807,721
IMPORTE POR DETALLAR	0
IMPORTE DETALLADO	10,807,721

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
OTROS INGRESOS O PRODUCTOS	10,807,721

IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	10,807,721
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN	0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

INGRESOS

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES?	NO
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	0
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0781
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0
¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL?	NO
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	10,807,721

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220900034949	01/03/2022
FEBRERO	1,703,874	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220980004889	01/03/2022
MARZO	1,956,250	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220290281815	21/04/2022
ABRIL	3,982,724	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220720317153	04/05/2022
MAYO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220240520963	24/06/2022
JUNIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220460115599	21/07/2022
JULIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN	220820119130	18/08/2022

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
		CERO		
AGOSTO	517,241	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220810816723	14/09/2022
SEPTIEMBRE	385,354	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220170276887	19/10/2022
OCTUBRE	359,029	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220861015895	03/11/2022
NOVIEMBRE	1,148,026	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220381141764	03/12/2022
DICIEMBRE	755,223	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230790000499	03/01/2023
Total	3,807,721			

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	580,859

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	595,755	24

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	595,755	0	0	0	24
ASIMILADOS A SALARIOS	0	0	0	0	0

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

SUELDOS Y SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA	31,694

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA	564,061
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL	595,755

TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	47,799	0	0	0	0	10	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220000323699	14/02/2022

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	41,535	0	0	0	0	10	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220980004889	01/03/2022

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	36,819	0	0	0	0	7	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220290281815	21/04/2022

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	32,670	0	0	0	0	6	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220720317153	04/05/2022

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	33,332	0	0	0	0	8	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220240520963	24/06/2022

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JUNIO	28,128	0	0	0	0	6	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220460115599	21/07/2022

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO	31,088	0	0	0	0	6	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220820119130	18/08/2022

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AGOSTO	54,827	0	0	0	0	12	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220810816723	14/09/2022

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodo de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
SEPTIEMBRE	70,909	0	0	0	0	14	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220170276887	19/10/2022

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
OCTUBRE	76,102	0	0	0	0	15	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220861015895	03/11/2022

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
NOVIEMBRE	47,102	0	0	0	0	9	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220381141764	03/12/2022

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
DICIEMBRE	95,445	31,694	1,051	1,051	0	11	PRESENTADA PAGADA	230790000499	03/01/2023

ISR A CARGO	1,051
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,051
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	1,051
CANTIDAD PAGADA	1,051

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodo de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Total	595,755	31,694	2,203	1,051	1,152	24			

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	595,755
IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	31,694
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA	14,896
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA	0
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL	14,896

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

	Exenta	Gravada	Total
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0	0	0
VIÁTICOS	0	0	0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0	0	0
SELECCIONA EL PORCENTAJE A APLICAR EN LA NÓMINA EXENTA	MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR		
NÓMINA EXENTA NO DEDUCIBLE	14,896		14,896
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE	14,896	0	14,896

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. EXENTA	16,798
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. GRAVADA	564,061

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL	580,859

ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS	0

TOTAL DE NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0			0	0	NO PRESENTADA		
FEBRERO	0			0	0	NO PRESENTADA		
MARZO	0			0	0	NO PRESENTADA		
ABRIL	0			0	0	NO PRESENTADA		

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	0			0	0	NO PRESENTADA		

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JUNIO	0			0	0	NO PRESENTADA		

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO	0			0	0	NO PRESENTADA		

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AGOSTO	0			0	0	NO PRESENTADA		

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
SEPTIEMBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
OCTUBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
NOVIEMBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
DICIEMBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Total	0	0	0	0	0			

IMPORTE DE LA NÓMINA POR ASIMILADOS CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS: 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE: 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

VIÁTICOS: 0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodo de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES Y COOPERATIVAS	0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE	0
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE	0

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL	580,859
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE	0
NÓMINA DEDUCIBLE	580,859
MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO	0

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO

NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	0
NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO	0

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR	580,859
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES	14,896

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL EJERCICIO	2,581

SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA

PERIODO	MONTO
ENERO	274
FEBRERO	0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO
MARZO	206
ABRIL	0
MAYO	749
JUNIO	150
JULIO	204
AGOSTO	107
SEPTIEMBRE	157
OCTUBRE	396
NOVIEMBRE	120
DICIEMBRE	217
Total	**2,580**

SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR	
SUBSIDIO PAGADO DEVUELTO POR LA AUTORIDAD	
TOTAL DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DISPONIBLE	2,581
SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES	0
SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	0

DETALLE DE SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220000323699	14/02/2022
FEBRERO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220980004889	01/03/2022
MARZO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220290261615	21/04/2022
ABRIL		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220720317153	04/05/2022

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220240520963	24/06/2022
JUNIO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220460115599	21/07/2022
JULIO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220820119130	18/08/2022
AGOSTO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220810816723	14/09/2022
SEPTIEMBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220170276887	19/10/2022
OCTUBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220861015895	03/11/2022
NOVIEMBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220381141764	03/12/2022
DICIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	230790000499	03/01/2023
Total	0			

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES: 0

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES

CONCEPTO	MONTO
ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	0
ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0
Total	0

SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN: 2,581

GASTOS: 7,379,889

GASTOS

Concepto	Nómina	Importe
ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES Y COOPERATIVAS	0	0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS / RESICO	0

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

Mes	Importe de honorarios pagados a personas físicas o RESICO	ISR retenciones por pago de honorarios o RESICO	Estatus	N° de operación de declaración	Fecha de presentación de la declaración
ENERO			NO PRESENTADA		
FEBRERO			NO PRESENTADA		
MARZO			NO PRESENTADA		
ABRIL			NO PRESENTADA		
MAYO			NO PRESENTADA		
JUNIO			NO PRESENTADA		
JULIO			NO PRESENTADA		
AGOSTO			NO PRESENTADA		
SEPTIEMBRE			NO PRESENTADA		
OCTUBRE			NO PRESENTADA		
NOVIEMBRE			NO PRESENTADA		
DICIEMBRE			NO PRESENTADA		
TOTAL	0	0			

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS O RESICO, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
TOTAL DE ISR RETENCIONESPOR PAGO DE HONORARIOS O RESICO, SOLO PERIODOS PAGADOS	0

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS 0

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

Mes	Importe del pago por el uso o goce temporal de bienes inmuebles	ISR retenciones por arrendamiento de inmuebles	Estatus	Nº de operación de declaración	Fecha de presentación de la declaración
ENERO			NO PRESENTADA		
FEBRERO			NO PRESENTADA		
MARZO			NO PRESENTADA		
ABRIL			NO PRESENTADA		
MAYO			NO PRESENTADA		
JUNIO			NO PRESENTADA		
JULIO			NO PRESENTADA		
AGOSTO			NO PRESENTADA		
SEPTIEMBRE			NO PRESENTADA		
OCTUBRE			NO PRESENTADA		
NOVIEMBRE			NO PRESENTADA		
DICIEMBRE			NO PRESENTADA		
TOTAL	0	0			

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE LOS IMPORTES DEL PAGO POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, SOLO PAGADOS	0
TOTAL DE ISR RETENCIONES POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
INTERESES NETOS	0

CONCEPTO	IMPORTE
GASTOS EN GENERAL	7,379,889

GASTOS	7,379,889
DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	0

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO	IMPORTE
SIN GASTOS RELACIONADOS A LA NÓMINA	0

TOTAL DE DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	0
GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA	0
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	0

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

DEPRECIACIÓN APLICADA	TIPO DE INVERSIÓN	SUBTIPO DE INVERSIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN	GASTOS RELACIONADOS	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN	DEDUCCIÓN ACTUALIZADA
SIN DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	SIN INVERSIONES	SIN INVERSIONES	0	0	0	0
Total					0	0

TOTALES DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES	0
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES	0
COSTO DE LO VENDIDO	

COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO	NO APLICA
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	0
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA	0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0781
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0
¿TIENES FACILIDADES ADMINISTRATIVAS O ESTÍMULOS DEDUCIBLES?	NO
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	7,379,889

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	10,807,721
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	7,379,889

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

UTILIDAD FISCAL ANTES DEL PTU	2,907,973
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
PTU TIMBRADA Y PAGADA A MAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
UTILIDAD FISCAL ANTES DEL PTU	2,907,973
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

LÍMITE DE PÉRDIDAS A APLICAR	0
MONTO POR APLICAR	

ORIGEN DE LA PÉRDIDA	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE GENERÓ LA PÉRDIDA	PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR	PÉRDIDA FISCAL ACTUALIZADA	POR APLICAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
PROPIA			0	0		0

AÑO EN QUE SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ	
MES EN QUE SE GENERÓ O SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ LA PÉRDIDA	
INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA LA PÉRDIDA/MES	
INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA LA PÉRDIDA/INPC	
INPC DEL MES EN QUE SE GENERÓ O SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ LA PÉRDIDA/MES	
INPC DEL MES EN QUE SE GENERÓ O SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ LA PÉRDIDA/INPC	
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN DEL PERIODO	

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR	0
PÉRDIDA ACTUALIZADA	0

ORIGEN DE LA PÉRDIDA	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE GENERÓ LA PÉRDIDA	PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR	PÉRDIDA FISCAL ACTUALIZADA	POR APLICAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
Total			**0**	**0**	**0**	**0**

RESULTADO FISCAL	0
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	0
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	0
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES STRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

LÍMITE DEL IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0
MONTO POR APLICAR	0

Ejercicio al que corresponde el dividendo o la utilidad distribuida	Total de dividendos pagado	ISR remanente o ISR por dividendos pagado	ISR por dividendos a acreditar	Remanente
TOTAL		0	0	0

DETALLE DE PAGO IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
ENERO		NO PRESENTADA

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
FEBRERO		NO PRESENTADA
MARZO		NO PRESENTADA
ABRIL		NO PRESENTADA
MAYO		NO PRESENTADA
JUNIO		NO PRESENTADA
JULIO		NO PRESENTADA
AGOSTO		NO PRESENTADA

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
SEPTIEMBRE		NO PRESENTADA
OCTUBRE		NO PRESENTADA
NOVIEMBRE		NO PRESENTADA
DICIEMBRE		NO PRESENTADA

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO: 0

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

LÍMITE DE IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO A APLICAR: 0

MONTO POR APLICAR:

ORIGEN DEL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
PROPIA		2022	0	0		0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	0
AÑO EN QUE SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ	
MES EN QUE SE GENERÓ O SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ EL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	
INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA EL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO/MES	JUNIO/2022
INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA EL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO/INPC	122.044

ORIGEN DEL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
Total			0	0	0	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS 0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220900034949	01/03/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodo de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220980004889	01/03/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220290281815	21/04/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220720317153	04/05/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodo de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

CANTIDAD PAGADA 0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220240520963	24/06/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0
TOTAL DE APLICACIONES 0
CANTIDAD A CARGO 0
CANTIDAD PAGADA 0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JUNIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220460115599	21/07/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0
TOTAL DE APLICACIONES 0
CANTIDAD A CARGO 0
CANTIDAD PAGADA 0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220820119130	18/08/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AGOSTO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220810816723	14/09/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
SEPTIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220170276887	19/10/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
OCTUBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220861015895	03/11/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
NOVIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220381141764	03/12/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
DICIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230790000499	03/01/2023

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodo de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Total	0			

IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS	0
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES	0
ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	0

IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO	MONTO	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220900034949	01/03/2022
FEBRERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220980004889	01/03/2022
MARZO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220290281815	21/04/2022
ABRIL	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220720317153	04/05/2022
MAYO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220240520963	24/06/2022
JUNIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220460115599	21/07/2022
JULIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220820119130	18/08/2022
AGOSTO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220810816723	14/09/2022
SEPTIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220170276887	19/10/2022

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
OCTUBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220861015895	03/11/2022
NOVIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220381141764	03/12/2022
DICIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230790000499	03/01/2023

TOTAL DE ISR RETENIDO, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO DE INGRESOS POR INICIO DE OPERACIONES	0
TOTAL DE RETENCIONES	0
ISR A CARGO DEL EJERCICIO	0
¿TE AUTORIZARON APLICAR UN COEFICIENTE DE UTILIDAD MENOR EN PAGOS PROVISIONALES AL DETERMINADO EN EL EJERCICIO?	NO

PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A CARGO	0

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.0000
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	10,807,721
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	7,899,748
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	2,907,973
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DATOS ADICIONALES

INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	0
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	0
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	2,907,973
¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?	NO
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	0

CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)

SALDO INICIAL DE LA CUCA	0
APORTACIONES DE CAPITAL	0
PRIMAS NETAS POR SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES EFECTUADAS POR LOS SOCIOS O ACCIONISTAS	0
REDUCCIONES DE CAPITAL	0
RESULTADO	0
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	0.0000
SALDO DE LA CUCA AL 31 DE DICIEMBRE	0
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	0

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)

UTILIDAD FISCAL NETA (UFIN)

RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO	0
ISR DEL EJERCICIO PAGADO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9 LISR	0
IMPORTE DE LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES	0
MONTO A RESTAR DE LA UTILIDAD FISCAL NETA	0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230080156925
Fecha y hora de presentación: 07/04/2023 21:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DISMINUCIÓN POR ACREDITAMIENTO DEL ISR PAGADO POR DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO	0
UFIN	0
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DE EJERCICIOS ANTERIORES ACTUALIZADO	0
UFIN DEL EJERCICIO	0
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DEL EJERCICIO	

DETERMINACIÓN DE LA CUFIN

SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA ACTUALIZADO	0
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO (UFIN)	0
DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS DE OTRAS PERSONAS MORALES	0
INGRESOS, DIVIDENDOS O UTILIDADES SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES (REFIPRES).	0
DIVIDENDOS O UTILIDADES PAGADOS CON LAS UTILIDADES DISTRIBUIDAS (UFIN)	0
UTILIDADES DISTRIBUIDAS POR REDUCCIÓN DE CAPITAL	0
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA	0
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DEL EJERCICIO	
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA AL TÉRMINO DEL EJERCICIO	0

¿CUENTA CON EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA REPORTABLE? NO

000486

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
Declaración Anual de Personas Morales

SAT

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Período de la declaración:	Del Ejercicio	**Ejercicio:**	2021
Fecha y hora de presentación:	12/04/2022 01:16	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	220050162882	**Vencimiento obligación:**	31/03/2022

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR PERSONAS MORALES
Impuesto a cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

Sello digital :

QZBTAVLIZa6JXbtPZGLhTwxcPo+tL4qAiTsWxD+/s7VKjzIyHxZq6R+St8yupCqULRzG4K5kL6lcmyAsgQ5mptLMVfA6g5UUoITi
kZe61FKAzMEyR3iwVt3qDyrGlgKm3NzM4uSu0HvreD/Sh7ZV3JP/rPJPvevUU0NgUCeEeLAjWyk/dSQnJ1M/fe+NP/JElIUeTXSk
8gSHCEGOJO5Gy8nLZkpIFpR2l4cB6x4+AZvHfiWv8t9LPJSL5iJ8GjdNoAC9Sbn6uhgml89U8Tdtot0dXoADPu5fckEhP0Rde3Dr
KyGWOPy6VV0wAOUicq3apgIJeOlOeiD2pZyLf/RXGg==

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220050162882
Fecha y hora de presentación: 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DATOS ADICIONALES

INDICA SI OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS	No

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES	9,129,660
IMPORTE POR DETALLAR	0
IMPORTE DETALLADO	9,129,660

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	9,129,660

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
FEBRERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MARZO	4,579,625	PRESENTADA CON PAGO
ABRIL	5,007,776	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MAYO	5,007,776	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JUNIO	5,007,776	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JULIO	5,007,776	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
AGOSTO	5,007,776	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
SEPTIEMBRE	7,137,517	PRESENTADA CON PAGO
OCTUBRE	7,137,517	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
NOVIEMBRE	7,137,517	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
DICIEMBRE	9,129,660	PRESENTADA CON PAGO
Total	**9,129,660**	

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220050162882
Fecha y hora de presentación: 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

INGRESOS

IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS		9,129,660
¿TIENES INGRESOS A DISMINUIR?	NO	
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN		0

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES?	NO	
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS		0
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS		0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS		0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS		0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL		0.0735
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE		0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE		0
¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL?	NO	
¿OBTUVISTE INGRESOS EN EL EXTRANJERO?	NO	
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES		9,129,660

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	306,588

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	315,810	9

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodo de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220050162882
Fecha y hora de presentación: 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	315,810	0	0	0	9
ASIMILADOS A SALARIOS	0	0	0	0	0

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

SUELDOS Y SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA	17,400
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA	298,410
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL	315,810

TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	17,980	0	0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	4

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	16,240	0	0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	4

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220050162882
Fecha y hora de presentación: 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	21,025	0	0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	5

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	21,750	0	0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	5

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220050162882
Fecha y hora de presentación: 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO	22,475	0	0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	5

ISR A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	23,925	0	0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	6

ISR A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220050162882
Fecha y hora de presentación: 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO	26,970	0	0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	6

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO	26,970	0	0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	6

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
SEPTIEMBRE	25,230	0	0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	6

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodo de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220050162882
Fecha y hora de presentación: 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	26,100	0	0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	7

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	33,785	0	0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	8

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220050162882
Fecha y hora de presentación: 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	53,360	17,400	0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	8

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	**315,810**	**17,400**	**0**	**0**	**0**		**9**

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	315,810
IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	17,400
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA	9,222
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA	0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220050162882 **Fecha y hora de presentación:** 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL	9,222

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

	Exenta	Gravada	Total
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0	0	0
VIÁTICOS	0	0	0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0	0	0

SELECCIONA EL PORCENTAJE A APLICAR EN LA NÓMINA EXENTA	MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)		
NÓMINA EXENTA NO DEDUCIBLE	9,222		9,222
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE	9,222	0	9,222

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. EXENTA	8,178
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. GRAVADA	298,410
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL	306,588

ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS	0

TOTAL DE NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	0			0	NO PRESENTADA	0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	0			0	NO PRESENTADA	0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220050162882
Fecha y hora de presentación: 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	0			0	NO PRESENTADA	0
ABRIL	0			0	NO PRESENTADA	0
MAYO	0			0	NO PRESENTADA	0
JUNIO	0			0	NO PRESENTADA	0
JULIO	0			0	NO PRESENTADA	0
AGOSTO	0			0	NO PRESENTADA	0
SEPTIEMBRE	0			0	NO PRESENTADA	0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220050162882
Fecha y hora de presentación: 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	0			0	NO PRESENTADA	0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	0			0	NO PRESENTADA	0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	0			0	NO PRESENTADA	0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

IMPORTE DE LA NÓMINA POR ASIMILADOS CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS: 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE: 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

VIÁTICOS: 0

ANTICIPOS DE RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES: 0

OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES: 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE: 0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220050162882 **Fecha y hora de presentación:** 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE	0

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL	306,588
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE	0
NÓMINA DEDUCIBLE	306,588
MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO	0

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO

NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	0
NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO	0

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR	306,588
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES	9,222

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL EJERCICIO	9,095

SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA

PERIODO	MONTO
ENERO	527
FEBRERO	476
MARZO	764
ABRIL	638
MAYO	659
JUNIO	701

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodo de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220050162882 **Fecha y hora de presentación:** 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO
JULIO	791
AGOSTO	791
SEPTIEMBRE	833
OCTUBRE	765
NOVIEMBRE	1,097
DICIEMBRE	1,054
Total	**9,096**

SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR	8,338
SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES	0
SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	0
SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES	0

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES

CONCEPTO	MONTO
ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	0
ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0
Total	**0**

SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN	17,433
GASTOS	9,067,303

GASTOS

Concepto	Importe	Importe Total
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	59,003	59,003
OTROS GASTOS	9,008,300	9,008,300

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodo de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220050162882 **Fecha y hora de presentación:** 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS 0

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS

Mes	Importe de los honorarios pagados	ISR retenciones por servicios profesionales	Estatus
ENERO	0		NO PRESENTADA
FEBRERO	0		NO PRESENTADA
MARZO	0		NO PRESENTADA
ABRIL	0		NO PRESENTADA
MAYO	0		NO PRESENTADA
JUNIO	0		NO PRESENTADA
JULIO	0		NO PRESENTADA
AGOSTO	0		NO PRESENTADA
SEPTIEMBRE	0		NO PRESENTADA
OCTUBRE	0		NO PRESENTADA
NOVIEMBRE	0		NO PRESENTADA
DICIEMBRE	0		NO PRESENTADA
TOTAL	0	0	

TOTAL DE HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS, SOLO PERIODOS PAGADOS 0

TOTAL DE ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SOLO PERIODOS PAGADOS 0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220050162882
Fecha y hora de presentación: 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS 0

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

Mes	Importe del uso o goce temporal de bienes pagados	ISR retenciones por arrendamiento de inmuebles	Estatus
ENERO	0		NO PRESENTADA
FEBRERO	0		NO PRESENTADA
MARZO	0		NO PRESENTADA
ABRIL	0		NO PRESENTADA
MAYO	0		NO PRESENTADA
JUNIO	0		NO PRESENTADA
JULIO	0		NO PRESENTADA
AGOSTO	0		NO PRESENTADA
SEPTIEMBRE	0		NO PRESENTADA
OCTUBRE	0		NO PRESENTADA
NOVIEMBRE	0		NO PRESENTADA
DICIEMBRE	0		NO PRESENTADA
TOTAL	0	0	

TOTAL DE LOS IMPORTES POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS, SOLO PERIODOS PAGADOS 0

TOTAL DE ISR RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS 0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220050162882 **Fecha y hora de presentación:** 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	IMPORTE
DEDUCCIONES AUTORIZADAS	0

TOTAL DE GASTOS 9,067,303

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA 0

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO	IMPORTE
SIN GASTOS RELACIONADOS A LA NÓMINA	0

TOTAL DE DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA 0

GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA 0

DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA 0

INVERSIONES 0

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

CONCEPTO	IMPORTE
SIN INVERSIONES	0

TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES 0

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO 0

DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES 0

COSTO DE LO VENDIDO

COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO NO APLICA

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220050162882
Fecha y hora de presentación: 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	0
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA	0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0735
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0

¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? NO

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	9,067,303

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	9,129,660
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	9,067,303
UTILIDAD FISCAL ANTES DEL PTU	62,357
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
PTU TIMBRADA Y PAGADA EN EL MES DE MAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	62,357

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220050162882 **Fecha y hora de presentación:** 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO	0
RESULTADO FISCAL	0
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	0
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
ESTÍMULOS POR APLICAR AL IMPUESTO CAUSADO	0
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	0
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

LÍMITE DEL IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0
MONTO REMANENTE POR APLICAR	0

Ejercicio al que corresponde el dividendo o la utilidad distribuida	Total de dividendos pagado	ISR remanente o ISR por dividendos pagado	ISR por dividendos a acreditar	Remanente
TOTAL		0		0

DETALLE DE PAGO IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
ENERO	0	NO PRESENTADA

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
FEBRERO	0	NO PRESENTADA

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220050162882 **Fecha y hora de presentación:** 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
MARZO	0	NO PRESENTADA
ABRIL	0	NO PRESENTADA
MAYO	0	NO PRESENTADA
JUNIO	0	NO PRESENTADA
JULIO	0	NO PRESENTADA
AGOSTO	0	NO PRESENTADA
SEPTIEMBRE	0	NO PRESENTADA

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220050162882
Fecha y hora de presentación: 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
OCTUBRE	0	NO PRESENTADA

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
NOVIEMBRE	0	NO PRESENTADA

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
DICIEMBRE	0	NO PRESENTADA

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO 0

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

LÍMITE DE IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO A APLICAR 0

MONTO REMANENTE POR APLICAR 0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS 0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	0	NO PRESENTADA

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	0	NO PRESENTADA

HACIENDA

SAT

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220050162882
Fecha y hora de presentación: 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	0	NO PRESENTADA
ABRIL	0	NO PRESENTADA
MAYO	0	NO PRESENTADA
JUNIO	0	NO PRESENTADA
JULIO	0	NO PRESENTADA
AGOSTO	0	NO PRESENTADA
SEPTIEMBRE	0	NO PRESENTADA

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodo de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220050162882 **Fecha y hora de presentación:** 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
OCTUBRE	0	NO PRESENTADA

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
NOVIEMBRE	0	NO PRESENTADA

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
DICIEMBRE	0	NO PRESENTADA

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
Total	**0**	

IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS	0
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES	67,529
ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	0

IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO	MONTO	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
FEBRERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MARZO	46,299	PRESENTADA CON PAGO
ABRIL	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MAYO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220050162882
Fecha y hora de presentación: 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

PERIODO	MONTO	ESTATUS
JUNIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JULIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
AGOSTO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
SEPTIEMBRE	2,523	PRESENTADA CON PAGO
OCTUBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
NOVIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
DICIEMBRE	18,707	PRESENTADA CON PAGO

ACUMULADO	0
ISR RETENIDO DE INGRESOS POR INICIO DE OPERACIONES	0
TOTAL DE RETENCIONES	0
ISR A CARGO DEL EJERCICIO	0

PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A CARGO	0

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.0000
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	9,129,660
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	9,067,303
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	62,357
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Período de la declaración:	Del Ejercicio	**Ejercicio:**	2021
Número de operación:	220050162882	**Fecha y hora de presentación:**	12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación:	31/03/2022		

DATOS ADICIONALES

INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	0
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	62,357
¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?	NO
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	0
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	0
¿CUENTA CON EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA REPORTABLE?	NO

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ESTADOS FINANCIEROS

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodo de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220050162882
Fecha y hora de presentación: 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	9,129,660	0	9,129,660
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS	0	0	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES	0	0	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO	0	0	0
INGRESOS NETOS	9,129,660	0	9,129,660
INVENTARIO INICIAL			
COMPRAS NETAS NACIONALES	0	0	0
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN	0	0	0
INVENTARIO FINAL			
COSTO DE LAS MERCANCÍAS			0
MANO DE OBRA	0	0	0
MAQUILAS	0	0	0
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	0	0	0
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS			0
UTILIDAD BRUTA			0
PÉRDIDA BRUTA			
GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	0
UTILIDAD DE OPERACIÓN			0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ESTADOS FINANCIEROS

SAT

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Período de la declaración:	Del Ejercicio	**Ejercicio:**	2021
Número de operación:	220050162882	**Fecha y hora de presentación:**	12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación:	31/03/2022		

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

PÉRDIDA DE OPERACIÓN			
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES	0	0	0
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO	0	0	0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES	0	0	0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO	0	0	0
GANANCIA CAMBIARIA	0	0	0
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES	0	0	0
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO	0	0	0
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES	0	0	0
INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO	0	0	0
PÉRDIDA CAMBIARIA	0	0	0
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE			
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE	0	0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES	0	0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS	0	0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS			0
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			0
GASTOS NACIONALES			9,067,303
GASTOS EXTRANJEROS			0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ESTADOS FINANCIEROS

SAT

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Período de la declaración:	Del Ejercicio	**Ejercicio:**	2021
Número de operación:	220050162882	**Fecha y hora de presentación:**	12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación:	31/03/2022		

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

OTROS GASTOS	0
OTROS PRODUCTOS NACIONALES	0
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS	0
OTROS PRODUCTOS	0
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	0
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	62,357
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	0
ISR	0
PTU	0
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	0
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	0
EFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0
EFECTOS DE REEXPRESIÓN DESFAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0
UTILIDAD NETA	62,357
PÉRDIDA NETA	0

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ESTADOS FINANCIEROS

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220050162882
Fecha y hora de presentación: 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO

EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	55,000
EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO	0
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)	0
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS (EXCEPTO ACCIONES)	0
CLIENTES	703,708
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CONTRIBUCIONES A FAVOR	0
INVENTARIOS	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	0
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO	0
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	0
TERRENOS	0
CONSTRUCCIONES	0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ESTADOS FINANCIEROS

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodo de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220050162882
Fecha y hora de presentación: 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO

MAQUINARIA Y EQUIPO	2,820,283
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0
EQUIPO DE CÓMPUTO	11,033
EQUIPO DE TRANSPORTE	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-239,721
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	0
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
SUMA ACTIVO	3,350,303

PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	35,261
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	35,261
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	0
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ESTADOS FINANCIEROS

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodo de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220050162882 **Fecha y hora de presentación:** 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

PASIVO

ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)	0
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	0
OTROS PASIVOS	0
SUMA PASIVO	35,261

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL SOCIAL	50,000
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	0
RESERVAS	0
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	0
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	0
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,202,685
UTILIDAD DEL EJERCICIO	62,357
PÉRDIDAS ACUMULADAS	0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	
SUMA CAPITAL CONTABLE	3,315,042
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	3,350,303

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ESTADOS FINANCIEROS

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodo de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220050162882
Fecha y hora de presentación: 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	0
EFECTOS DE REEXPRESIÓN	0
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	0
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	
ANTICIPOS DE CLIENTES	0
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES O POR REEMBOLSO DE CAPITAL	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	
INVENTARIO ACUMULABLE DEL EJERCICIO	0
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	0
COSTO DE VENTAS CONTABLE	0
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES	
ISR, IETU, IMPAC Y PTU	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ESTADOS FINANCIEROS

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220050162882
Fecha y hora de presentación: 12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación: 31/03/2022

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	0
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO	0
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	0
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	0
ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	
ESTÍMULO FISCAL POR CONTRATAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	
DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	0
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS	
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	0
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO	
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN	
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ESTADOS FINANCIEROS

SAT

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Período de la declaración:	Del Ejercicio	**Ejercicio:**	2021
Número de operación:	220050162882	**Fecha y hora de presentación:**	12/04/2022 01:16
Vencimiento obligación:	31/03/2022		

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	0
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	0
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	0
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	0
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA.	0

000520

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

RFC:	ICO091216UUA		Hoja 1 de 1
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV		
Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Enero	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	15/02/2023 00:45	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	515477815		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto a favor:	15,378

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

Sello Digital :

o8CBopX+uihaAN3EBY9SCDGy4x7Nls66eB0zLJwu+4LoB3riBQtCav10euRMEr8RJI4FbponfSJ4cCxl+Y/N7bAXhsy4gbt4WNt
LO1FCm0B6seONKL8ZOUqD+uoDSwQMznRu3ZMyUlrOVEeIp/5xlzRq0ndBxi1dVCDuW4Sfns=

HACIENDA

000521

SAT

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	08/02/2023 20:52
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/02/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230770155063

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	1,332
Cantidad a cargo:	1,332
Cantidad a pagar:	1,332

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el indice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0423 0PC1 2900 3773 3488**

Importe total a pagar: **$1,332**

Vigente hasta: **23/02/2023**

Obligado a pagar por internet

04230PC1290037733488 1332

Sello digital :

bNTa14hCSYpX/8boXkFMi1kOyJKoJAxPerAzvtAYNx+OTChI63YCx06BCPhvD9xnYT7i3dP9BXOrG22DKW/QwAYnMqQMXGh7n4+Y
R2+bS0g2KVJCcfcrg0gEou1cxPQEJwzsZZgDQHxKD93H+aXyPYhdWlFuhe9nFaFLp2SDkE3lDYmdGQs3PZN0y0kMKzZVVuGGAtFq
v9SKRoUX91n1HZ9myremIjWrcQzU7rqvOTe1lekI+RiZB6KkIYbJavByrrrakq7fRNd7/1xueL0rmOkvxRG362sfURcIrle7ySVV
LnonBuclWnNCZpOz5skA7LhoRGxGNzFhlPTUHGxyFA==

HACIENDA

000522

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	08/02/2023 20:52
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/02/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230770155063

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME El Banco de Hoy · Banco Azteca · BanBajío · BBVA · Bancrea · Banjercito · Banorte · banregio · Bansi · Banco Base · CIBanco · citibanamex · HSBC · Inbursa · Intercam Banco · Mi Banco · Banca Mifel · monex Banco · MUFG Bank México, S.A. · Banco Multiva · Santander · Scotiabank · Bx+

Sello digital :

bNTa14hCSYpX/8boXkFMi1kOyJKoJAxPerAzvtAYNx+OTChI63YCx06BCPhvD9xnYT7i3dP9BXOrG22DKW/QwAYnMqQMXGh7n4+Y
R2+bS0g2KVJCcfcrg0gEou1cxPQEJwzsZZgDQHxKD93H+aXyPYhdWlFuhe9nFaFLp2SDkE31DYmdGQs3PZN0y0kMKzZVVuGGAtFq
v9SKRoUX91n1HZ9myremIjWrcQzU7rqvOTe1lekI+RiZB6KkIYbJavByrrrakq7fRNd7/1xueL0rmOkvxRG362sfURcIrle7ySVV
LnonBuclWnNCZpOz5skA7LhoRGxGNzFhlPTUHGxyFA==

RECIBO DE OPERACIÓN

Título: Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales - Depósito Referenciado

Medio de Presentación: Internet (BEP)

Fecha de Pago: 15/02/2023

Hora de Pago: 17:58 hrs

Cuenta Origen: ENLACE NEGOCIOS BASICA - 0248008101

Línea de Captura: 04230PC1290037733488

Importe Pagado: $1,332

Comisión: $0.00 MN

IVA Comisión: $0.00 MN

Número de Operación: 594527504623

Llave de Pago: 8465046225

Canal de Pago: IN Internet

Forma de Pago : 03 Transferencia Electrónica de Fondos

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante. Comuníquese con nosotros al 5140 5640 desde la Cd. De México y 01 800 DIRECTA (347 3282) en el Interior de la República, de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs. y sábados de 8:00 a 14:00 hrs.

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

000523

HACIENDA

000524

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	15/02/2023 01:08
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/02/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230530026609

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS		0
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO	
INGRESOS NOMINALES		0
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES		0
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO		0

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	0
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0000

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2022			
2021	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	13/04/2022
2020	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	25/03/2021
2019	0.0000	CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL	
2018	0.0000	CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL	

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	0

HACIENDA

000525

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	15/02/2023 01:08
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/02/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230530026609

DETERMINACIÓN

BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	0
IMPUESTO CAUSADO	0
IMPUESTO DEL PERIODO	0
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	0
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO	0
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

000526

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	15/02/2023 01:08
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/02/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230530026609

DETERMINACIÓN

IMPUESTO A CARGO	0

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

000527

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	ICO091216UUA
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal		
EJERCICIO	2023	PERIODO	Enero
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	15/02/2023 00:45	NÚMERO DE OPERACIÓN	515477815

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	0	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF	0	TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	0	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	0

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	0	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RF		IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0	IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)	0	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	0	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA	
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0	IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0	IVA ACREDITABLE	0
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0	MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS	0	TOTAL DE IVA ACREDITABLE	0

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

000528

EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	0	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	15,378
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO	0	CANTIDAD A CARGO	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN		SALDO A FAVOR	15,378
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS		DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0	IMPUESTO A FAVOR	15,378
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)		ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	0	DIFERENCIA A CARGO	0
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE		IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
IVA RETENIDO		IMPUESTO A CARGO	0
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	0	REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE			

DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A CARGO		CERTIFICADOS TESOFE	
A FAVOR	15,378	DIÉSEL MARINO	
PARTE ACTUALIZADA		TOTAL DE APLICACIONES	0
RECARGOS		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	0
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	0

000529

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Febrero	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	26/03/2023 01:17	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	521364380		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto a favor:	4,859

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

Sello Digital :

SGOOTaKghTXQKKKFhy7SBCnovY92fvhiSNh0XeWearhLk+NAR0q5AxNKCULi/7I1hMZQhmtle1vO0bxvdkGy2NwPWESHdJJcw2N
n1hPoN12/vBqYUwGLTre1BuoZvr3sB9vV9aZBo0/nD4DTIL1Goi7R8SeRnc2H4zlBqknU/Q=

HACIENDA

000530

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	10/03/2023 17:38
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/03/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230450043607

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	1,203
Cantidad a cargo:	1,203
Cantidad a pagar:	1,203

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0423 1F1W 4100 3808 0405**

Importe total a pagar: **$1,203**

Vigente hasta: **27/03/2023**

Obligado a pagar por internet

04231F1W410038080405 1203

Sello digital :

ZGIUq6V5FAwEqe12LSJkY4sTAeQhrbXXRkYP2fiKvs1obZJvABWoKKvDBnfmzCjh2cIjcaanWPXXK0RLDDWEoguferw7m/xt3P38
F9qf5PwgxexnlIupwGLvrezh4Eu4Qsa4833i0Mqqu1JoHMaNAghOjNdIqnGc5blxmZymTS1a4dWRRkbfSP9W6y/b+xUjpwXesKnk
jglAyyA6A9AA7gZChy+gYs5ip3eKswqiptMCh4An7ObrJi+nhAFvoNGeHmPsAvL+tSPdcIGj3a38mKIA5c6Nc7600qpDtf6rgC9z
KWvGNSmHXL8URQzXrs/gImZbOnq1pW9xx18xzHr7zg==

000531

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	10/03/2023 17:38
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/03/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230450043607

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME El Banco de Hoy · Banco Azteca · BanBajío · BBVA · Bancrea · Banjercito · Banorte · banregio · Bansi · Banco Base · CIBanco · citibanamex · HSBC · Inbursa · Intercam Banco · Mi Banco · Banca Mifel · monex Banco · MUFG Bank México, S.A. · Banco Multiva · Santander · Scotiabank · BX+

Sello digital :

ZGIUq6V5FAwEqe12LSJkY4sTAeQhrbXXRkYP2fiKvs1obZJvABWoKKvDBnfmzCjh2cIjcaanWPXXK0RLDDWEoguferw7m/xt3P38
F9qf5PwgxexnlIupwGLvrezh4Eu4Qsa4833i0Mqqu1JoHMaNAghOjNdIqnGc5blxmZymTS1a4dWRRkbfSP9W6y/b+xUjpwXesKnk
jglAyyA6A9AA7gZChy+gYs5ip3eKswqiptMCh4An7ObrJi+nhAFvoNGeHmPsAvL+tSPdcIGj3a38mKIA5c6Nc7600qpDtf6rgC9z
KWvGNSmHXL8URQzXrs/gImZbOnq1pW9xx18xzHr7zg==

RECIBO DE OPERACIÓN

Título: Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales - Depósito Referenciado

Medio de Presentación: Internet (BEP)

Fecha de Pago: 16/03/2023

Hora de Pago: 18:23 hrs

Cuenta Origen: ENLACE NEGOCIOS BASICA - 0248008101

Línea de Captura: 04231F1W410038080405

Importe Pagado: $1,203

Comisión: $0.00 MN

IVA Comisión: $0.00 MN

Número de Operación: 535372807523

Llave de Pago: 912EA06A34

Canal de Pago: IN Internet

Forma de Pago : 03 Transferencia Electrónica de Fondos

En el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante. Comuníquese con nosotros al 5140 5640 desde la Cd. De México y 01 800 DIRECTA (347 3282) en el Interior de la República, de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs. y sábados de 8:00 a 14:00 hrs.

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

000532

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT

000533

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	26/03/2023 01:27
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/03/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230810414796

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS		25,300
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO	
¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	NO	
INGRESOS NOMINALES		25,300
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES		0

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
Total	**0**	

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	25,300

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	25,300
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0000

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT

000534

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	26/03/2023 01:27
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/03/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230810414796

DETERMINACIÓN

2022			
2021	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	12/04/2022
2020	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	25/03/2021
2019	0.0000	CAPTURADO EN DECLARACION PROVISIONAL	15/02/2023
2018	0.0000	CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL	15/02/2023

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	0
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	0
IMPUESTO CAUSADO	0
IMPUESTO DEL PERIODO	0
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	0
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT

000535

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	26/03/2023 01:27
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/03/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230810414796

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO		ESTATUS
ENERO		0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
A CARGO		0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES		0	
TOTAL DE APLICACIONES		0	
CANTIDAD A CARGO		0	
CANTIDAD A PAGAR		0	
Total	**0**		
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS		0	

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO 0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES		ESTATUS
ENERO		0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
Total	**0**		
ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS		0	
ISR RETENIDO		0	
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO		0	

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT

000536

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	26/03/2023 01:27
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/03/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230810414796

DETERMINACIÓN

IMPUESTO A CARGO	0

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

000537

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	ICO091216U[illegible]
DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACION	Normal		
EJERCICIO	2023	PERIODO	Febrero
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	26/03/2023 01:17	NÚMERO DE OPERACIÓN	521364380

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	25,300	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF	0	TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	0

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	0	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	25,300
REGALIAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0	TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	25,300

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	4,048	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICION DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
IVA PAGADO SUJETO AL ESTIMULO DE LA RF	0	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACION DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0	IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	4,048
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)	0	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	4,048	PROPORCION UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA	
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0	IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR	0	IVA ACREDITABLE	0

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

000538

ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS			
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0	MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0	TOTAL DE IVA ACREDITABLE	0
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0		

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	25,300	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	8,907
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO		CANTIDAD A CARGO	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN		SALDO A FAVOR	4,859
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS		DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	25,300	IMPUESTO A FAVOR	4,859
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)		ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	4,048	DIFERENCIA A CARGO	0
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE		IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
IVA RETENIDO		IMPUESTO A CARGO	0
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	0	REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE			

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%	0	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	25,300
REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	25,300

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

000539

DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A CARGO		CERTIFICADOS TESOFE	
A FAVOR	4,859	DIÉSEL MARINO	
PARTE ACTUALIZADA		TOTAL DE APLICACIONES	0
RECARGOS		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCION		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	0
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIESEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTIMULOS		CANTIDAD A PAGAR	0

000540

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Marzo	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	20/04/2023 20:37	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	525129211		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto a cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

Sello Digital :

ZvFNo1/fUU0vX2YPYj6Ni3sOka6PALYz67e54f2z3XS/itMkk1lumGDeNWjLz3xulHgbyw6BcE8AbFJx/C5s0Y3murWstnPYZG+Gg+WqabXsQiXoXgBa92+XhNfyv3cxN6qSndr4xH9reXp+f6LXIDq2SPK9oFsR+4woAeQMTc=

HACIENDA

000541

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	12/04/2023 19:10
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/04/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230360075080

Impuestos que declara:

ncepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	1,331
Cantidad a cargo:	1,331
Cantidad a pagar:	1,331

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0423 238H 7900 3832 6476**

Importe total a pagar: **$1,331**

Vigente hasta: **20/04/2023**

Obligado a pagar por internet

0423238H790038326476 1331

Sello digital :

hHwWzHEYOQovz4DgMiP7MpRoYz+MmKVh4cycAZOs41vhL106BJoTP7tA9RMUIxPR/MfhTt/2dKyPdJe0ktq5gWVetUioEcUf0Nm=
jSnp6TSqRmN145tEwFAaWEfMFJ/kGeAQvElMOYwShmhlTOxYgjbyXfNEirmYHKGPwzcniCFeyVMTxvDWVwqR7OAilK0q6xCiXZz.
8Rlmlo03wd2F+HCc4r0d5u6NwhRSUUPG1gzOF15DdyJk718JAeWAz4EflWyuQHANTpAG9QYQb6uKczfWiE0PnSEh7VZSgzfeXf1/
w9fQ9yshpo9ODLA0fldnD5qaOZ3OPXKRcQkASdPR3A==

HACIENDA

000542

SAT

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	12/04/2023 19:10
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/04/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230360075080

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME El Banco de Hoy · Banco Azteca · BanBajío · BBVA · Bancrea · Banjercito · Banorte · banregio · BANSi · Banco BASE · CIBanco · citibanamex · HSBC · INBURSA · INTERCAM Banco · MI BANCO · Banca Mifel · monex Banco · MUFG MUFG Bank México, S.A. · Banco MULTIVA · Santander · Scotiabank · BX+

Sello digital :

hHwWzHEYOQovz4DgMiP7MpRoYz+MmKVh4cycAZOs4lvhL106BJoTP7tA9RMUIxPR/MfhTt/2dKyPdJe0ktq5gWVetUioEcUf0NmF
jSnp6TSqRmN145tEwFAaWEfMFJ/kGeAQvElMOYwShmhlTOxYgjbyXfNEirmYHKGPwzcniCFeyVMTxvDWVwqR7OAilK0q6xCiXZz/
8Rlmlo03wd2F+HCc4r0d5u6NwhRSUUPG1gzOF15DdyJk718JAeWAz4EflWyuQHANTpAG9QYQb6uKczfWiE0PnSEh7VZSgzfeXf1/
w9fQ9yshpo9ODLA0f1dnDSqaOZ3OPXKRcQkASdPR3A==

RECIBO DE OPERACIÓN

Título: Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales - Depósito Referenciado

Medio de Presentación: Internet (BEP)

Fecha de Pago: 14/04/2023

Hora de Pago: 14:07 hrs

Cuenta Origen: ENLACE NEGOCIOS BASICA - 0248008101

Línea de Captura: 0423238H790038326476

Importe Pagado: $1,331

Comisión: $0.00 MN

IVA Comisión: $0.00 MN

Número de Operación: 574753610423

Llave de Pago: 2C7C7A1340

Canal de Pago: IN Internet

Forma de Pago : 03 Transferencia Electrónica de Fondos

a el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante. Comuníquese con nosotros al 5140 5640 desde la Cd. De México y 01 800 DIRECTA (347 3282) en el Interior de la República, de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs. y sábados de 8:00 a 14:00 hrs.

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

000543

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT

000544

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	20/04/2023 20:42
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/04/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230480089128

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS		76,293
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO	
¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	NO	
INGRESOS NOMINALES		76,293
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES		25,300

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
FEBRERO	25,300	PRESENTADA-PAGO EN CERO
Total	**25,300**	

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	25,300
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	101,593

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	101,593
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0000

COEFICIENTE DE UTILIDAD

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT

000545

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	20/04/2023 20:42
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/04/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230480089128

DETERMINACIÓN

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2022	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	07/04/2023
2021	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	12/04/2022
2020	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	25/03/2021
2019	0.0000	CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL	15/02/2023
2018	0.0000	CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL	15/02/2023

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	0
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	0
IMPUESTO CAUSADO	0
IMPUESTO DEL PERIODO	0
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LIMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	0
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	0

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT

000546

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	20/04/2023 20:42
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/04/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230480089128

DETERMINACIÓN

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	IMPUESTO A CARGO		ESTATUS
ENERO		0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
A CARGO		0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES		0	
TOTAL DE APLICACIONES		0	
CANTIDAD A CARGO		0	
CANTIDAD A PAGAR		0	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO		ESTATUS
FEBRERO		0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
A CARGO		0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES		0	
TOTAL DE APLICACIONES		0	
CANTIDAD A CARGO		0	
CANTIDAD A PAGAR		0	

Total	**0**	
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS		0

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT

000547

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	20/04/2023 20:42
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/04/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230480089128

DETERMINACIÓN

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
Total	**0**	

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO	0
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0
IMPUESTO A CARGO	0

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

000548

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	ICO091216UUA
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal		
EJERCICIO	2023	PERIODO	Marzo
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	20/04/2023 20:37	NÚMERO DE OPERACIÓN	525129211

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	76,293	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF	0	TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	0

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	0	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	76,293
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0	TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	76,293

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	12,207	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RF	0	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0	IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	6,026
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)	0	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	12,207	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA	
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	6,181	IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR	0	IVA ACREDITABLE	6,181

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

000549

ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS			
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		TOTAL DE IVA ACREDITABLE	6,181
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	6,181		

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	76,293	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	6,026
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO	0	CANTIDAD A CARGO	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN	0	SALDO A FAVOR	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS		DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	76,293	IMPUESTO A FAVOR	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)	0	ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	12,207	DIFERENCIA A CARGO	0
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE	0	IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
IVA RETENIDO	0	IMPUESTO A CARGO	0
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	6,181	REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	0		

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%	0	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	76,293
REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	76,293

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

000550

DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A CARGO	0	CERTIFICADOS TESOFE	
A FAVOR		DIÉSEL MARINO	
PARTE ACTUALIZADA		TOTAL DE APLICACIONES	0
RECARGOS		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	0
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	0

000551

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

RFC:	ICO091216UUA		Hoja 1 de 1
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV		
Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Abril	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	05/05/2023 19:05	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	527537507		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Impuesto a favor: 5,663

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

Sello Digital :

eZbCgSGJjnZzmaaF/9XRivJrsaBuykgs7o1RvG1KUDRzBPzPf4XNAkVrBEvCaARsZtMjulwCovkMtoB39EG5yXUfndU2ZtwQ3OA
jPjrDBtw3UCP4fO4PX2a6UP5OUyWnS7KMsEEfwevgHB/xtk5BTy1OHxzYYzX02ypSp0pYXU=

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

000552

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	04/05/2023 19:44
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/05/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230720629232

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	622
Subsidio para el empleo:	(1)
Cantidad a cargo:	621
Cantidad a pagar:	621

Sello digital :

fd78oahyI7F8ncz6dWEkUrdxHiYJUV4CeBp2C5jTNrZk/ut7bmZi/ac3Vjyn8+G0uP7KDbb6yXeTZWpL+pG+7tf3f3o+oQn5/d/i
bsFbNka4Pea3WP7JAMDucGyd+zYiU08VpoM0YVWh6eC+bFHm6PQBsZ0GG1L8LfG9m59r5kVbI/H1j5Gim5z/dQq/wK3nf7Q+vOtH
uJ9WKKvZrUm78HpnfT5QGyOENDigfwqgZ/KCDK9AiGlKTjPBBzS7JepFj+MKhitufVzNEhLQSweT2aqRR0JgirJRuKJaS6K0lP5s
NOeCF1dZMMQpy0kqLODULaHbc5RosaTyRBIzmO/xpw==

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

RFC:	ICO091216UUA	000553	Hoja 2 de 3
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV		

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	04/05/2023 19:44
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/05/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230720629232

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de ...izar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0423 2N3T 8000 3865 9490**

Importe total a pagar: **$621**

Vigente hasta: **22/05/2023**

Obligado a pagar por internet

04232N3T800038659490 621

Sello digital :

fd78oahyI7F8ncz6dWEkUrdxHiYJUV4CeBp2C5jTNrZk/ut7bmZi/ac3Vjyn8+G0uP7KDbb6yXeTZWpL+pG+7tf3f3o+oQn5/d/i
bsFbNka4Pea3WP7JAMDucGyd+zYiU08VpoM0YVWh6eC+bFHm6PQBsZ0GG1L8LfG9m59r5kVbI/H1j5Gim5z/dQq/wK3nf7Q+vOtH
uJ9WKKvZrUm78HpnfT5QGyOENDigfwqgZ/KCDK9AiGlKTjPBBzS7JepFj+MKhitufVzNEhLQSweT2aqRR0JgirJRuKJaS6K0lP5s
NOeCF1dZMMQpy0kqLODULaHbc5RosaTyRBIzmO/xpw==

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

RFC:	ICO091216UUA	000554	Hoja 3 de 3
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV		

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	04/05/2023 19:44
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/05/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230720629232

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME El Banco de Hoy · Banco Azteca · BanBajío · BBVA · Bancrea · Banjercito · Banorte · banregio · BANSi · Banco BASE · CIBanco · citibanamex · HSBC · INBURSA · INTERCAM Banco · MI BANCO · Banca Mifel · monex Banco · MUFG Bank México, S.A. · Multiva · Santander · Scotiabank · BX+

Sello digital :

fd78oahyI7F8ncz6dWEkUrdxHiYJUV4CeBp2C5jTNrZk/ut7bmZi/ac3Vjyn8+G0uP7KDbb6yXeTZWpL+pG+7tf3f3o+oQn5/d/i
bsFbNka4Pea3WP7JAMDucGyd+zYiU08VpoM0YVWh6eC+bFHm6PQBsZ0GG1L8LfG9m59r5kVbI/H1j5Gim5z/dQq/wK3nf7Q+vOtH
uJ9WKKvZrUm78HpnfT5QGyOENDigfwqgZ/KCDK9AiGlKTjPBBzS7JepFj+MKhitufVzNEhLQSweT2aqRR0JgirJRuKJaS6K0lP5s
NOeCF1dZMMQpy0kqLODULaHbc5RosaTyRBIzmO/xpw==

¡OPERACIÓN EXITOSA!

Servicio o impuesto

Cantidad

$ 621 MN

Desde	Para
	
Mujer Banorte	Línea de captura
Cuenta ····2627	04232N3T800038659490

22/05/2023 - 13:05:21

Ver más detalles >

Compartir

Finalizar

Otro pago

000555

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT

000556

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	05/05/2023 18:54
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/05/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230810631975

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS		0
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO	
INGRESOS NOMINALES		0
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES		101,593

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	INGRESOS NOMINALES		ESTATUS
ENERO		0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
FEBRERO		25,300	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MARZO		76,293	PRESENTADA-PAGO EN CERO
Total	**101,593**		

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS		101,593
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO		101,593

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO		101,593
COEFICIENTE DE UTILIDAD		0.0000

COEFICIENTE DE UTILIDAD

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT

000557

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	05/05/2023 18:54
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/05/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230810631975

DETERMINACIÓN

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2022	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	07/04/2023
2021	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	12/04/2022
2020	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	25/03/2021
2019	0.0000	CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL	15/02/2023
2018	0.0000	CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL	15/02/2023

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	0
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	0
IMPUESTO CAUSADO	0
IMPUESTO DEL PERIODO	0
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LIMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	0
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	0

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

000558

SAT

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	05/05/2023 18:54
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/05/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230810631975

DETERMINACIÓN

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	IMPUESTO A CARGO		ESTATUS
ENERO		0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
A CARGO	0		
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0		
TOTAL DE APLICACIONES	0		
CANTIDAD A CARGO	0		
CANTIDAD A PAGAR	0		

PERIODO	IMPUESTO A CARGO		ESTATUS
FEBRERO		0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
A CARGO	0		
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0		
TOTAL DE APLICACIONES	0		
CANTIDAD A CARGO	0		
CANTIDAD A PAGAR	0		

PERIODO	IMPUESTO A CARGO		ESTATUS
MARZO		0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
A CARGO	0		
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0		

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT

000559

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	05/05/2023 18:54
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/05/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230810631975

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES		0
CANTIDAD A CARGO		0
CANTIDAD A PAGAR		0
Total	0	
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS		0
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO		0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES		ESTATUS
ENERO		0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
FEBRERO		0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MARZO		0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
Total	0		

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS		0
ISR RETENIDO		0
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO		0
IMPUESTO A CARGO		0

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	0

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT

000560

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	05/05/2023 18:54
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/05/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230810631975

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

000561

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	ICO091216UUA
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal		
EJERCICIO	2023	PERIODO	Abril
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	05/05/2023 19:05	NÚMERO DE OPERACIÓN	527537507

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	0	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF		TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	0

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	0	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RF	0	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0	IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)	0	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	0	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA	
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0	IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		IVA ACREDITABLE	0
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS		TOTAL DE IVA ACREDITABLE	0

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

000562

EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%		OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	5,663
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO		CANTIDAD A CARGO	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN		SALDO A FAVOR	5,663
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS		DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0	IMPUESTO A FAVOR	5,663
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)		ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	0	DIFERENCIA A CARGO	0
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE		IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
IVA RETENIDO		IMPUESTO A CARGO	0
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	0	REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE			

DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A CARGO		CERTIFICADOS TESOFE	
A FAVOR	5,663	DIÉSEL MARINO	
PARTE ACTUALIZADA		TOTAL DE APLICACIONES	0
RECARGOS		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	0
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	0

000563

HACIENDA

SAT

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Mayo	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	17/06/2023 07:49	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	533775455		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto a favor:	11,507

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

Sello Digital :

pZlKxDABWpFKynPITDsxfBPvnSGctbQZEyL+sHxcwrkFUXZdAjTCKCAH4yq5R7h989mT3+HY7+kkflu0k/vJls4GzI4BwpADx7+
B8XpKCcFLG8Q052twf/Y7gg7D9nWJ8y8esxvFM1GIWwkRl0Se+4RcNfsTSIexBQxj0ao/ik=

000564

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	15/06/2023 12:12
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/06/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230560177580

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	643
Cantidad a cargo:	643
Cantidad a pagar:	643

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0423 3IFF 5100 3896 9405**

Importe total a pagar: **$643**

Vigente hasta: **22/06/2023**

Obligado a pagar por internet

04233IFF510038969405 643

Sello digital :

CUPCGPSfFqSsk8bwKj6zFtSGXLsTM7D8diX8vR9LJmqY/ZtqQcBRtDm+kULeBbky1xR7sqzSdbhAVQEifRW05zyqVzBV5rIPW5oP
ElruVrJOwKw3p7/Ii8oLHyFQ20SAUFO+0PnaREACYIikduntr8+6lrGJWKZhRi9gGNQ9YF1TnA4GE53xkW+ZyCDhVTBonCRSmdRG
OqstgtL3CC3myiBXKBEUvRJJpcOaw1p4DPW5b8LITmVUjBJWIdcvOMlAgZc8ftmeX1rZeSkxlHa1+krpwXUuRyFCSCEW2y/mPdxc
vOve1YD+L2GYeatyzoOxh7FRnAp6Slo7i/AgNzbEww==

000565

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	15/06/2023 12:12
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/06/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230560177580

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME El Banco de Hoy · BanBajío · BBVA · Bancrea · Banjercito · Banorte · banregio · BANSI · Banco Base · CIBanco · citibanamex · HSBC · INBURSA · INTERCAM Banco · MI BANCO · Banca Mifel · monex Banco · MUFG MUFG Bank Mexico, S.A. · Banco MULTIVA · Santander · Scotiabank · BX+

Sello digital :

CUPCGPSfFqSsk8bwKj6zFtSGXLsTM7D8diX8vR9LJmqY/ZtqQcBRtDm+kULeBbky1xR7sqzSdbhAVQEifRW05zyqVzBV5rIPW5oP
ElruVrJOwKw3p7/Ii8oLHyFQ20SAUFO+0PnaREACYIikduntr8+6lrGJWKZhRi9gGNQ9YF1TnA4GE53xkW+ZyCDhVTBonCRSmdRG
OqstgtL3CC3myiBXKBEUvRJJpcOaw1p4DPW5b8LITmVUjBJWIdcvOMlAgZc8ftmeX1rZeSkxlHa1+krpwXUuRyFCSCEW2y/mPdxc
vOve1YD+L2GYeatyzoOxh7FRnAp6Slo7i/AgNzbEww==

000566

BANORTE

Autorizado

Pago referenciado SAT

Cantidad

$ 643 MN

Clave de rastreo:	591448017223
Cuenta origen:	Mujer Banorte ****2627
Medio de presentación:	Móvil
Linea de captura:	04233IFF510038969405
Comisión:	$ 0 MN
IVA de comisión:	$ 0 MN

000567

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	17/06/2023 07:55
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/06/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230140226064

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS		299,999
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO	
INGRESOS NOMINALES		299,999
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES		101,593

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
FEBRERO	25,300	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MARZO	76,293	PRESENTADA-PAGO EN CERO
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
Total	**101,593**	

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	101,593
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	401,592

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	401,592
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0000

COEFICIENTE DE UTILIDAD

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	17/06/2023 07:55
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/06/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230140226064

DETERMINACIÓN

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2022	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	07/04/2023
2021	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	12/04/2022
2020	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	25/03/2021
2019	0.0000	CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL	15/02/2023
2018	0.0000	CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL	15/02/2023

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	0
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU DETERMINADA EN DECLARACIÓN ANUAL	0
MONTO LÍMITE DE PTU A APLICAR	0
PTU PAGADA AL MES DE MAYO	0
LÍMITE DE PTU A DISTRIBUIR EN EL PERIODO	0
PTU ACUMULADA A APLICAR EN EL PERIODO	0

BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	0
IMPUESTO CAUSADO	0
IMPUESTO DEL PERIODO	0

HACIENDA

000569

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	17/06/2023 07:55
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/06/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230140226064

DETERMINACIÓN

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	0
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	IMPUESTO A CARGO		ESTATUS
ENERO		0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
A CARGO	0		
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0		
TOTAL DE APLICACIONES	0		
CANTIDAD A CARGO	0		
CANTIDAD A PAGAR	0		

PERIODO	IMPUESTO A CARGO		ESTATUS
FEBRERO		0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
A CARGO	0		

HACIENDA

000570

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	17/06/2023 07:55
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/06/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230140226064

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO		ESTATUS
MARZO		0	PRESENTADA-PAGO EN CERO

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO		ESTATUS
ABRIL		0	PRESENTADA-PAGO EN CERO

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

Total	**0**

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	17/06/2023 07:55
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/06/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230140226064

DETERMINACIÓN

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MARZO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
Total	**0**	

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO	0
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0
IMPUESTO A CARGO	0

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0

HACIENDA

000572

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	17/06/2023 07:55
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/06/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230140226064

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

000573

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	ICO091216UUA
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal		
EJERCICIO	2023	PERIODO	Mayo
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	17/06/2023 07:49	NÚMERO DE OPERACIÓN	533775455

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	299,999	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF		TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	0

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	299,999	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RF	0	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0	IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)	0	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	0	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA	0
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0	IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0	IVA ACREDITABLE	0
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0	MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	0
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS	0	TOTAL DE IVA ACREDITABLE	0

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

000574

EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	299,999	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	30,405
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO	0	CANTIDAD A CARGO	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN	0	SALDO A FAVOR	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS		DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	299,999	IMPUESTO A FAVOR	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)		ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	48,000	DIFERENCIA A CARGO	0
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE	0	IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	
IVA RETENIDO	0	IMPUESTO A CARGO	0
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	17,595	REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	0		

DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A CARGO		CERTIFICADOS TESOFE	
A FAVOR	0	DIÉSEL MARINO	
PARTE ACTUALIZADA		TOTAL DE APLICACIONES	0
RECARGOS		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCION		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	0
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIESEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTIMULOS		CANTIDAD A PAGAR	0

000575

HACIENDA

SAT

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Junio	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	07/07/2023 06:11	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	536622050		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto a favor:	3,187

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

Sello Digital :

ZvuMQH4nUvGdup8wAn4hg4VMiNO4oQbTvBrUcDYEgfstQ1VhZZm4Fuvse7j82zXqNliWGlwkdcOiGCmNjSJJTQ4JiMUcFk8H9eq
Wc5pEIj9/ahPOQsrpCzC/pJ/ABZ91W+683ifxTeqemtZnGaoJL60gUlpP9ZTw+QWEWKNMLg=

000576

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	06/07/2023 18:22
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/07/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230720932651

puestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	622
Cantidad a cargo:	622
Cantidad a pagar:	622

Sello digital :

B5ee6HZn5UC/Dh+w566gxJLe/4iz83If/5w5M1b+RiZ0txN6TqZzop0VStcI1iE/Agz0rA1sQpDyJ18c2TRlEqqZ3X4u4qahYA9T
GouiSBHADiiVVlqAZJ1M3hFhd7dznxZo1u9FeUXHbELeRudlf5nHVd5h7XoK92Bsm51/hQRn3QXLJQZzVaGngnIGE8NymAGgGKRL
47XEw4SVSOgkDii7XdMH2gOHtaMVceoXVfqdxTWZHUD0/U+N9ocE31riaSYjRsNSo7u8bC55Xs3Xofy5b9PkL9RK3CSo2GWTFlyH
zoVL/tP0uGKX+4xtj/oxAa5bMl0Mp8ryl83N//m3jA==

000577

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	06/07/2023 18:22
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/07/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230720932651

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0423 3ZCC 9800 3925 6404**

Importe total a pagar: **$622**

Vigente hasta: **20/07/2023**

Obligado a pagar por internet

04233ZCC980039256404 622

Sello digital :

B5ee6HZn5UC/Dh+w566gxJLe/4iz83If/5w5M1b+RiZ0txN6TqZzop0VStcI1iE/Agz0rA1sQpDyJ18c2TRlEqqZ3X4u4qahYA9T
GouiSBHADiiVVlqAZJ1M3hFhd7dznxZo1u9FeUXHbELeRudlf5nHVd5h7XoK92Bsm51/hQRn3QXLJQZzVaGngnIGE8NymAGgGKRL
47XEw4SVSOgkDii7XdMH2gOHtaMVceoXVfqdxTWZHUD0/U+N9ocE31riaSYjRsNSo7u8bC55Xs3Xofy5b9PkL9RK3CSo2GWTFlyH
zoVL/tP0uGKX+4xtj/oxAa5bMl0Mp8ryl83N//m3jA==

000578

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	06/07/2023 18:22
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/07/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230720932651

deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME El Banco de Hoy · BanBajio · BBVA · Banco Bancrea · Banjercito · Banorte · banregio · Bansi · Banco Base · CIBanco · citibanamex · HSBC · Inbursa Banco · Intercam Banco · Mi Banco · Banca Mifel · monex Banco · MUFG Bank México, S.A. · Banco Multiva · Santander · Scotiabank · BX+

Sello digital :

B5ee6HZn5UC/Dh+w566gxJLe/4iz83If/5w5M1b+RiZ0txN6TqZzop0VStcI1iE/Agz0rA1sQpDyJ18c2TRlEqqZ3X4u4qahYA9T
GouiSBHADiiVVlqAZJ1M3hFhd7dznxZo1u9FeUXHbELeRudlf5nHVd5h7XoK92Bsm51/hQRn3QXLJQZzVaGngnIGE8NymAGgGKRL
47XEw4SVSOgkDii7XdMH2gOHtaMVceoXVfqdxTWZHUD0/U+N9ocE31riaSYjRsNSo7u8bC55Xs3Xofy5b9PkL9RK3CSo2GWTFlyH
zoVL/tP0uGKX+4xtj/oxAa5bM10Mp8ryl83N//m3jA==

RECIBO DE OPERACIÓN

Título: Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales - Depósito Referenciado

Medio de Presentación: Internet (BEP)

Fecha de Pago: 14/07/2023

Hora de Pago: 11:51 hrs

Cuenta Origen: ENLACE NEGOCIOS BASICA - 0248008101

Línea de Captura: 04233ZCC980039256404

Importe Pagado: $622

Comisión: $0.00 MN

IVA Comisión: $0.00 MN

Número de Operación: 519391619523

Llave de Pago: B469C5D171

Canal de Pago: IN Internet

Forma de Pago : 03 Transferencia Electrónica de Fondos

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante. Comuníquese con nosotros al 5140 5640 desde la Cd. De México y 01 800 DIRECTA (347 3282) en el Interior de la República, de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs. y sábados de 8:00 a 14:00 hrs.

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

000579

000580

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	06/07/2023 18:22
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/07/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230720932651

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS		67,629
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO	
¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	NO	
INGRESOS NOMINALES		67,629
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES		401,592

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
FEBRERO	25,300	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MARZO	76,293	PRESENTADA-PAGO EN CERO
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MAYO	299,999	PRESENTADA-PAGO EN CERO
Total	**101,593**	

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	401,592

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	469,221

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	469,221
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0000

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	06/07/2023 18:22
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/07/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230720932651

DETERMINACIÓN

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2022	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	07/04/2023
2021	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	12/04/2022
2020	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	25/03/2021
2019	0.0000	CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL	15/02/2023
2018	0.0000	CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL	15/02/2023

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	0
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU DETERMINADA EN DECLARACIÓN ANUAL	0
MONTO LÍMITE DE PTU A APLICAR	0
PTU PAGADA AL MES DE MAYO	0
LÍMITE DE PTU A DISTRIBUIR EN EL PERIODO	0
PTU ACUMULADA A APLICAR EN EL PERIODO	0

000582

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	06/07/2023 18:22
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/07/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230720932651

DETERMINACIÓN

BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	0
IMPUESTO CAUSADO	0
IMPUESTO DEL PERIODO	0
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	0
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales 000583
ISR personas morales

SAT

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	06/07/2023 18:22
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/07/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230720932651

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

000584 SAT

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	06/07/2023 18:22
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/07/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230720932651

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MAYO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0
Total	0
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MARZO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MAYO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
Total	0	

HACIENDA

000585

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT

RFC:	ICO091216UUA
Denominación o razón social:	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	06/07/2023 18:22
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/07/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230720932651

DETERMINACIÓN

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO	0
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

IMPUESTO A CARGO	0

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

000586

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: ICO091216UUA
Denominación o razón social: IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	06/07/2023 18:22
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/07/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230720932651

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	10
PAGOS DE SUELDOS	63,556
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	0
ISR RETENIDO POR SUELDOS	622
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	622
IMPUESTO A CARGO	622

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	622
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	622
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	622
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	622
CANTIDAD A PAGAR	622

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

000587

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	ICO091216UUA
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal		
EJERCICIO	2023	PERIODO	Junio
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	07/07/2023 06:11	NÚMERO DE OPERACIÓN	536622050

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	67,629	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF	0	TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	0

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	0	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	67,629
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0	TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	67,629

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	10,821	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RF		IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0	IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	10,821
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)	0	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	10,821	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA	
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR	0	IVA ACREDITABLE	0

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

000588

ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		TOTAL DE IVA ACREDITABLE	0
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0		

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	67,629	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	14,008
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO		CANTIDAD A CARGO	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN		SALDO A FAVOR	3,187
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS		DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	67,629	IMPUESTO A FAVOR	3,187
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)		ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	10,821	DIFERENCIA A CARGO	0
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE		IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
IVA RETENIDO		IMPUESTO A CARGO	0
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	0	REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE			

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%	0	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	67,629
REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	67,629

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

000589

DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A CARGO		CERTIFICADOS TESOFE	
A FAVOR	3,187	DIÉSEL MARINO	
PARTE ACTUALIZADA		TOTAL DE APLICACIONES	0
RECARGOS		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	0
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	0

000590

IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV
R.F.C. ICO091216UUA
CALLE CORREGIDORA N. 4 COLONIA MORELOS C.P. 39530
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

ESTADO DE POSICION FINANCIERA, BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2021.

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		**A CORTO PLAZO**	
CAJA	$ 20,000.00		
BANCOS	$ 35,000.00	IMPUESTOS POR PAGAR	$ 35,261.36
CLIENTES	$ 703,708.59		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	**$ 758,708.59**	TOTAL A CORTO PLAZO	**$ 35,261.36**
FIJO		**CAPITAL CONTABLE**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 2,820,282.62	CAPITAL SOCIAL	$ 50,000.00
DEP ACUM DE MAQ. Y EQUIPO	$ 234,782.61	UTIL. DE EJERCICIOS ANTERIORES	$ 3,202,685.00
EQUIPO DE COMPUTO	$ 11,032.76	UTIL. DEL EJERCICIO	$ 62,357.00
DEP ACUM. DE EQ DE COMPUTO	$ 4,938.00		
TOTAL ACTIVO FIJO	**$ 2,591,594.77**	SUMA DE CAPITAL	**$ 3,315,042.00**
TOTAL DE ACTIVO	**$ 3,350,303.36**	**TOTAL DEL PASIVO Y CAPITAL**	**$ 3,350,303.36**

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LA MISMA, ASUMIENDO ASÍ MISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

C.P.C. ARTURO ZARAGOZA LOPEZ
CED. PROF. N° 760829
N° REGISTRO A.G.A.F.F. 4881

IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV
R.F.C. ICO091216UUA
CALLE CORREGIDORA N. 4 COLONIA MORELOS C.P. 39530
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021.

		%
INGRESOS	$ 9,129,660.00	100
TOTAL INGRESOS	**$ 9,129,660.00**	100
EGRESOS		
GASTOS GENERALES	$ 9,067,303.00	100
TOTAL CTAS DE RESULTADO DEUDORAS	**$ 9,067,303.00**	
TOTAL EGRESOS	**$ 9,067,303.00**	
UTILIDAD O PERDIDA	**$ 62,357.00**	100

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LA MISMA, ASUMIENDO ASÍ MISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

C.P.C. ARTURO ZARAGOZA LOPEZ
CED. PROF. N° 760829
N° REGISTRO A.G.A.F.F. 4881

IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV
R.F.C. ICO091216UUA
CALLE CORREGIDORA N. 4 COLONIA MORELOS C.P. 39530
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

RELACION ANALITICA DE CLIENTES AL 31 DE DICIEMBRE 2021.

SOCRATES AVELINO FIGUEROA	$	350,000.00
JOSE ANTONIO CORDOVA SOLCHAGA	$	353,708.59
TOTAL	**$**	**703,708.59**

RELACION ANALITICA DE BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021.

BANORTE	$	35,000.00
TOTAL	**$**	**35,000.00**

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LA MISMA, ASUMIENDO ASÍ MISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

C.P.C. ARTURO ZARAGOZA LOPEZ
CED. PROF. Nº 760829
Nº REGISTRO A.G.A.F.F. 4881

IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV
R.F.C. ICO091216UUA
CALLE CORREGIDORA N. 4 COLONIA MORELOS C.P. 39530
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

RELACION ANALITICA DE ACTIVOS FIJOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021.

MAQUINARIA Y EQUIPO

EVOLVEDORA DE CONCRETO MCA. CIPSA	$ 13,000.00
RODILLO VIBRO COMPACTADOR AR-18	$ 80,000.00
VIBRADOR A GASOLINA MCA CIPSA, MOTOR HONDA 5.5 HP	$ 7,000.00
RETRO EXCAVADORA MARCA JHON DEERE MOD. 2011	$ 278,260.87
RETRO EXCAVADORA MARCA CATERPILLAR MOD. 416 D	$ 208,695.66
RETRO EXCAVADORA MARCA CATERPILLAR MOD. 416 E	$ 347,826.09
CAMIÓN DE VOLTEO TORTON INTER	$ 775,000.00
CAMIÓN VOLTEO RABON M2	$ 610,500.00
AUTOMOVIL MARCA VERSA MODELO 19	$ 200,000.00
CAMIONETA NISSAN 19	$ 300,000.00
SUMA	**$ 2,820,282.62**

EQUIPO DE COMPUTO

COMPUTADORA HP	$ 11,032.76
SUMA	**$ 11,032.76**

SUMA DE TOTAL DE ACTIVO FIJO **$ 2,831,315.38**

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LA MISMA, ASUMIENDO ASÍ MISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

C.P.C. ARTURO ZARAGOZA LOPEZ
CED. PROF. Nº 760829
Nº REGISTRO A.G.A.F.F. 4881

IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

R.F.C. ICO091216UUA
CALLE CORREGIDORA N. 4 COLONIA MORELOS C.P. 39530
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

BALANCE COMPARATIVO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL AL 31 DE DICIEMBRE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE 2022.

CUENTAS	31 DE DICIEMBRE 2022	31 DE DICIEMBRE 2021	DIFERENCIAS	SIGNO
ACTIVO				
A CORTO PLAZO				
CAJA	25,000.00	20,000.00	5,000.00	+
BANCOS	40,000.00	35,000.00	5,000.00	+
CLIENTES	392,488.23	703,708.59	311,220.36	-
SUMA DE ACTIVO A CORTO PLAZO	**457,488.23**	**758,708.59**	**301,220.36**	-
A LARGO PLAZO				
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,820,282.62	2,820,282.62	0.00	=
EQUIPO DE COMPUTO	11,032.76	11,032.76	0.00	=
DEP ACUM DE MAQ. Y EQUIPO	234,782.61	234,782.61	0.00	=
DEP ACUM. DE EQ DE COMPUTO	4,938.00	4,938.00	0.00	=
SUMA DE ACTIVO A LARGO PLAZO	**3,071,035.99**	**3,071,035.99**	**0.00**	=
TOTAL ACTIVO	**3,528,524.22**	**3,829,744.58**	**301,220.36**	-
PASIVO				
CIRCULANTE				
IMPUESTOS POR PAGAR	28,753.00	35,261.36	6,508.36	-
PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	=
SUMA DE PASIVO CIRCULANTE	**28,753.00**	**35,261.36**	**6,508.36**	-
TOTAL DE PASIVO	**28,753.00**	**35,261.36**	**6,508.36**	-
CAPITAL CONTABLE				
CAPITAL SOCIAL	50,000.00	50,000.00	0.00	=
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	2,907,973.00	62,357.00	2,845,616.00	+
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	62,357.00	3,202,685.00	3,140,328.00	-
TOTAL CAPITAL CONTABLE	**3,020,330.00**	**3,315,042.00**	**294,712.00**	-
ACTIVO	3,528,524.22	3,829,744.58	301,220.36	-
PASIVO	28,753.00	35,261.36	6,508.36	+
CAPITAL CONTABLE	3,020,330.00	3,315,042.00	294,712.00	-

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LA MISMA, ASUMIENDO ASÍ MISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

C.P.C. ARTURO ZARAGOZA LOPEZ
CED. PROF. N° 760829
N° REGISTRO A.G.A.F.F. 4881

000595



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
SALGADO
HERNANDEZ
IRINA

SEXO M


DOMICILIO
C NUEVO LEON 23
COL PROGRESO 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.


CLAVE DE ELECTOR SLHRIR67082312M900
CURP
SAHI670823MGRLRR09
AÑO DE REGISTRO
1993 06
FECHA DE NACIMIENTO
23/08/1967
SECCIÓN
0057
VIGENCIA
2023 - 2033



INE

IDMEX2412998667<<0057054805632
6708238M3312315MEX<06<<00253<9
SALGADO<HERNANDEZ<<IRINA<<<<<<

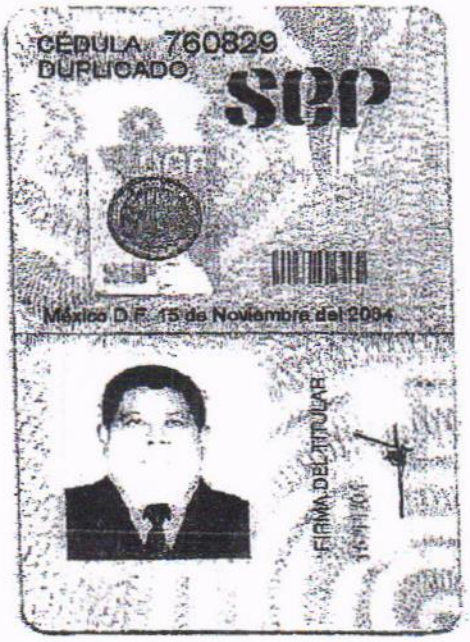
CÉDULA 760829
DUPLICADO
SEP
México D.F. 15 de Noviembre del 2004
FIRMA DEL TITULAR

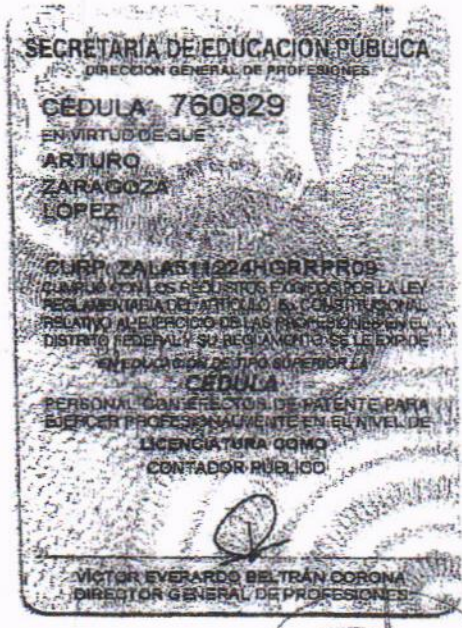
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES
CÉDULA 760829
EN VIRTUD DE QUE
ARTURO
ZARAGOZA
LOPEZ
CURP ZALA511224HGRRPR09
CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY
REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL
RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL
DISTRITO FEDERAL Y SU REGLAMENTO SE LE EXPIDE
EN EDUCACIÓN DE TIPO SUPERIOR LA
CÉDULA
PERSONAL CON EFECTOS DE PATENTE PARA
EJERCER PROFESIONALMENTE EN EL NIVEL DE
LICENCIATURA COMO
CONTADOR PÚBLICO
VÍCTOR EVERARDO BELTRÁN CORONA
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
ZARAGOZA
LOPEZ
ARTURO

FECHA DE NACIMIENTO 24/12/1951
SEXO H

DOMICILIO
C 14 DE SEPTIEMBRE 67
COL LA MIRA 39480
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE DE ELECTOR ZRLPAR51122412H900
CURP ZALA511224HGRRPR09 AÑO DE REGISTRO 1992 03
ESTADO 12 MUNICIPIO 001 SECCIÓN 0070
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2015 VIGENCIA 2025

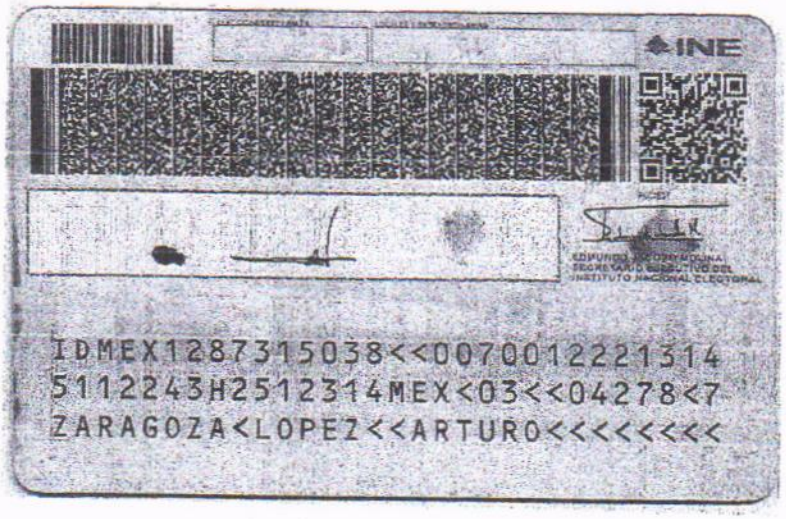
INE

IDMEX1287315038<<00700122213 14
5112243H2512314MEX<03<<04278<7
ZARAGOZA<LOPEZ<<ARTURO<<<<<<<<<

Instituto Mexicano de
Contadores Públicos
Estado de Guerrero

Oficio No. CCPEG/084/2019

Acapulco, Gro., 25 de Marzo del 2019

A QUIEN CORRESPONDA:

P R E S E N T E

Nos permitimos hacer constar que el C.P.C. ARTURO ZARAGOZA LOPEZ, es Asociado Activo del COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO, A.C., y del INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PÚBLICOS, A.C., desde el quince de Febrero de mil novecientos ochenta y tres, con número de asociado 128.

A solicitud del interesado, se extiende la presente Constancia el veinticinco de Marzo del dos mil diecinueve, en la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero.

A T E N T A M E N T E

Instituto Mexicano de Contadores Públicos Estado de Guerrero

C.P. y P.C.C.A. Luis Enrique Schott Gaspar
PRESIDENTE

L.C. Graciela Pérez Benítez
SECRETARIO

Av. Lic. Manuel Gómez Morín Lote 12 y 19-A, Fracc. Magallanes C.P. 39670 Acapulco, Gro.
Tels. 01(744) 4848532 y 01(744) 4869144 www.ccpgro.org.mx

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

ENTREGA PERSONAL

Dependencia:- DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION. SUBDIRECCION DE PROGRAMACION. COORDINACION DE CONTROL DE EMPRESAS DICTAMINADAS.

Núm.:- 360-III- 10383

Exp.:- 119/ 10383

Lic. Alfonso [illegible]

ASUNTO:- Se expide constancia de inscripción en el Registro de Contadores Públicos de acuerdo a su solicitud, de fecha 11 del presente mes.

México, D. F., a 16 de marzo de 1983.

Contador Público
ARTURO ZARAGOZA LOPEZ
Costera M. Alemán 276-201
Centro
Acapulco, Gro.

En atención a su solicitud arriba mencionada, y en virtud de haber acreditado lo dispuesto en el Artículo 52 del Código Fiscal de la Federación vigente y Artículo 2º del Reglamento del Artículo 85 del derogado Código Fiscal de la Federación de fecha 30 de diciembre de 1966, aplicable por disposición del párrafo segundo del Artículo Segundo transitorio del Código Fiscal de la Federación vigente, me complace hacer de su conocimiento que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio de la Dirección General de Fiscalización a mi cargo, con fundamento en el Artículo 39, fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha tenido a bien registrarlo en el LIBRO I DEL REGISTRO DE CONTADORES PUBLICOS, con fecha 16 de marzo de 1983, correspondiéndole el número 4 8 8 1.

Aprovecho la ocasión para exhortarlo al buen uso y cumplimiento de los lineamientos que establecen la Ley y el Código de Etica Profesional.

A t e n t a m e n t e.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
El Director General.

MANUEL RODRIGUEZ ROCHA
Contador Público.

MRR*CHV*cupc.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL
ADMINISTRACION CENTRAL DE OPERACION DE LA FISCALIZACION
324-A-IV-
1107 23891
133530

ENTREGA PERSONAL

ASUNTO : SE EXPIDE CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE DESPACHOS CONTABLES Y FISCALES DE ACUERDO A SU SOLICITUD.

MEXICO, D.F., 17 DE JUNIO DE 1993.

ZARAGOZA LOPEZ ARTURO
CONTADOR PUBLICO REGISTRADO INDEPENDIENTE
COST. MIGUEL ALEMAN 276-203
COL. FRACC. HORNOS
ACAPULCO, GRO. C.P. 39300
P R E S E N T E

COPIA COTEJADA

EN ATENCION A SU SOLICITUD ARRIBA MENCIONADA Y EN VIRTUD DE HABER ACREDITADO LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 52 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE Y 45-A DEL REGLAMENTO DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION EN VIGOR; ME COMPLACE HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, POR MEDIO DE ESTA ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL, HA TENIDO A BIEN REGISTRARLE EN EL LIBRO I DE REGISTRO DE DESPACHOS CONTABLES FISCALES CON FECHA 15 DE JUNIO DE 1993 CORRESPONDIENDOLE EL NUMERO 03356.

A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
LA ADMINISTRADORA CENTRAL

C.P. JOSEFINA DEL ONDE VALDIVIESO.

Profesión:
Nombre:
ZARAGOZA LOPEZ ARTURO
R.F.C.:
ZALA511224NW3
Medio de Presentación:
Internet

Esta Coordinación de Operación de la Fiscalización Nacional, de la Administración Central de Operación de la Fiscalización Nacional, dependiente de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, del Servicio de Administración Tributaria, en atención a su solicitud y en virtud de haber dado cumplimiento a los requisitos establecidos en los artículos 52, primer párrafo, fracción I, primero y segundo párrafo del inciso a), del Código Fiscal de la Federación, reformado mediante Decreto por el que se reforman, adicionan, y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, 60 de su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XVIII y 8, fracción III, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; artículos 2, primer párrafo, apartado B, fracción III, inciso a) y tercer párrafo; 10, primer párrafo, fracción I, en relación con el artículo 9, penúltimo párrafo; 18, primer párrafo, Apartado A, fracción II, en relación con el artículo 17, primer párrafo, fracción XIII, y penúltimo párrafo, numeral 1, inciso a),del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2007 y reformado mediante Decretos publicados el 29 de abril de 2010 y 13 de julio de 2012, en el mismo órgano oficial; de conformidad con el artículo Segundo transitorio, fracción VIII del Decreto por el que se reforman, adicionan, y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013; se le comunica que su registro número **4881** como Contador Público para formular dictámenes, quedó renovado en el Sistema de Contadores Públicos Registrados, con fecha **04/01/2014** y hora **11:58:16.**

Aprovecho la ocasión, para invitarle a que haga un buen uso de esta renovación y al cumplimiento de las normas de auditoría, a las disposiciones fiscales y al código de ética profesional del colegio al que pertenece.

Cadena Original:
|MEEO4507076R0|00001000000200783457|MEDINA ESTRADA OCTAVIO|ZALA511224NW3|4881|04/01/2014 11:58:16|

Sello Digital:
EEotaCLtr/IB/GGVs5cp25wPiL5GRDzGe8nqhxgN6s3pCc68Hf5Lx68w6rig
nMkN6r5iTg7SJhSC0HrVgjMqkHDLcEKUpTobISSJgqSaXg22aeL1mAGsWJPe
LayW0SNOPKUZ44ek3xBX8e97IW/CAWVOMu0EDC1ZwiKoJk7ILX0

Avenida Hidalgo Núm. 77 Mod. II 2° Piso, col. Guerrero, deleg. Cuauhtémoc, c.p. 06300, México, D.F. Tel. (55) 5802 0505, sat.gob.mx

From: registro.cprs@sat.gob.mx
To: arturo_zaragoza888@hotmail.com
Subject: Notificación Renovación de CP
Date: Sat, 4 Jan 2014 11:58:17 -0600FO-OF-CPRS-NOTCPRINT V 1.1

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Auditoría Fiscal Federal.
Administración Central de Operación de la Fiscalización Nacional.
Coordinación de Operación de la Fiscalización Nacional.

Notificación
Constancia de Renovación en el Sistema de Contadores Públicos Registrados

000603

Instituto Mexicano de Contadores Públicos

CERTIFICADO No. 5052

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos

Extiende el presente Certificado con Reconocimiento de Idoneidad de la Secretaría de Educación Pública:

SEP/DGP/CP075/15, emitido el 20 de agosto de 2016

a

C.P.C.

Arturo Zaragoza López

En virtud de haber demostrado capacidad profesional para ejercer la Contaduría Pública, conforme lo señala el Reglamento para la Certificación Profesional de los Contadores Públicos.

Vigencia

1 de mayo de 2019 al 30 de abril de 2023

La certificación de la Contaduría Pública al servicio de la sociedad.

Verificación QR:

Cadena Original De Certificación Digital DPC:

I3HNpK2xllGVl1KVsMyajaPX5pXi3pJMztaSw9DU6IGBmsAoJpDJ30zD2suS2NPFj
5mmsEypkaeWkXmlIJOkjWOntUCm1enlxdGF1oWQtueF5ueF1NiRmlSUo6yZn1GUnl
k

Verificación Web Aquí. Si no puede abrir el link copie la siguiente ruta sin las comillas:

"https://dpc.imcp.org.mx/system/portal/?idx=444&xdme=5842&ecrmxhg=mXyrkJaglIKRllCV&pExk=mHankJ
OpmleRl1OV&bmgds=m33ZxMegx1OcylWXyKuclJKb1Veho9aDqK5QxKLGplQ"

IMCP 2019 D R

Principal▸Servicios▸Servicios Prestados por Terceros▸Consulta CPRS

Búsqueda de Contadores Públicos Registrados

Menú Principal Nueva búsqueda

Datos Generales del CPR

NÚM. REGISTRO CPR: 4881
FECHA DE ALTA: 15/07/1983
NOMBRE CPR: ZARAGOZA LOPEZ ARTURO
ENTIDAD FEDERATIVA: GUERRERO
MUNICIPIO O DELEGACIÓN: ACAPULCO
ALAF: ADM. DESCONCENTRADA DE GUERRERO 1

Despacho del CPR

NÚM. REGISTRO DESPACHO: 2356
NOMBRE DESPACHO: ZARAGOZA LOPEZ ARTURO
ENTIDAD FEDERATIVA: GUERRERO
SITUACIÓN DESPACHO: ALTA

Colegio del CPR

AGRUPACIÓN: INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PÚBLICOS A.C.
NOMBRE COLEGIO: COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO AC
ENTIDAD FEDERATIVA: GUERRERO
SITUACIÓN COLEGIO: ALTA

Dictámenes presentados del CPR

EJERCICIO	NUMERO
2001	12
2002	17
2003	13
2004	12
2005	13
2006	11
2007	16
2008	15
2009	13
2010	11
2011	12

2012	12
2013	10

Situaciones del CPR

SITUACION	FECHA
PRESENTÓ NEC 2006	30/03/2007
PRESENTO CONSTANCIA SOCIO ACT. 2007	30/03/2007
PRESENTO CONSTANCIA SOCIO ACT. 2008	14/04/2008
PRESENTÓ NEC 2007	14/04/2008
PRESENTÓ NEC 2008	31/03/2009
PRESENTÓ CONSTANCIA SOCIO ACT. 2009	31/03/2009
PRESENTÓ NEC 2009	30/03/2010
PRESENTÓ CONSTANCIA SOCIO ACT. 2010	30/03/2010
PRESENTÓ NEC 2010	31/03/2011
PRESENTÓ CONSTANCIA SOCIO ACT. 2011	31/03/2011
PRESENTÓ NEC 2011	29/03/2012
PRESENTÓ CONSTANCIA SOCIO ACT. 2012	29/03/2012
PRESENTÓ NEC 2012	25/03/2013
PRESENTÓ CONSTANCIA SOCIO ACT. 2013	25/03/2013
RENOVADO	04/01/2014
PRESENTÓ NEC 2013	14/03/2014
PRESENTÓ CONSTANCIA SOCIO ACT. 2014	14/03/2014
PRESENTÓ NEC 2014	02/03/2015
PRESENTÓ CONSTANCIA SOCIO ACT. 2015	02/03/2015
PRESENTÓ NEC 2015	29/02/2016
PRESENTÓ CONSTANCIA SOCIO ACT. 2016	29/02/2016
PRESENTÓ NEC 2016	07/03/2017

PRESENTÓ CONSTANCIA SOCIO ACT. 2017	07/03/2017
PRESENTÓ NEC 2017	07/03/2018
PRESENTÓ CONSTANCIA SOCIO ACT. 2018	07/03/2018
PRESENTÓ NEC 2018	04/03/2019
PRESENTÓ CONSTANCIA SOCIO ACT. 2019	04/03/2019
PRESENTO CERTIFICACIÓN	30/05/2019

Antecedentes de Sanción del CPR

SANCIÓN	FECHA DE INICIO Y TERMINO	MEDIO DE DEFENSA

000607

IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV
R.F.C. ICO091216UUA
CALLE CORREGIDORA N. 4 COLONIA MORELOS C.P. 39530
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

ESTADO DE POSICION FINANCIERA, BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2022.

ACTIVO		**PASIVO**	
CIRCULANTE		**A CORTO PLAZO**	
CAJA	$ 25,000.00	IMPUESTOS POR PAGAR	$ 28,753.00
BANCOS	$ 40,000.00		
CLIENTES	$ 392,488.23		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	**$ 457,488.23**	TOTAL A CORTO PLAZO	**$ 28,753.00**
FIJO		**CAPITAL CONTABLE**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 2,820,282.62	CAPITAL SOCIAL	$ 50,000.00
DEP ACUM DE MAQ. Y EQUIPO	$ 234,782.61	UTIL. DE EJERCICIOS ANTERIORES	$ 62,357.00
EQUIPO DE COMPUTO	$ 11,032.76	UTIL. DEL EJERCICIO	$ 2,907,973.00
DEP ACUM. DE EQ DE COMPUTO	$ 4,938.00		
TOTAL ACTIVO FIJO	**$ 2,591,594.77**	SUMA DE CAPITAL	**$ 3,020,330.00**
TOTAL DE ACTIVO	**$ 3,049,083.00**	**TOTAL DEL PASIVO Y CAPITAL**	**$ 3,049,083.00**

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LA MISMA, ASUMIENDO ASÍ MISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

C.P.C. ARTURO ZARAGOZA LOPEZ
CED. PROF. Nº 760829
Nº REGISTRO A.G.A.F.F. 4881

IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV
R.F.C. ICO091216UUA
CALLE CORREGIDORA N. 4 COLONIA MORELOS C.P. 39530
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022.

		%
INGRESOS	$ 10,807,721.00	100
TOTAL INGRESOS	**$ 10,807,721.00**	100
EGRESOS		
GASTOS GENERALES	$ 7,899,748.00	100
TOTAL CTAS DE RESULTADO DEUDORAS	**$ 7,899,748.00**	
TOTAL EGRESOS	**$ 7,899,748.00**	
UTILIDAD O PERDIDA	**$ 2,907,973.00**	100

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LA MISMA, ASUMIENDO ASÍ MISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

C.P.C. ARTURO ZARAGOZA LOPEZ
CED. PROF. Nº 760829
Nº REGISTRO A.G.A.F.F. 4881

IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV
R.F.C. ICO091216UUA
CALLE CORREGIDORA N. 4 COLONIA MORELOS C.P. 39530
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

RELACION ANALITICA DE CLIENTES AL 31 DE DICIEMBRE 2022.

	SOCRATES AVELINO FIGUEROA	$	392,488.23
TOTAL		**$**	**392,488.23**

RELACION ANALITICA DE BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022.

	BANORTE	$	40,000.00
TOTAL		**$**	**40,000.00**

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LA MISMA, ASUMIENDO ASÍ MISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

C.P.C. ARTURO ZARAGOZA LOPEZ
CED. PROF. Nº 760829
Nº REGISTRO A.G.A.F.F. 4881

IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV
R.F.C. ICO091216UUA
CALLE CORREGIDORA N. 4 COLONIA MORELOS C.P. 39530
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

RELACION ANALITICA DE ACTIVOS FIJOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022.

MAQUINARIA Y EQUIPO

/OLVEDORA DE CONCRETO MCA. CIPSA	$	13,000.00
RODILLO VIBRO COMPACTADOR AR-18	$	80,000.00
VIBRADOR A GASOLINA MCA CIPSA, MOTOR HONDA 5.5 HP	$	7,000.00
RETRO EXCAVADORA MARCA JHON DEERE MOD. 2011	$	278,260.87
RETRO EXCAVADORA MARCA CATERPILLAR MOD. 416 D	$	208,695.66
RETRO EXCAVADORA MARCA CATERPILLAR MOD. 416 E	$	347,826.09
CAMIÓN DE VOLTEO TORTON INTER	$	775,000.00
CAMIÓN VOLTEO RABON M2	$	610,500.00
AUTOMOVIL MARCA VERSA MODELO 19	$	200,000.00
CAMIONETA NISSAN 19	$	300,000.00
SUMA	**$**	**2,820,282.62**

EQUIPO DE COMPUTO

COMPUTADORA HP	$	11,032.76
SUMA	**$**	**11,032.76**
SUMA DE TOTAL DE ACTIVO FIJO	**$**	**2,831,315.38**

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LA MISMA, ASUMIENDO ASÍ MISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

C.P.C. ARTURO ZARAGOZA LOPEZ
CED. PROF. Nº 760829
Nº REGISTRO A.G.A.F.F. 4881

IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV

000611

R.F.C. ICO091216UUA
CALLE CORREGIDORA N. 4 COLONIA MORELOS C.P. 39530
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO


BALANCE COMPARATIVO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL AL 31 DE DICIEMBRE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE 2022.


CUENTAS	31 DE DICIEMBRE 2022	31 DE DICIEMBRE 2021	DIFERENCIAS	SIGNO
ACTIVO				
A CORTO PLAZO				
CAJA	25,000.00	20,000.00	5,000.00	+
BANCOS	40,000.00	35,000.00	5,000.00	+
CLIENTES	392,488.23	703,708.59	311,220.36	-
SUMA DE ACTIVO A CORTO PLAZO	**457,488.23**	**758,708.59**	**301,220.36**	-
A LARGO PLAZO				
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,820,282.62	2,820,282.62	0.00	=
EQUIPO DE COMPUTO	11,032.76	11,032.76	0.00	=
DEP ACUM DE MAQ. Y EQUIPO	234,782.61	234,782.61	0.00	=
DEP ACUM. DE EQ DE COMPUTO	4,938.00	4,938.00	0.00	=
SUMA DE ACTIVO A LARGO PLAZO	**3,071,035.99**	**3,071,035.99**	**0.00**	=
TOTAL ACTIVO	**3,528,524.22**	**3,829,744.58**	**301,220.36**	-
PASIVO				
CIRCULANTE				
IMPUESTOS POR PAGAR	28,753.00	35,261.36	6,508.36	-
PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	=
SUMA DE PASIVO CIRCULANTE	**28,753.00**	**35,261.36**	**6,508.36**	-
TOTAL DE PASIVO	**28,753.00**	**35,261.36**	**6,508.36**	-
CAPITAL CONTABLE				
CAPITAL SOCIAL	50,000.00	50,000.00	0.00	=
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	2,907,973.00	62,357.00	2,845,616.00	+
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	62,357.00	3,202,685.00	3,140,328.00	-
TOTAL CAPITAL CONTABLE	**3,020,330.00**	**3,315,042.00**	**294,712.00**	-
ACTIVO	3,528,524.22	3,829,744.58	301,220.36	-
PASIVO	28,753.00	35,261.36	6,508.36	+
CAPITAL CONTABLE	3,020,330.00	3,315,042.00	294,712.00	-


"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LA MISMA, ASUMIENDO ASÍ MISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"


ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

C.P.C. ARTURO ZARAGOZA LOPEZ
CED. PROF. N° 760829
N° REGISTRO A.G.A.F.F. 4881

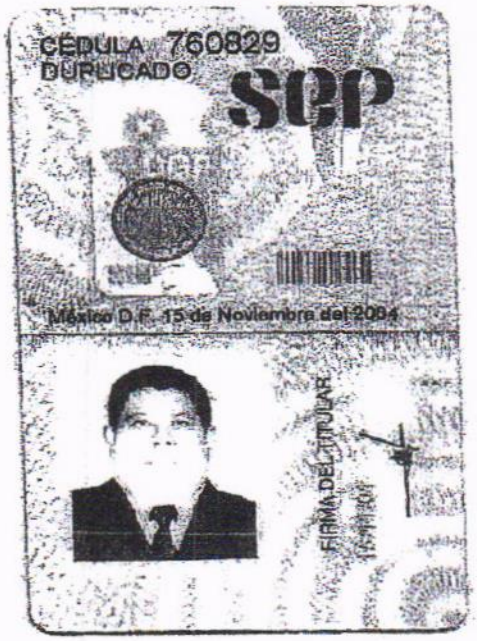
CÉDULA 760829
DUPLICADO
SEP
México D.F. 15 de Noviembre del 2004
FIRMA DEL TITULAR

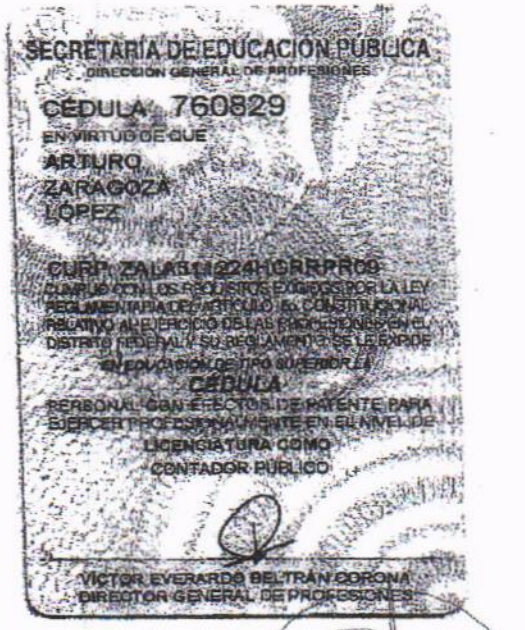
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES
CÉDULA 760829
EN VIRTUD DE QUE
ARTURO
ZARAGOZA
LÓPEZ
CURP ZALA811224HCRRPR09
CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY
REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL
RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL
DISTRITO FEDERAL Y SU REGLAMENTO SE LE EXPIDE
EN EDUCACIÓN DE TIPO SUPERIOR LA
CÉDULA
PERSONAL CON EFECTOS DE PATENTE PARA
EJERCER PROFESIONALMENTE EN EL NIVEL DE
LICENCIATURA COMO
CONTADOR PÚBLICO
VÍCTOR EVERARDO BELTRÁN CORONA
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

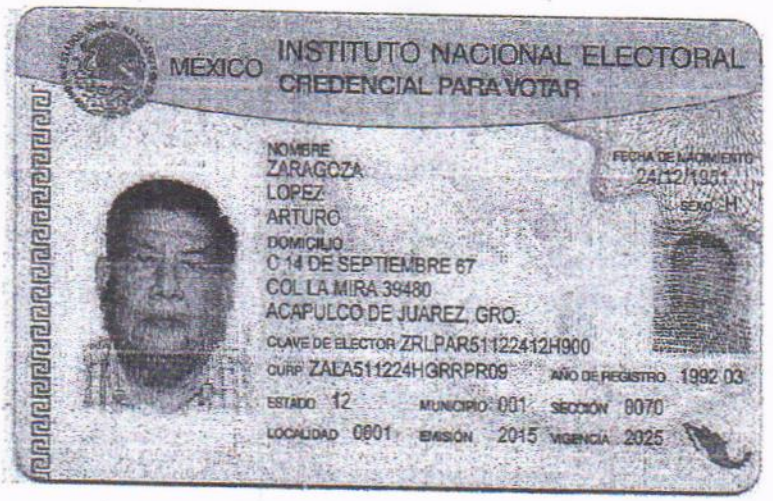
MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
ZARAGOZA
LOPEZ
ARTURO
DOMICILIO
C 14 DE SEPTIEMBRE 67
COL LA MIRA 39480
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
FECHA DE NACIMIENTO 24/12/1951
SEXO H
CLAVE DE ELECTOR ZRLPAR51122412H900
CURP ZALA511224HGRRPR09
AÑO DE REGISTRO 1992 03
ESTADO 12 MUNICIPIO 001 SECCIÓN 0070
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2015 VIGENCIA 2025

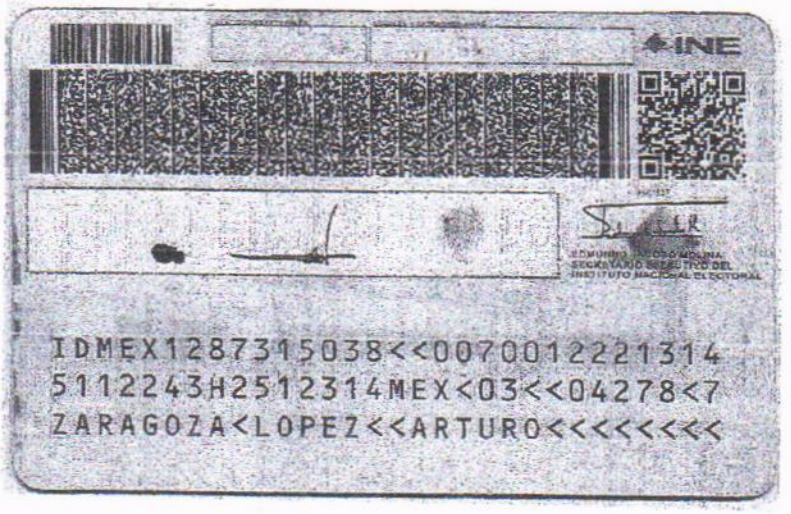
INE
IDMEX1287315038<<0070012221314
5112243H2512314MEX<03<<04278<7
ZARAGOZA<LOPEZ<<ARTURO<<<<<<<<<

Instituto Mexicano de
Contadores Públicos
Estado de Guerrero

Oficio No. CCPEG/084/2019

Acapulco, Gro., 25 de Marzo del 2019

A QUIEN CORRESPONDA:

P R E S E N T E

Nos permitimos hacer constar que el **C.P.C. ARTURO ZARAGOZA LOPEZ**, es Asociado Activo del **COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO, A.C.**, y del **INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PÚBLICOS, A.C.**, desde el quince de Febrero de mil novecientos ochenta y tres, con número de asociado 128.

A solicitud del interesado, se extiende la presente Constancia el veinticinco de Marzo del dos mil diecinueve, en la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero.

A T E N T A M E N T E

Instituto Mexicano de Contadores Públicos Estado de Guerrero

C.P. y P.C.C.A. Luis Enrique Schott Gaspar
PRESIDENTE

L.C. Graciela Pérez Benítez
SECRETARIO

Av. Lic. Manuel Gómez Morín Lote 12 y 13-A, Fracc. Magallanes C.P. 39670 Acapulco, Gro.
Tels. 01(744) 4868532 y 01(744) 4869144 www.ccpgro.org.mx

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

ENTREGA PERSONAL

Dependencia:- DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION. SUBDIRECCION DE PROGRAMACION. COORDINACION DE CONTROL DE EMPRESAS DICTAMINADAS.

Núm.- 360-III- 10383

Exp.- 11p/ 10383

ASUNTO:- Se expide constancia de inscripción en el Registro de Contadores Públicos de acuerdo a su solicitud, de fecha 11 del presente mes.

México, D. F., a 16 de marzo de 1983.

Contador Público
ARTURO ZARAGOZA LOPEZ
Costera M. Alemán 276-201
Centro
Acapulco, Gro.

En atención a su solicitud arriba mencionada, y en virtud de haber acreditado lo dispuesto en el Artículo 52 del Código Fiscal de la Federación vigente y Artículo 2º del Reglamento del Artículo 85 del derogado Código Fiscal de la Federación de fecha 30 de diciembre de 1966, aplicable por disposición del párrafo segundo del Artículo Segundo transitorio del Código Fiscal de la Federación vigente, me complace hacer de su conocimiento que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio de la Dirección General de Fiscalización a mi cargo, con fundamento en el Artículo 59, fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha tenido a bien registrarlo en el LIBRO I DEL REGISTRO DE CONTADORES PUBLICOS, con fecha 16 de marzo de 1983, correspondiéndole el número 4 8 8 1.

Aprovecho la ocasión para exhortarlo al buen uso y cumplimiento de los lineamientos que establecen la Ley y el Código de Etica Profesional.

Atentamente.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
El Director General.

MANUEL RODRIGUEZ ROCHA
Contador Público.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL
ADMINISTRACION CENTRAL DE OPERACION DE LA FISCALIZACION.
324-A-IV-
110/ 23891

133530

ENTREGA PERSONAL

ASUNTO : SE EXPIDE CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE DESPACHOS CONTABLES Y FISCALES DE ACUERDO A A SU SOLICITUD

MEXICO, D.F., 17 DE JUNIO DE 1993.

ZARAGOZA LOPEZ ARTURO
CONTADOR PUBLICO REGISTRADO INDEPENDIENTE
COST. MIGUEL ALEMAN 276-303
COL. FRACC. HORNOS
ACAPULCO, GRO. C.P. 39300
P R E S E N T E

COPIA COTEJADA

EN ATENCION A SU SOLICITUD ARRIBA MENCIONADA Y EN VIRTUD DE HABER ACREDITADO LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 52 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE Y 45-A DEL REGLAMENTO DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION EN VIGOR; ME COMPLACE HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, POR MEDIO DE ESTA ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL, HA TENIDO A BIEN REGISTRARLE EN EL LIBRO I DE REGISTRO DE DESPACHOS CONTABLES FISCALES, CON FECHA 15 DE JUNIO DE 1993 CORRESPONDIENDOLE EL NUMERO 08356.

A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
LA ADMINISTRADORA CENTRAL

C.P. JOSEFINA DEL ONSE VALDIVIESO.

Profesión:
Nombre:
ZARAGOZA LOPEZ ARTURO
R.F.C.:
ZALA511224NW3
Medio de Presentación:
Internet

Esta Coordinación de Operación de la Fiscalización Nacional, de la Administración Central de Operación de la Fiscalización Nacional, dependiente de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, del Servicio de Administración Tributaria, en atención a su solicitud y en virtud de haber dado cumplimiento a los requisitos establecidos en los artículos 52, primer párrafo, fracción I, primero y segundo párrafo del inciso a), del Código Fiscal de la Federación, reformado mediante Decreto por el que se reforman, adicionan, y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, 60 de su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XVIII y 8, fracción III, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; artículos 2, primer párrafo, apartado B, fracción III, inciso a) y tercer párrafo; 10, primer párrafo, fracción I, en relación con el artículo 9, penúltimo párrafo; 18, primer párrafo, Apartado A, fracción II, en relación con el artículo 17, primer párrafo, fracción XIII, y penúltimo párrafo, numeral 1, inciso a),del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2007 y reformado mediante Decretos publicados el 29 de abril de 2010 y 13 de julio de 2012, en el mismo órgano oficial; de conformidad con el artículo Segundo transitorio, fracción VIII del Decreto por el que se reforman, adicionan, y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013; se le comunica que su registro número **4881** como Contador Público para formular dictámenes, quedó renovado en el Sistema de Contadores Públicos Registrados, con fecha **04/01/2014** y hora **11:58:16.**

Aprovecho la ocasión, para invitarle a que haga un buen uso de esta renovación y al cumplimiento de las normas de auditoría, a las disposiciones fiscales y al código de ética profesional del colegio al que pertenece.

Cadena Original:
|MREO4507076R0|00001000000200783457|MEDINA ESTRADA OCTAVIO|ZALA511224NW3|4881|04/01/2014 11:58:16|

Sello Digital:
EEotaCLtr/IB/GGVs5cp25wPiL5GRDzGe8nqhxgN6s3pCc68Hf5Lx68w6rig
nMkN6r5iTg7SJhSC0HrVgjMqkHDLcEKUpTobISSJgqSaXg22aeL1mAGsWJPe
LayW0SNOPKUZ44ek3xBX8e97IW/CAWVOMu0EDClZwiKoJk7ILX0

Avenida Hidalgo Núm. 77 Mod. II 2° Piso, col. Guerrero, deleg. Cuauhtémoc, c.p. 06300, México, D.F. Tel. (55) 5802 0505, sat.gob.mx

From: registro.cprs@sat.gob.mx
To: arturo_zaragoza888@hotmail.com
Subject: Notificación Renovación de CP
Date: Sat, 4 Jan 2014 11:58:17 -0600FO-OF-CPRS-NOTCPRINT V 1.1

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Auditoría Fiscal Federal.
Administración Central de Operación de la Fiscalización Nacional.
Coordinación de Operación de la Fiscalización Nacional.

Notificación
Constancia de Renovación en el Sistema de Contadores Públicos Registrados

Instituto Mexicano de Contadores Públicos

CERTIFICADO No. 5052

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos

Extiende el presente Certificado con Reconocimiento de Idoneidad de la Secretaría de Educación Pública:

SEP/DGP/CP075/16, emitido el 20 de agosto de 2016

a

C.P.C.

Arturo Zaragoza López

En virtud de haber demostrado capacidad profesional para ejercer la Contaduría Pública, conforme lo señala el Reglamento para la Certificación Profesional de los Contadores Públicos.

Vigencia

1 de mayo de 2019 al 30 de abril de 2023

La certificación de la Contaduría Pública al servicio de la sociedad.

Verificación QR:

Cadena Original De Certificación Digital DPC:

I3HNpK2xIlGVl1KVsMyajaPX5pXi3pJMztaSw9DU6IGBmsAoJpDJ30zD2suS2NPFj
5mmsEypkaeWkXmIlJOkjWOntUCm1enlxdGF1oWQtueF5ueF1NiRmlSUo6yZn1GUnl
k

Verificación Web Aquí. Si no puede abrir el link copie la siguiente ruta sin las comillas:
"https://dpc.imcp.org.mx/system/portal/?idx=444&xdme=5842&ecrmxhg=mXyrkJaglIKRllCV&pExk=mHankJOpmleRl1OV&bmgds=m33ZxMegx1OcylWXyKuclJKb1Veho9aDqK5QxKLGpIQ"

IMCP 2019 D R

Principal ▸ Servicios ▸ Servicios Prestados por Terceros ▸ Consulta CPRS

Búsqueda de Contadores Públicos Registrados

Menú Principal Nueva búsqueda

Datos Generales del CPR

NÚM. REGISTRO CPR: 4881
FECHA DE ALTA: 15/07/1983
NOMBRE CPR: ZARAGOZA LOPEZ ARTURO
ENTIDAD FEDERATIVA: GUERRERO
MUNICIPIO O DELEGACIÓN: ACAPULCO
ALAF: ADM. DESCONCENTRADA DE GUERRERO 1

Despacho del CPR

NÚM. REGISTRO DESPACHO: 2356
NOMBRE DESPACHO: ZARAGOZA LOPEZ ARTURO
ENTIDAD FEDERATIVA: GUERRERO
SITUACIÓN DESPACHO: ALTA

Colegio del CPR

AGRUPACIÓN: INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PÚBLICOS A.C.
NOMBRE COLEGIO: COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO AC
ENTIDAD FEDERATIVA: GUERRERO
SITUACIÓN COLEGIO: ALTA

Dictámenes presentados del CPR

EJERCICIO	NUMERO
2001	12
2002	17
2003	13
2004	12
2005	13
2006	11
2007	16
2008	15
2009	13
2010	11
2011	12

2012	12
2013	10

Situaciones del CPR

SITUACION	FECHA
PRESENTÓ NEC 2006	30/03/2007
PRESENTO CONSTANCIA SOCIO ACT. 2007	30/03/2007
PRESENTO CONSTANCIA SOCIO ACT. 2008	14/04/2008
PRESENTÓ NEC 2007	14/04/2008
PRESENTÓ NEC 2008	31/03/2009
PRESENTÓ CONSTANCIA SOCIO ACT. 2009	31/03/2009
PRESENTÓ NEC 2009	30/03/2010
PRESENTÓ CONSTANCIA SOCIO ACT. 2010	30/03/2010
PRESENTÓ NEC 2010	31/03/2011
PRESENTÓ CONSTANCIA SOCIO ACT. 2011	31/03/2011
PRESENTÓ NEC 2011	29/03/2012
PRESENTÓ CONSTANCIA SOCIO ACT. 2012	29/03/2012
PRESENTÓ NEC 2012	25/03/2013
PRESENTÓ CONSTANCIA SOCIO ACT. 2013	25/03/2013
RENOVADO	04/01/2014
PRESENTÓ NEC 2013	14/03/2014
PRESENTÓ CONSTANCIA SOCIO ACT. 2014	14/03/2014
PRESENTÓ NEC 2014	02/03/2015
PRESENTÓ CONSTANCIA SOCIO ACT. 2015	02/03/2015
PRESENTÓ NEC 2015	29/02/2016
PRESENTÓ CONSTANCIA SOCIO ACT. 2016	29/02/2016
PRESENTÓ NEC 2016	07/03/2017

PRESENTÓ CONSTANCIA SOCIO ACT. 2017	07/03/2017
PRESENTÓ NEC 2017	07/03/2018
PRESENTÓ CONSTANCIA SOCIO ACT. 2018	07/03/2018
PRESENTÓ NEC 2018	04/03/2019
PRESENTÓ CONSTANCIA SOCIO ACT. 2019	04/03/2019
PRESENTO CERTIFICACIÓN	30/05/2019

Antecedentes de Sanción del CPR

SANCIÓN	FECHA DE INICIO Y TERMINO	MEDIO DE DEFENSA

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. **41066004-016-2023.**
REFERENTE A LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**

000623

AT-7 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO: TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, **DEBERÁ PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD ANEXAR FACTURA DE MAQUINARIA PROPIA**.

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01 CEL. 744 2354717 / 744 4490912 E-MAIL: [illegible], gno_0301@hotmail.com

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN No: **41066004-016-2023**		ANEXO TÉCNICO AT-7
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: **IMEXA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.**	FIRMA DEL LICITANTE:	FECHA: **03 de agosto de 2023**	HOJA 1: DE: 1

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

EQUIPO No. *	NOMBRE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO	MARCA	CARACTERÍSTICAS PARTICULARES						UBICACIÓN FÍSICA (ENTIDAD FEDERATIVA)	DISPONIBILIDAD			
			MODELO	AÑO	NUMERO DE SERIE	CAPACIDAD	COMBUSTIBLE	POTENCIA		PROPIO	RENTADO	OPCIÓN DE COMPRA	FECHA
EQBAILAR	BAILARINA	OAKLAND	AL-G200	2020	S/N	640 – 680 IPM	GASOLINA	4.5 HP	*CUAHUTEMOC #16 CP 39300 ACAPULCO DE JUÁREZ TEL 7444821606*		X		03/09/2023
EQBAILAR	CAMION PIPA	INTERNATIONAL	4300	2016	S/N	9 M3	DIESEL	130 H.P.			X		03/09/2023
EQCV0001	CAMION VOLTEO	INTERNATIONAL	4400	2016	S/N	6 M3	DIESEL	170 H.P.			X		14/08/2023
EQCORTAP	CORTADORA DE PISO	FELSA	COMMANDER	2019	S/N	15.5 CM CORTE	GASOLINA	13 H.P.			X		02/11/2023
EQECORTE	EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO	INFRA	4010	2020	S/N	ANTORCHA/ FUEGO	NO APLICA	NO APLICA			X		13/10/2023
EQTRAN	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	ADA	N6+	2020	S/N	5,000 METROS	NO APLICA	NO APLICA			X		14/08/2023
EQTRAN	RETRO EXCAVADORA	CATERPILLAR	*420F2*	2018	S/N	¾ M3	DIESEL	80 H.P.			X		14/08/2023
EQMOTO14H	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	14H	2019	S/N	4.2 M	DIESEL	215 HP	*CUAHUTEMOC #16 CP 39300 ACAPULCO DE JUÁREZ TEL 7444821606*		X		03/09/2023
EQMOTO14H	PLANTA DE SOLDAR	MILLER	BOB 250	2019	S/N	225 AMPERIOS A 25 VOLTIOS	NO APLICA	NO APLICA			X		13/10/2023
EQRE0001	REVOLVEDORA	CIPSA	ULTRA 10	2020	S/N	DE 1 SACO	GASOLINA	8 H.P.			X		25/08/2023
EQVG0002	VIBRADOR DE GASOLINA	BOSCH	GVC	2019	S/N	15.000 VPM	GASOLINA	4 H.P.			X		25/08/2023
EQVIB	VIBRADOR PARA CONCRETO	CIPSA	KHOLER	2020	S/N	RPM: 3,500	GASOLINA	4. H.P.			X		01/10/2023
EQVAP	VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR	VAP 70	2019	S/N	2200 RPM	DIESEL	155 H.P.			X		03/09/2023

NOTA IMPORTANTE: TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN RENTADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARÁ GANADOR.

*CON ESTOS NÚMEROS SE IDENTIFICARÁ LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN, EXCEPTO EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EN LOS CUALES SE DEBERÁ ASENTAR EL NOMBRE Y MODELO DE ESTAS.

Sindicato de Trabajadores Productores y Distribuidores de Materiales Para la Construcción, Constructores y Similares del Estado de Guerrero.

Av. Cuauhtémoc 16, Col. Centro C.P.39300 Tel.744 482 1606 Acapulco, Gro.

000625

CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO

ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO., A 03 DE AGOSTO DE 2023.

ING. LUZ MARÍA MERAZA RADILLA.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO
PRESENTE

EN ATENCION A LAS BASES DE LICITACION **No. 41066004-016-2023**, ENVIO A USTED **CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO** Y DISPONIBILIDAD CON LA EMPRESA **IMEXA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.**, DEL SIGUIENTE EQUIPO Y MAQUINARIA QUE SERA UTILIZADA PARA LA OBRA **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**

CANTIDAD	NOMBRE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO	MARCA	MODELO
1	BAILARINA	OAKLAND	AL-G200
1	CAMION PIPA	INTERNATIONAL	4300
2	CAMION VOLTEO	INTERNATIONAL	4400
1	CORTADORA DE PISO	FELSA	COMMANDER
1	EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO	INFRA	4010
2	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	SOUTH	N6+
2	RETRO EXCAVADORA	CATERPILLAR	420F2
1	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	14H
1	PLANTA DE SOLDAR	MILLER	BOB 250
1	REVOLVEDORA	CIPSA	ULTRA 10
1	VIBRADOR DE GASOLINA	BOSCH	GVC
2	VIBRADOR PARA CONCRETO	CIPSA	KHOLER
1	VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR	VAP 70

INFORMO A USTED QUE EL EQUIPO ANTES MENCIONADO ES SIN OPCION A COMPRA.

UBICACIÓN: AV. CUAHUTEMOC No. 16 COL. CENTRO C.P. 39300 ACAPULCO, GRO.

LA FECHA EN QUE EL EQUIPO ESTARA DISPONIBLE EN LA OBRA, APARTIR DEL DIA **13 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.**

ATENTAMENTE

C. RAUL AVILA MORALES
SECRETARIO GENERAL

CROC
SINDICATO DE LA CONSTRUCCION

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. **41066004-016-2023.**
REFERENTE A LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**

000626

AT-8 MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS, CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, EN MATERIA DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL.

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01
CEL. 744 2354717 / 744 4490912 E-MAIL: [illegible], gno_0301@hotmail.com

000627

ANEXO AT-8 MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS, CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, EN MATERIA DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL.

Acapulco de Juárez, Gro., a 03 de agosto de 2023.

Ing. Luz María Meraza Radilla.
Secretaría De Desarrollo Urbano Y Obras Públicas
del Municipio De Acapulco De Juárez, Guerrero
Presente

Que en mi carácter de **Administrador Único**, de la empresa **IMEXA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.**, lo que se acredita en los términos del testimonio de la póliza número **1585**, de fecha **16 de diciembre de 2009**, otorgada ante la fe del Licenciado **SHUNASHI JAZMÍN ALTAMIRANO PINEDA** Corredor Público número 5, de la Ciudad de Acapulco, Gro., inscrita en el Registro Público de la Ciudad de Acapulco, Guerrero, en el folio número **10160*17**, con fecha **17 de febrero de 2010**, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal, número **41066004-016-2023**, de fecha **18 de julio de 2023**, relativa a los trabajos consistentes en **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 44, fracción XX de la Ley de Obras Públicas y Servicios Estado de Guerrero No. 266 y a lo solicitado en el anexo AT 8 de la convocatoria a la licitación, a nombre de mi representada manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que los precios consignados en la proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios.

ATENTAMENTE

ING. IRINA SALGADO HERNÁNDEZ.
ADMINISTRADOR ÚNICO.

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01
CEL. 744 2354717 / 744 4490912 E-MAIL: imexa@telmexmail.com, gno_0301@hotmail.com

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. **41066004-016-2023.**
REFERENTE A LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**

000001

AE-1 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN, AGRUPADO POR:

A MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE;

B MANO DE OBRA; Y

C MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01 CEL. 744 2354717 / 744 4490912 E-MAIL: [illegible], gno_0301@hotmail.com

000002

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-016-2023 **Fecha:** 03/08/2023 **Duración:** 90 días naturales

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

DOCUMENTO AE - 01 a

Inicio obra: 14/08/2023 **Fin obra:** 11/11/2023

Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Origen		Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
	MATERIALES		Nacional	Extranjero				
1.	ALAMBRE RECOCIDO	KG	x		230.823642	$38.00	$8,771.30	0.26%
3.	VARILLA DE 3/8" 9.5 MM	KG	x		66.983600	$28.36	$1,899.65	0.06%
7018	SOLDADURA ELECTRODO 7018	KG	x		9.945000	$137.00	$1,362.47	0.04%
AGUA	AGUA (MANEJO)	M3	x		493.993103	$50.80	$25,094.85	0.75%
ARENA	ARENA	M3	x		165.704562	$250.00	$41,426.14	1.24%
CAJA-BANQ	BOTA PARA LLAVE	PZA	x		3.000000	$750.00	$2,250.00	0.07%
CAL	CALHIDRA	TON	x		1.095974	$3,200.00	$3,507.12	0.10%
CLAVOS	CLAVOS DE 2 A 4 "	KG	x		58.877426	$65.00	$3,827.03	0.11%
CO06	PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 BCO. Y COLS. REG.	LT	x		47.739375	$285.00	$13,605.72	0.41%
CO08	PRIMARIO ANTICORROSIVO	LT	x		9.945000	$198.00	$1,969.11	0.06%
DUELA	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25"	PZA	x		80.784300	$30.00	$2,423.53	0.07%
GRAVA	GRAVA	M3	x		64.911075	$666.67	$43,274.27	1.30%
MAABR-4	ABRAZADERA DE 4 PULG	PZA	x		3.000000	$298.00	$894.00	0.03%
MAAC0001	ALAMBRE RECOCIDO	KG	x		24.032516	$28.50	$684.93	0.02%
MAAC0002	ALAMBRON # 2	KG	x		83.666000	$35.00	$2,928.31	0.09%
MAAC0003	ACERO DEL # 3 HASTA 6	KG	x		242.859580	$30.91	$7,506.79	0.22%
MAAC0004	ACERO DE REFUERZO DEL 3 AL 8 FY=4200 KG/	KG	x		36.000000	$34.00	$1,224.00	0.04%
MAAC0008	CLAVOS DE 2"	KG	x		0.760600	$55.00	$41.83	0.00%
MAACC-CPVC	ACCESORIOS DE CPVC	PZA	x		3.000000	$188.00	$564.00	0.02%
MAACER4	ACERO 4	KG	x		760.048000	$30.91	$23,493.08	0.70%
MAADAP-M1/2	ADAPTADOR MACHO BRONCE 1/2	PZA	x		3.000000	$135.00	$405.00	0.01%
MAAG0001	CEMENTO GRIS	TON	x		79.238764	$3,880.00	$307,446.41	9.20%
MAAG0008	AGUA (MANEJO)	M3	x		0.216771	$40.00	$8.67	0.00%
MABARR3.5	BARROTE PINO 3RA 1.5X3.5	PZA	x		19.564000	$75.00	$1,467.30	0.04%
MABROCAL-POI	BROCAL DE POLIETILENO	PZA	x		2.000000	$2,980.00	$5,960.00	0.18%

000003

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-016-2023 **Fecha:** 03/08/2023 **Duración:** 90 días naturales

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

DOCUMENTO AE - 01 a

Inicio obra: 14/08/2023 **Fin obra:** 11/11/2023

Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Origen		Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
MACODO-PVC6	CODO PVC 6 PULG DIAM	PZA	x		2.000000	$255.00	$510.00	0.02%
MACON-1/2	CONECTOR CON VARILLA 1/2 DE 60 CM	PZA	x		588.540000	$78.00	$45,906.12	1.37%
MACONCE-PRE	CONCRETO PREMEZCLADO FC= 300 KG/CM2	M3	x		301.626750	$2,320.00	$699,774.06	20.95%
MACON-PRE25(	CONCRETO PREMEZCLADO FC= 250 KG/CM2	M3	x		2.814000	$2,020.00	$5,684.28	0.17%
MACURA-C	CURACRETO	LT	x		367.837500	$49.00	$18,024.04	0.54%
MADIESEL	DIESEL	LTO	x		12.843000	$21.20	$272.27	0.01%
MAEST-009	ESTOPA BLANCA	KG	x		0.100000	$81.00	$8.10	0.00%
MAFIBT-SIN	FIBRA MICRO SINTETICA	KG	x		176.562000	$220.00	$38,843.64	1.16%
MAGRA-RAY	GRAVA Y/O RAYUELA PARA FILTRO	M3	x		64.440000	$490.00	$31,575.60	0.95%
MAGRAVA	GRAVA PARA REGISTRO	M3	x		1.600000	$450.00	$720.00	0.02%
MAHE0007	TAPA REG. ELECT. 60X60 C/MRCO ANG. Y LAM	PZA	x		8.000000	$823.00	$6,584.00	0.20%
MAHILO	CARRETE DE HILO	PZA	x		21.542480	$50.00	$1,077.12	0.03%
MAHULE-N	HULE NEGRO CAL 600	M2	x		1574.344500	$35.00	$55,102.06	1.65%
MALA0180	ALAMBRE RECOCIDO No. 18	KG	x		0.200000	$30.00	$6.00	0.00%
MALIJ-TUB12	LIJA PARA TUBERIA	ML	x		0.250000	$22.50	$5.63	0.00%
MALLAVE-R1/2	LLAVE CUADRO ROSCABLE1/2PULG	PZA	x		3.000000	$225.00	$675.00	0.02%
MALLAV-INS1/2	LLAVE DE INSERCION 1/2"	PZA	x		3.000000	$90.00	$270.00	0.01%
MALLAV-NA1/2	LLAVE NARIZ BRONCE 1/2"	PZA	x		3.000000	$75.00	$225.00	0.01%
MAMA0001	MADERA DE PINO	PT	x		246.432000	$20.00	$4,928.64	0.15%
MAMA0002	CHAFLAN DE 1/2" X 1/2"	ML	x		3.350000	$25.00	$83.75	0.00%
MAMA0007	TRIPLAY DE PINO DE 16 MM.	PZA	x		5.748798	$775.00	$4,455.32	0.13%

000004

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-016-2023 **Fecha:** 03/08/2023 **Duración:** 90 días naturales

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

DOCUMENTO AE - 01 a

Inicio obra: 14/08/2023 **Fin obra:** 11/11/2023

Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Origen		Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
MAPE0001	ARENA DE LA REGION	M3	x		20.530519	$400.00	$8,212.21	0.25%
MAPE0002	GRAVA 1" A 3/4"	M3	x		0.730176	$390.00	$284.77	0.01%
MAPEG-PVC	PEGAMENTO PVC	PZA	x		11.350000	$71.00	$805.85	0.02%
MAPIED-BRA	PIEDRA BRAZA DE LA REGION	M3	x		373.302000	$749.00	$279,603.20	8.37%
MAPIN-ESM	PINTURA ESMALTE MCA COMEX O SIMILAR	LT			8.950500	$285.00	$2,550.89	0.08%
MAPLAC	PLACA 15X15 CM	KG	x		89.505000	$40.00	$3,580.20	0.11%
MAPLANN	PLANO	PLAN	x		0.683974	$12,500.00	$8,549.67	0.26%
MAPOLIN	POLIN DE 3RA VARIAS MEDIDAS	PT	x		83.267600	$17.70	$1,473.84	0.04%
MAPRUEBA-H	PRUEBA HIDROSTATICA	PRUE	x		1.500000	$450.00	$675.00	0.02%
MASFALT	ASFALTO OXIDADO	LT	x		195.750000	$32.00	$6,264.00	0.19%
MATABICON	TABICON	PZA	x		60.000000	$12.00	$720.00	0.02%
MATABIQUE	TABIQUE COMUN BARRO R.R. DE 7x14x28 CM.	PZA	x		2220.000000	$5.00	$11,100.00	0.33%
MATABL	TABLA DE 3RA	PZA	x		181.776000	$185.00	$33,628.56	1.01%
MATA-REG	TAPADERA DE REGISTRO CON ANGULO Y CONCRETO	PZA	x		2.000000	$750.00	$1,500.00	0.04%
MATBANCO	MATERIAL DE BANCO	M3	x		633.856500	$275.00	$174,310.54	5.22%
MATUB-1	TUBO ACERO 1 PULG	PZA	x		33.813000	$430.00	$14,539.59	0.44%
MATUB-3	TUBO PVC 3 PULG DIAM CED RD26	ML	x		53.500000	$275.00	$14,712.50	0.44%
MATUB-8PVC	TUBO PVC SANITARIO 8 PULG	ML	x		45.796000	$450.00	$20,608.20	0.62%
MATUB-ACE	TUBO DE ACERO 1 1/2 PULG	PZA	x		19.890000	$850.00	$16,906.50	0.51%
MATUB-CON50	TUBO CONDUIT PVC PESADO 50 MM	ML	x		214.000000	$32.00	$6,848.00	0.20%
MATUB-CPVC1/:	TUBERIA DE CPVC 1/2 PULG	ML	x		18.000000	$44.00	$792.00	0.02%
MATUB-PVC4	TUBO PVC 4"	ML	x		26.780000	$49.00	$1,312.22	0.04%
MATUB-PVC-6	TUBO PVC SANITARIO 6 PULG	ML	x		19.260000	$295.00	$5,681.70	0.17%

000005

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-016-2023 **Fecha:** 03/08/2023 **Duración:** 90 días naturales

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

DOCUMENTO AE - 01 a

Inicio obra: 14/08/2023 **Fin obra:** 11/11/2023

Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Origen		Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
MAUNI-6	UNION SERVICIO PVC 6 PULG	PZA	x		2.000000	$380.00	$760.00	0.02%
MAVAL-ESF13	VALVULA ESFERA CPVC 13MM	PZA	x		3.000000	$160.00	$480.00	0.01%
MCLA0021	CLAVO	KG	x		0.200000	$45.00	$9.00	0.00%
SEG-CORT	SEGUETA PARA CORTE	PZA	x		0.100000	$15.94	$1.59	0.00%
THINNER	THINNER STANDARD	LT	x		104.760000	$77.00	$8,066.52	0.24%
	TOTAL MATERIALES						**$2,040,742.69**	

000006

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-016-2023 **Fecha:** 03/08/2023 **Duración:** 90 días naturales

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

DOCUMENTO
AE - 01 b

Inicio obra: 14/08/2023 **Fin obra:** 11/11/2023

Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
	MANO DE OBRA						
MO01	PEON	JOR	03/08/2023	951.502042	$444.84	$423,266.17	12.67%
MO02	OFIC. ALBAÑIL	JOR	03/08/2023	303.264249	$836.56	$253,698.74	7.59%
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	03/08/2023	6.502857	$679.86	$4,421.03	0.13%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	03/08/2023	55.007865	$914.91	$50,327.25	1.51%
MO083	OFIC. PLOMERO	JOR	03/08/2023	6.502857	$601.54	$3,911.73	0.12%
MOAY0001	AYUDANTE GENERAL	JOR	03/08/2023	48.085225	$601.54	$28,925.19	0.87%
MO-ELEC	OFIC. ELECTRICO	JOR	03/08/2023	5.000000	$640.71	$3,203.55	0.10%
MOF-H	OFIC. HERRERO	JOR	03/08/2023	12.240000	$640.71	$7,842.29	0.23%
MOFI0001	OFIC. FIERRERO	JOR	03/08/2023	8.121212	$640.71	$5,203.34	0.16%
MOF-P	OFIC. PINTOR	JOR	03/08/2023	11.373041	$640.71	$7,286.82	0.22%
	TOTAL MANO DE OBRA					**$788,086.11**	

000007

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-016-2023 **Fecha:** 03/08/2023 **Duración:** 90 días naturales

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

DOCUMENTO AE - 01 c

Inicio obra: 14/08/2023 **Fin obra:** 11/11/2023

Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
	EQUIPO Y HERRAMIENTA						
EQBAILAR	BAILARINA DE 4.5 HP	HOR	03/08/2023	64.013600	$100.33	$6,422.48	0.19%
EQCORTAP	CORTADORA DE PISO	HOR	03/08/2023	33.930000	$123.01	$4,173.73	0.12%
EQCV0001	CAMION VOLTEO DE 6 M3	HOR	03/08/2023	249.051273	$804.00	$200,237.22	5.99%
EQECORTE	EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO	HOR	03/08/2023	1.392300	$1,176.92	$1,638.63	0.05%
EQMOTO14H	MOTONIVELADORA CAT. 14H DE 215 HP	HOR	03/08/2023	35.598600	$1,521.63	$54,167.90	1.62%
EQPIPA	CAMION PIPA DE 9 M3	HOR	03/08/2023	21.977387	$717.78	$15,774.93	0.47%
EQPLAN	PLANTA DE SOLDAR MILLER	HOR	03/08/2023	19.890000	$67.36	$1,339.79	0.04%
EQRE0001	REVOLVEDORA DE 1 SACO	HOR	03/08/2023	0.570450	$71.34	$40.70	0.00%
EQRETROEXCA	RETRO EXCAVADORA CAT 90 HP	HOR	03/08/2023	284.354011	$540.44	$153,676.28	4.60%
EQTRAN	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	HOR	03/08/2023	323.137200	$11.48	$3,709.62	0.11%
EQVAP	VIBROCOMPACTADOR VAP 70	HOR	03/08/2023	8.828100	$795.89	$7,026.20	0.21%
EQVG0002	VIBRADOR DE GASOLINA	HOR	03/08/2023	0.285225	$47.62	$13.58	0.00%
EQVIB	VIBRADOR PARA CONCRETO	HOR	03/08/2023	189.010750	$117.49	$22,206.87	0.66%
	TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA					**$470,427.93**	

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. **41066004-016-2023.**
REFERENTE A LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**

000008

AE- 2 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS: **ANEXAR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO. Y UMA**

A ANÁLISIS DEL FACTOR Tp/TI;
B TABLA DE CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL; Y
C ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL SALARIO REAL

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01
CEL. 744 2354717 / 744 4490912 E-MAIL: [illegible], gno_0301@hotmail.com

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO AE - 02

LICITACIÓN No: 41066004-016-2023 Fecha: 2023/08/03

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

LUGAR: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	***ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ***
Nombre del Licitante	ADMINISTRADOR UNICO

DATOS BÁSICOS PARA EL ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL

Inicio: 14-ago-23 Terminación: 11-nov-23 Duración : 90 dias

DICAL	DÍAS CALENDARIO		365.00
DIAGI	DÍAS DE AGUINALDO		15.00
PIVAC	DÍAS POR PRIMA VACACIONAL		1.50
	Prima dominical		
Tp	**TOTAL DE DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO**	SUMA:	**381.50**
DIDOM	DÍAS DOMINGO		52.00
DIVAC	DÍAS DE VACACIONES		6.00
DILUN	DÍAS LUNES		3.00
DIFEO	DÍAS FESTIVOS POR LEY		2.00
DIPEC	DÍAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIA Y OTROS)		5.00
DIPCO	DÍAS POR COSTUMBRE		6.00
DIPEN	DÍAS POR PERMISOS Y ENFERMEDAD NO PROFESIONAL		
DISIN	DÍAS POR SINDICATO (CONTRATO COLECTIVO)		
DINLA	**DÍAS NO LABORADOS AL AÑO**	SUMA:	**74.00**
TI	**TOTAL DE DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO (DICAL)-(DINLA)**		291.00
Tp / TI	DÍAS PAGADOS / DÍAS LABORADOS		1.310997
FSBC	FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN (Tp-Te) / DICAL para cálculo de IMSS		1.045205

TABLA DE SALARIOS REALES

SALARIO MINIMO D.F $: 207.44

CLAVE	CATEGORÍAS	Salario Nominal $	Tp / TI	Obligación Obrero Patronal Ps= IMSS e INFONAVIT	Ps x (Tp/TI)	Otros cargos	Fsr= Ps (Tp / TI) + (Tp/TI)+G
						Otros cargos	
A	B	C	D	E	F = E x D	G = 0 %	H = D + F + G
MO01	PEON	250.00	1.310997	0.357252	0.468356		1.779353
MO02	OFIC. ALBAÑIL	500.00	1.310997	0.276215	0.362117		1.673114
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	400.00	1.310997	0.296450	0.388645		1.699642
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	250.00	1.310997	0.357252	0.468356		1.779353
MO082	CABO DE OFICIOS	550.00	1.310997	0.268865	0.352481		1.663478
MO083	OFIC. PLOMERO	350.00	1.310997	0.310973	0.407685		1.718682
MO093	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	550.00	1.310997	0.268865	0.352481		1.663478
MOAY0001	AYUDANTE GENERAL	350.00	1.310997	0.310973	0.407685		1.718682
MOCAMION-6	OPERADOR DE CAMION DE VOLTEO	450.00	1.310997	0.285240	0.373949		1.684946
MO-ELEC	OFIC. ELECTRICO	375.00	1.310997	0.303253	0.397564		1.708561
MOF-H	OFIC. HERRERO	375.00	1.310997	0.303253	0.397564		1.708561
MOFI0001	OFIC. FIERRERO	375.00	1.310997	0.303253	0.397564		1.708561
MOF-P	OFIC. PINTOR	375.00	1.310997	0.303253	0.397564		1.708561
MOOPERRETRO	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	450.00	1.310997	0.285240	0.373949		1.684946

	LICITACIÓN No: 41066004-016-2023 Fecha: 2023/08/03 Obra : REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. Ubicación: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero Inicio: 14/08/2023 Terminación: 11/11/2023 Duración: 90 Días	DOCUMENTO **AE - 02**
IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. Nombre del Licitante	**ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ** ADMINISTRADOR UNICO	Firma

SALARIO MINIMO D.F $:	207.44	3 veces salario mínimo D.F.	622.32	25 veces salario mínimo D.F.	5186.00	25 veces salario mínimo D.F.	5,186.00

CATEGORIA	SALARIO			I. RIESGO	II. ENFERMEDAD Y MATERNIDAD					III	IV		V			TOTAL	PS
Clave de Categoría	Salario Nominal $	Factor Salario Base de Cotización	Salario Base de Cotización	DE TRABAJO	Cuota Fija	Excedente de tres salarios mínimos	Aplicación IMSS al excedente	Prestaciones en dinero	Gastos médicos pensionados	INVALIDEZ Y VIDA	Retiro (SAR)	Cesantía en edad avanzada y vejez	Guarderías y Prestaciones sociales	INFONAVIT	Impuesto Sobre Nómina	Suma prestaciones	Obligación Obrero-Patronal
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
			BxC	ExD	FxSMDF	D-3SMDF	HxG	IxD	JxD	KxD	LxD	MxD	NxD	OxD	PxD	SUMA(F:P)	Q / D
	Sn	FSBC	SBC	0.50000%	20.4000%		1.5000%	0.9500%	1.4250%	2.3750%	2.00%	4.2750%	1.00%	5.00%	2.00%	SP	SP/SBC
MO01	250.00	1.0452	261.30	1.31	42.32			2.48	3.72	6.21	5.23	11.17	2.61	13.07	5.23	93.35	0.357252
MO02	500.00	1.0452	522.60	2.61	42.32			4.96	7.45	12.41	10.45	22.34	5.23	26.13	10.45	144.35	0.276215
MO031	400.00	1.0452	418.08	2.09	42.32			3.97	5.96	9.93	8.36	17.87	4.18	20.90	8.36	123.94	0.296450
MO067	250.00	1.0452	261.30	1.31	42.32			2.48	3.72	6.21	5.23	11.17	2.61	13.07	5.23	93.35	0.357252
MO082	550.00	1.0452	574.86	2.87	42.32			5.46	8.19	13.65	11.50	24.58	5.75	28.74	11.50	154.56	0.268865
MO083	350.00	1.0452	365.82	1.83	42.32			3.48	5.21	8.69	7.32	15.64	3.66	18.29	7.32	113.76	0.310973
MO093	550.00	1.0452	574.86	2.87	42.32			5.46	8.19	13.65	11.50	24.58	5.75	28.74	11.50	154.56	0.268865
MOAY0001	350.00	1.0452	365.82	1.83	42.32			3.48	5.21	8.69	7.32	15.64	3.66	18.29	7.32	113.76	0.310973
MOCAMION-6	450.00	1.0452	470.34	2.35	42.32			4.47	6.70	11.17	9.41	20.11	4.70	23.52	9.41	134.16	0.285240
MO-ELEC	375.00	1.0452	391.95	1.96	42.32			3.72	5.59	9.31	7.84	16.76	3.92	19.60	7.84	118.86	0.303253
MOF-H	375.00	1.0452	391.95	1.96	42.32			3.72	5.59	9.31	7.84	16.76	3.92	19.60	7.84	118.86	0.303253
MOFI0001	375.00	1.0452	391.95	1.96	42.32			3.72	5.59	9.31	7.84	16.76	3.92	19.60	7.84	118.86	0.303253
MOF-P	375.00	1.0452	391.95	1.96	42.32			3.72	5.59	9.31	7.84	16.76	3.92	19.60	7.84	118.86	0.303253
MOOPERRETRO	450.00	1.0452	470.34	2.35	42.32			4.47	6.70	11.17	9.41	20.11	4.70	23.52	9.41	134.16	0.285240

000011

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-016-2023 **Fecha:** 03/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

DOCUMENTO
AE - 02 c

Duración: 90 días naturales

Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Inicio obra:** 14/08/2023 **Fin obra:** 11/11/2023

TABULADOR DE SALARIO BASE DE MANO DE OBRA E INTREGRACION DE SALARIOS

Código	Concepto	Unidad	Salario Base por Jornal	Factor Salario Real	Salario Real
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	$400.00	1.69964	$679.86
MOAY0001	AYUDANTE GENERAL	JOR	$350.00	1.71868	$601.54
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$550.00	1.66348	$914.91
MOFI0001	OFIC. FIERRERO	JOR	$375.00	1.70856	$640.71
MOF-H	OFIC. HERRERO	JOR	$375.00	1.70856	$640.71
MOF-P	OFIC. PINTOR	JOR	$375.00	1.70856	$640.71
MO02	OFIC. ALBAÑIL	JOR	$500.00	1.67311	$836.56
MO-ELEC	OFIC. ELECTRICO	JOR	$375.00	1.70856	$640.71
MO083	OFIC. PLOMERO	JOR	$350.00	1.71868	$601.54
MO01	PEON	JOR	$250.00	1.77935	$444.84

gob.mx

Instituto Mexicano del Seguro Social

IMSS Desde su empresa

000012

Fecha de solicitud del trámite		
24 / DD	07 / MM	2023 / AAAA

Acuse Notarial de confirmación de transmisión del archivo de la Determinación de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo Derivada de la Revisión Anual de la Siniestralidad de la Empresa :

IMEXA CONSTRUCTORES

al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Registro Patronal :	B6159781107
Delegación:	[12] Guerrero
Subdelegación:	[2] Acapulco
Folio:	12-02500073
Lote número:	12-02500073
Fecha de transacción:	02-02-2023
Razón Social:	IMEXA CONSTRUCTORES
Actividad Económica:	LA CONSTRUCCION EN GENERAL
Clase :	5
Fracción :	412
Representante Legal :	MORALES ROMAN GENOVEVA
Denominación del trámite:	Determinación de la Prima de RT - Envío de Archivo.

Datos base para la Determinación.

Días Subsidiados (S):	0	Periodo Revisión: 2022
Porcentajes (I):	0.0	
Defunciones (D):	0	
Trabajadores Prom. (N):	00009.2	Prima Anterior: 00.58875
Años prom. Vida A. (V):	28	
Factor de Prima (F):	2.3	
Prima Mínima R. (M):	00.00500	Prima Declarada: 00.50000
Días del Año:	365	
Acreditación STyPS:	NO	

Cadena Original:

NOTARIA_RAZON_SOCIAL=IMEXA CONSTRUCTORES | NOTARIA_DENOMINACION_TRAMITE=DETERMINACION ANUAL DE PRIMA | NOTARIA_NOMBRE_ARCHIVO=B6159781.DAP | NOTARIA_TAMANO_ARCHIVO=546 bytes | NOTARIA_REGISTRO_PATRONAL=B6159781107 | FECHA_ENVIO=2023-02-02 13:03 | NOTARIA_SECUENCIA_FIRMA=16315593678961577122 | SELLO_DIGITAL=D441890F23D9AABC1D49F7C858E7DBB84D092C7DC11BA0BC8E8044A4392C4132D374A5ACDF66833E99534C690230799B378289CE1DB4A218D

Contacto:
Paseo de la Reforma 476, P.B.
Col. Juárez, Cuauhtémoc
C.P. 06600 Ciudad de México

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. **41066004-016-2023.**
REFERENTE A LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**

000013

AE-3 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ÉSTOS PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS.

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01 CEL. 744 2354717 / 744 4490912 E-MAIL: [illegible], gno_0301@hotmail.com

000014

Dependencia: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO
AE - 03

Licitación: 41066004-016-2023 FECHA: 03/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales

Inicio obra: 14/08/2023 **Fin obra:** 11/11/2023

Ubicación: ,ACAPULCO DE JUAREZ,Guerrero

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ	RLOPySRM
Licitante	ADMINISTRADOR UNICO	ART. 210

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES

Código: EQCORTAP **Modelo:** DE PISO 13 H.P. **Capacidad:**
CORTADORA DE PISO **Serie:**
Tipo de Combustible: GASOLINA

Indicador Economico de Referencia: CETES % Tasa de Interes Anual: 11.090%
Indicador Especifico de mercado de Seguros: CETES % Prima Anual Promedio de Seguros: 4.000%

PRECIO DE ADQUISICIÓN	$	22,391.60		VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	4
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	$	-		HORAS POR AÑO (Hea):	500 Hrs
EQUIPO ADICIONAL:	$	-		VIDA ECONOMICA (Ve):	2000 Hrs
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)			hrs	COSTO COMBUSTIBLE (Pc):	20.45 /Lts
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	$	-		COSTO LUBRICANTE (Pa):	104.48 /Lts
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)			hrs	POTENCIA NOMINAL:	13 HP
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	$	22,391.60		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):	0.8
VALOR DE RESCATE (Vr)		10%	$ 2,239.16	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):	10.4
TASA DE INTERES ANUAL (i)		11.0900%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		4.0000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):	0.1514
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	$	444.84		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):	0.0035
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	$	55.61		CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	2 Lts
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)		8	hrs	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)		150.00	hrs	CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):	0.0133

I.- CARGOS FIJOS	OPERACIONES	ACTIVA	%	ESPERA	%	RESERVA
a).- DEPRECIACION.....D =(Vm-Vr)/Ve	($22,391.6-$2,239.16)/2,000.00	$ 10.08	100%	$ 10.08	15%	$ 1.51
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	($22,391.6+$2,239.16)x11.0900 %/(2x500)	$ 2.73	100%	$ 2.73	100%	$ 2.73
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	($22,391.60+$2,239.16)x4.00 %/(2x500)	$ 0.99	100%	$ 0.99	100%	$ 0.99
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	0.8 x 10.08	$ 8.06		$ -	15%	$ 1.21
	Suma Cargos Fijos	**$ 21.86**		**$ 13.80**		**$ 6.44**

II.- CONSUMOS					
a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0.1514x10.4x $20.45	$ 32.20	5%	$ 1.61	$ -
b).-Otras Fuentes de Energia	$.00 * 0	$ -	5%	$ -	$ -
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.0035x10.4)+2/150] x $104.48lt	$ 5.19	5%	$ 0.26	$ -
d). Llantas.....N=Pn/Vn	$.00/0	$ -	15%	$ -	$ -
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	$00/0	$ -		$ -	$ -
f).-Otros Consumos					

Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe	
DISCO DE DIAMANTE	JGO	$ 4,074.30	0.002000	*	$8.15	
		$ -	-			Suma: $ 8.15
		$ -	-			

	Suma de Otros Consumos	$ 8.15	5%	$ 0.41	$ -
	Suma de Consumos	**$ 45.54**		**$ 2.28**	**$ -**

III.- OPERACIÓN	CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	$ 444.84	8.0000	$ 55.61
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
	Suma de Operación Po=S/Ht		**$55.61**	100% **$55.61**	100% **$55.61**
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA			**$ 123.01**	**$ 71.69**	**$ 62.05**

000015

Dependencia: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO
AE - 03

Licitación: 41066004-016-2023 FECHA: 03/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Ubicación: ,ACAPULCO DE JUAREZ,Guerrero

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ	RLOPySRM
Licitante	ADMINISTRADOR UNICO	ART. 210

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES

Código: EQCV0001	**Modelo:**	**Capacidad:**	
CAMION VOLTEO DE 6 M3		**Serie:**	
		Tipo de Combustible:	DIESEL
Indicador Economico de Referencia:	CETES	% Tasa de Interes Anual:	11.090%
Indicador Especifico de mercado de Seguros:	CETES	% Prima Anual Promedio de Seguros:	3.000%

PRECIO DE ADQUISICION	$	850,000.00		VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	4
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	$	45,000.00		HORAS POR AÑO (Hea):	2000 Hrs
EQUIPO ADICIONAL:	$	-		VIDA ECONOMICA (Ve):	8000 Hrs
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)		1200.00	hrs	COSTO COMBUSTIBLE (Pc):	21.2 /Lts
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	$	-		COSTO LUBRICANTE (Pa):	80 /Lts
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)			hrs	POTENCIA NOMINAL:	170 HP
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	$	805,000.00		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):	0.8
VALOR DE RESCATE (Vr)		15%	$ 120,750.00	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):	136
TASA DE INTERES ANUAL (i)		11.0900%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		3.0000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):	0.1514
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	$	758.23		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):	0.003
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	$	94.78		CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	20 Lts
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)		8	hrs	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)		100.00	hrs	CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):	0.2000

I.- CARGOS FIJOS	**OPERACIONES**	**ACTIVA**	**%**	**ESPERA**	**%**	**RESERVA**
a).- DEPRECIACION.....D =(Vm-Vr)/Ve	($805,000.-$120,750.)/8,000.00	$ 85.53	100%	$ 85.53	15%	$ 12.83
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	($805,000.+$120,750.)x11.0900 %/(2x2000)	$ 25.67	100%	$ 25.67	100%	$ 25.67
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	($805,000.00+$120,750.00)x3.00 %/(2x2000)	$ 6.94	100%	$ 6.94	100%	$ 6.94
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	0.8 x 85.53	$ 68.42		$ -	15%	$ 10.26
	Suma Cargos Fijos	**$ 186.56**		**$ 118.14**		**$ 55.70**

II.- CONSUMOS					
a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0.1514x136x $21.2	$ 436.52	5%	$ 21.83	$ -
b).-Otras Fuentes de Energia	$.00 * 0	$ -	5%	$ -	$ -
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.003x136)+20/100] x $80lt	$ 48.64	5%	$ 2.43	$ -
d). Llantas.....N=Pn/Vn	$45,000.00/1,200	$ 37.50	15%	$ 5.63	$ -
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	$00/0	$ -		$ -	$ -
f).-Otros Consumos					

Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe	
		$ -	-			
		$ -	-			Suma: $ -
		$ -	-			

Suma de Otros Consumos	$ -	5%	$ -	$ -
Suma de Consumos	**$ 522.66**		**$ 29.89**	**$ -**

III.- OPERACIÓN	CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht
MOCAMION-6	OPERADOR DE CAMION DE VOLTEO	JOR	$ 758.23	8.0000	$ 94.78
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
		Suma de Operación Po=S/Ht	**$94.78**	100% **$94.78**	100% **$94.78**

COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA	**$ 804.00**	**$ 242.81**	**$ 150.48**

000016

Dependencia: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO
AE - 03

Licitación: 41066004-016-2023 FECHA: 03/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Ubicación: ,ACAPULCO DE JUAREZ,Guerrero

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ	RLOPySRM
Licitante	ADMINISTRADOR UNICO	ART. 210

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES

Código: EQRE0001	**Modelo:**	**Capacidad:**	
REVOLVEDORA DE 1 SACO		**Serie:**	
		Tipo de Combustible:	GASOLINA
Indicador Economico de Referencia:	CETES	% Tasa de Interes Anual:	11.090%
Indicador Especifico de mercado de Seguros:	CETES	% Prima Anual Promedio de Seguros:	3.000%

PRECIO DE ADQUISICION	$	25,000.00		VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	2.2	
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	$	3,500.00		HORAS POR AÑO (Hea):	500	Hrs
EQUIPO ADICIONAL:	$	-		VIDA ECONOMICA (Ve):	1100	Hrs
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)		1200.00	hrs	COSTO COMBUSTIBLE (Pc):	21.55	/Lts
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	$	-		COSTO LUBRICANTE (Pa):	80	/Lts
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)			hrs	POTENCIA NOMINAL:	8	HP
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	$	21,500.00		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):	0.8	
VALOR DE RESCATE (Vr)		10%	$ 2,150.00	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):	6.4	
TASA DE INTERES ANUAL (i)		11.0900%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8	
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		3.0000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):	0.2271	
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	$	-		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):	0.0035	
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	$	-		CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	2	Lts
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)			hrs	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1	
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)		500.00	hrs	CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):	0.0040	

I.- CARGOS FIJOS	**OPERACIONES**	**ACTIVA**	**%**	**ESPERA**	**%**	**RESERVA**
a).- DEPRECIACION.....D =(Vm-Vr)/Ve	($21,500.-$2,150.)/1,100.00	$ 17.59	100%	$ 17.59	15%	$ 2.64
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	($21,500.+$2,150.)x11.0900 %/(2x500)	$ 2.62	100%	$ 2.62	100%	$ 2.62
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	($21,500.00+$2,150.00)x3.00 %/(2x500)	$ 0.71	100%	$ 0.71	100%	$ 0.71
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	0.8 x 17.59	$ 14.07		$ -	15%	$ 2.11
	Suma Cargos Fijos	**$ 34.99**		**$ 20.92**		**$ 8.08**

II.- CONSUMOS

a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0.2271x6.4x $21.55	$ 31.32	5%	$ 1.57	$ -
b).-Otras Fuentes de Energia	$.00 * 0	$ -	5%	$ -	$ -
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.0035x6.4)+2/500] x $80lt	$ 2.11	5%	$ 0.11	$ -
d). Llantas.....N=Pn/Vn	$3,500.00/1,200	$ 2.92	15%	$ 0.44	$ -
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	$00/0	$ -		$ -	$ -
f).-Otros Consumos					

Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe	
		$ -	-			
		$ -	-			Suma: $ -
		$ -	-			

	Suma de Otros Consumos	$ -	5%	$ -	$ -
	Suma de Consumos	**$ 36.35**		**$ 2.12**	**$ -**

III.- OPERACIÓN	CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
	Suma de Operación Po=S/Ht			100%	100%
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA			**$ 71.34**	**$ 23.04**	**$ 8.08**

000017

Dependencia: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO
AE - 03

Licitación: 41066004-016-2023 FECHA: 03/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Ubicación: ,ACAPULCO DE JUAREZ,Guerrero

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ	RLOPySRM
Licitante	ADMINISTRADOR UNICO	ART. 210

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES

Código: EQRETROEXCAVA	**Modelo:**	**Capacidad:**	
RETRO EXCAVADORA CAT 90 HP		**Serie:**	
		Tipo de Combustible:	DIESEL
Indicador Economico de Referencia:	CETES	% Tasa de Interes Anual:	11.090%
Indicador Especifico de mercado de Seguros:	CETES	% Prima Anual Promedio de Seguros:	3.000%

PRECIO DE ADQUISICION	$	570,000.00		VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	5	
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	$	30,000.00		HORAS POR AÑO (Hea):	2000	Hrs
EQUIPO ADICIONAL:	$	-		VIDA ECONOMICA (Ve):	10000	Hrs
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)		2000.00	hrs	COSTO COMBUSTIBLE (Pc):	21.2	/Lts
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	$	-		COSTO LUBRICANTE (Pa):	80	/Lts
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)			hrs	POTENCIA NOMINAL:	90	HP
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	$	540,000.00		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):	1	
VALOR DE RESCATE (Vr)		20%	$ 108,000.00	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):	90	
TASA DE INTERES ANUAL (i)		11.0900%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8	
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		3.0000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):	0.1514	
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	$	758.23		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):	0.0035	
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	$	94.78		CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	40	Lts
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)		8	hrs	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1	
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)		200.00	hrs	CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):	0.2000	

I.- CARGOS FIJOS	**OPERACIONES**	**ACTIVA**	**%**	**ESPERA**	**%**	**RESERVA**
a).- DEPRECIACION.....D =(Vm-Vr)/Ve	($540,000.-$108,000.)/10,000.00	$ 43.20	100%	$ 43.20	15%	$ 6.48
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	($540,000.+$108,000.)x11.0900 %/(2x2000)	$ 17.97	100%	$ 17.97	100%	$ 17.97
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	($540,000.00+$108,000.00)x3.00 %/(2x2000)	$ 4.86	100%	$ 4.86	100%	$ 4.86
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	0.8 x 43.2	$ 34.56		$ -	15%	$ 5.18
	Suma Cargos Fijos	**$ 100.59**		**$ 66.03**		**$ 34.49**

II.- CONSUMOS					
a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0.1514x90x $21.2	$ 288.87	5%	$ 14.44	$ -
b).-Otras Fuentes de Energia	$.00 * 0	$ -	5%	$ -	$ -
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.0035x90)+40/200] x $80lt	$ 41.20	5%	$ 2.06	$ -
d). Llantas.....N=Pn/Vn	$30,000.00/2,000	$ 15.00	15%	$ 2.25	$ -
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	$00/0	$ -		$ -	$ -

f).-Otros Consumos

Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe	
		$ -	-			
		$ -	-			Suma: $ -
		$ -	-			

Suma de Otros Consumos	$ -	5%	$ -	$ -
Suma de Consumos	**$ 345.07**		**$ 18.75**	**$ -**

III.- OPERACIÓN	CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht
MOOPERRETRO	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	JOR	$ 758.23	8.0000	$ 94.78
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
	Suma de Operación Po=S/Ht		**$94.78**	100%	**$94.78**

COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA			**$ 540.44**		**$ 179.56**	**$ 129.27**

000018

Dependencia: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO
AE - 03

Licitación: 41066004-016-2023 FECHA: 03/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Ubicación: ,ACAPULCO DE JUAREZ,Guerrero

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ	RLOPySRM
Licitante	ADMINISTRADOR UNICO	ART. 210

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES

Código: EQTRAN	**Modelo:**	**Capacidad:**	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA		**Serie:**	
		Tipo de Combustible:	
Indicador Economico de Referencia:	CETES	% Tasa de Interes Anual:	11.090%
Indicador Especifico de mercado de Seguros:	CETES	% Prima Anual Promedio de Seguros:	4.000%

PRECIO DE ADQUISICION	$	21,839.00		VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	10	
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	$	-		HORAS POR AÑO (Hea):	500	Hrs
EQUIPO ADICIONAL:	$	-		VIDA ECONOMICA (Ve):	5000	Hrs
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)			hrs	COSTO COMBUSTIBLE (Pc):		/Lts
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	$	-		COSTO LUBRICANTE (Pa):		/Lts
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)			hrs	POTENCIA NOMINAL:		HP
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	$	21,839.00		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):	0.8	
VALOR DE RESCATE (Vr)		10%	$ 2,183.90	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):		
TASA DE INTERES ANUAL (i)		11.0900%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	1	
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		4.0000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):	0.1514	
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	$	-		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):	0.0035	
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	$	-		CAPACIDAD DEL CARTER (CC):		Lts
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)			hrs	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1	
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)			hrs	CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):		

I.- CARGOS FIJOS	**OPERACIONES**	**ACTIVA**	**%**	**ESPERA**	**%**	**RESERVA**
a).- DEPRECIACION.....D =(Vm-Vr)/Ve	($21,839.-$2,183.9)/5,000.00	$ 3.93	100%	$ 3.93	15%	$ 0.59
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	($21,839.+$2,183.9)x11.0900 %/(2x500)	$ 2.66	100%	$ 2.66	100%	$ 2.66
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	($21,839.00+$2,183.90)x4.00 %/(2x500)	$ 0.96	100%	$ 0.96	100%	$ 0.96
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	1 x 3.93	$ 3.93		$ -	15%	$ 0.59
	Suma Cargos Fijos	**$ 11.48**		**$ 7.55**		**$ 4.80**

II.- CONSUMOS					
a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0.1514x0x $0	$ -	5%	$ -	$ -
b).-Otras Fuentes de Energia	$.00 * 0	$ -	5%	$ -	$ -
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.0035x0)+0/0] x $0lt	$ -	5%	$ -	$ -
d). Llantas.....N=Pn/Vn	$.00/0	$ -	15%	$ -	$ -
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	$00/0	$ -		$ -	$ -
f).-Otros Consumos					

Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe	
		$ -	-			
		$ -	-			Suma: $ -
		$ -	-			

Suma de Otros Consumos	$ -	5%	$ -	$ -
Suma de Consumos	**$ -**		**$ -**	**$ -**

III.- OPERACIÓN	CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
	Suma de Operación Po=S/Ht			100%	100%
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA			**$ 11.48**	**$ 7.55**	**$ 4.80**

Dependencia: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO
AE - 03

Licitación: 41066004-016-2023 FECHA: 03/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Ubicación: ,ACAPULCO DE JUAREZ,Guerrero

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ	RLOPySRM
Licitante	ADMINISTRADOR UNICO	ART. 210

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES

Código: EQVG0002	**Modelo:**	**Capacidad:**	
VIBRADOR DE GASOLINA		**Serie:**	
		Tipo de Combustible:	DIESEL
Indicador Economico de Referencia:	CETES	% Tasa de Interes Anual:	11.090%
Indicador Especifico de mercado de Seguros:	CETES	% Prima Anual Promedio de Seguros:	6.300%

PRECIO DE ADQUISICION	$	20,000.00		VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	3	
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	$	-		HORAS POR AÑO (Hea):	400	Hrs
EQUIPO ADICIONAL:	$	-		VIDA ECONOMICA (Ve):	1200	Hrs
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)			hrs	COSTO COMBUSTIBLE (Pc):	21.2	/Lts
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	$	-		COSTO LUBRICANTE (Pa):	80	/Lts
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)			hrs	POTENCIA NOMINAL:	4	HP
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	$	20,000.00		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):	0.8	
VALOR DE RESCATE (Vr)		15%	$ 3,000.00	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):	3.2	
TASA DE INTERES ANUAL (i)		11.0900%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8	
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		6.3000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):	0.2271	
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	$	-		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):	0.0035	
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	$	-		CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	1	Lts
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)			hrs	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1	
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)		100.00	hrs	CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):	0.0100	

I.- CARGOS FIJOS	**OPERACIONES**	**ACTIVA**	**%**	**ESPERA**	**%**	**RESERVA**
a).- DEPRECIACION.....D =(Vm-Vr)/Ve	($20,000.-$3,000.)/1,200.00	$ 14.17	100%	$ 14.17	15%	$ 2.13
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	($20,000.+$3,000.)x11.0900 %/(2x400)	$ 3.19	100%	$ 3.19	100%	$ 3.19
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	($20,000.00+$3,000.00)x6.30 %/(2x400)	$ 1.81	100%	$ 1.81	100%	$ 1.81
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	0.8 x 14.17	$ 11.34		$ -	15%	$ 1.70
	Suma Cargos Fijos	**$ 30.51**		**$ 19.17**		**$ 8.83**

II.- CONSUMOS						
a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0.2271x3.2x $21.2	$ 15.41	5%	$ 0.77		$ -
b).-Otras Fuentes de Energia	$.00 * 0	$ -	5%	$ -		$ -
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.0035x3.2)+1/100] x $80lt	$ 1.70	5%	$ 0.09		$ -
d). Llantas.....N=Pn/Vn	$.00/0	$ -	15%	$ -		$ -
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	$00/0	$ -		$ -		$ -

f).-Otros Consumos

Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe	
		$ -	-			
		$ -	-			Suma: $ -
		$ -	-			

Suma de Otros Consumos	$ -	5%	$ -		$ -
Suma de Consumos	**$ 17.11**		**$ 0.86**		**$ -**

III.- OPERACIÓN	CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
		Suma de Operación Po=S/Ht		100%	100%
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA			**$ 47.62**	**$ 20.03**	**$ 8.83**

000020

Dependencia: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO
AE - 03

Licitación: 41066004-016-2023 FECHA: 03/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Ubicación: ,ACAPULCO DE JUAREZ,Guerrero

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. **Licitante**	ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ ADMINISTRADOR UNICO	RLOPySRM ART. 210

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES

Código: EQECORTE	**Modelo:**	**Capacidad:**	
EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO		**Serie:**	
		Tipo de Combustible:	
Indicador Economico de Referencia:	CETES	% Tasa de Interes Anual:	11.090%
Indicador Especifico de mercado de Seguros:	CETES	% Prima Anual Promedio de Seguros:	4.000%

PRECIO DE ADQUISICION	$	12,500.00		VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	3		
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	$	-		HORAS POR AÑO (Hea):	2000	Hrs	
EQUIPO ADICIONAL:	$	-		VIDA ECONOMICA (Ve):	6000	Hrs	
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)			hrs	COSTO COMBUSTIBLE (Pc):		/Lts	
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	$	-		COSTO LUBRICANTE (Pa):		/Lts	
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)			hrs	POTENCIA NOMINAL:		HP	
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	$	12,500.00		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):	1		
VALOR DE RESCATE (Vr)		9%	$ 1,148.75	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):			
TASA DE INTERES ANUAL (i)		11.0900%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8		
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		4.0000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):	0.1514		
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	$	-		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):	0.003		
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	$	-		CAPACIDAD DEL CARTER (CC):		Lts	
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)			hrs	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1		
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)			hrs	CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):			

I.- CARGOS FIJOS	**OPERACIONES**	**ACTIVA**	**%**	**ESPERA**	**%**	**RESERVA**
a).- DEPRECIACION.....D =(Vm-Vr)/Ve	($12,500.-$1,148.75)/6,000.00	$ 1.89	100%	$ 1.89	15%	$ 0.28
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	($12,500.+$1,148.75)x11.0900 %/(2x2000)	$ 0.38	100%	$ 0.38	100%	$ 0.38
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	($12,500.00+$1,148.75)x4.00 %/(2x2000)	$ 0.14	100%	$ 0.14	100%	$ 0.14
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	0.8 x 1.89	$ 1.51		$ -	15%	$ 0.23
	Suma Cargos Fijos	**$ 3.92**		**$ 2.41**		**$ 1.03**

II.- CONSUMOS						
a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0.1514x0x $0	$ -	5%	$ -		$ -
b).-Otras Fuentes de Energia	$.00 * 0	$ -	5%	$ -		$ -
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.003x0)+0/0] x $0lt	$ -	5%	$ -		$ -
d). Llantas.....N=Pn/Vn	$.00/0	$ -	15%	$ -		$ -
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	$00/0	$ -		$ -		$ -

f).-Otros Consumos

Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe		
OXIGENO	CILI	$ 1,300.00	0.850000	*	$1,105.00		
ACETILENO	CIL	$ 800.00	0.085000	*	$68.00	**Suma:**	**$ 1,173.00**
		$ -	-				

Suma de Otros Consumos	$ 1,173.00	5%	$ 58.65		$ -
Suma de Consumos	**$ 1,173.00**		**$ 58.65**		**$ -**

III.- OPERACIÓN	CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
		Suma de Operación Po=S/Ht		100%	100%
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA			**$ 1,176.92**	**$ 61.06**	**$ 1.03**

Dependencia: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO
AE - 03

Licitación: 41066004-016-2023 FECHA: 03/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Ubicación: ,ACAPULCO DE JUAREZ,Guerrero

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ	RLOPySRM
Licitante	ADMINISTRADOR UNICO	ART. 210

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES

Código: EQMOTO14H	**Modelo:** 14H	**Capacidad:**	
MOTONIVELADORA CAT. 14H DE 215 HP		**Serie:**	
		Tipo de Combustible:	DIESEL
Indicador Economico de Referencia:	CETES	% Tasa de Interes Anual:	11.090%
Indicador Especifico de mercado de Seguros:	CETES	% Prima Anual Promedio de Seguros:	4.000%

PRECIO DE ADQUISICION	$	4,814,940.00		VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	5	
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	$	80,000.00		HORAS POR AÑO (Hea):	2000	Hrs
EQUIPO ADICIONAL:	$	-		VIDA ECONOMICA (Ve):	10000	Hrs
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)		3000.00	hrs	COSTO COMBUSTIBLE (Pc):	21.2	/Lts
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	$	-		COSTO LUBRICANTE (Pa):	80	/Lts
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)			hrs	POTENCIA NOMINAL:	215	HP
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	$	4,734,940.00		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):	0.75	
VALOR DE RESCATE (Vr)		10%	$ 473,494.00	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):	161.25	
TASA DE INTERES ANUAL (i)		11.0900%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.5	
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		4.0000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):	0.1514	
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	$	914.91		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):	0.0015	
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	$	114.36		CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	20	Lts
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)		8	hrs	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1	
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)		200.00	hrs	CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):	0.1000	

I.- CARGOS FIJOS	**OPERACIONES**	**ACTIVA**	**%**	**ESPERA**	**%**	**RESERVA**
a).- DEPRECIACION.....D =(Vm-Vr)/Ve	($4,734,940.-$473,494.)/10,000.00	$ 426.14	100%	$ 426.14	15%	$ 63.92
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	($4,734,940.+$473,494.)x11.0900 %/(2x2000)	$ 144.40	100%	$ 144.40	100%	$ 144.40
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	($4,734,940.00+$473,494.00)x4.00 %/(2x2000)	$ 52.08	100%	$ 52.08	100%	$ 52.08
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	0.5 x 426.14	$ 213.07		$ -	15%	$ 31.96
	Suma Cargos Fijos	**$ 835.69**		**$ 622.62**		**$ 292.36**

II.- CONSUMOS						
a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0.1514x161.25x $21.2	$ 517.56	5%	$ 25.88		$ -
b).-Otras Fuentes de Energia	$.00 * 0	$ -	5%	$ -		$ -
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.0015x161.25)+20/200] x $80lt	$ 27.35	5%	$ 1.37		$ -
d). Llantas.....N=Pn/Vn	$80,000.00/3,000	$ 26.67	15%	$ 4.00		$ -
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	$00/0	$ -		$ -		$ -

f).-Otros Consumos

Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe		
		$ -	-				
		$ -	-			**Suma:**	$ -
		$ -	-				
		Suma de Otros Consumos	$ -	5%	$ -		$ -
		Suma de Consumos	**$ 571.58**		**$ 31.25**		**$ -**

III.- OPERACIÓN	CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht
MO093	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JOR	$ 914.91	8.0000	$ 114.36
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
		Suma de Operación Po=S/Ht	**$114.36**	100% **$114.36**	100% **$114.36**
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA			**$ 1,521.63**	**$ 768.23**	**$ 406.72**

000022

Dependencia: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO
AE - 03

Licitación: 41066004-016-2023 FECHA: 03/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Ubicación: ,ACAPULCO DE JUAREZ,Guerrero

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ	RLOPySRM
Licitante	ADMINISTRADOR UNICO	ART. 210

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES

Código: EQVAP **Modelo:** **Capacidad:**
VIBROCOMPACTADOR VAP 70 **Serie:**
Tipo de Combustible: DIESEL

Indicador Economico de Referencia: CETES % Tasa de Interes Anual: 11.090%
Indicador Especifico de mercado de Seguros: CETES % Prima Anual Promedio de Seguros: 4.000%

PRECIO DE ADQUISICION	$	1,135,599.20		VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	5	
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	$	26,800.00		HORAS POR AÑO (Hea):	2000	Hrs
EQUIPO ADICIONAL:	$	-		VIDA ECONOMICA (Ve):	10000	Hrs
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)		3000.00	hrs	COSTO COMBUSTIBLE (Pc):	21.2	/Lts
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	$	-		COSTO LUBRICANTE (Pa):	80	/Lts
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)			hrs	POTENCIA NOMINAL:	155	HP
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	$	1,108,799.20		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):	0.8	
VALOR DE RESCATE (Vr)		10%	$ 110,879.92	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):	124	
TASA DE INTERES ANUAL (i)		11.0900%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8	
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		4.0000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):	0.1514	
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	$	914.91		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):	0.003	
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	$	114.36		CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	36	Lts
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)		8	hrs	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1	
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)		150.00	hrs	CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):	0.2400	

I.- CARGOS FIJOS	**OPERACIONES**	**ACTIVA**	**%**	**ESPERA**	**%**	**RESERVA**
a).- DEPRECIACION.....D =(Vm-Vr)/Ve	($1,108,799.2-$110,879.92)/10,000.00	$ 99.79	100%	$ 99.79	15%	$ 14.97
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	($1,108,799.2+$110,879.92)x11.0900 %/(2x2000)	$ 33.82	100%	$ 33.82	100%	$ 33.82
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	($1,108,799.20+$110,879.92)x4.00 %/(2x2000)	$ 12.20	100%	$ 12.20	100%	$ 12.20
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	0.8 x 99.79	$ 79.83		$ -	15%	$ 11.97
	Suma Cargos Fijos	**$ 225.64**		**$ 145.81**		**$ 72.96**

II.- CONSUMOS						
a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0.1514x124x $21.2	$ 398.00	5%	$ 19.90		$ -
b).-Otras Fuentes de Energia	$.00 * 0	$ -	5%	$ -		$ -
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.003x124)+36/150] x $80lt	$ 48.96	5%	$ 2.45		$ -
d). Llantas.....N=Pn/Vn	$26,800.00/3,000	$ 8.93	15%	$ 1.34		$ -
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	$00/0	$ -		$ -		$ -
f).-Otros Consumos						

Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe	
		$ -	-			
		$ -	-			Suma: $ -
		$ -	-			

	Suma de Otros Consumos	$ -	5%	$ -	$ -
	Suma de Consumos	**$ 455.89**		**$ 23.69**	**$ -**

III.- OPERACIÓN	CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht
MO093	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JOR	$ 914.91	8.0000	$ 114.36
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
	Suma de Operación Po=S/Ht		**$114.36**	100%	**$114.36** 100% **$114.36**
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA			**$ 795.89**	**$ 283.86**	**$ 187.32**

000023

Dependencia: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO
AE - 03

Licitación: 41066004-016-2023 FECHA: 03/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Ubicación: ,ACAPULCO DE JUAREZ,Guerrero

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. **Licitante**	ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ ADMINISTRADOR UNICO	RLOPySRM ART. 210

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES

Código: EQPIPA		**Modelo:**		**Capacidad:**	
CAMION PIPA DE 9 M3				**Serie:**	
				Tipo de Combustible:	GASOLINA
Indicador Economico de Referencia:	CETES			% Tasa de Interes Anual:	11.090%
Indicador Especifico de mercado de Seguros:	CETES			% Prima Anual Promedio de Seguros:	4.000%

PRECIO DE ADQUISICION	$	703,488.70		VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	5	
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	$	16,000.00		HORAS POR AÑO (Hea):	2000	Hrs
EQUIPO ADICIONAL:	$	-		VIDA ECONOMICA (Ve):	10000	Hrs
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)		2000.00	hrs	COSTO COMBUSTIBLE (Pc):	20.45	/Lts
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	$	-		COSTO LUBRICANTE (Pa):	104.48	/Lts
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)			hrs	POTENCIA NOMINAL:	130	HP
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	$	687,488.70		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):	0.7	
VALOR DE RESCATE (Vr)		20%	$ 137,497.74	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):	91	
TASA DE INTERES ANUAL (i)		11.0900%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8	
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		4.0000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):	0.2271	
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	$	914.91		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):	0.0035	
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	$	114.36		CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	18	Lts
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)		8	hrs	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1	
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)		200.00	hrs	CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):	0.0900	

I.- CARGOS FIJOS	**OPERACIONES**	**ACTIVA**	**%**	**ESPERA**	**%**	**RESERVA**
a).- DEPRECIACION.....D =(Vm-Vr)/Ve	($687,488.7-$137,497.74)/10,000.00	$ 55.00	100%	$ 55.00	15%	$ 8.25
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	($687,488.7+$137,497.74)x11.0900 %/(2x2000)	$ 22.87	100%	$ 22.87	100%	$ 22.87
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	($687,488.70+$137,497.74)x4.00 %/(2x2000)	$ 8.25	100%	$ 8.25	100%	$ 8.25
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	0.8 x 55	$ 44.00		$ -	15%	$ 6.60
	Suma Cargos Fijos	**$ 130.12**		**$ 86.12**		**$ 45.97**

II.- CONSUMOS						
a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0.2271x91x $20.45	$ 422.62	5%	$ 21.13		$ -
b).-Otras Fuentes de Energia	$.00 * 0	$ -	5%	$ -		$ -
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.0035x91)+18/200] x $104.48lt	$ 42.68	5%	$ 2.13		$ -
d). Llantas.....N=Pn/Vn	$16,000.00/2,000	$ 8.00	15%	$ 1.20		$ -
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	$00/0	$ -		$ -		$ -
f).-Otros Consumos						

Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe	
		$ -	-			
		$ -	-			Suma: $ -
		$ -	-			

Suma de Otros Consumos	$ -	5%	$ -	$ -
Suma de Consumos	**$ 473.30**		**$ 24.46**	**$ -**

III.- OPERACIÓN	CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht
MO093	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JOR	$ 914.91	8.0000	$ 114.36
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
	Suma de Operación Po=S/Ht		**$114.36**	100%	**$114.36** 100% **$114.36**
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA			**$ 717.78**	**$ 224.94**	**$ 160.33**

000024

Dependencia: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO
AE - 03

Licitación: 41066004-016-2023 FECHA: 03/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Ubicación: ,ACAPULCO DE JUAREZ,Guerrero

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ	RLOPySRM
Licitante	ADMINISTRADOR UNICO	ART. 210

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES

Código: EQBAILAR **Modelo:** **Capacidad:**
BAILARINA DE 4.5 HP **Serie:**
Tipo de Combustible: GASOLINA

Indicador Economico de Referencia: CETES — % Tasa de Interes Anual: 11.090%
Indicador Especifico de mercado de Seguros: CETES — % Prima Anual Promedio de Seguros: 4.000%

PRECIO DE ADQUISICION	$	33,607.00		VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	4	
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	$	-		HORAS POR AÑO (Hea):	1000	Hrs
EQUIPO ADICIONAL:	$	-		VIDA ECONOMICA (Ve):	4000	Hrs
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)			hrs	COSTO COMBUSTIBLE (Pc):	20.45	/Lts
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	$	-		COSTO LUBRICANTE (Pa):	104.48	/Lts
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)			hrs	POTENCIA NOMINAL:	8	HP
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	$	33,607.00		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):	1	
VALOR DE RESCATE (Vr)		10%	$ 3,360.70	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):	8	
TASA DE INTERES ANUAL (i)		11.0900%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8	
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		4.0000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):	0.1514	
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	$	444.84		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):	0.003	
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	$	55.61		CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	1	Lts
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)		8	hrs	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1	
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)		100.00	hrs	CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):	0.0100	

I.- CARGOS FIJOS	**OPERACIONES**	**ACTIVA**	**%**	**ESPERA**	**%**	**RESERVA**
a).- DEPRECIACION.....D =(Vm-Vr)/Ve	($33,607.-$3,360.7)/4,000.00	$ 7.56	100%	$ 7.56	15%	$ 1.13
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	($33,607.+$3,360.7)x11.0900 %/(2x1000)	$ 2.05	100%	$ 2.05	100%	$ 2.05
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	($33,607.00+$3,360.70)x4.00 %/(2x1000)	$ 0.74	100%	$ 0.74	100%	$ 0.74
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	0.8 x 7.56	$ 6.05		$ -	15%	$ 0.91
	Suma Cargos Fijos	**$ 16.40**		**$ 10.35**		**$ 4.83**

II.- CONSUMOS						
a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0.1514x8x $20.45	$ 24.77	5%	$ 1.24		$ -
b).-Otras Fuentes de Energia	$.00 * 0	$ -	5%	$ -		$ -
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.003x8)+1/100] x $104.48lt	$ 3.55	5%	$ 0.18		$ -
d). Llantas.....N=Pn/Vn	$.00/0	$ -	15%	$ -		$ -
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	$00/0	$ -		$ -		$ -
f).-Otros Consumos						

Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe	
		$ -	-			
		$ -	-			Suma: $ -
		$ -	-			

Suma de Otros Consumos	$ -	5%	$ -	$ -
Suma de Consumos	**$ 28.32**		**$ 1.42**	**$ -**

III.- OPERACIÓN	CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	$ 444.84	8.0000	$ 55.61
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
		Suma de Operación Po=S/Ht	**$55.61**	100%	**$55.61** 100% **$55.61**
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA			**$ 100.33**	**$ 67.38**	**$ 60.44**

000025

Dependencia: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO
AE - 03

Licitación: 41066004-016-2023 FECHA: 03/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Ubicación: ,ACAPULCO DE JUAREZ,Guerrero

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. **Licitante**	ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ ADMINISTRADOR UNICO	RLOPySRM ART. 210

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES

Código: EQPLAN PLANTA DE SOLDAR MILLER	**Modelo:**
	Capacidad:
	Serie:
	Tipo de Combustible:
Indicador Economico de Referencia: CETES	% Tasa de Interes Anual: 11.090%
Indicador Especifico de mercado de Seguros: CETES	% Prima Anual Promedio de Seguros: 4.000%

PRECIO DE ADQUISICION	$	25,521.00		VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	5
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	$	-		HORAS POR AÑO (Hea):	2000 Hrs
EQUIPO ADICIONAL:	$	-		VIDA ECONOMICA (Ve):	10000 Hrs
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)			hrs	COSTO COMBUSTIBLE (Pc):	/Lts
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	$	-		COSTO LUBRICANTE (Pa):	/Lts
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)			hrs	POTENCIA NOMINAL:	HP
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	$	25,521.00		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):	1
VALOR DE RESCATE (Vr)		9%	$ 2,345.38	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):	
TASA DE INTERES ANUAL (i)		11.0900%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	1.5
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		4.0000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):	0.1514
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	$	444.84		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):	0.003
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	$	55.61		CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	Lts
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)		8	hrs	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)			hrs	CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):	

I.- CARGOS FIJOS	**OPERACIONES**	**ACTIVA**	**%**	**ESPERA**	**%**	**RESERVA**
a).- DEPRECIACION.....D =(Vm-Vr)/Ve	($25,521.-$2,345.38)/10,000.00	$ 2.32	100%	$ 2.32	15%	$ 0.35
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	($25,521.+$2,345.38)x11.0900 %/(2x2000)	$ 0.77	100%	$ 0.77	100%	$ 0.77
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	($25,521.00+$2,345.38)x4.00 %/(2x2000)	$ 0.28	100%	$ 0.28	100%	$ 0.28
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	1.5 x 2.32	$ 3.48		$ -	15%	$ 0.52
	Suma Cargos Fijos	**$ 6.85**		**$ 3.37**		**$ 1.92**

II.- CONSUMOS						
a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0.1514x0x $0	$ -	5%	$ -		$ -
b).-Otras Fuentes de Energia	$4.90 * 1	$ 4.90	5%	$ 0.25		$ -
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.003x0)+0/0] x $0lt	$ -	5%	$ -		$ -
d). Llantas.....N=Pn/Vn	$.00/0	$ -	15%	$ -		$ -
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	$00/0	$ -		$ -		$ -
f).-Otros Consumos						

Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe	
		$ -	-			
		$ -	-			Suma: $ -
		$ -	-			

Suma de Otros Consumos	$ -	5%	$ -	$ -
Suma de Consumos	**$ 4.90**		**$ 0.25**	**$ -**

III.- OPERACIÓN	CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	$ 444.84	8.0000	$ 55.61
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
	Suma de Operación Po=S/Ht		**$55.61**	100% **$55.61**	100% **$55.61**

COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA				
	$ 67.36		**$ 59.23**	**$ 57.53**

000026

Dependencia: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO AE - 03

Licitación: 41066004-016-2023 FECHA: 03/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Ubicación: ,ACAPULCO DE JUAREZ,Guerrero

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. **Licitante**	ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ ADMINISTRADOR UNICO	RLOPySRM ART. 210

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES

Código: EQVIB	**Modelo:**	**Capacidad:**	
VIBRADOR PARA CONCRETO		**Serie:**	
		Tipo de Combustible:	GASOLINA
Indicador Economico de Referencia:	CETES	% Tasa de Interes Anual:	11.090%
Indicador Especifico de mercado de Seguros:	CETES	% Prima Anual Promedio de Seguros:	3.000%

PRECIO DE ADQUISICION	$	118,783.44		VIDA ECONOMICA EN ANOS:	0.8		
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	$	-		HORAS POR AÑO (Hea):	2500	Hrs	
EQUIPO ADICIONAL:	$	-		VIDA ECONOMICA (Ve):	2000	Hrs	
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)			hrs	COSTO COMBUSTIBLE (Pc):	24	/Lts	
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	$	-		COSTO LUBRICANTE (Pa):	123.8	/Lts	
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)			hrs	POTENCIA NOMINAL:	4	HP	
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	$	118,783.44		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):	1		
VALOR DE RESCATE (Vr)		20%	$ 23,756.69	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):	4		
TASA DE INTERES ANUAL (i)		11.0900%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.3		
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		3.0000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):	0.227		
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	$	444.84		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):	0.003		
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	$	22.24		CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	5	Lts	
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)		20	hrs	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1		
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)		100.00	hrs	CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):	0.0500		

I.- CARGOS FIJOS	**OPERACIONES**	**ACTIVA**	**%**	**ESPERA**	**%**	**RESERVA**
a).- DEPRECIACION.....D =(Vm-Vr)/Ve	($118,783.44-$23,756.69)/2,000.00	$ 47.51	100%	$ 47.51	15%	$ 7.13
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	($118,783.44+$23,756.69)x11.0900 %/(2x2500)	$ 3.16	100%	$ 3.16	100%	$ 3.16
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	($118,783.44+$23,756.69)x3.00 %/(2x2500)	$ 0.86	100%	$ 0.86	100%	$ 0.86
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	0.3 x 47.51	$ 14.25		$ -	15%	$ 2.14
	Suma Cargos Fijos	**$ 65.78**		**$ 51.53**		**$ 13.29**

II.- CONSUMOS

a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0.227x4x $24	$ 21.79	5%	$ 1.09		$ -
b).-Otras Fuentes de Energia	$.00 * 0	$ -	5%	$ -		$ -
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.003x4)+5/100] x $123.8lt	$ 7.68	5%	$ 0.38		$ -
d). Llantas.....N=Pn/Vn	$.00/0	$ -	15%	$ -		$ -
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	$00/0	$ -		$ -		$ -
f).-Otros Consumos						

Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe	
		$ -	-			
		$ -	-			Suma: $ -
		$ -	-			

Suma de Otros Consumos	$ -	5%	$ -	$ -
Suma de Consumos	**$ 29.47**		**$ 1.47**	**$ -**

III.- OPERACIÓN	CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL ($)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO $/Ht
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	$ 444.84	20.0000	$ 22.24
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
	Suma de Operación Po=S/Ht		**$22.24**	100% **$22.24**	100% **$22.24**
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA			**$ 117.49**	**$ 75.24**	**$ 35.53**

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. **41066004-016-2023.**
REFERENTE A LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**

000027

AE-4 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01 CEL. 744 2354717 / 744 4490912 E-MAIL: mexa@telmexmail.com, gno_0301@hotmail.com

000028

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023 FECHA: 03/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

DOCUMENTO AE - 04

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

INICIO:	14/08/2023	TERMINACION:	11/11/2023	PLAZO:	90 DIAS

DESGLOSE DE COSTOS INDIRECTOS

MONTO DE LA OBRA A COSTO DIRECTO $ 3,340,812.23

CONCEPTO	TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS			
	ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL		ADMINISTRACION OFICINA DE CAMPO	
	MONTO	PORCENTAJE	MONTO	PORCENTAJE
I. HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES				
a. Personal directivo incluye: Prestaciones	165,149.56	4.9434%		
b. Personal técnico incluye: Prestaciones	48,000.16	1.4368%	199,499.42	5.9716%
c. Personal administrativo incluye: Prestaciones	37,823.88	1.1322%	43,439.88	1.3003%
d. Cuota Patronal del Seguro Social del inciso a, b y c (consideradas)				
e. Prestaciones de la LFT del inciso a, b y c (consideradas)				
f. Pasajes y viáticos (consideradas)				
g. Los que deriven de suscripción de contratos de trabajo del inciso a,b y c.				
SUBTOTALES	**250,973.60**		**242,939.30**	
II. DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS				
a. Edificios y Locales	6,681.62	0.2000%		
b. Locales de Mantenimiento y Guarda	3,340.81	0.1000%	5,011.22	0.1500%
c. Bodegas	2,505.61	0.0750%		
d. Instalaciones Generales	2,672.65	0.0800%	3,340.81	0.1000%
e. Muebles y enseres	1,503.37	0.0450%		
f. Depreciación o Renta, y Operación de Vehículos	2,004.49	0.0600%	5,011.22	0.1500%
g. Campamentos				
SUBTOTALES	**18,708.55**		**13,363.25**	
III. SERVICIOS				
a. Consultores,Asesores,Servicio y Laboratorios			6,681.62	0.2000%
b. Estudios e Investigación	3,340.81	0.1000%	3,340.81	0.1000%
SUBTOTALES	**3,340.81**		**10,022.44**	
IV. FLETES Y ACARREOS				
a. De Campamentos			1,844.13	0.0552%
b. De Equipo de Construcción				
c. De Plantas y elementos para Instalaciones				
d. De mobiliario			6,347.54	0.1900%
SUBTOTALES			**8,191.67**	
V. GASTOS OFICINA				
a. Papelería y útiles de escritorio	4,008.97	0.1200%	2,338.57	0.0700%
b. Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio.	3,006.73	0.0900%	334.08	0.0100%
c. equipo de computación	2,672.65	0.0800%		
d. Situación de fondos	1,670.41	0.0500%		
e. Copias y duplicados	835.20	0.0250%		
f. Luz, gas y otros consumos	2,004.49	0.0600%	1,670.41	0.0500%
g. Gastos de la licitación	11,692.84	0.3500%		
SUBTOTALES	**25,891.29**		**4,343.06**	
VI. CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	**2,839.69**	0.0850%	**1,670.41**	0.0500%
VII. SEGURIDAD E HIGIENE	**2,839.69**	0.0850%	**1,670.41**	0.0500%
VIII. SEGUROS Y FIANZAS				
a. Primas por Seguro	5,011.22	0.1500%		
b. Primas por Fianzas	5,011.22	0.1500%	20,039.26	0.5998%
SUBTOTALES	**10,022.44**		**20,039.26**	
IX. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES				
a. Construcción y conservación de caminos de acceso				
b. Montaje y desmantelamiento de equipo				
c. Construcción de Instalaciones generales				
1. De Campamentos				
2. De equipo de construcción				
3. De plantas y elementos para instalaciones				
4. Letrero nominativo de obra			4,008.97	0.1200%
SUBTOTALES			**4,008.97**	
TOTALES	314,616.07	9.4174%	306,248.76	9.1668%

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR UNICO

TOTALES $ 620,864.84 **% INDIRECTO 18.5842%**

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. **41066004-016-2023.**
REFERENTE A LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**

000029

AE-5 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.
ANEXAR INDICADOR ECONOMICO TASA DE INTERES

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01
CEL. 744 2354717 / 744 4490912 E-MAIL: imexa@telmexmail.com, gno_0301@hotmail.com

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ **SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS**	LICITACION 41066004-016-2023 QUE SE CELEBRARA EN LUGAR DE CELEBRACION ACAPULCO EL DIA: 3 de agosto de 2023 OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. LUGAR: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero	DOCUMENTO **AE - 05**
IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. Razón Social delLicitante	ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ ADMINISTRADOR UNICO	FIRMA

DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO (COSTO DIRECTO + INDIRECTO DE OBRA)

Inicio: 14/08/2023 Terminacion: 11/11/2023 Duracion: 90 Dias

COSTO DIRECTO DE LA OBRA:	3,340,812.23	TASA DE INTERES USADA (Anual)=	11.0900%	% APLICABLE AL PERIODO
INDIRECTO DE OBRA:	18.5842%	+ PUNTOS DEL BANCO=	4.0000%	1.6950%
COSTO DIRECTO +INDIRECTO:	3,961,675.46	TASA DE INTERES DIARIA =	0.0413%	LOP ART. 54 P. 1 y 2
MONTO TOTAL DE LA OBRA:	4,310,713.33	DIAS PARA PAGO DE ESTIMACIONES:	41	
			0.0000%	
			0.0000%	
			0.0000%	

ANTICIPOS		MONTO A EJERCER		IMPORTE DE ANTICIPOS		INDICADOR ECONOMICO
EJERCICIO		EJERCICIO		EJERCICIO		CETES 27-JUL-23
30.00%	0.00%	3,961,675.46	0.00	1,188,502.64	0.00	

%Am1= AMORTIZACION1		%Am2= AMORTIZACION2
EJERCICIO	**Spa1**= Saldo Por amortizar al Recibir 2do. Anticipo: $0.00	
%Am1= (Anticipo / 1er + 2do Ejercicio)		**%Am2= Spa1 / Ipe2**
30.0000%	**Ipe2**= Importe por Ejercer al Recibir el 2do Anticipo: $0.00	0.0000%

PERIODO SEGUN PROGRAMA	PERIODO	INGRESOS A COSTO DIRECTO + INDIRECTO				EGRESOS		IMPORTES		FINANCIAMIENTO
		ANTICIPOS	ESTIMACIONES	AMORTIZACION	COBROS	GASTOS DE OBRA (CD+I)	ANTICIPO PROVEEDORES *	DIFERENCIA	DIFERENCIA ACUMULADA	
	0	1,188,502.64	0.00		1,188,502.64	0.00	0.00	1,188,502.64	1,188,502.64	0.00
1	Mes1	0.00	500,689.80	0.00	0.00	500,689.80	0.00	-500,689.80	687,812.84	0.00
2	Mes2	0.00	859,559.64	150,206.94	350,482.86	859,559.64	0.00	-509,076.78	178,736.06	0.00
3	Mes3	0.00	2,089,279.00	257,867.89	601,691.75	2,089,279.00	0.00	-1,487,587.25	-1,308,851.19	-22,185.57
4	Mes4	0.00	512,147.02	626,783.70	1,462,495.30	512,147.02	0.00	950,348.27	-358,502.92	-6,076.77
	0	0.00	0.00	153,644.11	358,502.92	0.00	0.00	358,502.92	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	TOTALES	1,188,502.64	3,961,675.46	1,188,502.64	3,961,675.46	3,961,675.46	0.00			-28,262.34

0.00

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= INTERES NETO A PAGAR / GASTOS DE OBRA (COSTO DIRECTO +INDIRECTO) = 28,262.34 / 3,961,675.46 = % **0.7134%**

* ANEXAR COMPROBANTES (CEDULA DE GASTOS DE ANTICIPOS)

000030

Banco de México

000031

DOCUMENTO
AE - 05 b

Subastas y colocación de valores
Valores Gubernamentales

Fecha de consulta: 27/07/2023 10:29:44

Título	Valores gubernamentales Resultados de la subasta semanal, Plazo en días Cetes a 28 días	Valores gubernamentales Resultados de la subasta semanal, Monto asignado Cetes a 28 días	Valores gubernamentales Resultados de la subasta semanal, Tasa de rendimiento Cetes a 28 días
Periodo disponible	02/09/1982 - 27/07/2023	04/01/1996 - 27/07/2023	02/09/1982 - 27/07/2023
Periodicidad	Diaria	Diaria	Diaria
Cifra	Sin tipo de Cifra	Sin tipo de Cifra	Porcentajes
Unidad	Días	Millones de Pesos	Porcentajes
Base			
Aviso			
Tipo de información	Niveles	Niveles	Niveles
Fecha	SF43935	SF43937	SF43936
05/01/2023	28	15,000	10.49
12/01/2023	28	15,000	10.46
19/01/2023	28	12,500	10.70
26/01/2023	28	12,500	10.80
02/02/2023	28	12,500	10.78
09/02/2023	28	12,500	10.82
16/02/2023	28	12,500	11.05
23/02/2023	28	12,500	11.04
02/03/2023	28	20,000	11.05
09/03/2023	27	20,000	11.19
16/03/2023	28	20,000	11.30
23/03/2023	28	17,500	11.28
30/03/2023	28	17,500	11.34
05/04/2023	29	15,000	11.28
13/04/2023	28	13,000	11.30
20/04/2023	28	13,000	11.30
27/04/2023	28	13,000	11.27
04/05/2023	28	17,500	11.40
11/05/2023	28	12,000	11.39
18/05/2023	28	8,000	11.25
25/05/2023	28	8,000	11.25
01/06/2023	28	8,000	11.20
08/06/2023	28	8,000	11.32
15/06/2023	28	8,000	11.15
22/06/2023	28	8,000	11.09
29/06/2023	28	8,000	11.02
06/07/2023	28	8,500	11.30
13/07/2023	28	8,500	11.29
20/07/2023	28	8,500	11.18
27/07/2023	28	8,500	11.09

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. **41066004-016-2023.**
REFERENTE A LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE Ii, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**

000032

AE-6 UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01
CEL. 744 2354717 / 744 4490912 E-MAIL: imexa@telmexmail.com, gno_0301@hotmail.com

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023 03/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

DOCUMENTO
AE - 06

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD

CLAVE	CONCEPTO	FORMULA	IMPORTE	%
CD	COSTO DIRECTO		3,340,812.23	
CI	I.-INDIRECTO		620,864.83	18.5842%
CF	II.-FINANCIAMIENTO		28,261.65	0.7134%
Up%	**UTILIDAD PROPUESTA**			4.5000%
	PTU= PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD		10.00%	
	ISR= IMPUESTO SOBRE LA RENTA		30.00%	
%U	UTILIDAD NETA = Up% / [1- (PTU+ISR)]	%U =4.5 % / [1- (10%+ 30%)]		7.5000%
CU	CARGO POR UTILIDAD (COSTO DIRECTO+ COSTO INDIRECTO+ COSTO FINANCIAMIENTO) x % UTILIDAD NETA	($ 3,340,812.23 + $ 620,864.83 + $ 28,261.65) x 7.5% =	$299,245.40	
	IMPORTE TOTAL UTILIDAD		$299,245.40	
	PORCENTAJE TOTAL DE UTILIDAD (%=Total utilidad * 100 / (CD+CI+CF))	[$ 299,245.40 / ($ 3,340,812.23 + $ 620,864.83 + $ 28,261.65)] * 100%		**7.5000%**

ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR UNICO

000033

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. **41066004-016-2023.**
REFERENTE A LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**

000034

AE-7 CARGOS ADICIONALES

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01
CEL. 744 2354717 / 744 4490912 E-MAIL: imexa@telmexmail.com, gno_0301@hotmail.com

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023 03/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

DOCUMENTO
AE - 07 a

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

DETERMINACION DE CARGOS ADICIONALES

CLAVE	CONCEPTO	FORMULA	IMPORTE	%
CD	COSTO DIRECTO		$3,340,812.23	
CI	I.-INDIRECTO		$620,864.83	18.5842%
CF	II.-FINANCIAMIENTO		$28,261.65	0.7134%
UT	III.- UTILIDAD TOTAL		$299,245.40	7.5000%
		Subtotal	**$4,289,184.11**	
	CARGOS ADICIONALES			
CSFP	IMPORTE DE LAS APORTACIONES POR CONCEPTO DE INSPECCION Y SUPERVISION QUE LAS LEYES DE LA MATERIA ENCOMIENDAN A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA. ARTICULO No. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS.			
	(CSFP = Subtotal / (1-.005) - Subtotal))	$ 4,289,184.11 / (1- 0 .005) - $ 4,289,184.11	$21,553.69	0.5025%
		TOTAL DE CARGOS ADICIONALES	**$21,553.69**	**0.5025%**

ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR UNICO

000035

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN No: 41066004-016-2023	ANEXO ECONÓMICO AE7
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	FIRMA DEL LICITANTE:	FECHA: 03-AGO-2023	HOJA: 1 DE: 1

CARGOS ADICIONALES

No	CARGOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES A	ARTÍCULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL QUE LO NORMA (ADJUNTAR COPIA FOTOSTÁTICA)	% QUE APLICA	INSUMO O PARTE DEL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO EN QUE SE APLICARÁ
C.A.1	**SFP 5 al millar =**	**ARTICULO 220.-** *REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS* *Última Reforma DOF 24-02-2023*	0.5025 %	CARGOS ADICIONALES, SECRETTARIA DE LA FUNCION PUBLICA

ATENTAMENTE

ADMINISTRADOR UNICO: ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ

II. Las dependencias y entidades reconocerán la variación en la tasa de interés propuesta por el contratista, de acuerdo con las variaciones del indicador económico específico a que esté sujeta;

III. El contratista presentará su solicitud de aplicación de la tasa de interés que corresponda cuando sea al alza; en caso de que la variación resulte a la baja, la dependencia o entidad deberá realizar los ajustes correspondientes, y

IV. El análisis, cálculo e integración del incremento o decremento en el costo por financiamiento se realizará conforme al análisis original presentado por el contratista, actualizando la tasa de interés. La diferencia en porcentaje que resulte dará el nuevo costo por financiamiento.

Artículo 218.- Para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, cuando exista un retraso en la entrega del anticipo en contratos que comprendan dos o más ejercicios, en los términos del segundo párrafo de la fracción V del artículo 50 de la Ley, las dependencias y entidades deberán considerar lo siguiente:

I. Para su cálculo, en el análisis de costo por financiamiento presentado por el contratista, se deberá reubicar el importe del anticipo dentro del periodo en que realmente se entregue éste, y

II. El nuevo costo por financiamiento se aplicará a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa de ejecución convenido, a partir de la fecha en que debió entregarse el anticipo.

SECCIÓN V
DEL CARGO POR UTILIDAD

Artículo 219.- El cargo por utilidad es la ganancia que recibe el contratista por la ejecución del concepto de trabajo; será fijado por el propio contratista y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento.

Para el cálculo del cargo por utilidad se considerará el impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas a cargo del contratista.

SECCIÓN VI
DE LOS CARGOS ADICIONALES

Artículo 220.- Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos, indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Únicamente quedarán incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión.

Los cargos adicionales deberán incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LOS CONTRATOS A PRECIO ALZADO

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. **41066004-016-2023.**
REFERENTE A LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**

000038

AE-8 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. CUANDO EXISTAN INSUMOS DE LOS SEÑALADOS EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE DEBERÁ SEÑALAR EL PRECIO OFERTADO POR EL LICITANTE.

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01
CEL. 744 2354717 / 744 4490912 E-MAIL: imexa@telmexmail.com, gno_0301@hotmail.com

000039

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-016-2023 **Fecha:** 03/08/2023 **Duración:** 90 días naturales

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

DOCUMENTO
AE - 08

Inicio obra: 14/08/2023 **Fin obra:** 11/11/2023

Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS

No.	DESCRIPCIÓN DE LOS COSTOS BÁSICOS	UNIDAD	CANTIDAD DEL COSTO BASICO	COSTO SIN IVA	IMPORTE	
1	ALAMBRE RECOCIDO	KG	230.823642	$38.00	$8,771.30	
2	VARILLA DE 3/8" 9.5 MM	KG	66.983600	$28.36	$1,899.65	
3	SOLDADURA ELECTRODO 7018	KG	9.945000	$137.00	$1,362.47	
4	AGUA (MANEJO)	M3	493.993103	$50.80	$25,094.85	
5	ARENA	M3	165.704562	$250.00	$41,426.14	
6	BOTA PARA LLAVE	PZA	3.000000	$750.00	$2,250.00	
7	CALHIDRA	TON	1.095974	$3,200.00	$3,507.12	
8	CLAVOS DE 2 A 4 "	KG	58.877426	$65.00	$3,827.03	
9	PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 BCO. Y COLS. REG.	LT	47.739375	$285.00	$13,605.72	
10	PRIMARIO ANTICORROSIVO	LT	9.945000	$198.00	$1,969.11	
11	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25"	PZA	80.784300	$30.00	$2,423.53	
12	GRAVA	M3	64.911075	$666.67	$43,274.27	
13	ABRAZADERA DE 4 PULG	PZA	3.000000	$298.00	$894.00	
14	ALAMBRE RECOCIDO	KG	24.032516	$28.50	$684.93	
15	ALAMBRON # 2	KG	83.666000	$35.00	$2,928.31	
16	ACERO DEL # 3 HASTA 6	KG	242.859580	$30.91	$7,506.79	
17	ACERO DE REFUERZO DEL 3 AL 8 FY=4200 KG/	KG	36.000000	$34.00	$1,224.00	
18	CLAVOS DE 2"	KG	0.760600	$55.00	$41.83	
19	ACCESORIOS DE CPVC	PZA	3.000000	$188.00	$564.00	
20	ACERO 4	KG	760.048000	$30.91	$23,493.08	
21	ADAPTADOR MACHO BRONCE 1/2	PZA	3.000000	$135.00	$405.00	

000040

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-016-2023 **Fecha:** 03/08/2023 **Duración:** 90 días naturales

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

DOCUMENTO
AE - 08

Inicio obra: 14/08/2023 **Fin obra:** 11/11/2023

Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS

No.	DESCRIPCIÓN DE LOS COSTOS BÁSICOS	UNIDAD	CANTIDAD DEL COSTO BASICO	COSTO SIN IVA	IMPORTE	
22	CEMENTO GRIS	TON	79.238764	$3,880.00	$307,446.41	
23	AGUA (MANEJO)	M3	0.216771	$40.00	$8.67	
24	BARROTE PINO 3RA 1.5X3.5	PZA	19.564000	$75.00	$1,467.30	
25	BROCAL DE POLIETILENO	PZA	2.000000	$2,980.00	$5,960.00	
26	CODO PVC 6 PULG DIAM	PZA	2.000000	$255.00	$510.00	
27	CONECTOR CON VARILLA 1/2 DE 60 CM	PZA	588.540000	$78.00	$45,906.12	
28	CONCRETO PREMEZCLADO FC= 300 KG/CM2	M3	301.626750	$2,320.00	$699,774.06	
29	CONCRETO PREMEZCLADO FC= 250 KG/CM2	M3	2.814000	$2,020.00	$5,684.28	
30	CURACRETO	LT	367.837500	$49.00	$18,024.04	
31	DIESEL	LTO	12.843000	$21.20	$272.27	
32	ESTOPA BLANCA	KG	0.100000	$81.00	$8.10	
33	FIBRA MICRO SINTETICA	KG	176.562000	$220.00	$38,843.64	
34	GRAVA Y/O RAYUELA PARA FILTRO	M3	64.440000	$490.00	$31,575.60	
35	GRAVA PARA REGISTRO	M3	1.600000	$450.00	$720.00	
36	TAPA REG. ELECT. 60X60 C/MRCO ANG. Y LAM	PZA	8.000000	$823.00	$6,584.00	
37	CARRETE DE HILO	PZA	21.542480	$50.00	$1,077.12	
38	HULE NEGRO CAL 600	M2	1574.344500	$35.00	$55,102.06	
39	ALAMBRE RECOCIDO No. 18	KG	0.200000	$30.00	$6.00	
40	LIJA PARA TUBERIA	ML	0.250000	$22.50	$5.63	
41	LLAVE CUADRO ROSCABLE1/2PULG	PZA	3.000000	$225.00	$675.00	
42	LLAVE DE INSERCION 1/2"	PZA	3.000000	$90.00	$270.00	
43	LLAVE NARIZ BRONCE 1/2"	PZA	3.000000	$75.00	$225.00	

000041

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-016-2023 **Fecha:** 03/08/2023 **Duración:** 90 días naturales

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

DOCUMENTO
AE - 08

Inicio obra: 14/08/2023 **Fin obra:** 11/11/2023

Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS

No.	DESCRIPCIÓN DE LOS COSTOS BÁSICOS	UNIDAD	CANTIDAD DEL COSTO BASICO	COSTO SIN IVA	IMPORTE	
44	MADERA DE PINO	PT	246.432000	$20.00	$4,928.64	
45	CHAFLAN DE 1/2" X 1/2"	ML	3.350000	$25.00	$83.75	
46	TRIPLAY DE PINO DE 16 MM.	PZA	5.748798	$775.00	$4,455.32	
47	ARENA DE LA REGION	M3	20.530519	$400.00	$8,212.21	
48	GRAVA 1" A 3/4"	M3	0.730176	$390.00	$284.77	
49	PEGAMENTO PVC	PZA	11.350000	$71.00	$805.85	
50	PIEDRA BRAZA DE LA REGION	M3	373.302000	$749.00	$279,603.20	
51	PINTURA ESMALTE MCA COMEX O SIMILAR	LT	8.950500	$285.00	$2,550.89	
52	PLACA 15X15 CM	KG	89.505000	$40.00	$3,580.20	
53	PLANO	PLAN	0.683974	$12,500.00	$8,549.67	
54	POLIN DE 3RA VARIAS MEDIDAS	PT	83.267600	$17.70	$1,473.84	
55	PRUEBA HIDROSTATICA	PRUE	1.500000	$450.00	$675.00	
56	ASFALTO OXIDADO	LT	195.750000	$32.00	$6,264.00	
57	TABICON	PZA	60.000000	$12.00	$720.00	
58	TABIQUE COMUN BARRO R.R. DE 7x14x28 CM.	PZA	2220.000000	$5.00	$11,100.00	
59	TABLA DE 3RA	PZA	181.776000	$185.00	$33,628.56	
60	TAPADERA DE REGISTRO CON ANGULO Y CONCRETO	PZA	2.000000	$750.00	$1,500.00	
61	MATERIAL DE BANCO	M3	633.856500	$275.00	$174,310.54	
62	TUBO ACERO 1 PULG	PZA	33.813000	$430.00	$14,539.59	
63	TUBO PVC 3 PULG DIAM CED RD26	ML	53.500000	$275.00	$14,712.50	
64	TUBO PVC SANITARIO 8 PULG	ML	45.796000	$450.00	$20,608.20	
65	TUBO DE ACERO 1 1/2 PULG	PZA	19.890000	$850.00	$16,906.50	

000042

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-016-2023 **Fecha:** 03/08/2023 **Duración:** 90 días naturales

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

DOCUMENTO
AE - 08

Inicio obra: 14/08/2023 **Fin obra:** 11/11/2023

Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS

No.	DESCRIPCIÓN DE LOS COSTOS BÁSICOS	UNIDAD	CANTIDAD DEL COSTO BASICO	COSTO SIN IVA	IMPORTE	
66	TUBO CONDUIT PVC PESADO 50 MM	ML	214.000000	$32.00	$6,848.00	
67	TUBERIA DE CPVC 1/2 PULG	ML	18.000000	$44.00	$792.00	
68	TUBO PVC 4"	ML	26.780000	$49.00	$1,312.22	
69	TUBO PVC SANITARIO 6 PULG	ML	19.260000	$295.00	$5,681.70	
70	UNION SERVICIO PVC 6 PULG	PZA	2.000000	$380.00	$760.00	
71	VALVULA ESFERA CPVC 13MM	PZA	3.000000	$160.00	$480.00	
72	CLAVO	KG	0.200000	$45.00	$9.00	
73	SEGUETA PARA CORTE	PZA	0.100000	$15.94	$1.59	
74	THINNER STANDARD	LT	104.760000	$77.00	$8,066.52	

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. **41066004-016-2023.**
REFERENTE A LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**

000043

AE-9 ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO. DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRÁN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS.

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01 CEL. 744 2354717 / 744 4490912 E-MAIL: imexa@telmexmail.com, gno_0301@hotmail.com

000044

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 09

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023
Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A1	Análisis No.:		10			
Análisis:	**3-0073**		**M2**		**2,692.8100**	**$46,612.54**	

Trazo y nivelación topográficas del terreno para estructuras estableciendo ejes y referencias, para superficie mayores a 300.00 m2 (vialidad) incluye: elaboración de planos topográficos.

MATERIALES							
CAL	CALHIDRA	TON	$3,200.00	*	0.000407	$1.30	9.69%
DUELA	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25"	PZA	$30.00	*	0.030000	$0.90	6.71%
MAHILO	CARRETE DE HILO	PZA	$50.00	*	0.008000	$0.40	2.98%
3.	VARILLA DE 3/8" 9.5 MM	KG	$28.36	*	0.020000	$0.57	4.25%
MAPLANN	PLANO	PLAN	$12,500.00	*	0.000254	$3.18	23.70%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$6.35**	**47.32%**
MANO DE OBRA							
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	$1,455.27	/	300.000000	$4.85	36.14%
MO01	PEON	JOR	$444.84	*	0.001500	$0.67	4.99%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$5.52**	**41.13%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQTRAN	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	HOR	$11.48	*	0.120000	$1.38	10.28%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$5.52	*	0.030000	$0.17	1.27%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$1.55**	**11.55%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$13.42**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$2.49	
	SUBTOTAL1					$15.91	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$0.11	
	SUBTOTAL2					$16.02	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$1.20	
	SUBTOTAL3					$17.22	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.09	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$17.31**	

000045

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 09

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023
Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A1	Análisis No.:		20			
Análisis:	**D-CAR5A10**		**M2**		**1,649.0000**	**$120,888.19**	

Demolición a maquina de carpeta asfaltica de 5.00 a 10.00 cms. De espesor. Incluye mano de obra y acarreos en 1a. estación.

MANO DE OBRA							
2P	CUADRILLA 02 (2 PEON + 0.1 CABO)	JOR	$1,010.61	*	0.003000	$3.03	5.33%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$3.03**	**5.33%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQRETROEXCA\	RETRO EXCAVADORA CAT 90 HP	HOR	$540.44	/	25.000000	$21.62	38.06%
EQCV0001	CAMION VOLTEO DE 6 M3	HORA	$804.00	/	25.000000	$32.16	56.61%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$53.78**	**94.67%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$56.81**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$10.56	
	SUBTOTAL1					$67.37	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$0.48	
	SUBTOTAL2					$67.85	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$5.09	
	SUBTOTAL3					$72.94	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.37	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$73.31**	

000046

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 09

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023

Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A1	Análisis No.:		30			
Análisis:	**D-BANQU**		**M2**		**146.0400**	**$9,258.94**	

Demolición mecánica de banqueta de 10 cms. de espesor incluye: herramienta menor, equipo y mano de obra.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRETROEXCA\	RETRO EXCAVADORA CAT 90 HP	HOR	$540.44	/	11.000000	$49.13	100.00%

SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**		**$49.13** **100.00%**
	(CD) COSTO DIRECTO		**$49.13** **100.00%**
	(CI) INDIRECTOS	18.5842%	$9.13
	SUBTOTAL1		$58.26
	(CF) FINANCIAMIENTO	0.7134%	$0.42
	SUBTOTAL2		$58.68
	(CU) UTILIDAD	7.5000%	$4.40
	SUBTOTAL3		$63.08
	CARGOS ADICIONALES		
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3	0.502500%	$0.32
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)		**$63.40**

000047

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 09

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023

Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A1	Análisis No.:		40			
Análisis:	**D-GUARM**		**M**		**183.6700**	**$12,807.31**	

Demolición mecánica de guarnición de 15x20x50 cm., incluye extracción de pedacería, mano de obra, equipo y herramienta.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRETROEXCA\	RETRO EXCAVADORA CAT 90 HP	HOR	$540.44	/	10.000000	$54.04	100.00%

SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**		**$54.04** **100.00%**
	(CD) COSTO DIRECTO		**$54.04** **100.00%**
	(CI) INDIRECTOS	18.5842%	$10.04
	SUBTOTAL1		$64.08
	(CF) FINANCIAMIENTO	0.7134%	$0.46
	SUBTOTAL2		$64.54
	(CU) UTILIDAD	7.5000%	$4.84
	SUBTOTAL3		$69.38
	CARGOS ADICIONALES		
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3	0.502500%	$0.35
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)		**$69.73**

000048

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 09

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023
Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A1	Análisis No.:		50			
Análisis:	**1-0056**		**M**		**120.0000**	**$12,974.40**	

Descoronamiento de muro de piedra braza de 30 cm de ancho incluye: acarreo de material fuera de la obra producto de la demolición.

MANO DE OBRA							
2P	CUADRILLA 02 (2 PEON + 0.1 CABO)	JOR	$1,010.61	*	0.020000	$20.21	24.12%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$20.21**	**24.12%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQRETROEXCA	RETRO EXCAVADORA CAT 90 HP	HOR	$540.44	/	8.500000	$63.58	75.88%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$63.58**	**75.88%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$83.79**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$15.57	
	SUBTOTAL1					$99.36	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$0.71	
	SUBTOTAL2					$100.07	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$7.51	
	SUBTOTAL3					$107.58	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.54	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$108.12**	

000049

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO
AE - 09

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023

Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A1	Análisis No.:		60			
Análisis:	**EXC-001**		**M3**		**699.4300**	**$51,967.65**	

Excavación por medios mecánicos en cepas de 0.00 A 2.00 mts de profundidad en material tipo II incluye afine de talud y fondo, acarreos a primera estación de 20 mts.

MANO DE OBRA

2P	CUADRILLA 02 (2 PEON + 0.1 CABO)	JOR	$1,010.61	*	0.003500	$3.54	6.15%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$3.54**	**6.15%**

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRETROEXCA'	RETRO EXCAVADORA CAT 90 HP	HOR	$540.44	*	0.100000	$54.04	93.85%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$54.04**	**93.85%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$57.58**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$10.70	
	SUBTOTAL1					$68.28	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$0.49	
	SUBTOTAL2					$68.77	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$5.16	
	SUBTOTAL3					$73.93	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.37	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$74.30**	

000050

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 09

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023

Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A1	Análisis No.:		70			
Análisis:	**9-0139**		**M3**		**420.2900**	**$35,161.46**	

Relleno de material producto de excavación compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor, incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.

MATERIALES							
AGUA	AGUA (MANEJO)	M3	$50.80	*	0.105000	$5.33	8.22%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$5.33**	**8.22%**
MANO DE OBRA							
2P	CUADRILLA 02 (2 PEON + 0.1 CABO)	JOR	$1,010.61	/	20.000000	$50.53	77.94%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$50.53**	**77.94%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQPIPA	CAMION PIPA DE 9 M3	HOR	$717.78	*	0.012500	$8.97	13.84%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$8.97**	**13.84%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$64.83**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$12.05	
	SUBTOTAL1					$76.88	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$0.55	
	SUBTOTAL2					$77.43	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$5.81	
	SUBTOTAL3					$83.24	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.42	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$83.66**	

000051

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 09

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023

Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A1	Análisis No.:		80			
Análisis:	**9-0138**		**M3**		**30.0000**	**$14,969.70**	

Relleno de material inerte de banco compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.

MATERIALES							
AGUA	AGUA (MANEJO)	M3	$50.80	*	0.103429	$5.25	1.36%
MATBANCO	MATERIAL DE BANCO	M3	$275.00	*	1.250000	$343.75	88.89%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$349.00**	**90.25%**
MANO DE OBRA							
2P	CUADRILLA 02 (2 PEON + 0.1 CABO)	JOR	$1,010.61	/	35.000000	$28.87	7.47%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$28.87**	**7.47%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQPIPA	CAMION PIPA DE 9 M3	HOR	$717.78	*	0.012326	$8.85	2.29%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$8.85**	**2.29%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$386.72**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$71.87	
	SUBTOTAL1					$458.59	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$3.27	
	SUBTOTAL2					$461.86	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$34.64	
	SUBTOTAL3					$496.50	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$2.49	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$498.99**	

000052

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 09

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023
Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A2	Análisis No.:		10			
Análisis:	**31-0448**		**M3**		**558.0000**	**$45,906.66**	
Apertura en caja por medios mecánicos en terreno tipo II-A, incluye acamellonamiento del material.							
MANO DE OBRA							
2P	CUADRILLA 02 (2 PEON + 0.1 CABO)	JOR	$1,010.61	/	350.000000	$2.89	4.53%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$2.89**	**4.53%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQMOTO14H	MOTONIVELADORA CAT. 14H DE 215 HP	HOR	$1,521.63	/	25.000000	$60.87	95.47%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$60.87**	**95.47%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$63.76**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$11.85	
	SUBTOTAL1					$75.61	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$0.54	
	SUBTOTAL2					$76.15	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$5.71	
	SUBTOTAL3					$81.86	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.41	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$82.27**	

000053

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 09

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023
Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A2	Análisis No.:		20			
Análisis:	**31-0454**		**M2**		**1,471.3500**	**$59,074.70**	
Afine y compactación de sub rasante al 90 % PROCTOR mínimo, por medios mecánicos.							
MATERIALES							
AGUA	AGUA (MANEJO)	M3	$50.80	*	0.050000	$2.54	8.16%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$2.54**	**8.16%**
MANO DE OBRA							
2P	CUADRILLA 02 (2 PEON + 0.1 CABO)	JOR	$1,010.61	/	50.000000	$20.21	64.94%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$20.21**	**64.94%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQPIPA	CAMION PIPA DE 9 M3	HOR	$717.78	*	0.005000	$3.59	11.54%
EQVAP	VIBROCOMPACTADOR VAP 70	HOR	$795.89	*	0.006000	$4.78	15.36%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$8.37**	**26.90%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$31.12**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$5.78	
	SUBTOTAL1					$36.90	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$0.26	
	SUBTOTAL2					$37.16	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$2.79	
	SUBTOTAL3					$39.95	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.20	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$40.15**	

000054

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 09

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023
Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A2	Análisis No.:		30			
Análisis:	**31-0457**		**M3**		**442.6200**	**$229,781.75**	

Formación de base de 30 cms. de espesor con material producto de banco con equipo mecánico incluye vertido, afine, compactado al 95 % PROCTOR y agua.

MATERIALES							
AGUA	AGUA (MANEJO)	M3	$50.80	*	0.100000	$5.08	1.26%
MATBANCO	MATERIAL DE BANCO	M3	$275.00	*	1.200000	$330.00	82.02%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$335.08**	**83.28%**
MANO DE OBRA							
2P	CUADRILLA 02 (2 PEON + 0.1 CABO)	JOR	$1,010.61	/	80.000000	$12.63	3.14%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$12.63**	**3.14%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQPIPA	CAMION PIPA DE 9 M3	HOR	$717.78	*	0.012500	$8.97	2.23%
EQMOTO14H	MOTONIVELADORA CAT. 14H DE 215 HP	HOR	$1,521.63	*	0.030000	$45.65	11.35%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$54.62**	**13.58%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$402.33**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$74.77	
	SUBTOTAL1					$477.10	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$3.40	
	SUBTOTAL2					$480.50	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$36.04	
	SUBTOTAL3					$516.54	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$2.60	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$519.14**	

000055

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 09

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023

Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A2	Análisis No.:		40			
Análisis:	**32-0466**		**M2**		**556.6400**	**$22,182.10**	
Afine y compactación en banquetas, andadores y plazas a mano incluye acarreos a primera estación.							
MATERIALES							
AGUA	AGUA (MANEJO)	M3	$50.80	*	0.040000	$2.03	6.57%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$2.03**	**6.57%**
MANO DE OBRA							
2P	CUADRILLA 02 (2 PEON + 0.1 CABO)	JOR	$1,010.61	/	70.000000	$14.44	46.76%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$14.44**	**46.76%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQPIPA	CAMION PIPA DE 9 M3	HOR	$717.78	*	0.004000	$2.87	9.29%
EQBAILAR	BAILARINA DE 4.5 HP	HOR	$100.33	*	0.115000	$11.54	37.37%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$14.41**	**46.66%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$30.88**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$5.74	
	SUBTOTAL1					$36.62	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$0.26	
	SUBTOTAL2					$36.88	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$2.77	
	SUBTOTAL3					$39.65	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.20	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$39.85**	

000056

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 09

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023

Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A3	Análisis No.:		10			
Análisis:	**4-0080**		**M3**		**16.0000**	**$3,209.92**	

Excavación a mano en material tipo II-A, en seco y barreta de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad, depositando el producto de excavación a orilla de cepa, cualquier zona..

MANO DE OBRA

2P	CUADRILLA 02 (2 PEON + 0.1 CABO)	JOR	$1,010.61	/	6.500000	$155.48	100.00%

SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**		**$155.48** **100.00%**
	(CD) COSTO DIRECTO		**$155.48** **100.00%**
	(CI) INDIRECTOS	18.5842%	$28.89
	SUBTOTAL1		$184.37
	(CF) FINANCIAMIENTO	0.7134%	$1.32
	SUBTOTAL2		$185.69
	(CU) UTILIDAD	7.5000%	$13.93
	SUBTOTAL3		$199.62
	CARGOS ADICIONALES		
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3	0.502500%	$1.00
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)		**$200.62**

000057

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 09

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023

Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A3	Análisis No.:		20			
Análisis:	**9-0139**		**M3**		**15.8000**	**$1,321.83**	

Relleno de material producto de excavación compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor, incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.

MATERIALES							
AGUA	AGUA (MANEJO)	M3	$50.80	*	0.105000	$5.33	8.22%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$5.33**	**8.22%**
MANO DE OBRA							
2P	CUADRILLA 02 (2 PEON + 0.1 CABO)	JOR	$1,010.61	/	20.000000	$50.53	77.94%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$50.53**	**77.94%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQPIPA	CAMION PIPA DE 9 M3	HOR	$717.78	*	0.012500	$8.97	13.84%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$8.97**	**13.84%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$64.83**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$12.05	
	SUBTOTAL1					$76.88	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$0.55	
	SUBTOTAL2					$77.43	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$5.81	
	SUBTOTAL3					$83.24	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.42	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$83.66**	

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 09

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023

Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A3	Análisis No.:		30			
Análisis:	**5-0102**		**M3**		**2.0000**	**$951.12**	
Cama de arena para instalación de tubería incluye: acostillado, acarreo de material en 1ra. estación, material y mano de obra.							
MATERIALES							
ARENA	ARENA	M3	$250.00	*	1.070000	$267.50	72.58%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$267.50**	**72.58%**
MANO DE OBRA							
2P	CUADRILLA 02 (2 PEON + 0.1 CABO)	JOR	$1,010.61	/	10.000000	$101.06	27.42%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$101.06**	**27.42%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$368.56**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$68.49	
	SUBTOTAL1					$437.05	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$3.12	
	SUBTOTAL2					$440.17	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$33.01	
	SUBTOTAL3					$473.18	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$2.38	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$475.56**	

000059

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 09

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023
Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A3	Análisis No.:		40			
Análisis:	**27-0412**		**ML**		**50.0000**	**$22,462.00**	

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 3" CED. RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

MATERIALES							
MATUB-3	TUBO PVC 3 PULG DIAM CED RD26	ML	$275.00	*	1.070000	$294.25	84.52%
MAPRUEBA-H	PRUEBA HIDROSTATICA	PRUE	$450.00	*	0.030000	$13.50	3.88%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$307.75**	**88.40%**
MANO DE OBRA							
1P1E	CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE)	JOR	$1,414.08	/	35.000000	$40.40	11.60%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$40.40**	**11.60%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$348.15**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$64.70	
	SUBTOTAL1					$412.85	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$2.95	
	SUBTOTAL2					$415.80	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$31.19	
	SUBTOTAL3					$446.99	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$2.25	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$449.24**	

000060

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 09

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023
Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A3	Análisis No.:		50			
Análisis:	**TOMDOM***		**PZA**		**3.0000**	**$5,280.93**	

Toma domiciliaria de agua potable con tubo de CPVC de 13 mm. de 6 mts. de longitud, incluye: excavación, relleno, válvula de inserción, abrazadera de 4", acarreo de materiales, mano de obra y herramienta.

MATERIALES							
MALLAV-INS1/2	LLAVE DE INSERCION 1/2"	PZA	$90.00	*	1.000000	$90.00	6.60%
MAADAP-M1/2	ADAPTADOR MACHO BRONCE 1/2	PZA	$135.00	*	1.000000	$135.00	9.90%
MALLAV-NA1/2	LLAVE NARIZ BRONCE 1/2"	PZA	$75.00	*	1.000000	$75.00	5.50%
MATUB-CPVC1/2	TUBERIA DE CPVC 1/2 PULG	ML	$44.00	*	6.000000	$264.00	19.35%
MAACC-CPVC	ACCESORIOS DE CPVC	PZA	$188.00	*	1.000000	$188.00	13.78%
MAABR-4	ABRAZADERA DE 4 PULG	PZA	$298.00	*	1.000000	$298.00	21.84%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$1050.00**	**76.97%**
MANO DE OBRA							
1P1E	CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE)	JOR	$1,414.08	/	4.500000	$314.24	23.03%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$314.24**	**23.03%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$1,364.24**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$253.53	
	SUBTOTAL1					$1,617.77	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$11.54	
	SUBTOTAL2					$1,629.31	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$122.20	
	SUBTOTAL3					$1,751.51	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$8.80	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$1,760.31**	

000061

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO
AE - 09

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023

Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A3	Análisis No.:		60			
Análisis:	**314-IHS-07-087**		**PZA**		**3.0000**	**$728.79**	

Válvula de esfera de CPVC 13 mm, incluye: suministro de materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES							
MAVAL-ESF13	VALVULA ESFERA CPVC 13MM	PZA	$160.00	*	1.000000	$160.00	84.98%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$160.00**	**84.98%**
MANO DE OBRA							
1P1E	CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE)	JOR	$1,414.08	/	50.000000	$28.28	15.02%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$28.28**	**15.02%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$188.28**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$34.99	
	SUBTOTAL1					$223.27	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$1.59	
	SUBTOTAL2					$224.86	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$16.86	
	SUBTOTAL3					$241.72	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$1.21	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$242.93**	

000062

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO
AE - 09

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023

Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A3	Análisis No.:		70			
Análisis:	**BOTA01**		**PZA**		**3.0000**	**$4,165.20**	

Caja para llave de banqueta (bota) incluye llave de cuadro roscable 1/2", herramienta menor, mano de obra, materiales y equipo.

MATERIALES							
CAJA-BANQ	BOTA PARA LLAVE	PZA	$750.00	*	1.000000	$750.00	69.70%
MALLAVE-R1/2	LLAVE CUADRO ROSCABLE1/2PULG	PZA	$225.00	*	1.000000	$225.00	20.91%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$975.00**	**90.61%**
MANO DE OBRA							
1P1E	CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE)	JOR	$1,414.08	/	14.000000	$101.01	9.39%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$101.01**	**9.39%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$1,076.01**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$199.97	
	SUBTOTAL1					$1,275.98	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$9.10	
	SUBTOTAL2					$1,285.08	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$96.38	
	SUBTOTAL3					$1,381.46	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$6.94	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$1,388.40**	

000063

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 09

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023
Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A4	Análisis No.:		10			
Análisis:	**EXC-001**		**M3**		**47.2600**	**$3,511.42**	

Excavación por medios mecánicos en cepas de 0.00 A 2.00 mts de profundidad en material tipo II incluye afine de talud y fondo, acarreos a primera estación de 20 mts.

MANO DE OBRA							
2P	CUADRILLA 02 (2 PEON + 0.1 CABO)	JOR	$1,010.61	*	0.003500	$3.54	6.15%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$3.54**	**6.15%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQRETROEXCA'	RETRO EXCAVADORA CAT 90 HP	HOR	$540.44	*	0.100000	$54.04	93.85%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$54.04**	**93.85%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$57.58**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$10.70	
	SUBTOTAL1					$68.28	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$0.49	
	SUBTOTAL2					$68.77	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$5.16	
	SUBTOTAL3					$73.93	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.37	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$74.30**	

000064

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 09

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023

Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A4	Análisis No.:		20			
Análisis:	**9-0139**		**M3**		**31.7900**	**$2,659.55**	

Relleno de material producto de excavación compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor, incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.

MATERIALES							
AGUA	AGUA (MANEJO)	M3	$50.80	*	0.105000	$5.33	8.22%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$5.33**	**8.22%**
MANO DE OBRA							
2P	CUADRILLA 02 (2 PEON + 0.1 CABO)	JOR	$1,010.61	/	20.000000	$50.53	77.94%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$50.53**	**77.94%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQPIPA	CAMION PIPA DE 9 M3	HOR	$717.78	*	0.012500	$8.97	13.84%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$8.97**	**13.84%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$64.83**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$12.05	
	SUBTOTAL1					$76.88	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$0.55	
	SUBTOTAL2					$77.43	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$5.81	
	SUBTOTAL3					$83.24	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.42	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$83.66**	

000065

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 09

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023

Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A4	Análisis No.:		30			
Análisis:	**9-0138**		**M3**		**13.6200**	**$6,796.24**	

Relleno de material inerte de banco compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.

MATERIALES							
AGUA	AGUA (MANEJO)	M3	$50.80	*	0.103429	$5.25	1.36%
MATBANCO	MATERIAL DE BANCO	M3	$275.00	*	1.250000	$343.75	88.89%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$349.00**	**90.25%**
MANO DE OBRA							
2P	CUADRILLA 02 (2 PEON + 0.1 CABO)	JOR	$1,010.61	/	35.000000	$28.87	7.47%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$28.87**	**7.47%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQPIPA	CAMION PIPA DE 9 M3	HOR	$717.78	*	0.012326	$8.85	2.29%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$8.85**	**2.29%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$386.72**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$71.87	
	SUBTOTAL1					$458.59	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$3.27	
	SUBTOTAL2					$461.86	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$34.64	
	SUBTOTAL3					$496.50	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$2.49	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$498.99**	

000066

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO
AE - 09

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023

Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A4	Análisis No.:		40			
Análisis:	**5-0102**		**M3**		**3.3700**	**$1,602.64**	

Cama de arena para instalación de tubería incluye: acostillado, acarreo de material en 1ra. estación, material y mano de obra.

MATERIALES							
ARENA	ARENA	M3	$250.00	*	1.070000	$267.50	72.58%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$267.50**	**72.58%**
MANO DE OBRA							
2P	CUADRILLA 02 (2 PEON + 0.1 CABO)	JOR	$1,010.61	/	10.000000	$101.06	27.42%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$101.06**	**27.42%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$368.56**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$68.49	
	SUBTOTAL1					$437.05	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$3.12	
	SUBTOTAL2					$440.17	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$33.01	
	SUBTOTAL3					$473.18	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$2.38	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$475.56**	

000067

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 09

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023
Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A4	Análisis No.:		50			
Análisis:	**28-0417**		**PZA**		**2.0000**	**$26,542.68**	
Pozo de visita de forma cónica de 0.60 a 1.20 mts. de diámetro interior por 1.50 mts. de altura a base de mamposteria, muro de tabique de 25 cms. con aplanado de mortero cemento arena 1:3 acabado pulido, incluye excavación, acarreo y relleno.							
MATERIALES							
MATABIQUE	TABIQUE COMUN BARRO R.R. DE 7x14x28 CM.	PZA	$5.00	*	750.000000	$3750.00	36.46%
MAAC0004	ACERO DE REFUERZO DEL 3 AL 8 FY=4200 KG/	KG	$34.00	*	18.000000	$612.00	5.95%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$4362.00**	**42.41%**
MANO DE OBRA							
1A5P	CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)	JOR	$3,341.39	/	1.500000	$2227.59	21.66%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$2227.59**	**21.66%**
BASICOS							
MABA0006	MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3	M3	$2,251.34	*	1.500000	$3377.01	32.83%
MABA001	CIMBRA COMUN	ML	$58.10	*	1.000000	$58.10	0.56%
MABA0017	CONCRETO F'C=200KG/CM2 T.M.A. 3/4"	M3	$2,171.34	*	0.120000	$260.56	2.53%
SUBTOTAL:	**BASICOS**					**$3695.67**	**35.93%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$10,285.26**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$1,911.43	
	SUBTOTAL1					$12,196.69	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$87.01	
	SUBTOTAL2					$12,283.70	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$921.28	
	SUBTOTAL3					$13,204.98	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$66.36	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$13,271.34**	

000068

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 09

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023
Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A4	Análisis No.:		60			
Análisis:	**37-0579BP**		**PZA**		**2.0000**	**$8,420.20**	

Suministro y colocación de brocal y tapa de Polietileno alta resistencia abierto o cerrado para pozo de visita de 60 cm de diámetro, incluye material y mano de obra.

MATERIALES

MABROCAL-POL	BROCAL DE POLIETILENO	PZA	$2,980.00	*	1.000000	$2980.00	91.33%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$2980.00**	**91.33%**

MANO DE OBRA

1P1E	CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE)	JOR	$1,414.08	/	5.000000	$282.82	8.67%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$282.82**	**8.67%**

(CD) COSTO DIRECTO		**$3,262.82**	**100.00%**
(CI) INDIRECTOS	18.5842%	$606.37	
SUBTOTAL1		$3,869.19	
(CF) FINANCIAMIENTO	0.7134%	$27.60	
SUBTOTAL2		$3,896.79	
(CU) UTILIDAD	7.5000%	$292.26	
SUBTOTAL3		$4,189.05	
CARGOS ADICIONALES			
(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3	0.502500%	$21.05	
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)		**$4,210.10**	

000069

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO
AE - 09

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023

Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A4	Análisis No.:		70			
Análisis:	**26-0390***		**PZA**		**2.0000**	**$4,964.26**	

Registro sanitario de 0.40x0.60x0.60 mts., a base de tabicón10x14x28, asentado con mortero cemento arena 1:3, aplanado interior acabado fino con mortero cemento arena 1:3, piso de 10 cm, de concreto simple F'c= 150 Kg/cm2, tapa de concreto F'c=250 Kg/cm2, armado con varilla del No. 3 @ 20 cm. en ambos sentidos, de 15 cm. de espesor incluye trazo, nivelación, barrenado y demolición de roca, acarreo y m.o.

MATERIALES							
MATABICON	TABICON	PZA	$12.00	*	30.000000	$360.00	18.71%
MATA-REG	TAPADERA DE REGISTRO CON ANGULO Y CONCRETO	PZA	$750.00	*	1.000000	$750.00	38.99%
MAAG0001	CEMENTO GRIS	TON	$3,880.00	*	0.005000	$19.40	1.01%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$1129.40**	**58.71%**
MANO DE OBRA							
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	$1,455.27	/	3.000000	$485.09	25.22%
2P	CUADRILLA 02 (2 PEON + 0.1 CABO)	JOR	$1,010.61	/	10.000000	$101.06	5.25%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$586.15**	**30.47%**
BASICOS							
MABA0006	MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3	M3	$2,251.34	*	0.070000	$157.59	8.19%
MABA0016	CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4"	M3	$2,104.59	*	0.024000	$50.51	2.63%
SUBTOTAL:	**BASICOS**					**$208.10**	**10.82%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$1,923.65**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$357.49	
	SUBTOTAL1					$2,281.14	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$16.27	
	SUBTOTAL2					$2,297.41	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$172.31	
	SUBTOTAL3					$2,469.72	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$12.41	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$2,482.13**	

000070

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 09

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023

Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A4	Análisis No.:		80			
Análisis:	**TUBO 8"**		**M**		**42.8000**	**$33,092.53**	
Suministro e instalación de tubo PVC sanitario de 8" de diametro incluye acarreos, materiales secundarios, conexiones y mano de obra.							
MATERIALES							
MAPEG-PVC	PEGAMENTO PVC	PZA	$71.00	*	0.250000	$17.75	2.96%
MATUB-8PVC	TUBO PVC SANITARIO 8 PULG	ML	$450.00	*	1.070000	$481.50	80.35%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$499.25**	**83.32%**
MANO DE OBRA							
1P1E	CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE)	JOR	$1,414.08	/	15.000000	$94.27	15.73%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$94.27**	**15.73%**
BASICOS							
MABA0006	MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3	M3	$2,251.34	*	0.002534	$5.70	0.95%
SUBTOTAL:	**BASICOS**					**$5.70**	**0.95%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$599.22**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$111.36	
	SUBTOTAL1					$710.58	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$5.07	
	SUBTOTAL2					$715.65	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$53.67	
	SUBTOTAL3					$769.32	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$3.87	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$773.19**	

000071

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 09

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023
Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A4	Análisis No.:		90			
Análisis:	**SUM-COD2**		**PZA**		**2.0000**	**$712.20**	
Suministro y colocación de codo PVC sanitario de 6"X45°, incluye carga y descarga en almacén de obra.							
MATERIALES							
MAPEG-PVC	PEGAMENTO PVC	PZA	$71.00	*	0.030000	$2.13	0.77%
MACODO-PVC6	CODO PVC 6 PULG DIAM	PZA	$255.00	*	1.000000	$255.00	92.40%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$257.13**	**93.17%**
MANO DE OBRA							
1P1E	CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE)	JOR	$1,414.08	/	75.000000	$18.85	6.83%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$18.85**	**6.83%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$275.98**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$51.29	
	SUBTOTAL1					$327.27	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$2.33	
	SUBTOTAL2					$329.60	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$24.72	
	SUBTOTAL3					$354.32	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$1.78	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$356.10**	

000072

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 09

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023
Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A4	Análisis No.:		100			
Análisis:	**PU-6255**		**PZA**		**2.0000**	**$1,248.28**	

Suministro y colocación de unión de servicio de P.V.C. De 150 mm (6") de diámetro para alcantarillado sanitario incluye carga y descarga en almacén de obra.

MATERIALES							
MAPEG-PVC	PEGAMENTO PVC	PZA	$71.00	*	0.025000	$1.78	0.37%
MAUNI-6	UNION SERVICIO PVC 6 PULG	PZA	$380.00	*	1.000000	$380.00	78.56%
SEG-CORT	SEGUETA PARA CORTE	PZA	$15.94	*	0.050000	$0.80	0.17%
MALIJ-TUB12	LIJA PARA TUBERIA	ML	$22.50	*	0.125000	$2.81	0.58%
MAEST-009	ESTOPA BLANCA	KG	$81.00	*	0.050000	$4.05	0.84%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$389.44**	**80.51%**
MANO DE OBRA							
1P1E	CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE)	JOR	$1,414.08	/	15.000000	$94.27	19.49%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$94.27**	**19.49%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$483.71**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$89.89	
	SUBTOTAL1					$573.60	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$4.09	
	SUBTOTAL2					$577.69	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$43.33	
	SUBTOTAL3					$621.02	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$3.12	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$624.14**	

000073

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 09

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023
Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A4	Análisis No.:		110			
Análisis:	**PU-6239**		**ML**		**18.0000**	**$8,694.54**	

Suministro de tubo de PVC sanitario de norma liso de 150 mm de diámetro, incluye flete, carga y descarga en almacén de obra.

MATERIALES							
MAPEG-PVC	PEGAMENTO PVC	PZA	$71.00	*	0.030000	$2.13	0.57%
MATUB-PVC-6	TUBO PVC SANITARIO 6 PULG	ML	$295.00	*	1.070000	$315.65	84.32%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$317.78**	**84.89%**
MANO DE OBRA							
1P1E	CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE)	JOR	$1,414.08	/	25.000000	$56.56	15.11%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$56.56**	**15.11%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$374.34**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$69.57	
	SUBTOTAL1					$443.91	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$3.17	
	SUBTOTAL2					$447.08	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$33.53	
	SUBTOTAL3					$480.61	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$2.42	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$483.03**	

000074

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 09

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023
Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A5	Análisis No.:		10			
Análisis:	**18-0296**		**M3**		**276.5200**	**$761,912.15**	
Muro de piedra braza de la región, asentada con mortero cemento arena 1:5, acabado común incluye: acarreo de materiales en 1ra. erstación de 20 mts.							
MATERIALES							
MAPIED-BRA	PIEDRA BRAZA DE LA REGION	M3	$749.00	*	1.350000	$1011.15	47.35%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$1011.15**	**47.35%**
MANO DE OBRA							
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	$1,455.27	/	3.000000	$485.09	22.72%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$485.09**	**22.72%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQCV0001	CAMION VOLTEO DE 6 M3	HORA	$804.00	*	0.096000	$77.18	3.61%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$77.18**	**3.61%**
BASICOS							
MABA0009	MORTERO CEMENTO ARENA 1:5	M3	$1,686.07	*	0.333300	$561.97	26.32%
SUBTOTAL:	**BASICOS**					**$561.97**	**26.32%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$2,135.39**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$396.85	
	SUBTOTAL1					$2,532.24	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$18.07	
	SUBTOTAL2					$2,550.31	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$191.27	
	SUBTOTAL3					$2,741.58	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$13.78	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$2,755.36**	

000075

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 09

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023
Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A5	Análisis No.:		20			
Análisis:	**18-0313**		**ML**		**26.0000**	**$3,388.32**	
Dren para muro de mampostería a base de P.V.C. 4" tipo rígido incluye material y mano de obra.							
MATERIALES							
MATUB-PVC4	TUBO PVC 4"	ML	$49.00	*	1.030000	$50.47	49.97%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$50.47**	**49.97%**
MANO DE OBRA							
2P	CUADRILLA 02 (2 PEON + 0.1 CABO)	JOR	$1,010.61	/	20.000000	$50.53	50.03%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$50.53**	**50.03%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$101.00**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$18.77	
	SUBTOTAL1					$119.77	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$0.85	
	SUBTOTAL2					$120.62	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$9.05	
	SUBTOTAL3					$129.67	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.65	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$130.32**	

000076

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 09

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023

Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A5	Análisis No.:		30			
Análisis:	**18-0318**		**M3**		**53.7000**	**$54,747.69**	
FILTRO DE GRAVA Y/O RAJUELA DE PIEDRA DE 30 CMS DE ESPESOR INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA							
MATERIALES							
MAGRA-RAY	GRAVA Y/O RAYUELA PARA FILTRO	M3	$490.00	*	1.200000	$588.00	74.42%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$588.00**	**74.42%**
MANO DE OBRA							
2P	CUADRILLA 02 (2 PEON + 0.1 CABO)	JOR	$1,010.61	/	5.000000	$202.12	25.58%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$202.12**	**25.58%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$790.12**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$146.84	
	SUBTOTAL1					$936.96	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$6.68	
	SUBTOTAL2					$943.64	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$70.77	
	SUBTOTAL3					$1,014.41	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$5.10	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$1,019.51**	

000077

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 09

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023
Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A5	Análisis No.:		40			
Análisis:	**11-0151***		**PZA**		**13.0000**	**$5,738.98**	

Anclaje de castillo de 20 x 15 cms. 4 var. # 4 y estribos del # 2 a.c. 20 cms. Hasta una profundidad de 50 cms., concreto f´c = 200 kg/cm2 incluye material y mano de obra.

MANO DE OBRA							
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	$1,455.27	/	11.000000	$132.30	38.67%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$132.30**	**38.67%**
BASICOS							
MABA0001	CIMBRA APARENTE EN CADENAS Y CASTILLOS	M2	$317.03	*	0.100000	$31.70	9.27%
MABA0018	CONCRETO F'C=250KG/CM2 T.M.A. 3/4"	M3	$2,465.17	*	0.015000	$36.98	10.81%
MABA0019	ACERO RFZO. CIMENTACION ALAM.#2 FY=2530K	KG	$35.94	*	1.100000	$39.53	11.55%
MABA0020	ACERO RFZO. DEL FY=4200 KG/CM2	KG	$32.78	*	3.100000	$101.62	29.70%
SUBTOTAL:	**BASICOS**					**$209.83**	**61.33%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$342.13**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$63.58	
	SUBTOTAL1					$405.71	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$2.89	
	SUBTOTAL2					$408.60	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$30.65	
	SUBTOTAL3					$439.25	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$2.21	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$441.46**	

000078

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 09

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023
Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A5	Análisis No.:		50			
Análisis:	**11-0160***		**M**		**31.5300**	**$27,838.78**	

Cadena de desplante de concreto f'c=250 Kg/cm2, de 15x20 cm, armado con 6 varillas No.4 y estribos No. 2 a cada 25 cm, incluye cimbra común, acarreo de material 1ra. estación.

MANO DE OBRA							
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	$1,455.27	/	5.500000	$264.59	38.67%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$264.59**	**38.67%**
BASICOS							
MABA0001	CIMBRA APARENTE EN CADENAS Y CASTILLOS	M2	$317.03	*	0.200000	$63.41	9.27%
MABA0018	CONCRETO F'C=250KG/CM2 T.M.A. 3/4"	M3	$2,465.17	*	0.030000	$73.96	10.81%
MABA0019	ACERO RFZO. CIMENTACION ALAM.#2 FY=2530K	KG	$35.94	*	2.200000	$79.07	11.56%
MABA0020	ACERO RFZO. DEL FY=4200 KG/CM2	KG	$32.78	*	6.200000	$203.24	29.70%
SUBTOTAL:	**BASICOS**					**$419.68**	**61.33%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$684.27**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$127.17	
	SUBTOTAL1					$811.44	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$5.79	
	SUBTOTAL2					$817.23	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$61.29	
	SUBTOTAL3					$878.52	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$4.41	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$882.93**	

000079

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 09

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023
Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A5	Análisis No.:		60			
Análisis:	**11-0221**		**M2**		**26.8000**	**$76,899.12**	

Losa de concreto f´c= 250 kg/cm2 de 10 cms de espesor armada con var. No. 4 a cada 15 cm. En ambos sentidos, para paso peatonal, según planos estructurales incluye cimbrado, armado, colado y descimbrado, material y mano de obra.

MATERIALES							
MAACER4	ACERO 4	KG	$30.91	*	28.360000	$876.61	39.42%
MAAC0001	ALAMBRE RECOCIDO	KG	$28.50	*	0.475000	$13.54	0.61%
MACON-PRE250	CONCRETO PREMEZCLADO FC= 250 KG/CM2	M3	$2,020.00	*	0.105000	$212.10	9.54%
MADIESEL	DIESEL	LTO	$21.20	*	0.300000	$6.36	0.29%
CLAVOS	CLAVOS DE 2 A 4 "	KG	$65.00	*	0.270000	$17.55	0.79%
MAMA0002	CHAFLAN DE 1/2" X 1/2"	ML	$25.00	*	0.125000	$3.13	0.14%
MAMA0007	TRIPLAY DE PINO DE 16 MM.	PZA	$775.00	*	0.120000	$93.00	4.18%
MABARR3.5	BARROTE PINO 3RA 1.5X3.5	PZA	$75.00	*	0.730000	$54.75	2.46%
MAPOLIN	POLIN DE 3RA VARIAS MEDIDAS	PT	$17.70	*	3.107000	$54.99	2.47%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$1332.03**	**59.90%**
MANO DE OBRA							
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	$1,455.27	/	3.300000	$440.99	19.83%
1F1A	CUADRILLA No 6 (1 FIERRERO + 1 AYUDANTE)	JOR	$1,413.76	/	3.300000	$428.41	19.27%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$869.40**	**39.10%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQVIB	VIBRADOR PARA CONCRETO	HOR	$117.49	*	0.190000	$22.32	1.00%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$22.32**	**1.00%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$2,223.75**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$413.27	
	SUBTOTAL1					$2,637.02	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$18.81	
	SUBTOTAL2					$2,655.83	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$199.19	
	SUBTOTAL3					$2,855.02	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$14.35	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$2,869.37**	

000080

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 09

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023

Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A5	Análisis No.:		70			
Análisis:	**F-BARANDAL1**		**M**		**39.7800**	**$94,417.43**	

Suministro y colocación de barandal de tubo de acero negro de 1 1/2" con división de tubo de 1" con postes de 1 1/2" a cada metro soldado a placa de 1/2" de 15x15 cms. embutida en losa, incluye materiales, mano de obra, pintura, equipo y herramienta.

MATERIALES							
MATUB-ACE	TUBO DE ACERO 1 1/2 PULG	PZA	$850.00	*	0.500000	$425.00	23.10%
MATUB-1	TUBO ACERO 1 PULG	PZA	$430.00	*	0.850000	$365.50	19.87%
CO08	PRIMARIO ANTICORROSIVO	LT	$198.00	*	0.250000	$49.50	2.69%
THINNER	THINNER STANDARD	LT	$77.00	*	0.500000	$38.50	2.09%
MAPLAC	PLACA 15X15 CM	KG	$40.00	*	2.250000	$90.00	4.89%
3.	VARILLA DE 3/8" 9.5 MM	KG	$28.36	*	0.330000	$9.36	0.51%
7018	SOLDADURA ELECTRODO 7018	KG	$137.00	*	0.250000	$34.25	1.86%
MAPIN-ESM	PINTURA ESMALTE MCA COMEX O SIMILAR	LT	$285.00	*	0.225000	$64.13	3.49%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$1076.24**	**58.51%**
MANO DE OBRA							
1P1A	CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + AYUDANTE)	JOR	$1,413.76	/	9.250000	$152.84	8.31%
1H1A	CUADRILLA No 9 (1 HERRERO + AYUDANTE)	JOR	$1,413.76	/	3.250000	$435.00	23.65%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$587.84**	**31.96%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQPLAN	PLANTA DE SOLDAR MILLER	HOR	$67.36	*	0.500000	$33.68	1.83%
EQECORTE	EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO	HOR	$1,176.92	*	0.035000	$41.19	2.24%
EQCV0001	CAMION VOLTEO DE 6 M3	HORA	$804.00	*	0.125000	$100.50	5.46%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$175.37**	**9.53%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$1,839.45**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$341.85	
	SUBTOTAL1					$2,181.30	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$15.56	
	SUBTOTAL2					$2,196.86	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$164.76	
	SUBTOTAL3					$2,361.62	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$11.87	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$2,373.49**	

000081

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 09

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023

Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A6	Análisis No.:		10			
Análisis:	**REG-AUX**		**PZA**		**8.0000**	**$28,435.68**	

Registro auxiliar para alumbrado público de 50x60x65mts., de tabique rojo recocido 7x14x28 cms., con 14 cms. de espesor asentado y aplanado con mortero cemento arena 1:5 incluye: plantilla de concreto de 10 cms de espesor f´c=100kg/cm2, marco y contramarco de ángulo de 1 1/2"x3/16" concreto f´c=200kg/cm2 en tapa y fijación de marco, drén de grava de 20 cms de espesor, herramienta menor, materiales y mano de obra.

MATERIALES							
MAHE0007	TAPA REG. ELECT. 60X60 C/MRCO ANG. Y LAM	PZA	$823.00	*	1.000000	$823.00	29.88%
MATABIQUE	TABIQUE COMUN BARRO R.R. DE 7x14x28 CM.	PZA	$5.00	*	90.000000	$450.00	16.34%
MAGRAVA	GRAVA PARA REGISTRO	M3	$450.00	*	0.200000	$90.00	3.27%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$1363.00**	**49.48%**
MANO DE OBRA							
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	$1,455.27	/	1.500000	$970.18	35.22%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$970.18**	**35.22%**
BASICOS							
MABA0009	MORTERO CEMENTO ARENA 1:5	M3	$1,686.07	*	0.250000	$421.52	15.30%
SUBTOTAL:	**BASICOS**					**$421.52**	**15.30%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$2,754.70**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$511.94	
	SUBTOTAL1					$3,266.64	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$23.30	
	SUBTOTAL2					$3,289.94	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$246.75	
	SUBTOTAL3					$3,536.69	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$17.77	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$3,554.46**	

000082

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 09

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023
Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A6	Análisis No.:		20			
Análisis:	**TUB-PESA50**		**M**		**200.0000**	**$40,248.00**	

Suministro y tendido de tubo conduit pvc pesado 50 mm de diámetro incluye conexión, trazo, excavación, relleno, cama de arena, herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra.

MATERIALES							
MATUB-CON50	TUBO CONDUIT PVC PESADO 50 MM	ML	$32.00	*	1.070000	$34.24	21.95%
MAPE0001	ARENA DE LA REGION	M3	$400.00	*	0.100000	$40.00	25.65%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$74.24**	**47.60%**
MANO DE OBRA							
2P	CUADRILLA 02 (2 PEON + 0.1 CABO)	JOR	$1,010.61	/	20.000000	$50.53	32.40%
1E1A	CUADRILLA (1 OF ELECTRICO + AYUDANTE)	JOR	$1,247.66	/	40.000000	$31.19	20.00%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$81.72**	**52.40%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$155.96**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$28.98	
	SUBTOTAL1					$184.94	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$1.32	
	SUBTOTAL2					$186.26	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$13.97	
	SUBTOTAL3					$200.23	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$1.01	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$201.24**	

000083

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 09

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023
Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A7	Análisis No.:		10			
Análisis:	**4-0080**		**M3**		**64.3500**	**$12,909.90**	

Excavación a mano en material tipo II-A, en seco y barreta de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad, depositando el producto de excavación a orilla de cepa, cualquier zona..

MANO DE OBRA

2P	CUADRILLA 02 (2 PEON + 0.1 CABO)	JOR	$1,010.61	/	6.500000	$155.48	100.00%

SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**		**$155.48**	**100.00%**
	(CD) COSTO DIRECTO		**$155.48**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS	18.5842%	$28.89	
	SUBTOTAL1		$184.37	
	(CF) FINANCIAMIENTO	0.7134%	$1.32	
	SUBTOTAL2		$185.69	
	(CU) UTILIDAD	7.5000%	$13.93	
	SUBTOTAL3		$199.62	
	CARGOS ADICIONALES			
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3	0.502500%	$1.00	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)		**$200.62**	

000084

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 09

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023
Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A7	Análisis No.:		20			
Análisis:	**9-0138**		**M3**		**38.5500**	**$19,236.06**	

Relleno de material inerte de banco compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.

MATERIALES							
AGUA	AGUA (MANEJO)	M3	$50.80	*	0.103429	$5.25	1.36%
MATBANCO	MATERIAL DE BANCO	M3	$275.00	*	1.250000	$343.75	88.89%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$349.00**	**90.25%**
MANO DE OBRA							
2P	CUADRILLA 02 (2 PEON + 0.1 CABO)	JOR	$1,010.61	/	35.000000	$28.87	7.47%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$28.87**	**7.47%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQPIPA	CAMION PIPA DE 9 M3	HOR	$717.78	*	0.012326	$8.85	2.29%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$8.85**	**2.29%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$386.72**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$71.87	
	SUBTOTAL1					$458.59	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$3.27	
	SUBTOTAL2					$461.86	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$34.64	
	SUBTOTAL3					$496.50	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$2.49	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$498.99**	

000085

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO
AE - 09

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023

Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A7	Análisis No.:		30			
Análisis:	**32-0471**		**ML**		**424.3500**	**$225,253.47**	

Guarnición de concreto simple de f´c= 200 kg/cm2 de 20x15x40 cm. de sección T.M.A. 3/4" Incluye cimbrado, descimbrado, materiales y mano de obra.

MATERIALES							
1.	ALAMBRE RECOCIDO	KG	$38.00	*	0.125000	$4.75	1.15%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$4.75**	**1.15%**
MANO DE OBRA							
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	$1,455.27	/	8.000000	$181.91	44.22%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$181.91**	**44.22%**
BASICOS							
MACIM-FRON	CIMBRA EN FRONTERA DE 3RA	ML	$40.17	*	1.000000	$40.17	9.76%
MABA0017	CONCRETO F'C=200KG/CM2 T.M.A. 3/4"	M3	$2,171.34	*	0.085000	$184.56	44.86%
SUBTOTAL:	**BASICOS**					**$224.73**	**54.63%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$411.39**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$76.45	
	SUBTOTAL1					$487.84	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$3.48	
	SUBTOTAL2					$491.32	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$36.85	
	SUBTOTAL3					$528.17	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$2.65	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$530.82**	

000086

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO
AE - 09

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023
Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A7	Análisis No.:		40			
Análisis:	**32-0475A**		**M2**		**1,471.3500**	**$1,437,435.38**	

Pavimento premezclado F'c= 300 Kg/cm2, T.A.M. 3/4" de 20 cm. de espesor resistencia normal, acabado a regla incluye junta constructiva con chaflan de 1/2", en cada junta fria (al termino del colado) se procederá a colocar 8 conectores con varilla de 1/2" a cada 60 cms. 30-30 cms., fibra microsintetica, curado con curacreto, vibrado, acarreos de materiales a 1ra. estación.

MATERIALES							
AGUA	AGUA (MANEJO)	M3	$50.80	*	0.100000	$5.08	0.67%
MACONCE-PRE	CONCRETO PREMEZCLADO FC= 300 KG/CM2	M3	$2,320.00	*	0.205000	$475.60	62.82%
MACON-1/2	CONECTOR CON VARILLA 1/2 DE 60 CM	PZA	$78.00	*	0.400000	$31.20	4.12%
MAFIBT-SIN	FIBRA MICRO SINTETICA	KG	$220.00	*	0.120000	$26.40	3.49%
MACURA-C	CURACRETO	LT	$49.00	*	0.250000	$12.25	1.62%
MAAG0001	CEMENTO GRIS	TON	$3,880.00	*	0.009500	$36.86	4.87%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$587.39**	**77.58%**
MANO DE OBRA							
1A5P	CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)	JOR	$3,341.39	*	0.044000	$147.02	19.42%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$147.02**	**19.42%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQVIB	VIBRADOR PARA CONCRETO	HOR	$117.49	*	0.125000	$14.69	1.94%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$14.69**	**1.94%**
BASICOS							
MACIM-FRON	CIMBRA EN FRONTERA DE 3RA	ML	$40.17	*	0.200000	$8.03	1.06%
SUBTOTAL:	**BASICOS**					**$8.03**	**1.06%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$757.13**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$140.71	
	SUBTOTAL1					$897.84	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$6.41	
	SUBTOTAL2					$904.25	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$67.82	
	SUBTOTAL3					$972.07	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$4.88	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$976.95**	

000087

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 09

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023

Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A7	Análisis No.:		50			
Análisis:	**SUMPOL**		**M2**		**1,471.3500**	**$83,896.38**	

Suministro y colocación de hule negro calibre 600 para evitar deshidratación del concreto, incluye materiales, herramienta y mano de obra.

MATERIALES							
MAHULE-N	HULE NEGRO CAL 600	M2	$35.00	*	1.070000	$37.45	84.75%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$37.45**	**84.75%**
MANO DE OBRA							
2P	CUADRILLA 02 (2 PEON + 0.1 CABO)	JOR	$1,010.61	/	150.000000	$6.74	15.25%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$6.74**	**15.25%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$44.19**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$8.21	
	SUBTOTAL1					$52.40	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$0.37	
	SUBTOTAL2					$52.77	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$3.96	
	SUBTOTAL3					$56.73	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.29	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$57.02**	

000088

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 09

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023
Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A7	Análisis No.:		60			
Análisis:	**CORTE01**		**ML**		**522.0000**	**$19,000.80**	
Corte de juntas en piso de concreto con cortadora manual de disco diamantado, incluye limpieza de la junta.							
MANO DE OBRA							
2P	CUADRILLA 02 (2 PEON + 0.1 CABO)	JOR	$1,010.61	/	50.000000	$20.21	71.64%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$20.21**	**71.64%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQCORTAP	CORTADORA DE PISO	HOR	$123.01	*	0.065000	$8.00	28.36%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$8.00**	**28.36%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$28.21**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$5.24	
	SUBTOTAL1					$33.45	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$0.24	
	SUBTOTAL2					$33.69	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$2.53	
	SUBTOTAL3					$36.22	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.18	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$36.40**	

000089

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 09

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023

Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A7	Análisis No.:		70			
Análisis:	**32-0484**		**ML**		**522.0000**	**$14,892.66**	

Calafateo en losas y guarniciones a base de asfalto oxidado incluye material, desperdicios, acarreos a primera estación y mano de obra.

MATERIALES							
MASFALT	ASFALTO OXIDADO	LT	$32.00	*	0.375000	$12.00	54.27%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$12.00**	**54.27%**
MANO DE OBRA							
2P	CUADRILLA 02 (2 PEON + 0.1 CABO)	JOR	$1,010.61	/	100.000000	$10.11	45.73%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$10.11**	**45.73%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$22.11**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$4.11	
	SUBTOTAL1					$26.22	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$0.19	
	SUBTOTAL2					$26.41	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$1.98	
	SUBTOTAL3					$28.39	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.14	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$28.53**	

000090

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO
AE - 09

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023

Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A7	Análisis No.:		80			
Análisis:	**22-0333***		**ML**		**424.3500**	**$38,887.43**	

Pintura esmalte amarillo trafico en guarniciones con desarrollo de 30.0 cm., incluye material mano de obra y acarreos a primera estación.

MATERIALES							
CO06	PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 BCO. Y COLS. REG.	LT	$285.00	*	0.112500	$32.06	45.14%
THINNER	THINNER STANDARD	LT	$77.00	*	0.200000	$15.40	21.68%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$47.46**	**66.83%**
MANO DE OBRA							
1P1A	CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + AYUDANTE)	JOR	$1,413.76	/	60.000000	$23.56	33.17%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$23.56**	**33.17%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$71.02**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$13.20	
	SUBTOTAL1					$84.22	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$0.60	
	SUBTOTAL2					$84.82	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$6.36	
	SUBTOTAL3					$91.18	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.46	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$91.64**	

000091

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 09

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023

Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A7	Análisis No.:		90			
Análisis:	**32-0468**		**M2**		**556.6400**	**$299,906.50**	

Banqueta de concreto hidráulico hecho en obra de f´c=150 kg/cm2 de 10 cms de espesor, T.M.A. 3/4", incluye curado, cimbrado, descimbrado, material y mano de obra.

MATERIALES							
1.	ALAMBRE RECOCIDO	KG	$38.00	*	0.125000	$4.75	1.14%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$4.75**	**1.14%**
MANO DE OBRA							
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	$1,455.27	/	9.000000	$161.70	38.72%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$161.70**	**38.72%**
BASICOS							
MACIM-FRON	CIMBRA EN FRONTERA DE 3RA	ML	$40.17	*	0.750000	$30.13	7.22%
MABA0016	CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4"	M3	$2,104.59	*	0.105000	$220.98	52.92%
SUBTOTAL:	**BASICOS**					**$251.11**	**60.14%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$417.56**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$77.60	
	SUBTOTAL1					$495.16	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$3.53	
	SUBTOTAL2					$498.69	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$37.40	
	SUBTOTAL3					$536.09	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$2.69	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$538.78**	

000092

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 09

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023

Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida: A8	Análisis No.:	M3		10	979.6400	$224,660.84	

Análisis: **CARGA**
Carga mecánica con uso de retroexcavadora y acarreo en camión de volteo (6M3) de material producto de excavación y/o demolición a tiro libre.

EQUIPO Y HERRAMIENTA								
EQRETROEXCA'	RETRO EXCAVADORA CAT 90 HP	HOR	$540.44	/	10.000000	$54.04	30.41%
EQCV0001	CAMION VOLTEO DE 6 M3	HORA	$804.00	/	6.500000	$123.69	69.59%
						$177.73	**100.00%**
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$177.73**	**100.00%**
	(CD) COSTO DIRECTO				18.5842%	$33.03	
	(CI) INDIRECTOS					$210.76	
	SUBTOTAL1				0.7134%	$1.50	
	(CF) FINANCIAMIENTO					$212.26	
	SUBTOTAL2				7.5000%	$15.92	
	(CU) UTILIDAD					$228.18	
	SUBTOTAL3						
	CARGOS ADICIONALES				0.502500%	$1.15	
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3					**$229.33**	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)						

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 09

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023

Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A8	Análisis No.:		20			
Análisis:	**33-0528**		**M2**		**2,692.8100**	**$43,058.03**	
Limpieza ultima general de obra para entrega con acopio y acarreo horizontal a 20 mts.							
MATERIALES							
AGUA	AGUA (MANEJO)	M3	$50.80	*	0.040000	$2.03	16.37
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$2.03**	**16.3**
MANO DE OBRA							
2P	CUADRILLA 02 (2 PEON + 0.1 CABO)	JOR	$1,010.61	/	100.000000	$10.11	81.5
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$10.11**	**81.5**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQCV0001	CAMION VOLTEO DE 6 M3	HORA	$804.00	*	0.000319	$0.26	2.10
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$0.26**	**2.10%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$12.40**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$2.30	
	SUBTOTAL1					$14.70	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$0.10	
	SUBTOTAL2					$14.80	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$1.11	
	SUBTOTAL3					$15.91	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.08	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$15.99**	

000094

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023

Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023
DOCUMENTO
AE - 09

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**1A1P**		**JOR**				
CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)							
MANO DE OBRA							
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$914.91	*	0.100000	$91.49	6.29%
MO01	PEON	JOR	$444.84	*	1.000000	$444.84	30.57%
MO02	OFIC. ALBAÑIL	JOR	$836.56	*	1.000000	$836.56	57.48%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$1372.89**	**94.34%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO4	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$1,372.89	*	0.030000	$41.19	2.83%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$1,372.89	*	0.030000	$41.19	2.83%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$82.38**	**5.66%**
	Costo Directo:					**$1455.27**	**100.00%**

000095

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023

Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

DOCUMENTO
AE - 09

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
			JOR				
Análisis:	**1A5P**						
CUADRILLA No 22	(1 ALBAÑIL + 5 PEONES)						
MANO DE OBRA							
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$914.91	*	0.100000	$91.49	2.74%
MO01	PEON	JOR	$444.84	*	5.000000	$2224.20	66.57%
MO02	OFIC. ALBAÑIL	JOR	$836.56	*	1.000000	$836.56	25.04%
						$3152.25	**94.34%**
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**						
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO4	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$3,152.25	*	0.030000	$94.57	2.83%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$3,152.25	*	0.030000	$94.57	2.83%
						$189.14	**5.66%**
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$3341.39**	**100.00%**
	Costo Directo:						

000096

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023

Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023
DOCUMENTO
AE - 09

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**1E1A**		**JOR**				
CUADRILLA (1 OF ELECTRICO + AYUDANTE)							
MANO DE OBRA							
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$914.91	*	0.100000	$91.49	7.33%
MO01	PEON	JOR	$444.84	*	1.000000	$444.84	35.65%
MO-ELEC	OFIC. ELECTRICO	JOR	$640.71	*	1.000000	$640.71	51.35%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$1177.04**	**94.34%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO4	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$1,177.04	*	0.030000	$35.31	2.83%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$1,177.04	*	0.030000	$35.31	2.83%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$70.62**	**5.66%**
	Costo Directo:					**$1247.66**	**100.00%**

000097

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023

Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

DOCUMENTO
AE - 09

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**1F1A**		**JOR**				
CUADRILLA No	6 (1 FIERRERO + 1 AYUDANTE)						
MANO DE OBRA							
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$914.91	*	0.100000	$91.49	6.47%
MOAY0001	AYUDANTE GENERAL	JOR	$601.54	*	1.000000	$601.54	42.55%
MOFI0001	OFIC. FIERRERO	JOR	$640.71	*	1.000000	$640.71	45.32%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$1333.74**	**94.34%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO4	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$1,333.74	*	0.030000	$40.01	2.83%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$1,333.74	*	0.030000	$40.01	2.83%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$80.02**	**5.66%**
	Costo Directo:					**$1413.76**	**100.00%**

000098

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023
Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023
DOCUMENTO
AE - 09

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**1H1A**		**JOR**				
CUADRILLA No 9 (1 HERRERO + AYUDANTE)							
MANO DE OBRA							
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$914.91	*	0.100000	$91.49	6.47%
MOAY0001	AYUDANTE GENERAL	JOR	$601.54	*	1.000000	$601.54	42.55%
MOF-H	OFIC. HERRERO	JOR	$640.71	*	1.000000	$640.71	45.32%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$1333.74**	**94.34%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO4	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$1,333.74	*	0.030000	$40.01	2.83%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$1,333.74	*	0.030000	$40.01	2.83%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$80.02**	**5.66%**
	Costo Directo:					**$1413.76**	**100.00%**

000099

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023
Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023
DOCUMENTO
AE - 09

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**1P1A**		**JOR**				
CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + AYUDANTE)							
MANO DE OBRA							
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$914.91	*	0.100000	$91.49	6.47%
MOAY0001	AYUDANTE GENERAL	JOR	$601.54	*	1.000000	$601.54	42.55%
MOF-P	OFIC. PINTOR	JOR	$640.71	*	1.000000	$640.71	45.32%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$1333.74**	**94.34%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO4	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$1,333.74	*	0.030000	$40.01	2.83%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$1,333.74	*	0.030000	$40.01	2.83%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$80.02**	**5.66%**
	Costo Directo:					**$1413.76**	**100.00%**

000100

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023

Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023
DOCUMENTO
AE - 09

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**1P1E**		**JOR**				
CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE)							
MANO DE OBRA							
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	$679.86	*	1.000000	$679.86	48.08%
MO083	OFIC. PLOMERO	JOR	$601.54	*	1.000000	$601.54	42.54%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$914.91	*	0.100000	$91.49	6.47%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$1372.89**	**97.09%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$1,372.89	*	0.030000	$41.19	2.91%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$41.19**	**2.91%**
	Costo Directo:					**$1414.08**	**100.00%**

000101

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023

Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023
DOCUMENTO
AE - 09

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**2A**		**JOR**				
CUADRILLA No 4 (2 AYUDANTE GENERAL)							
MANO DE OBRA							
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$914.91	*	0.200000	$182.98	12.82%
MOAY0001	AYUDANTE GENERAL	JOR	$601.54	*	2.000000	$1203.08	84.27%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$1386.06**	**97.09%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$1,386.06	*	0.030000	$41.58	2.91%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$41.58**	**2.91%**
	Costo Directo:					**$1427.64**	**100.00%**

000102

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023

Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023
DOCUMENTO
AE - 09

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**2P**		**JOR**				
CUADRILLA 02 (2 PEON + 0.1 CABO)							
MANO DE OBRA							
MO01	PEON	JOR	$444.84	*	2.000000	$889.68	88.03%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$914.91	*	0.100000	$91.49	9.05%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$981.17**	**97.09%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$981.17	*	0.030000	$29.44	2.91%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$29.44**	**2.91%**
	Costo Directo:					**$1010.61**	**100.00%**

000103

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023

Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023
DOCUMENTO
AE - 09

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**MABA0001**		**M2**				
CIMBRA APARENTE EN CADENAS Y CASTILLOS							
MATERIALES							
MAMA0007	TRIPLAY DE PINO DE 16 MM.	PZA	$775.00	*	0.333000	$258.08	81.41%
MAAC0001	ALAMBRE RECOCIDO	KG	$28.50	*	0.100000	$2.85	0.90%
MAAC0008	CLAVOS DE 2"	KG	$55.00	*	0.100000	$5.50	1.73%
MADIESEL	DIESEL	LTO	$21.20	*	0.500000	$10.60	3.34%
MAMA0001	MADERA DE PINO	PT	$20.00	*	2.000000	$40.00	12.62%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$317.03**	**100.00%**
	Costo Directo:					**$317.03**	**100.00%**

000104

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023

Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

DOCUMENTO
AE - 09

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**MABA0006**		**M3**				
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3							
MATERIALES							
AGUA	AGUA (MANEJO)	M3	$50.80	*	0.250000	$12.70	0.56%
ARENA	ARENA	M3	$250.00	*	1.100000	$275.00	12.21%
MAAG0001	CEMENTO GRIS	TON	$3,880.00	*	0.454000	$1761.52	78.24%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$2049.22**	**91.02%**
MANO DE OBRA							
2P	CUADRILLA 02 (2 PEON + 0.1 CABO)	JOR	$1,010.61	*	0.200000	$202.12	8.98%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$202.12**	**8.98%**
	Costo Directo:					**$2251.34**	**100.00%**

000105

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023

Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

DOCUMENTO
AE - 09

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**MABA0009**		**M3**				
MORTERO CEMENTO ARENA 1:5							
MATERIALES							
AGUA	AGUA (MANEJO)	M3	$50.80	*	0.240000	$12.19	0.72%
ARENA	ARENA	M3	$250.00	*	1.200000	$300.00	17.79%
MAAG0001	CEMENTO GRIS	TON	$3,880.00	*	0.302000	$1171.76	69.50%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$1483.95**	**88.01%**
MANO DE OBRA							
2P	CUADRILLA 02 (2 PEON + 0.1 CABO)	JOR	$1,010.61	*	0.200000	$202.12	11.99%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$202.12**	**11.99%**
	Costo Directo:					**$1686.07**	**100.00%**

000106

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023

Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

DOCUMENTO
AE - 09

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**MABA001**		**ML**				
CIMBRA COMUN							
MATERIALES							
MALA0180	ALAMBRE RECOCIDO No. 18	KG	$30.00	*	0.100000	$3.00	5.16%
MCLA0021	CLAVO	KG	$45.00	*	0.100000	$4.50	7.75%
MADIESEL	DIESEL	LTO	$21.20	*	0.500000	$10.60	18.24%
MAMA0001	MADERA DE PINO	PT	$20.00	*	2.000000	$40.00	68.85%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$58.10**	**100.00%**
	Costo Directo:					**$58.10**	**100.00%**

000107

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023

Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023
DOCUMENTO
AE - 09

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**MABA0016**		**M3**				
CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4"							
MATERIALES							
ARENA	ARENA	M3	$250.00	*	0.450000	$112.50	5.35%
GRAVA	GRAVA	M3	$666.67	*	0.700000	$466.67	22.17%
AGUA	AGUA (MANEJO)	M3	$50.80	*	0.190000	$9.65	0.46%
MAAG0001	CEMENTO GRIS	TON	$3,880.00	*	0.360000	$1396.80	66.37%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$1985.62**	**94.35%**
MANO DE OBRA							
2A	CUADRILLA No 4 (2 AYUDANTE GENERAL)	JOR	$1,427.64	/	12.000000	$118.97	5.65%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$118.97**	**5.65%**
	Costo Directo:					**$2104.59**	**100.00%**

000108

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023

Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023
DOCUMENTO
AE - 09

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**MABA0017**		**M3**				
CONCRETO F'C=200KG/CM2 T.M.A. 3/4"							
MATERIALES							
ARENA	ARENA	M3	$250.00	*	0.470000	$117.50	5.41%
GRAVA	GRAVA	M3	$666.67	*	0.660000	$440.00	20.26%
AGUA	AGUA (MANEJO)	M3	$50.80	*	0.190000	$9.65	0.44%
MAAG0001	CEMENTO GRIS	TON	$3,880.00	*	0.380000	$1474.40	67.90%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$2041.55**	**94.02%**
MANO DE OBRA							
2A	CUADRILLA No 4 (2 AYUDANTE GENERAL)	JOR	$1,427.64	/	11.000000	$129.79	5.98%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$129.79**	**5.98%**
	Costo Directo:					**$2171.34**	**100.00%**

000109

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023
Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023
DOCUMENTO
AE - 09

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**MABA0018**		**M3**				
CONCRETO F'C=250KG/CM2 T.M.A. 3/4"							
MATERIALES							
MAPE0002	GRAVA 1" A 3/4"	M3	$390.00	*	0.640000	$249.60	10.13%
MAAG0001	CEMENTO GRIS	TON	$3,880.00	*	0.423000	$1641.24	66.58%
MAAG0008	AGUA (MANEJO)	M3	$40.00	*	0.190000	$7.60	0.31%
MAPE0001	ARENA DE LA REGION	M3	$400.00	*	0.465000	$186.00	7.55%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$2084.44**	**84.56%**
MANO DE OBRA							
1A5P	CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)	JOR	$3,341.39	*	0.099704	$333.15	13.51%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$333.15**	**13.51%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQRE0001	REVOLVEDORA DE 1 SACO	HORA	$71.34	*	0.500000	$35.67	1.45%
EQVG0002	VIBRADOR DE GASOLINA	HORA	$47.62	*	0.250000	$11.91	0.48%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$47.58**	**1.93%**
	Costo Directo:					**$2465.17**	**100.00%**

000110

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023

Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023
DOCUMENTO
AE - 09

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**MABA0019**		**KG**				
ACERO RFZO. CIMENTACION ALAM.#2 FY=2530K							
MATERIALES							
MAAC0001	ALAMBRE RECOCIDO	KG	$28.50	*	0.033000	$0.94	2.62%
MAAC0002	ALAMBRON # 2	KG	$35.00	*	1.000000	$35.00	97.38%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$35.94**	**100.00%**
	Costo Directo:					**$35.94**	**100.00%**

000111

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023

Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

DOCUMENTO
AE - 09

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**MABA0020**		**KG**				
ACERO RFZO. DEL FY=4200 KG/CM2							
MATERIALES							
MAAC0001	ALAMBRE RECOCIDO	KG	$28.50	*	0.033000	$0.94	2.87%
MAAC0003	ACERO DEL # 3 HASTA 6	KG	$30.91	*	1.030000	$31.84	97.13%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$32.78**	**100.00%**
	Costo Directo:					**$32.78**	**100.00%**

000112

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Fecha: 03/08/2023

Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

DOCUMENTO
AE - 09

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**MACIM-FRON**		**ML**				
CIMBRA EN FRONTERA DE 3RA							
MATERIALES							
MATABL	TABLA DE 3RA	PZA	$185.00	*	0.160000	$29.60	73.69%
MAMA0001	MADERA DE PINO	PT	$20.00	*	0.200000	$4.00	9.96%
1.	ALAMBRE RECOCIDO	KG	$38.00	*	0.095238	$3.62	9.01%
CLAVOS	CLAVOS DE 2 A 4 "	KG	$65.00	*	0.045455	$2.95	7.34%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$40.17**	**100.00%**
	Costo Directo:					**$40.17**	**100.00%**

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. **41066004-016-2023.**
REFERENTE A LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**

000113

AE-10 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDO A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA S.D.U.O.P., DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA Y EN SU CASO, CON FECHAS CRITICAS QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01 CEL. 744 2354717 / 744 4490912 E-MAIL: imexa@telmexmail.com, gno_0301@hotmail.com

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO
AE - 10

Concurso No: 41066004-016-2023 **Fecha:** 03/08/2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 14/08/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 11/11/2023

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
	Pavimentación integral de calle Felipe II, Fraccionamiento Farallón del Obispo						
	Preliminares.						
3-0073	Trazo y nivelación topográficas del terreno para estructuras estableciendo ejes y referencias, para superficie mayores a 300.00 m2 (vialidad) incluye: elaboración de planos topográficos.	M2	100.00% 2,692.810000 $46,612.54				100.00% 2,692.810000 $46,612.54
D-CAR5A10	Demolición a maquina de carpeta asfaltica de 5.00 a 10.00 cms. De espesor. Incluye mano de obra y acarreos en 1a. estación.	M2	90.00% 1,484.100000 $108,799.37	10.00% 164.900000 $12,088.82			100.00% 1,649.000000 $120,888.19
D-BANQU	Demolición mecánica de banqueta de 10 cms. de espesor incluye: herramienta menor, equipo y mano de obra.	M2	90.00% 131.436000 $8,333.05	10.00% 14.604000 $925.89			100.00% 146.040000 $9,258.94
D-GUARM	Demolición mecánica de guarnición de 15x20x50 cm., incluye extracción de pedacería, mano de obra, equipo y herramienta.	M	80.00% 146.936000 $10,245.85	20.00% 36.734000 $2,561.46			100.00% 183.670000 $12,807.31
			Monto esta hoja:	**$173,990.81**	**$15,576.17**		**$189,566.98**
			Acumulado:	**$173,990.81**	**$15,576.17**		**$189,566.98**

ADMINISTRADOR UNICO: ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ

0001114

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 10

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-016-2023 **Fecha:** 03/08/2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 14/08/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 11/11/2023

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
1-0056	Descoronamiento de muro de piedra braza de 30 cm de ancho incluye: acarreo de material fuera de la obra producto de la demolición.	M	55.00%	45.00%			100.00%
			66.000000	54.000000			120.000000
			$7,135.92	$5,838.48			$12,974.40
EXC-001	Excavación por medios mecánicos en cepas de 0.00 A 2.00 mts de profundidad en material tipo II incluye afine de talud y fondo, acarreos a primera estación de 20 mts.	M3	30.00%	70.00%			100.00%
			209.829000	489.601000			699.430000
			$15,590.30	$36,377.35			$51,967.65
9-0139	Relleno de material producto de excavación compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor, incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.	M3		20.00%	80.00%		100.00%
				84.058000	336.232000		420.290000
				$7,032.29	$28,129.17		$35,161.46
9-0138	Relleno de material inerte de banco compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.	M3			100.00%		100.00%
					30.000000		30.000000
					$14,969.70		$14,969.70
	TOTAL Preliminares.		**$196,717.03**	**$64,824.29**	**$43,098.87**		
	ACUMULADO Preliminares.		**$196,717.03**	**$261,541.32**	**$304,640.19**	**$304,640.19**	
	PORCENTAJE PERIODO Preliminares.		**64.57%**	**21.28%**	**14.15%**		

Monto esta hoja:	**$22,726.22**	**$49,248.12**	**$43,098.87**		**$115,073.21**
Acumulado:	**$196,717.03**	**$64,824.29**	**$43,098.87**		**$304,640.19**

ADMINISTRADOR UNICO: ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ

0000115

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 10

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-016-2023 **Fecha:** 03/08/2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 14/08/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 11/11/2023

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
	PORCENTAJE ACUMULADO Preliminares.		**64.57%**	**85.85%**	**100.00%**	**100.00%**	
	Terracerías						
31-0448	Apertura en caja por medios mecánicos en terreno tipo II-A, incluye acamellonamiento del material.	M3		60.87%	39.13%		100.00%
				339.652170	218.347830		558.000000
				$27,943.18	$17,963.48		$45,906.66
31-0454	Afine y compactación de sub rasante al 90 % PROCTOR mínimo, por medios mecánicos.	M2		60.87%	39.13%		100.00%
				895.604340	575.745660		1,471.350000
				$35,958.51	$23,116.19		$59,074.70
31-0457	Formación de base de 30 cms. de espesor con material producto de banco con equipo mecánico incluye vertido, afine, compactado al 95 % PROCTOR y agua.	M3		60.87%	39.13%		100.00%
				269.420870	173.199130		442.620000
				$139,867.15	$89,914.60		$229,781.75
32-0466	Afine y compactación en banquetas, andadores y plazas a mano incluye acarreos a primera estación.	M2		60.87%	39.13%		100.00%
				338.824350	217.815650		556.640000
				$13,502.15	$8,679.95		$22,182.10
	TOTAL Terracerías			**$217,270.99**	**$139,674.22**		
		Monto esta hoja:		**$217,270.99**	**$139,674.22**		**$356,945.21**
		Acumulado:	**$196,717.03**	**$282,095.28**	**$182,773.09**		**$661,585.40**

ADMINISTRADOR UNICO: ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ

0001116

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 10

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-016-2023 **Fecha:** 03/08/2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 14/08/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 11/11/2023

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
	ACUMULADO Terracerías			**$217,270.99**	**$356,945.21**	**$356,945.21**	
	PORCENTAJE PERIODO Terracerías			**60.87%**	**39.13%**		
	PORCENTAJE ACUMULADO Terracerías			**60.87%**	**100.00%**	**100.00%**	
	Instalación Hidráulica.						
4-0080	Excavación a mano en material tipo II-A, en seco y barreta de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad, depositando el producto de excavación a orilla de cepa, cualquier zona..	M3	100.00% 16.000000 $3,209.92				100.00% 16.000000 $3,209.92
9-0139	Relleno de material producto de excavación compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor, incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.	M3			100.00% 15.800000 $1,321.83		100.00% 15.800000 $1,321.83
5-0102	Cama de arena para instalación de tubería incluye: acostillado, acarreo de material en 1ra. estación, material y mano de obra.	M3	35.00% 0.700000 $332.89	65.00% 1.300000 $618.23			100.00% 2.000000 $951.12
27-0412	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 3" CED. RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML		100.00% 50.000000 $22,462.00			100.00% 50.000000 $22,462.00
		Monto esta hoja:	**$3,542.81**	**$23,080.23**	**$1,321.83**		**$27,944.87**
		Acumulado:	**$200,259.84**	**$305,175.51**	**$184,094.92**		**$689,530.27**

ADMINISTRADOR UNICO: ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ

0001117

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 10

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-016-2023 **Fecha:** 03/08/2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 14/08/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 11/11/2023

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
TOMDOM*	Toma domiciliaria de agua potable con tubo de CPVC de 13 mm. de 6 mts. de longitud, incluye: excavación, relleno, válvula de inserción, abrazadera de 4", acarreo de materiales, mano de obra y herramienta.	PZA		95.00%	5.00%		100.00%
				2.850000	0.150000		3.000000
				$5,016.88	$264.05		$5,280.93
314-IHS-07-087	Válvula de esfera de CPVC 13 mm, incluye: suministro de materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA		60.00%	40.00%		100.00%
				1.800000	1.200000		3.000000
				$437.27	$291.52		$728.79
BOTA01	Caja para llave de banqueta (bota) incluye llave de cuadro roscable 1/2", herramienta menor, mano de obra, materiales y equipo.	PZA		20.00%	80.00%		100.00%
				0.600000	2.400000		3.000000
				$833.04	$3,332.16		$4,165.20
	TOTAL Instalación Hidráulica.		**$3,542.81**	**$29,367.42**	**$5,209.56**		
	ACUMULADO Instalación Hidráulica.		**$3,542.81**	**$32,910.23**	**$38,119.79**	**$38,119.79**	
	PORCENTAJE PERIODO Instalación Hidráulica.		**9.29%**	**77.04%**	**13.67%**		
	PORCENTAJE ACUMULADO Instalación Hidráulica.		**9.29%**	**86.33%**	**100.00%**	**100.00%**	
	Instalación sanitaria.						
	Monto esta hoja:			**$6,287.19**	**$3,887.73**		**$10,174.92**
	Acumulado:		**$200,259.84**	**$311,462.70**	**$187,982.65**		**$699,705.19**

ADMINISTRADOR UNICO: ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ

000118

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 10

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-016-2023 **Fecha:** 03/08/2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 14/08/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 11/11/2023

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
EXC-001	Excavación por medios mecánicos en cepas de 0.00 A 2.00 mts de profundidad en material tipo II incluye afine de talud y fondo, acarreos a primera estación de 20 mts.	M3	80.95%	19.05%			100.00%
			38.258100	9.001900			47.260000
			$2,842.58	$668.84			$3,511.42
9-0139	Relleno de material producto de excavación compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor, incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.	M3			100.00%		100.00%
					31.790000		31.790000
					$2,659.55		$2,659.55
9-0138	Relleno de material inerte de banco compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.	M3			80.95%	19.05%	100.00%
					11.025710	2.594290	13.620000
					$5,501.72	$1,294.52	$6,796.24
5-0102	Cama de arena para instalación de tubería incluye: acostillado, acarreo de material en 1ra. estación, material y mano de obra.	M3	23.81%	76.19%			100.00%
			0.802380	2.567620			3.370000
			$381.58	$1,221.06			$1,602.64

Monto esta hoja:	**$3,224.16**	**$1,889.90**	**$8,161.27**	**$1,294.52**	**$14,569.85**
Acumulado:	**$203,484.00**	**$313,352.60**	**$196,143.92**	**$1,294.52**	**$714,275.04**

ADMINISTRADOR UNICO: ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ

000119

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 10

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-016-2023 **Fecha:** 03/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 14/08/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 11/11/2023

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
28-0417	Pozo de visita de forma cónica de 0.60 a 1.20 mts. de diámetro interior por 1.50 mts. de altura a base de mamposteria, muro de tabique de 25 cms. con aplanado de mortero cemento arena 1:3 acabado pulido, incluye excavación, acarreo y relleno.	PZA		9.52%	90.48%		100.00%
				0.190480	1.809520		2.000000
				$2,527.87	$24,014.81		$26,542.68
37-0579BP	Suministro y colocación de brocal y tapa de Polietileno alta resistencia abierto o cerrado para pozo de visita de 60 cm de diámetro, incluye material y mano de obra.	PZA	14.29%	85.71%			100.00%
			0.285710	1.714290			2.000000
			$1,202.89	$7,217.31			$8,420.20
26-0390*	Registro sanitario de 0.40x0.60x0.60 mts., a base de tabicón10x14x28, asentado con mortero cemento arena 1:3, aplanado interior acabado fino con mortero cemento arena 1:3, piso de 10 cm, de concreto simple F'c= 150 Kg/cm2, tapa de concreto F'c=250 Kg/cm2, armado con varilla del No. 3 @ 20 cm. en ambos sentidos, de 15 cm. de espesor incluye trazo, nivelación, barrenado y demolición de roca, acarreo y m.o.	PZA		100.00%			100.00%
				2.000000			2.000000
				$4,964.26			$4,964.26
TUBO 8"	Suministro e instalación de tubo PVC sanitario de 8" de diametro incluye acarreos, materiales secundarios, conexiones y mano de obra.	M		100.00%			100.00%
				42.800000			42.800000
				$33,092.53			$33,092.53
		Monto esta hoja:	**$1,202.89**	**$47,801.97**	**$24,014.81**		**$73,019.67**
		Acumulado:	**$204,686.89**	**$361,154.57**	**$220,158.73**	**$1,294.52**	**$787,294.71**

ADMINISTRADOR UNICO: ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ

000120

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 10

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-016-2023 **Fecha:** 03/08/2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 14/08/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 11/11/2023

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
SUM-COD2	Suministro y colocación de codo PVC sanitario de 6"X45°, incluye carga y descarga en almacén de obra.	PZA		76.19%	23.81%		100.00%
				1.523810	0.476190		2.000000
				$542.63	$169.57		$712.20
PU-6255	Suministro y colocación de unión de servicio de P.V.C. De 150 mm (6") de diámetro para alcantarillado sanitario incluye carga y descarga en almacén de obra.	PZA		57.14%	42.86%		100.00%
				1.142860	0.857140		2.000000
				$713.30	$534.98		$1,248.28
PU-6239	Suministro de tubo de PVC sanitario de norma liso de 150 mm de diámetro, incluye flete, carga y descarga en almacén de obra.	ML		23.81%	76.19%		100.00%
				4.285710	13.714290		18.000000
				$2,070.13	$6,624.41		$8,694.54
	TOTAL Instalación sanitaria.		**$4,427.05**	**$53,017.93**	**$39,505.04**	**$1,294.52**	
	ACUMULADO Instalación sanitaria.		**$4,427.05**	**$57,444.98**	**$96,950.02**	**$98,244.54**	
	PORCENTAJE PERIODO Instalación sanitaria.		**4.51%**	**53.97%**	**40.21%**	**1.32%**	
	PORCENTAJE ACUMULADO Instalación sanitaria.		**4.51%**	**58.47%**	**98.68%**	**100.00%**	
	Albañileria						
	Monto esta hoja:			**$3,326.06**	**$7,328.96**		**$10,655.02**
	Acumulado:		**$204,686.89**	**$364,480.63**	**$227,487.69**	**$1,294.52**	**$797,949.73**

ADMINISTRADOR UNICO: ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ

0001121

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO
AE - 10

Concurso No: 41066004-016-2023 **Fecha:** 03/08/2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 14/08/2023
Fin obra: 11/11/2023

Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
18-0296	Muro de piedra braza de la región, asentada con mortero cemento arena 1:5, acabado común incluye: acarreo de materiales en 1ra. erstación de 20 mts.	M3	44.44%	55.56%			100.00%
			122.897780	153.622220			276.520000
			$338,627.62	$423,284.53			$761,912.15
18-0313	Dren para muro de mampostería a base de P.V.C. 4" tipo rígido incluye material y mano de obra.	ML		100.00%			100.00%
				26.000000			26.000000
				$3,388.32			$3,388.32
18-0318	FILTRO DE GRAVA Y/O RAJUELA DE PIEDRA DE 30 CMS DE ESPESOR INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA	M3		100.00%			100.00%
				53.700000			53.700000
				$54,747.69			$54,747.69
11-0151*	Anclaje de castillo de 20 x 15 cms. 4 var. # 4 y estribos del # 2 a.c. 20 cms. Hasta una profundidad de 50 cms., concreto f´c = 200 kg/cm2 incluye material y mano de obra.	PZA	25.93%	74.07%			100.00%
			3.370370	9.629630			13.000000
			$1,487.88	$4,251.10			$5,738.98
11-0160*	Cadena de desplante de concreto f'c=250 Kg/cm2, de 15x20 cm, armado con 6 varillas No.4 y estribos No. 2 a cada 25 cm, incluye cimbra común, acarreo de material 1ra. estación.	M		100.00%			100.00%
				31.530000			31.530000
				$27,838.78			$27,838.78
	Monto esta hoja:		**$340,115.50**	**$513,510.42**			**$853,625.92**
	Acumulado:		**$544,802.39**	**$877,991.05**	**$227,487.69**	**$1,294.52**	**$1,651,575.65**

ADMINISTRADOR UNICO: ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 10

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-016-2023 **Fecha:** 03/08/2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 14/08/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 11/11/2023

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
11-0221	Losa de concreto f´c= 250 kg/cm2 de 10 cms de espesor armada con var. No. 4 a cada 15 cm. En ambos sentidos, para paso peatonal, según planos estructurales incluye cimbrado, armado, colado y descimbrado, material y mano de obra.	M2			100.00%		100.00%
					26.800000		26.800000
					$76,899.12		$76,899.12
F-BARANDAL1	Suministro y colocación de barandal de tubo de acero negro de 1 1/2" con división de tubo de 1" con postes de 1 1/2" a cada metro soldado a placa de 1/2" de 15x15 cms. embutida en losa, incluye materiales, mano de obra, pintura, equipo y herramienta.	M			70.37%	29.63%	100.00%
					27.993330	11.786670	39.780000
					$66,441.89	$27,975.54	$94,417.43
	TOTAL Albañileria		**$340,115.50**	**$513,510.42**	**$143,341.01**	**$27,975.54**	
	ACUMULADO Albañileria		**$340,115.50**	**$853,625.92**	**$996,966.93**	**$1,024,942.47**	
	PORCENTAJE PERIODO Albañileria		**33.18%**	**50.10%**	**13.99%**	**2.73%**	
	PORCENTAJE ACUMULADO Albañileria		**33.18%**	**83.29%**	**97.27%**	**100.00%**	
	Instalaciones eléctricas y luminarias.						

	Monto esta hoja:			**$143,341.01**	**$27,975.54**	**$171,316.55**
ADMINISTRADOR UNICO: ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ	**Acumulado:**	**$544,802.39**	**$877,991.05**	**$370,828.70**	**$29,270.06**	**$1,822,892.20**

000123

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 10

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-016-2023 **Fecha:** 03/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 14/08/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 11/11/2023

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
REG-AUX	Registro auxiliar para alumbrado público de 50x60x65mts., de tabique rojo recocido 7x14x28 cms., con 14 cms. de espesor asentado y aplanado con mortero cemento arena 1:5 incluye: plantilla de concreto de 10 cms de espesor f´c=100kg/cm2, marco y contramarco de ángulo de 1 1/2"x3/16" concreto f´c=200kg/cm2 en tapa y fijación de marco, drén de grava de 20 cms de espesor, herramienta menor, materiales y mano de obra.	PZA		65.00% 5.200000 $18,483.19	35.00% 2.800000 $9,952.49		100.00% 8.000000 $28,435.68
TUB-PESA50	Suministro y tendido de tubo conduit pvc pesado 50 mm de diámetro incluye conexión, trazo, excavación, relleno, cama de arena, herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra.	M		65.00% 130.000000 $26,161.20	35.00% 70.000000 $14,086.80		100.00% 200.000000 $40,248.00
	TOTAL Instalaciones eléctricas y luminarias.			**$44,644.39**	**$24,039.29**		
	ACUMULADO Instalaciones eléctricas y luminarias.			**$44,644.39**	**$68,683.68**	**$68,683.68**	
	PORCENTAJE PERIODO Instalaciones eléctricas y luminarias.			**65.00%**	**35.00%**		
	PORCENTAJE ACUMULADO Instalaciones eléctricas y luminarias.			**65.00%**	**100.00%**	**100.00%**	
	Pavimentación.						
	Monto esta hoja:			**$44,644.39**	**$24,039.29**		**$68,683.68**
	Acumulado:		**$544,802.39**	**$922,635.44**	**$394,867.99**	**$29,270.06**	**$1,891,575.88**

ADMINISTRADOR UNICO: ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ

000124

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 10

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-016-2023 **Fecha:** 03/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 14/08/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 11/11/2023

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
4-0080	Excavación a mano en material tipo II-A, en seco y barreta de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad, depositando el producto de excavación a orilla de cepa, cualquier zona..	M3		63.64%	36.36%		100.00%
				40.950000	23.400000		64.350000
				$8,215.39	$4,694.51		$12,909.90
9-0138	Relleno de material inerte de banco compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.	M3		23.08%	76.92%		100.00%
				8.896150	29.653850		38.550000
				$4,439.09	$14,796.97		$19,236.06
32-0471	Guarnición de concreto simple de f´c= 200 kg/cm2 de 20x15x40 cm. de sección T.M.A. 3/4" Incluye cimbrado, descimbrado, materiales y mano de obra.	ML			100.00%		100.00%
					424.350000		424.350000
					$225,253.47		$225,253.47
32-0475A	Pavimento premezclado F'c= 300 Kg/cm2, T.A.M. 3/4" de 20 cm. de espesor resistencia normal, acabado a regla incluye junta constructiva con chaflan de 1/2", en cada junta fria (al termino del colado) se procederá a colocar 8 conectores con varilla de 1/2" a cada 60 cms. 30-30 cms., fibra microsintetica, curado con curacreto, vibrado, acarreos de materiales a 1ra. estación.	M2			100.00%		100.00%
					1,471.350000		1,471.350000
					$1,437,435.38		$1,437,435.38
		Monto esta hoja:		**$12,654.48**	**$1,682,180.33**		**$1,694,834.81**
		Acumulado:	**$544,802.39**	**$935,289.92**	**$2,077,048.32**	**$29,270.06**	**$3,586,410.69**

ADMINISTRADOR UNICO: ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ

000125

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 10

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-016-2023 **Fecha:** 03/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 14/08/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 11/11/2023

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
SUMPOL	Suministro y colocación de hule negro calibre 600 para evitar deshidratación del concreto, incluye materiales, herramienta y mano de obra.	M2			100.00%		100.00%
					1,471.350000		1,471.350000
					$83,896.38		$83,896.38
CORTE01	Corte de juntas en piso de concreto con cortadora manual de disco diamantado, incluye limpieza de la junta.	ML				100.00%	100.00%
						522.000000	522.000000
						$19,000.80	$19,000.80
32-0484	Calafateo en losas y guarniciones a base de asfalto oxidado incluye material, desperdicios, acarreos a primera estación y mano de obra.	ML				100.00%	100.00%
						522.000000	522.000000
						$14,892.66	$14,892.66
22-0333*	Pintura esmalte amarillo trafico en guarniciones con desarrollo de 30.0 cm., incluye material mano de obra y acarreos a primera estación.	ML				100.00%	100.00%
						424.350000	424.350000
						$38,887.43	$38,887.43
32-0468	Banqueta de concreto hidráulico hecho en obra de f´c=150 kg/cm2 de 10 cms de espesor, T.M.A. 3/4", incluye curado, cimbrado, descimbrado, material y mano de obra.	M2			21.43%	78.57%	100.00%
					119.280000	437.360000	556.640000
					$64,265.68	$235,640.82	$299,906.50
		Monto esta hoja:			**$148,162.06**	**$308,421.71**	**$456,583.77**
		Acumulado:	**$544,802.39**	**$935,289.92**	**$2,225,210.38**	**$337,691.77**	**$4,042,994.46**

ADMINISTRADOR UNICO: ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ

000126

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 10

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-016-2023 **Fecha:** 03/08/2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 14/08/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 11/11/2023

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
	TOTAL Pavimentación.			**$12,654.48**	**$1,830,342.39**	**$308,421.71**	
	ACUMULADO Pavimentación.			**$12,654.48**	**$1,842,996.87**	**$2,151,418.58**	
	PORCENTAJE PERIODO Pavimentación.			**0.59%**	**85.08%**	**14.34%**	
	PORCENTAJE ACUMULADO Pavimentación.			**0.59%**	**85.66%**	**100.00%**	
	Acarreos y limpiezas.						
CARGA	Carga mecánica con uso de retroexcavadora y acarreo en camión de volteo (6M3) de material producto de excavación y/o demolición a tiro libre.	M3			21.43%	78.57%	100.00%
					209.922850	769.717150	979.640000
					$48,141.61	$176,519.23	$224,660.84
33-0528	Limpieza ultima general de obra para entrega con acopio y acarreo horizontal a 20 mts.	M2				100.00%	100.00%
						2,692.810000	2,692.810000
						$43,058.03	$43,058.03
	TOTAL Acarreos y limpiezas.				**$48,141.61**	**$219,577.26**	
	ACUMULADO Acarreos y limpiezas.				**$48,141.61**	**$267,718.87**	
	PORCENTAJE PERIODO Acarreos y limpiezas.				**17.98%**	**82.02%**	
	PORCENTAJE ACUMULADO Acarreos y limpiezas.				**17.98%**	**100.00%**	

Monto esta hoja:			**$48,141.61**	**$219,577.26**	**$267,718.87**
Acumulado:	**$544,802.39**	**$935,289.92**	**$2,273,351.99**	**$557,269.03**	**$4,310,713.33**

ADMINISTRADOR UNICO: ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ

000127

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 10

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-016-2023 **Fecha:** 03/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 14/08/2023
Fin obra: 11/11/2023

Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
	TOTAL Pavimentación integral de calle Felipe II, Fraccionamiento Farallón del Obispo		**$544,802.39**	**$935,289.92**	**$2,273,351.99**	**$557,269.03**	
	ACUMULADO Pavimentación integral de calle Felipe II, Fraccionamiento Farallón del Obispo		**$544,802.39**	**$1,480,092.31**	**$3,753,444.30**	**$4,310,713.33**	
	PORCENTAJE PERIODO Pavimentación integral de calle Felipe II, Fraccionamiento Farallón del Obispo		**12.64%**	**21.70%**	**52.74%**	**12.93%**	
	PORCENTAJE ACUMULADO Pavimentación integral de calle Felipe II, Fraccionamiento Farallón del Obispo		**12.64%**	**34.34%**	**87.07%**	**100.00%**	

Monto esta hoja:	**$544,802.39**	**$935,289.92**	**$2,273,351.99**	**$557,269.03**	**$4,310,713.33**
Acumulado:					

ADMINISTRADOR UNICO: ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ

000128

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 10

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-016-2023 **Fecha:** 03/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 14/08/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 11/11/2023

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:			**$544,802.39**	**$935,289.92**	**$2,273,351.99**	**$557,269.03**	
ACUMULADO:			**$544,802.39**	**$1,480,092.31**	**$3,753,444.30**	**$4,310,713.33**	
PORCENTAJE PERIODO:			**12.64%**	**21.70%**	**52.74%**	**12.93%**	
PORCENTAJE ACUMULADO:			**12.64%**	**34.34%**	**87.07%**	**100.00%**	

000129

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. **41066004-016-2023.**
REFERENTE A LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**

000130

AE-11 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA S.D.U.O.P., PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

A MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS;

B MANO DE OBRA;

C MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS; Y

D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01 CEL. 744 2354717 / 744 4490912 E-MAIL: imexa@telmexmail.com, gno_0301@hotmail.com

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 11 a

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-016-2023 **Fecha:** 03/08/2023 **Duración:** 90 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Inicio obra: 14/08/2023 **Fin obra:** 11/11/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Código	Descripción	Unidad	Costo	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
1.	ALAMBRE RECOCIDO	KG	$38.00			0.27%	0.16%	0.43%
						144.913673	85.909969	230.823642
						$5,506.72	$3,264.58	$8,771.30
3.	VARILLA DE 3/8" 9.5 MM	KG	$28.36	0.07%		0.01%	0.01%	0.09%
				53.856200		9.237800	3.889600	66.983600
				$1,527.36		$261.98	$110.31	$1,899.65
7018	SOLDADURA ELECTRODO 7018	KG	$137.00			0.05%	0.02%	0.07%
						6.998333	2.946667	9.945000
						$958.78	$403.69	$1,362.47
AGUA	AGUA (MANEJO)	M3	$50.80	0.02%	0.27%	0.65%	0.29%	1.23%
				9.830839	107.769042	259.687165	116.706056	493.993103
				$499.41	$5,474.67	$13,192.11	$5,928.66	$25,094.85
ARENA	ARENA	M3	$250.00	0.62%	0.83%	0.32%	0.25%	2.03%
				50.761742	67.761026	26.516534	20.665260	165.704562
				$12,690.44	$16,940.26	$6,629.13	$5,166.31	$41,426.14
CAJA-BANQ	BOTA PARA LLAVE	PZA	$750.00		0.02%	0.09%		0.11%
					0.600000	2.400000		3.000000
					$450.00	$1,800.00		$2,250.00

ADMINISTRADOR UNICO: ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ	**Monto esta hoja:**	**$14,717.21**	**$22,864.93**	**$28,348.72**	**$14,873.55**	**$80,804.41**
	Acumulado:	**$14,717.21**	**$22,864.93**	**$28,348.72**	**$14,873.55**	**$80,804.41**

0001131

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 11 a

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-016-2023 **Fecha:** 03/08/2023 **Duración:** 90 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Inicio obra: 14/08/2023 **Fin obra:** 11/11/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Código	Descripción	Unidad	Costo	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
CAL	CALHIDRA	TON	$3,200.00	0.17% 1.095974 $3,507.12				0.17% 1.095974 $3,507.12
CLAVOS	CLAVOS DE 2 A 4 "	KG	$65.00			0.14% 43.967276 $2,857.87	0.05% 14.910149 $969.16	0.19% 58.877426 $3,827.03
CO06	PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 BCO. Y COLS. REG.	LT	$285.00				0.67% 47.739375 $13,605.72	0.67% 47.739375 $13,605.72
CO08	PRIMARIO ANTICORROSIVO	LT	$198.00			0.07% 6.998333 $1,385.67	0.03% 2.946667 $583.44	0.10% 9.945000 $1,969.11
DUELA	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25"	PZA	$30.00	0.12% 80.784300 $2,423.53				0.12% 80.784300 $2,423.53
GRAVA	GRAVA	M3	$666.67		0.00% 0.048686 $32.46	1.07% 32.716429 $21,811.06	1.05% 32.145960 $21,430.75	2.12% 64.911075 $43,274.27

ADMINISTRADOR UNICO: ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ	**Monto esta hoja:**	**$5,930.65**	**$32.46**	**$26,054.60**	**$36,589.07**	**$68,606.78**
	Acumulado:	**$20,647.86**	**$22,897.39**	**$54,403.32**	**$51,462.62**	**$149,411.19**

000132

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 11 a

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-016-2023 **Fecha:** 03/08/2023 **Duración:** 90 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Inicio obra: 14/08/2023 **Fin obra:** 11/11/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Código	Descripción	Unidad	Costo	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
MAABR-4	ABRAZADERA DE 4 PULG	PZA	$298.00		0.04%	0.00%		0.04%
					2.850000	0.150000		3.000000
					$849.30	$44.70		$894.00
MAAC0001	ALAMBRE RECOCIDO	KG	$28.50	0.00%	0.02%	0.02%		0.03%
				0.500837	10.801679	12.730000		24.032516
				$14.27	$307.85	$362.81		$684.93
MAAC0002	ALAMBRON # 2	KG	$35.00	0.01%	0.14%			0.14%
				3.707407	79.958593			83.666000
				$129.76	$2,798.55			$2,928.31
MAAC0003	ACERO DEL # 3 HASTA 6	KG	$30.91	0.02%	0.35%			0.37%
				10.761593	232.097987			242.859580
				$332.64	$7,174.15			$7,506.79
MAAC0004	ACERO DE REFUERZO DEL 3 AL 8 FY=4200 KG/	KG	$34.00		0.01%	0.05%		0.06%
					3.428572	32.571428		36.000000
					$116.57	$1,107.43		$1,224.00
MAAC0008	CLAVOS DE 2"	KG	$55.00	0.00%	0.00%			0.00%
				0.033704	0.726896			0.760600
				$1.85	$39.98			$41.83

ADMINISTRADOR UNICO: ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ	**Monto esta hoja:**	**$478.52**	**$11,286.40**	**$1,514.94**		**$13,279.86**
	Acumulado:	**$21,126.38**	**$34,183.79**	**$55,918.26**	**$51,462.62**	**$162,691.05**

000133

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 11 a

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-016-2023 **Fecha:** 03/08/2023 **Duración:** 90 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Inicio obra: 14/08/2023 **Fin obra:** 11/11/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Código	Descripción	Unidad	Costo	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
MAACC-CPVC	ACCESORIOS DE CPVC	PZA	$188.00		0.03%	0.00%		0.03%
					2.850000	0.150000		3.000000
					$535.80	$28.20		$564.00
MAACER4	ACERO 4	KG	$30.91			1.15%		1.15%
						760.048000		760.048000
						$23,493.08		$23,493.08
MAADAP-M1/2	ADAPTADOR MACHO BRONCE 1/2	PZA	$135.00		0.02%	0.00%		0.02%
					2.850000	0.150000		3.000000
					$384.75	$20.25		$405.00
MAAG0001	CEMENTO GRIS	TON	$3,880.00	2.36%	3.16%	6.41%	3.14%	15.07%
				12.391857	16.595385	33.719314	16.532208	79.238764
				$48,080.41	$64,390.09	$130,830.94	$64,144.97	$307,446.41
MAAG0008	AGUA (MANEJO)	M3	$40.00	0.00%	0.00%			0.00%
				0.009606	0.207165			0.216771
				$0.38	$8.29			$8.67
MABARR3.5	BARROTE PINO 3RA 1.5X3.5	PZA	$75.00			0.07%		0.07%
						19.564000		19.564000
						$1,467.30		$1,467.30

ADMINISTRADOR UNICO: ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ	**Monto esta hoja:**	**$48,080.79**	**$65,318.93**	**$155,839.77**	**$64,144.97**	**$333,384.46**
	Acumulado:	**$69,207.17**	**$99,502.72**	**$211,758.03**	**$115,607.59**	**$496,075.51**

0001134

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 11 a

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-016-2023 **Fecha:** 03/08/2023 **Duración:** 90 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Inicio obra: 14/08/2023 **Fin obra:** 11/11/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Código	Descripción	Unidad	Costo	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
MABROCAL-POL	BROCAL DE POLIETILENO	PZA	$2,980.00	0.04%	0.25%			0.29%
				0.285714	1.714286			2.000000
				$851.43	$5,108.57			$5,960.00
MACODO-PVC6	CODO PVC 6 PULG DIAM	PZA	$255.00		0.02%	0.01%		0.02%
					1.523810	0.476190		2.000000
					$388.57	$121.43		$510.00
MACON-1/2	CONECTOR CON VARILLA 1/2 DE 60 CM	PZA	$78.00			2.25%		2.25%
						588.540000		588.540000
						$45,906.12		$45,906.12
MACONCE-PRE300	CONCRETO PREMEZCLADO FC= 300 KG/CM2	M3	$2,320.00			34.29%		34.29%
						301.626750		301.626750
						$699,774.06		$699,774.06
MACON-PRE250	CONCRETO PREMEZCLADO FC= 250 KG/CM2	M3	$2,020.00			0.28%		0.28%
						2.814000		2.814000
						$5,684.28		$5,684.28
MACURA-C	CURACRETO	LT	$49.00			0.88%		0.88%
						367.837500		367.837500
						$18,024.04		$18,024.04

ADMINISTRADOR UNICO: ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ	**Monto esta hoja:**	**$851.43**	**$5,497.14**	**$769,509.93**		**$775,858.50**
	Acumulado:	**$70,058.60**	**$104,999.86**	**$981,267.96**	**$115,607.59**	**$1,271,934.01**

000135

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 11 a

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-016-2023 **Fecha:** 03/08/2023 **Duración:** 90 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Inicio obra: 14/08/2023 **Fin obra:** 11/11/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Código	Descripción	Unidad	Costo	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
MADIESEL	DIESEL	LTO	$21.20	0.00%	0.00%	0.01%		0.01%
				0.168519	3.729720	8.944762		12.843000
				$3.57	$79.07	$189.63		$272.27
MAEST-009	ESTOPA BLANCA	KG	$81.00		0.00%	0.00%		0.00%
					0.057143	0.042857		0.100000
					$4.63	$3.47		$8.10
MAFIBT-SIN	FIBRA MICRO SINTETICA	KG	$220.00			1.90%		1.90%
						176.562000		176.562000
						$38,843.64		$38,843.64
MAGRA-RAY	GRAVA Y/O RAYUELA PARA FILTRO	M3	$490.00		1.55%			1.55%
					64.440000			64.440000
					$31,575.60			$31,575.60
MAGRAVA	GRAVA PARA REGISTRO	M3	$450.00		0.02%	0.01%		0.04%
					1.040000	0.560000		1.600000
					$468.00	$252.00		$720.00
MAHE0007	TAPA REG. ELECT. 60X60 C/MRCO ANG. Y LAM	PZA	$823.00		0.21%	0.11%		0.32%
					5.200000	2.800000		8.000000
					$4,279.60	$2,304.40		$6,584.00

ADMINISTRADOR UNICO: ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ	**Monto esta hoja:**	**$3.57**	**$36,406.90**	**$41,593.14**		**$78,003.61**
	Acumulado:	**$70,062.17**	**$141,406.76**	**$1,022,861.10**	**$115,607.59**	**$1,349,937.62**

000136

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 11 a

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-016-2023 **Fecha:** 03/08/2023 **Duración:** 90 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Inicio obra: 14/08/2023 **Fin obra:** 11/11/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Código	Descripción	Unidad	Costo	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
MAHILO	CARRETE DE HILO	PZA	$50.00	0.05%				0.05%
				21.542480				21.542480
				$1,077.12				$1,077.12
MAHULE-N	HULE NEGRO CAL 600	M2	$35.00			2.70%		2.70%
						1574.344500		1574.344500
						$55,102.06		$55,102.06
MALA0180	ALAMBRE RECOCIDO No. 18	KG	$30.00		0.00%	0.00%		0.00%
					0.019048	0.180952		0.200000
					$0.57	$5.43		$6.00
MALIJ-TUB12	LIJA PARA TUBERIA	ML	$22.50		0.00%	0.00%		0.00%
					0.142857	0.107143		0.250000
					$3.22	$2.41		$5.63
MALLAVE-R1/2	LLAVE CUADRO ROSCABLE1/2PULG	PZA	$225.00		0.01%	0.03%		0.03%
					0.600000	2.400000		3.000000
					$135.00	$540.00		$675.00
MALLAV-INS1/2	LLAVE DE INSERCION 1/2"	PZA	$90.00		0.01%	0.00%		0.01%
					2.850000	0.150000		3.000000
					$256.50	$13.50		$270.00

ADMINISTRADOR UNICO: ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ	**Monto esta hoja:**	**$1,077.12**	**$395.29**	**$55,663.40**		**$57,135.81**
	Acumulado:	**$71,139.29**	**$141,802.05**	**$1,078,524.50**	**$115,607.59**	**$1,407,073.43**

0001137

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO
AE - 11 a

Concurso No: 41066004-016-2023 **Fecha:** 03/08/2023 **Duración:** 90 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Inicio obra:** 14/08/2023 **Fin obra:** 11/11/2023

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Código	Descripción	Unidad	Costo	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
MALLAV-NA1/2	LLAVE NARIZ BRONCE 1/2"	PZA	$75.00		0.01%	0.00%		0.01%
					2.850000	0.150000		3.000000
					$213.75	$11.25		$225.00
MAMA0001	MADERA DE PINO	PT	$20.00	0.00%	0.01%	0.16%	0.06%	0.24%
				0.674074	14.918878	165.235047	65.604000	246.432000
				$13.48	$298.38	$3,304.70	$1,312.08	$4,928.64
MAMA0002	CHAFLAN DE 1/2" X 1/2"	ML	$25.00			0.00%		0.00%
						3.350000		3.350000
						$83.75		$83.75
MAMA0007	TRIPLAY DE PINO DE 16 MM.	PZA	$775.00	0.00%	0.09%	0.12%		0.22%
				0.112233	2.420565	3.216000		5.748798
				$86.98	$1,875.94	$2,492.40		$4,455.32
MAPE0001	ARENA DE LA REGION	M3	$400.00	0.00%	0.26%	0.14%		0.40%
				0.023508	13.507010	7.000000		20.530519
				$9.40	$5,402.81	$2,800.00		$8,212.21
MAPE0002	GRAVA 1" A 3/4"	M3	$390.00	0.00%	0.01%			0.01%
				0.032356	0.697820			0.730176
				$12.62	$272.15			$284.77

ADMINISTRADOR UNICO: ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ	**Monto esta hoja:**	**$122.48**	**$8,063.03**	**$8,692.10**	**$1,312.08**	**$18,189.69**
	Acumulado:	**$71,261.77**	**$149,865.08**	**$1,087,216.60**	**$116,919.67**	**$1,425,263.12**

0001138

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 11 a

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-016-2023 **Fecha:** 03/08/2023 **Duración:** 90 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Inicio obra: 14/08/2023 **Fin obra:** 11/11/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Código	Descripción	Unidad	Costo	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
MAPEG-PVC	PEGAMENTO PVC	PZA	$71.00		0.04%	0.00%		0.04%
					10.902857	0.447143		11.350000
					$774.10	$31.75		$805.85
MAPIED-BRA	PIEDRA BRAZA DE LA REGION	M3	$749.00	6.09%	7.61%			13.70%
				165.911998	207.390002			373.302000
				$124,268.09	$155,335.11			$279,603.20
MAPIN-ESM	PINTURA ESMALTE MCA COMEX O SIMILAR	LT	$285.00			0.09%	0.04%	0.12%
						6.298500	2.652000	8.950500
						$1,795.07	$755.82	$2,550.89
MAPLAC	PLACA 15X15 CM	KG	$40.00			0.12%	0.05%	0.18%
						62.985000	26.520000	89.505000
						$2,519.40	$1,060.80	$3,580.20
MAPLANN	PLANO	PLAN	$12,500.00	0.42%				0.42%
				0.683974				0.683974
				$8,549.67				$8,549.67
MAPOLIN	POLIN DE 3RA VARIAS MEDIDAS	PT	$17.70			0.07%		0.07%
						83.267600		83.267600
						$1,473.84		$1,473.84

ADMINISTRADOR UNICO: ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ	**Monto esta hoja:**	**$132,817.76**	**$156,109.21**	**$5,820.06**	**$1,816.62**	**$296,563.65**
	Acumulado:	**$204,079.53**	**$305,974.29**	**$1,093,036.66**	**$118,736.29**	**$1,721,826.77**

0001139

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO
AE - 11 a

Concurso No: 41066004-016-2023 **Fecha:** 03/08/2023 **Duración:** 90 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Inicio obra:** 14/08/2023 **Fin obra:** 11/11/2023

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Código	Descripción	Unidad	Costo	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
MAPRUEBA-H	PRUEBA HIDROSTATICA	PRUE	$450.00		0.03% 1.500000 $675.00			0.03% 1.500000 $675.00
MASFALT	ASFALTO OXIDADO	LT	$32.00				0.31% 195.750000 $6,264.00	0.31% 195.750000 $6,264.00
MATABICON	TABICON	PZA	$12.00		0.04% 60.000000 $720.00			0.04% 60.000000 $720.00
MATABIQUE	TABIQUE COMUN BARRO R.R. DE 7x14x28 CM.	PZA	$5.00		0.15% 610.857150 $3,054.29	0.39% 1609.142850 $8,045.71		0.54% 2220.000000 $11,100.00
MATABL	TABLA DE 3RA	PZA	$185.00			1.17% 129.292800 $23,919.17	0.48% 52.483200 $9,709.39	1.65% 181.776000 $33,628.56
MATA-REG	TAPADERA DE REGISTRO CON ANGULO Y CONCRETO	PZA	$750.00		0.07% 2.000000 $1,500.00			0.07% 2.000000 $1,500.00

ADMINISTRADOR UNICO: ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ	**Monto esta hoja:**	**$5,949.29**	**$31,964.88**	**$15,973.39**	**$53,887.56**
	Acumulado: **$204,079.53**	**$311,923.58**	**$1,125,001.54**	**$134,709.68**	**$1,775,714.33**

000140

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 11 a

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-016-2023 **Fecha:** 03/08/2023 **Duración:** 90 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Inicio obra: 14/08/2023 **Fin obra:** 11/11/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Código	Descripción	Unidad	Costo	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
MATBANCO	MATERIAL DE BANCO	M3	$275.00		4.51%	3.99%	0.04%	8.54%
					334.425235	296.188408	3.242857	633.856500
					$91,966.94	$81,451.81	$891.79	$174,310.54
MATUB-1	TUBO ACERO 1 PULG	PZA	$430.00			0.50%	0.21%	0.71%
						23.794333	10.018667	33.813000
						$10,231.56	$4,308.03	$14,539.59
MATUB-3	TUBO PVC 3 PULG DIAM CED RD26	ML	$275.00		0.72%			0.72%
					53.500000			53.500000
					$14,712.50			$14,712.50
MATUB-8PVC	TUBO PVC SANITARIO 8 PULG	ML	$450.00		1.01%			1.01%
					45.796000			45.796000
					$20,608.20			$20,608.20
MATUB-ACE	TUBO DE ACERO 1 1/2 PULG	PZA	$850.00			0.58%	0.25%	0.83%
						13.996667	5.893333	19.890000
						$11,897.17	$5,009.33	$16,906.50
MATUB-CON50	TUBO CONDUIT PVC PESADO 50 MM	ML	$32.00		0.22%	0.12%		0.34%
					139.100000	74.900000		214.000000
					$4,451.20	$2,396.80		$6,848.00

ADMINISTRADOR UNICO: ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ	**Monto esta hoja:**	**$131,738.84**	**$105,977.34**	**$10,209.15**	**$247,925.33**
	Acumulado: **$204,079.53**	**$443,662.42**	**$1,230,978.88**	**$144,918.83**	**$2,023,639.66**

0001141

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 11 a

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-016-2023 **Fecha:** 03/08/2023 **Duración:** 90 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Inicio obra: 14/08/2023 **Fin obra:** 11/11/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Código	Descripción	Unidad	Costo	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
MATUB-CPVC1/2	TUBERIA DE CPVC 1/2 PULG	ML	$44.00		0.04% 17.100000 $752.40	0.00% 0.900000 $39.60		0.04% 18.000000 $792.00
MATUB-PVC4	TUBO PVC 4"	ML	$49.00		0.06% 26.780000 $1,312.22			0.06% 26.780000 $1,312.22
MATUB-PVC-6	TUBO PVC SANITARIO 6 PULG	ML	$295.00		0.07% 4.585714 $1,352.79	0.21% 14.674286 $4,328.91		0.28% 19.260000 $5,681.70
MAUNI-6	UNION SERVICIO PVC 6 PULG	PZA	$380.00		0.02% 1.142857 $434.29	0.02% 0.857143 $325.71		0.04% 2.000000 $760.00
MAVAL-ESF13	VALVULA ESFERA CPVC 13MM	PZA	$160.00		0.01% 1.800000 $288.00	0.01% 1.200000 $192.00		0.02% 3.000000 $480.00
MCLA0021	CLAVO	KG	$45.00		0.00% 0.019048 $0.86	0.00% 0.180952 $8.14		0.00% 0.200000 $9.00

ADMINISTRADOR UNICO: ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ	**Monto esta hoja:**	**$4,140.56**	**$4,894.36**		**$9,034.92**
	Acumulado:	**$204,079.53**	**$447,802.98**	**$1,235,873.24**	**$144,918.83**	**$2,032,674.58**

0001142

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 11 a

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-016-2023 **Fecha:** 03/08/2023 **Duración:** 90 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Inicio obra: 14/08/2023 **Fin obra:** 11/11/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Código	Descripción	Unidad	Costo	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
SEG-CORT	SEGUETA PARA CORTE	PZA	$15.94		0.00%	0.00%		0.00%
					0.057143	0.042857		0.100000
					$0.91	$0.68		$1.59
THINNER	THINNER STANDARD	LT	$77.00			0.05%	0.34%	0.40%
						13.996667	90.763333	104.760000
						$1,077.74	$6,988.78	$8,066.52

ADMINISTRADOR UNICO: ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ	**Monto esta hoja:**		**$0.91**	**$1,078.42**	**$6,988.78**	**$8,068.11**
	Acumulado:	**$204,079.53**	**$447,803.89**	**$1,236,951.66**	**$151,907.61**	**$2,040,742.69**

000143

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 11 a

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-016-2023 **Fecha:** 03/08/2023 **Duración:** 90 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Inicio obra: 14/08/2023 **Fin obra:** 11/11/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Código	Descripción	Unidad	Costo	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:				**$204,079.53**	**$447,803.89**	**$1,236,951.66**	**$151,907.61**	
ACUMULADO:				**$204,079.53**	**$651,883.42**	**$1,888,835.08**	**$2,040,742.69**	
PORCENTAJE PERIODO:				**10.00%**	**21.94%**	**60.61%**	**7.44%**	
PORCENTAJE ACUMULADO:				**10.00%**	**31.94%**	**92.56%**	**100.00%**	
TOTAL CANTIDAD MOSTRADA:				**413.17**	**2,161.21**	**6,931.02**	**797.32**	
ACUMULADA:				**413.17**	**2,574.38**	**9,505.40**	**10,302.72**	
PORCENTAJE PERIODO:				**4.01%**	**20.98%**	**67.27%**	**7.74%**	
PORCENTAJE ACUMULADO:				**4.01%**	**24.99%**	**92.26%**	**100.00%**	

000144

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-016-2023 **Fecha:** 03/08/2023 **Duración:** 90 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

DOCUMENTO
AE - 11 b

Lugar:
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ; Guerrero **Inicio obra:** 14/08/2023 **Fin obra:** 11/11/2023

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MANO DE OBRA

Código	Descripción	Áreadetrabajo	Unidad	SalarioReal	14/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	Total
MO01	PEON	A7	JOR	$444.84	5.04%	11.75%	29.36%	7.56%	53.71%
					89.202268	208.180508	520.199265	133.920001	951.502042
					$39,680.74	$92,607.02	$231,405.44	$59,572.97	$423,266.17
MO02	OFIC. ALBAÑIL	A7	JOR	$836.56	5.33%	6.60%	15.10%	5.16%	32.19%
					50.253397	62.184585	142.230711	48.595556	303.264249
					$42,039.98	$52,021.14	$118,984.52	$40,653.10	$253,698.74
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	A4	JOR	$679.86	0.00%	0.48%	0.07%		0.56%
					0.057143	5.604889	0.840825		6.502857
					$38.85	$3,810.54	$571.64		$4,421.03
MO082	CABO DE OFICIOS	A7	JOR	$914.91	0.79%	1.65%	2.66%	1.29%	6.39%
					6.775529	14.195320	22.948518	11.088498	55.007865
					$6,199.00	$12,987.44	$20,995.83	$10,144.98	$50,327.25
MO083	OFIC. PLOMERO	A4	JOR	$601.54	0.00%	0.43%	0.06%		0.50%
					0.057143	5.604889	0.840825		6.502857
					$34.37	$3,371.57	$505.79		$3,911.73
MOAY0001	AYUDANTE GENERAL	A5	JOR	$601.54		0.00%	2.17%	1.50%	3.67%
						0.012156	28.445869	19.627201	48.085225
						$7.31	$17,111.33	$11,806.55	$28,925.19
MO-ELEC	OFIC. ELECTRICO	A6	JOR	$640.71		0.26%	0.14%		0.41%
						3.250000	1.750000		5.000000
						$2,082.31	$1,121.24		$3,203.55

ADMINISTRADOR UNICO: ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ

Monto esta hoja:	**$87,992.94**	**$166,887.33**	**$390,695.79**	**$122,177.60**	**$767,753.66**
Acumulado:	**$87,992.94**	**$166,887.33**	**$390,695.79**	**$122,177.60**	**$767,753.66**

000145

IMEXA CONSTRUCTORAS, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-016-2023 **Fecha:** 03/08/2023 **Duración:** 90 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

DOCUMENTO
AE - 11 b

Lugar:
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ; Guerrero **Inicio obra:** 14/08/2023 **Fin obra:** 11/11/2023

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MANO DE OBRA

Código	Descripción	Áreadetrabajo	Unidad	SalarioReal	14/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	Total
MOF-H	OFIC. HERRERO	A5	JOR	$640.71			0.70%	0.29%	1.00%
							8.613333	3.626667	12.240000
							$5,518.65	$2,323.64	$7,842.29
MOFI0001	OFIC. FIERRERO	A5	JOR	$640.71			0.66%		0.66%
							8.121212		8.121212
							$5,203.34		$5,203.34
MOF-P	OFIC. PINTOR	A7	JOR	$640.71			0.25%	0.68%	0.92%
							3.026306	8.346734	11.373041
							$1,938.98	$5,347.84	$7,286.82

000146

ADMINISTRADOR UNICO: ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ

Monto esta hoja:			**$12,660.97**	**$7,671.48**	**$20,332.45**
Acumulado:	**$87,992.94**	**$166,887.33**	**$403,356.76**	**$129,849.08**	**$788,086.11**

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-016-2023 **Fecha:** 03/08/2023 **Duración:** 90 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

DOCUMENTO
AE - 11 b

Lugar:
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ; Guerrero **Inicio obra:** 14/08/2023 **Fin obra:** 11/11/2023

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MANO DE OBRA

Código	Descripción	Áreadetrabajo	Unidad	SalarioReal	14/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	Total
MOF-H	OFIC. HERRERO	A5	JOR	$640.71			0.70%	0.29%	1.00%
							8.613333	3.626667	12.240000
							$5,518.65	$2,323.64	$7,842.29
MOFI0001	OFIC. FIERRERO	A5	JOR	$640.71			0.66%		0.66%
							8.121212		8.121212
							$5,203.34		$5,203.34
MOF-P	OFIC. PINTOR	A7	JOR	$640.71			0.25%	0.68%	0.92%
							3.026306	8.346734	11.373041
							$1,938.98	$5,347.84	$7,286.82

000147

ADMINISTRADOR UNICO: ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ	**Monto esta hoja:**			**$12,660.97**	**$7,671.48**	**$20,332.45**
	Acumulado:	**$87,992.94**	**$166,887.33**	**$403,356.76**	**$129,849.08**	**$788,086.11**

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO
AE - 11 c

Concurso No: 41066004-016-2023 **Fecha:** 03/08/2023 **Duracion:** 90 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Inicio obra: 14/08/2023 **Fin obra:** 11/11/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

PROGRAMA DE EROGACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

Código	Descripción	Undad	Costo por Hora	Capacidad	Potencia	Horas por turno	No. De Máquinas	Días Efectivos	Horas Efectivas	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
EQBAILAR	BAILARINA DE 4.5 HP	HOR	$100.33		8	8	1	8.00	64.01360000		0.83%	0.53%		1.37%
											38.964800	25.048800		64.013600
											$3,909.34	$2,513.14		$6,422.48
EQCORTAP	CORTADORA DE PISO	HOR	$123.01		13	8	1	4.24	33.93000000				0.89%	0.89%
													33.930000	33.930000
													$4,173.73	$4,173.73
EQCV0001	CAMION VOLTEO DE 6 M3	HORA	$804.00		170	8	1	31.13	249.05127254	12.16%	3.65%	6.12%	20.64%	42.56%
										71.162187	21.343733	35.794990	120.750362	249.051273
										$57,214.40	$17,160.36	$28,779.17	$97,083.29	$200,237.22
EQECORTE	EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO	HOR	$1,176.92			8	1	0.17	1.39230000			0.25%	0.10%	0.35%
												0.979767	0.412533	1.392300
												$1,153.11	$485.52	$1,638.63
EQMOTO14H	MOTONIVELADORA CAT. 14H DE 215 HP	HOR	$1,521.63		215	8	1	4.45	35.59860000		7.01%	4.51%		11.51%
											21.668713	13.929887		35.598600
											$32,971.77	$21,196.13		$54,167.90
EQPIPA	CAMION PIPA DE 9 M3	HOR	$717.78		130	8	1	2.75	21.97738742		1.58%	1.77%	0.00%	3.35%
											10.361459	11.583951	0.031977	21.977387
											$7,437.25	$8,314.73	$22.95	$15,774.93

ADMINISTRADOR UNICO: ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ	**Monto esta hoja:**	**$57,214.40**	**$61,478.72**	**$61,956.28**	**$101,765.49**	**$282,414.89**
	Acumulado:	**$57,214.40**	**$61,478.72**	**$61,956.28**	**$101,765.49**	**$282,414.89**

000148

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO
AE - 11 c

Concurso No: 41066004-016-2023 **Fecha:** 03/08/2023 **Duracion:** 90 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Inicio obra: 14/08/2023 **Fin obra:** 11/11/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

PROGRAMA DE EROGACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

Código	Descripción	Undad	Costo por Hora	Capacidad	Potencia	Horas por turno	No. De Máquinas	Días Efectivos	Horas Efectivas	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
EQPLAN	PLANTA DE SOLDAR MILLER	HOR	$67.36			8	1	2.49	19.89000000			0.20%	0.08%	0.28%
												13.996667	5.893333	19.890000
												$942.82	$396.97	$1,339.79
EQRE0001	REVOLVEDORA DE 1 SACO	HORA	$71.34		8	8	1	0.07	0.57045000	0.00%	0.01%			0.01%
										0.025278	0.545172			0.570450
										$1.80	$38.90			$40.70
EQRETROEXCAVA	RETRO EXCAVADORA CAT 90 HP	HOR	$540.44		90	8	1	35.54	284.35401070	13.62%	7.79%	2.41%	8.84%	32.67%
										118.579743	67.810268	20.992285	76.971715	284.354011
										$64,085.24	$36,647.38	$11,345.07	$41,598.59	$153,676.28
EQTRAN	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	HOR	$11.48			8	1	40.39	323.13720000	0.79%				0.79%
										323.137200				323.137200
										$3,709.62				$3,709.62
EQVAP	VIBROCOMPACTADOR VAP 70	HOR	$795.89		155	8	1	1.10	8.82810000		0.91%	0.58%		1.49%
											5.373626	3.454474		8.828100
											$4,276.82	$2,749.38		$7,026.20
EQVG0002	VIBRADOR DE GASOLINA	HORA	$47.62		4	8	1	0.04	0.28522500	0.00%	0.00%			0.00%
										0.012639	0.272586			0.285225
										$0.60	$12.98			$13.58

ADMINISTRADOR UNICO: ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ	**Monto esta hoja:**	**$67,797.26**	**$40,976.08**	**$15,037.27**	**$41,995.56**	**$165,806.17**
	Acumulado:	**$125,011.66**	**$102,454.80**	**$76,993.55**	**$143,761.05**	**$448,221.06**

000149

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO
AE - 11 c

Concurso No: 41066004-016-2023 **Fecha:** 03/08/2023 **Duracion:** 90 dias naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Inicio obra: 14/08/2023 **Fin obra:** 11/11/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

PROGRAMA DE EROGACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

Código	Descripción	Undad	Costo por Hora	Capacidad	Potencia	Horas por turno	No. De Máquinas	Días Efectivos	Horas Efectivas	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
EQVIB	VIBRADOR CONCRETO	PARA HOR	$117.49		4	8	1	23.63	189.01075000			4.72%		4.72%
												189.010750		189.010750
												$22,206.87		$22,206.87

ADMINISTRADOR UNICO: ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ	**Monto esta hoja:**			**$22,206.87**		**$22,206.87**
	Acumulado:	**$125,011.66**	**$102,454.80**	**$99,200.42**	**$143,761.05**	**$470,427.93**

000150

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO
AE - 11 c

Concurso No: 41066004-016-2023 **Fecha:** 03/08/2023 **Duracion:** 90 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Inicio obra: 14/08/2023 **Fin obra:** 11/11/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

PROGRAMA DE EROGACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

Código	Descripción	Undad	Costo por Hora	Capacidad	Potencia	Horas por turno	No. De Máquinas	Días Efectivos	Horas Efectivas	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:										$125,011.66	$102,454.80	$99,200.42	$143,761.05	
ACUMULADO:										$125,011.66	$227,466.46	$326,666.88	$470,427.93	
PORCENTAJE PERIODO:										26.57%	21.78%	21.09%	30.56%	
PORCENTAJE ACUMULADO:										26.57%	48.35%	69.44%	100.00%	
TOTAL CANTIDAD MOSTRADA:										512.92	166.34	314.79	237.99	
ACUMULADA:										512.92	679.26	994.05	1,232.04	
PORCENTAJE PERIODO:										41.63%	13.50%	25.55%	19.32%	
PORCENTAJE ACUMULADO:										41.63%	55.13%	80.68%	100.00%	

0001511

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023 Fecha: 03/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

DOCUMENTO AE - 11 D

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

Inicio: 14/08/2023 Terminación: 11/11/2023 Duración (dias) 90

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	**ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ** ADMINISTRADOR UNICO	FIRMA

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS EN JORNALES

AREA DE TRABAJO	CATEGORIA	UNIDAD	AÑO TOTAL	2023 Mes1	2023 Mes2	2023 Mes3	2023 Mes4								
PERSONAL DE OFICINA DE CAMPO															
Personal técnico incluye: Prestaciones															
	SUPERINTENDENTE	Jornal	90.00	18	30	31	11								
	AUXILIAR SUPERINTENDENTE	Jornal	90.00	18	30	31	11								
	ING. TOPOGRAFO	Jornal	45.00	9	15	15.5	5.5								
	CADENERO	Jornal	45.00	9	15	15.5	5.5								
Personal administrativo incluye: Prestaciones															
	ADMINISTRADOR DE OBRA	Jornal	45.00	9	15	15.5	5.5								
	BODEGUERO	Jornal	45.00	9	15	15.5	5.5								
	VELADOR	Jornal	45.00	9	15	15.5	5.5								

0001152

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023 Fecha: 03/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

DOCUMENTO AE - 11 D

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero Inicio: 14/08/2023 Terminación: 11/11/2023 Duración (dias) 90

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	**ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ** ADMINISTRADOR UNICO	FIRMA

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS EN JORNALES

AREA DE TRABAJO	CATEGORIA	UNIDAD	AÑO TOTAL	2023 Mes1	2023 Mes2	2023 Mes3	2023 Mes4
PERSONAL DE OFICINA CENTRAL							
Personal directivo incluye: Prestaciones							
	DIRECTOR GENERAL	Jornal	90.00	18	30	31	11
	GERENTE DE CONSTRUCCION	Jornal	90.00	18	30	31	11
	RENTE DE CONSTRUCCION	Jornal	45.00	9	15	15.5	5.5
Personal técnico incluye: Prestaciones							
	JEFE DPTO. DE COSTOS	Jornal	45.00	9	15	15.5	5.5
	ANALISTA DE COSTOS	Jornal	45.00	9	15	15.5	5.5
Personal administrativo incluye: Prestaciones							
	CONTADOR	Jornal	45.00	9	15	15.5	5.5
	SECRETARIA	Jornal	45.00	9	15	15.5	5.5
	AUXILIAR DE LIMPIEZA	Jornal	45.00	9	15	15.5	5.5

000153

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023 Fecha: 03/08/2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

Inicio	Terminacion	Duracion (dias)
14/08/2023	11/11/2023	90

DOCUMENTO AE - 11 D

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	**ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ** ADMINISTRADOR UNICO	FIRMA

PROGRAMA DE EROGACION MENSUAL DE UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS EN JORNALES

AREA DE TRABAJO / CATEGORIA	UNIDAD	CANTIDAD	SALARIO DIARIO	AÑO IMPORTE	2023 Mes1	2023 Mes2	2023 Mes3	2023 Mes4
PERSONAL DE OFICINA DE CAMPO *Personal técnico incluye: Prestaciones*			simbologia	Cantidad $ Barra				
SUPERINTENDENTE	Jornal	90.00	$1,333.33	$120,000.00	18 $24,000.00	30 $40,000.00	31 $41,333.33	11 $14,666.67
AUXILIAR SUPERINTENDENTE	Jornal	90.00	$533.33	$48,000.00	18 $9,600.00	30 $16,000.00	31 $16,533.33	11 $5,866.67
ING. TOPOGRAFO	Jornal	45.00	$533.33	$24,000.00	9 $4,800.00	15 $8,000.00	15.5 $8,266.67	5.5 $2,933.33
CADENERO	Jornal	45.00	$166.67	$7,500.00	9 $1,500.00	15 $2,500.00	15.5 $2,583.33	5.5 $916.67
			Subtotal	199,500.00				

0001154

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023 Fecha: 03/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

Inicio	Terminacion	Duracion (dias)
14/08/2023	11/11/2023	90

DOCUMENTO AE - 11 D

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	**ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ** ADMINISTRADOR UNICO	FIRMA

PROGRAMA DE EROGACION MENSUAL DE UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS EN JORNALES

AREA DE TRABAJO / CATEGORIA	UNIDAD	CANTIDAD	SALARIO DIARIO	AÑO IMPORTE	2023 Mes1	2023 Mes2	2023 Mes3	2023 Mes4
Personal administrativo incluye: Prestaciones								
ADMINISTRADOR DE OBRA	Jornal	45.00	$666.67	$30,000.00	9 $6,000.00	15 $10,000.00	15.5 $10,333.33	5.5 $3,666.67
BODEGUERO	Jornal	45.00	$149.33	$6,720.00	9 $1,344.00	15 $2,240.00	15.5 $2,314.67	5.5 $821.33
VELADOR	Jornal	45.00	$149.33	$6,720.00	9 $1,344.00	15 $2,240.00	15.5 $2,314.67	5.5 $821.33
			Subtotal	43,440.00				

000155

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023 Fecha: 03/08/2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

Inicio	Terminacion	Duracion (dias)
14/08/2023	11/11/2023	90

DOCUMENTO
AE - 11 D

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR UNICO

FIRMA

PROGRAMA DE EROGACION MENSUAL DE UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS EN JORNALES

AREA DE TRABAJO / CATEGORIA	UNIDAD	CANTIDAD	SALARIO DIARIO	AÑO IMPORTE	2023 Mes1	2023 Mes2	2023 Mes3	2023 Mes4
PERSONAL DE OFICINA CENTRAL								
Personal directivo incluye: Prestaciones								
DIRECTOR GENERAL	Jornal	90.00	$883.33	$79,500.00	18 $15,900.00	30 $26,500.00	31 $27,383.33	11 $9,716.67
GERENTE DE CONSTRUCCION	Jornal	90.00	$618.33	$55,650.00	18 $11,130.00	30 $18,550.00	31 $19,168.33	11 $6,801.67
GERENTE DE CONSTRUCCION	Jornal	45.00	$666.67	$30,000.00	9 $6,000.00	15 $10,000.00	15.5 $10,333.33	5.5 $3,666.67
			Subtotal	165,150.00				
Personal técnico incluye: Prestaciones								
JEFE DPTO. DE COSTOS	Jornal	45.00	$666.67	$30,000.00	9 $6,000.00	15 $10,000.00	15.5 $10,333.33	5.5 $3,666.67
ANALISTA DE COSTOS	Jornal	45.00	$400.00	$18,000.00	9 $3,600.00	15 $6,000.00	15.5 $6,200.00	5.5 $2,200.00
			Subtotal	48,000.00				

000156

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023 Fecha: 03/08/2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.
Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

Inicio	Terminacion	Duracion (dias)
14/08/2023	11/11/2023	90

DOCUMENTO
AE - 11 D

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ ADMINISTRADOR UNICO	FIRMA

PROGRAMA DE EROGACIÓN MENSUAL DE UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS EN JORNALES

AREA DE TRABAJO / CATEGORIA	UNIDAD	CANTIDAD	SALARIO DIARIO	AÑO IMPORTE	2023 Mes1	2023 Mes2	2023 Mes3	2023 Mes4
Personal administrativo incluye: Prestaciones								
					9	15	15.5	5.5
CONTADOR	Jornal	45.00	$533.33	$24,000.00	$4,800.00	$8,000.00	$8,266.67	$2,933.33
					9	15	15.5	5.5
SECRETARIA	Jornal	45.00	$170.67	$7,680.00	$1,536.00	$2,560.00	$2,645.33	$938.67
					9	15	15.5	5.5
AUXILIAR DE LIMPIEZA	Jornal	45.00	$136.53	$6,144.00	$1,228.80	$2,048.00	$2,116.27	$750.93
			Subtotal	37,824.00				
			Subtotal por periodo	493,914.00	98,782.80	164,638.00	170,125.93	60,367.27
			Subtotal acumulado		98,782.80	263,420.80	433,546.73	493,914.00

000157

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. **41066004-016-2023.**
REFERENTE A LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**

000158

AE-12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ANEXANDO RESUMEN DEL PRESUPUESTO ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01 CEL. 744 2354717 / 744 4490912 E-MAIL: imexa@telmexmail.com, gno_0301@hotmail.com

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO
AE - 12

Concurso No: 41066004-016-2023 **Fecha:** 03/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 14/08/2023
Fin obra: 11/11/2023
Cod. Obra: CALLE FELIPE II

Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Partida	Concepto	Importe
1	**REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES.**	
A1	Preliminares.	$304,640.19
	(* TRESCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 19/100 M.N. *)	
A2	Terracerías	$356,945.21
	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 21/100 M.N. *)	
A3	Instalación Hidráulica.	$38,119.79
	(* TREINTA Y OCHO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 79/100 M.N. *)	
A4	Instalación sanitaria.	$98,244.54
	(* NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 54/100 M.N. *)	
A5	Albañileria	$1,024,942.47
	(* UN MILLON VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N. *)	
A6	Instalaciones eléctricas y luminarias.	$68,683.68
	(* SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 68/100 M.N. *)	
A7	Pavimentación.	$2,151,418.58
	(* DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 58/100 M.N. *)	
A8	Acarreos y limpiezas.	$267,718.87
	(* DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 87/100 M.N. *)	
A	**TOTAL Pavimentación integral de calle Felipe II, Fraccionamiento Farallón del Obispo**	**$4,310,713.33**

Total del presupuesto mostrado sin IVA: **$4,310,713.33**
IVA 16.00% **$689,714.13**
Total del presupuesto mostrado: **$5,000,427.46**
(* CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 46/100 M.N. *)

ADMINISTRADOR UNICO: ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ

IMEXA CONSTRUCTO S, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO
AE - 12

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Fecha: 03/08/2023
Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A	**Rehabilitación de calle Felipe II, Tramo Farallón Av. Universidad, Fracc. Magallanes.**					
A1	**Preliminares.**					
3-0073	Trazo y nivelación topográficas del terreno para estructuras estableciendo ejes y referencias, para superficie mayores a 300.00 m2 (vialidad) incluye: elaboración de planos topográficos.	M2	2,692.8100	$17.31	(* DIECISIETE PESOS 31/100 M.N. *)	$46,612.54
D-CAR5A10	Demolición a maquina de carpeta asfaltica de 5.00 a 10.00 cms. De espesor. Incluye mano de obra y acarreos en 1a. estación.	M2	1,649.0000	$73.31	(* SETENTA Y TRES PESOS 31/100 M.N. *)	$120,888.19
D-BANQU	Demolición mecánica de banqueta de 10 cms. de espesor incluye: herramienta menor, equipo y mano de obra.	M2	146.0400	$63.40	(* SESENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N. *)	$9,258.94
D-GUARM	Demolición mecánica de guarnición de 15x20x50 cm., incluye extracción de pedacería, mano de obra, equipo y herramienta.	M	183.6700	$69.73	(* SESENTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N. *)	$12,807.31
1-0056	Descoronamiento de muro de piedra braza de 30 cm de ancho incluye: acarreo de material fuera de la obra producto de la demolición.	M	120.0000	$108.12	(* CIENTO OCHO PESOS 12/100 M.N. *)	$12,974.40

000160

ADMINISTRADOR UNICO: ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ

Acumulado anterior:
Monto esta hoja: **$202,541.38**
Acumulado: **$202,541.38**

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 12

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Fecha: 03/08/2023
Duración: 90 días naturales
Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
EXC-001	Excavación por medios mecánicos en cepas de 0.00 A 2.00 mts de profundidad en material tipo II incluye afine de talud y fondo, acarreos a primera estación de 20 mts.	M3	699.4300	$74.30	(* SETENTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N. *)	$51,967.65
9-0139	Relleno de material producto de excavación compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor, incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.	M3	420.2900	$83.66	(* OCHENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N. *)	$35,161.46
9-0138	Relleno de material inerte de banco compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.	M3	30.0000	$498.99	(* CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N. *)	$14,969.70
A1	**TOTAL Preliminares.**					**$304,640.19**
A2	**Terracerías**					
31-0448	Apertura en caja por medios mecánicos en terreno tipo II-A, incluye acamellonamiento del material.	M3	558.0000	$82.27	(* OCHENTA Y DOS PESOS 27/100 M.N. *)	$45,906.66
31-0454	Afine y compactación de sub rasante al 90 % PROCTOR mínimo, por medios mecánicos.	M2	1,471.3500	$40.15	(* CUARENTA PESOS 15/100 M.N. *)	$59,074.70

ADMINISTRADOR UNICO: ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ

Acumulado anterior: $202,541.38
Monto esta hoja: $207,080.17
Acumulado: $409,621.55

0001161

IMEXA CONSTRUCTORE , S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO
AE - 12

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Fecha: 03/08/2023
Duración: 90 días naturales
Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
31-0457	Formación de base de 30 cms. de espesor con material producto de banco con equipo mecánico incluye vertido, afine, compactado al 95 % PROCTOR y agua.	M3	442.6200	$519.14	(* QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 14/100 M.N. *)	$229,781.75
32-0466	Afine y compactación en banquetas, andadores y plazas a mano incluye acarreos a primera estación.	M2	556.6400	$39.85	(* TREINTA Y NUEVE PESOS 85/100 M.N. *)	$22,182.10
A2	**TOTAL Terracerías**					**$356,945.21**
A3	**Instalación Hidráulica.**					
4-0080	Excavación a mano en material tipo II-A, en seco y barreta de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad, depositando el producto de excavación a orilla de cepa, cualquier zona..	M3	16.0000	$200.62	(* DOSCIENTOS PESOS 62/100 M.N. *)	$3,209.92
9-0139	Relleno de material producto de excavación compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor, incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.	M3	15.8000	$83.66	(* OCHENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N. *)	$1,321.83
5-0102	Cama de arena para instalación de tubería incluye: acostillado, acarreo de material en 1ra. estación, material y mano de obra.	M3	2.0000	$475.56	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 56/100 M.N. *)	$951.12

ADMINISTRADOR UNICO: ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ

Acumulado anterior:	**$409,621.55**
Monto esta hoja:	**$257,446.72**
Acumulado:	**$667,068.27**

000162

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 12

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Fecha: 03/08/2023
Duración: 90 días naturales
Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
27-0412	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 3" CED. RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	50.0000	$449.24	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N. *)	$22,462.00
TOMDOM*	Toma domiciliaria de agua potable con tubo de CPVC de 13 mm. de 6 mts. de longitud, incluye: excavación, relleno, válvula de inserción, abrazadera de 4", acarreo de materiales, mano de obra y herramienta.	PZA	3.0000	$1,760.31	(* UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 31/100 M.N. *)	$5,280.93
314-IHS-07-087	Válvula de esfera de CPVC 13 mm, incluye: suministro de materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	3.0000	$242.93	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N. *)	$728.79
BOTA01	Caja para llave de banqueta (bota) incluye llave de cuadro roscable 1/2", herramienta menor, mano de obra, materiales y equipo.	PZA	3.0000	$1,388.40	(* UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N. *)	$4,165.20
A3	**TOTAL Instalación Hidráulica.**					**$38,119.79**
A4	**Instalación sanitaria.**					
EXC-001	Excavación por medios mecánicos en cepas de 0.00 A 2.00 mts de profundidad en material tipo II incluye afine de talud y fondo, acarreos a primera estación de 20 mts.	M3	47.2600	$74.30	(* SETENTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N. *)	$3,511.42

ADMINISTRADOR UNICO: INGIRINA SALGADO HERNANDEZ

Acumulado anterior:	**$667,068.27**
Monto esta hoja:	**$36,148.34**
Acumulado:	**$703,216.61**

0000163

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO
AE - 12

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Fecha: 03/08/2023
Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
9-0139	Relleno de material producto de excavación compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor, incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.	M3	31.7900	$83.66	(* OCHENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N. *)	$2,659.55
9-0138	Relleno de material inerte de banco compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.	M3	13.6200	$498.99	(* CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N. *)	$6,796.24
5-0102	Cama de arena para instalación de tubería incluye: acostillado, acarreo de material en 1ra. estación, material y mano de obra.	M3	3.3700	$475.56	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 56/100 M.N. *)	$1,602.64
28-0417	Pozo de visita de forma cónica de 0.60 a 1.20 mts. de diámetro interior por 1.50 mts. de altura a base de mamposteria, muro de tabique de 25 cms. con aplanado de mortero cemento arena 1:3 acabado pulido, incluye excavación, acarreo y relleno.	PZA	2.0000	$13,271.34	(* TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 34/100 M.N. *)	$26,542.68
37-0579BP	Suministro y colocación de brocal y tapa de Polietileno alta resistencia abierto o cerrado para pozo de visita de 60 cm de diámetro, incluye material y mano de obra.	PZA	2.0000	$4,210.10	(* CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 10/100 M.N. *)	$8,420.20

ADMINISTRADOR UNICO: ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ

Acumulado anterior:	**$703,216.61**
Monto esta hoja:	**$46,021.31**
Acumulado:	**$749,237.92**

0001164

IMEXA CONSTRUCTORE[illegible] S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 12

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Fecha: 03/08/2023
Duración: 90 días naturales
Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
26-0390*	Registro sanitario de 0.40x0.60x0.60 mts., a base de tabicón10x14x28, asentado con mortero cemento arena 1:3, aplanado interior acabado fino con mortero cemento arena 1:3, piso de 10 cm, de concreto simple F'c= 150 Kg/cm2, tapa de concreto F'c=250 Kg/cm2, armado con varilla del No. 3 @ 20 cm. en ambos sentidos, de 15 cm. de espesor incluye trazo, nivelación, barrenado y demolición de roca, acarreo y m.o.	PZA	2.0000	$2,482.13	(* DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 13/100 M.N. *)	$4,964.26
TUBO 8"	Suministro e instalación de tubo PVC sanitario de 8" de diametro incluye acarreos, materiales secundarios, conexiones y mano de obra.	M	42.8000	$773.19	(* SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 19/100 M.N. *)	$33,092.53
SUM-COD2	Suministro y colocación de codo PVC sanitario de 6"X45*, incluye carga y descarga en almacén de obra.	PZA	2.0000	$356.10	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N. *)	$712.20
PU-6255	Suministro y colocación de unión de servicio de P.V.C. De 150 mm (6") de diámetro para alcantarillado sanitario incluye carga y descarga en almacén de obra.	PZA	2.0000	$624.14	(* SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 14/100 M.N. *)	$1,248.28
PU-6239	Suministro de tubo de PVC sanitario de norma liso de 150 mm de diámetro, incluye flete, carga y descarga en almacén de obra.	ML	18.0000	$483.03	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 03/100 M.N. *)	$8,694.54
A4	**TOTAL Instalación sanitaria.**					**$98,244.54**
A5	**Albañileria**					

ADMINISTRADOR UNICO: ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ

Acumulado anterior:	**$749,237.92**
Monto esta hoja:	**$48,711.81**
Acumulado:	**$797,949.73**

0001165

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO
AE - 12

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Fecha: 03/08/2023
Duración: 90 días naturales
Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
18-0296	Muro de piedra braza de la región, asentada con mortero cemento arena 1:5, acabado común incluye: acarreo de materiales en 1ra. erstación de 20 mts.	M3	276.5200	$2,755.36	(* DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N. *)	$761,912.15
18-0313	Dren para muro de mampostería a base de P.V.C. 4" tipo rígido incluye material y mano de obra.	ML	26.0000	$130.32	(* CIENTO TREINTA PESOS 32/100 M.N. *)	$3,388.32
18-0318	FILTRO DE GRAVA Y/O RAJUELA DE PIEDRA DE 30 CMS DE ESPESOR INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA	M3	53.7000	$1,019.51	(* UN MIL DIECINUEVE PESOS 51/100 M.N. *)	$54,747.69
11-0151*	Anclaje de castillo de 20 x 15 cms. 4 var. # 4 y estribos del # 2 a.c. 20 cms. Hasta una profundidad de 50 cms., concreto f´c = 200 kg/cm2 incluye material y mano de obra.	PZA	13.0000	$441.46	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 46/100 M.N. *)	$5,738.98
11-0160*	Cadena de desplante de concreto f'c=250 Kg/cm2, de 15x20 cm, armado con 6 varillas No.4 y estribos No. 2 a cada 25 cm, incluye cimbra común, acarreo de material 1ra. estación.	M	31.5300	$882.93	(* OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N. *)	$27,838.78
11-0221	Losa de concreto f´c= 250 kg/cm2 de 10 cms de espesor armada con var. No. 4 a cada 15 cm. En ambos sentidos, para paso peatonal, según planos estructurales incluye cimbrado, armado, colado y descimbrado, material y mano de obra.	M2	26.8000	$2,869.37	(* DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 37/100 M.N. *)	$76,899.12

ADMINISTRADOR UNICO: ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ

Acumulado anterior:	**$797,949.73**
Monto esta hoja:	**$930,525.04**
Acumulado:	**$1,728,474.77**

000136

IMEXA CONSTRUCTORE , S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO
AE - 12

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Fecha: 03/08/2023
Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
F-BARANDAL1	Suministro y colocación de barandal de tubo de acero negro de 1 1/2" con división de tubo de 1" con postes de 1 1/2" a cada metro soldado a placa de 1/2" de 15x15 cms. embutida en losa, incluye materiales, mano de obra, pintura, equipo y herramienta.	M	39.7800	$2,373.49	(* DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N. *)	$94,417.43
A5	**TOTAL Albañileria**					**$1,024,942.47**
A6	**Instalaciones eléctricas y luminarias.**					
REG-AUX	Registro auxiliar para alumbrado público de 50x60x65mts., de tabique rojo recocido 7x14x28 cms., con 14 cms. de espesor asentado y aplanado con mortero cemento arena 1:5 incluye: plantilla de concreto de 10 cms de espesor f´c=100kg/cm2, marco y contramarco de ángulo de 1 1/2"x3/16" concreto f´c=200kg/cm2 en tapa y fijación de marco, drén de grava de 20 cms de espesor, herramienta menor, materiales y mano de obra.	PZA	8.0000	$3,554.46	(* TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 46/100 M.N. *)	$28,435.68
TUB-PESA50	Suministro y tendido de tubo conduit pvc pesado 50 mm de diámetro incluye conexión, trazo, excavación, relleno, cama de arena, herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra.	M	200.0000	$201.24	(* DOSCIENTOS UN PESOS 24/100 M.N. *)	$40,248.00
A6	**TOTAL Instalaciones eléctricas y luminarias.**					**$68,683.68**
A7	**Pavimentación.**					

ADMINISTRADOR UNICO: ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ

Acumulado anterior:	**$1,728,474.77**
Monto esta hoja:	**$163,101.11**
Acumulado:	**$1,891,575.88**

0001627

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO
AE - 12

Concurso No. 41066004-016-2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Fecha: 03/08/2023
Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
4-0080	Excavación a mano en material tipo II-A, en seco y barreta de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad, depositando el producto de excavación a orilla de cepa, cualquier zona..	M3	64.3500	$200.62	(* DOSCIENTOS PESOS 62/100 M.N. *)	$12,909.90
9-0138	Relleno de material inerte de banco compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.	M3	38.5500	$498.99	(* CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N. *)	$19,236.06
32-0471	Guarnición de concreto simple de f´c= 200 kg/cm2 de 20x15x40 cm. de sección T.M.A. 3/4" Incluye cimbrado, descimbrado, materiales y mano de obra.	ML	424.3500	$530.82	(* QUINIENTOS TREINTA PESOS 82/100 M.N. *)	$225,253.47
32-0475A	Pavimento premezclado F'c= 300 Kg/cm2, T.A.M. 3/4" de 20 cm. de espesor resistencia normal, acabado a regla incluye junta constructiva con chaflan de 1/2", en cada junta fria (al termino del colado) se procederá a colocar 8 conectores con varilla de 1/2" a cada 60 cms. 30-30 cms., fibra microsintetica, curado con curacreto, vibrado, acarreos de materiales a 1ra. estación.	M2	1,471.3500	$976.95	(* NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N. *)	$1,437,435.38
SUMPOL	Suministro y colocación de hule negro calibre 600 para evitar deshidratación del concreto, incluye materiales, herramienta y mano de obra.	M2	1,471.3500	$57.02	(* CINCUENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N. *)	$83,896.38

ADMINISTRADOR UNICO: ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ

Acumulado anterior:	**$1,891,575.88**
Monto esta hoja:	**$1,778,731.19**
Acumulado:	**$3,670,307.07**

000168

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 12

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Fecha: 03/08/2023
Duración: 90 días naturales
Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CORTE01	Corte de juntas en piso de concreto con cortadora manual de disco diamantado, incluye limpieza de la junta.	ML	522.0000	$36.40	(* TREINTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N. *)	$19,000.80
32-0484	Calafateo en losas y guarniciones a base de asfalto oxidado incluye material, desperdicios, acarreos a primera estación y mano de obra.	ML	522.0000	$28.53	(* VEINTIOCHO PESOS 53/100 M.N. *)	$14,892.66
22-0333*	Pintura esmalte amarillo trafico en guarniciones con desarrollo de 30.0 cm., incluye material mano de obra y acarreos a primera estación.	ML	424.3500	$91.64	(* NOVENTA Y UN PESOS 64/100 M.N. *)	$38,887.43
32-0468	Banqueta de concreto hidráulico hecho en obra de f'c=150 kg/cm2 de 10 cms de espesor, T.M.A. 3/4", incluye curado, cimbrado, descimbrado, material y mano de obra.	M2	556.6400	$538.78	(* QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 78/100 M.N. *)	$299,906.50
A7	**TOTAL Pavimentación.**					**$2,151,418.58**
A8	**Acarreos y limpiezas.**					
CARGA	Carga mecánica con uso de retroexcavadora y acarreo en camión de volteo (6M3) de material producto de excavación y/o demolición a tiro libre.	M3	979.6400	$229.33	(* DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 33/100 M.N. *)	$224,660.84
33-0528	Limpieza ultima general de obra para entrega con acopio y acarreo horizontal a 20 mts.	M2	2,692.8100	$15.99	(* QUINCE PESOS 99/100 M.N. *)	$43,058.03

ADMINISTRADOR UNICO: ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ

Acumulado anterior:	**$3,670,307.07**
Monto esta hoja:	**$640,406.26**
Acumulado:	**$4,310,713.33**

000169

IMEXA CONSTRUCTO S, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 12

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Fecha: 03/08/2023
Duración: 90 días naturales
Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A8	TOTAL Acarreos y limpiezas.					$267,718.87
A	TOTAL Rehabilitación de calle Felipe II, Tramo Farallón Av. Universidad, Fracc. Magallanes.					$4,310,713.33

000170

ADMINISTRADOR UNICO: ING. IRINA SALGADO HERNANDEZ

Acumulado anterior:	$4,310,713.33
Monto esta hoja:	
Acumulado:	$4,310,713.33

IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
AE - 12

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Fecha: 03/08/2023
Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 14/08/2023
Fin Obra: 11/11/2023

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:	**$4,310,713.33**
IVA 16.00%	**$689,714.13**
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:	**$5,000,427.46**

(* CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 46/100 M.N. *)

0001171

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. **41066004-016-2023.**
REFERENTE A LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**

000184

E13 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01 CEL. 744 2354717 / 744 4490912 E-MAIL: imexa@telmexmail.com, gno_0301@hotmail.com

000185

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DOCUMENTO AE-13

CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION

Acapulco de Juárez, Gro., a 03 de agosto de 2023.

Ing. Luz María Meraza Radilla.
Secretaría De Desarrollo Urbano Y Obras Públicas
del Municipio De Acapulco De Juárez, Guerrero
Presente

Me refiero a la convocatoria No. **S/N** de fecha **18 de julio de 2023**, mediante la cual se invita a participar en la Licitación Pública Estatal No. **41066004-016-2023** relativa a los trabajos: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**

Sobre el particular, como representante legal de: **IMEXA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.** manifiesto a usted lo siguiente:

Se han adquirido oportunamente las BASES DE LA LICITACION, relativas a la preparación e integración de la proposición para la celebración de la LICITACION de que se trata; enterados de su contenido y aceptadas íntegramente. Para tal efecto se presenta nuestra proposición firmada, en apego a las INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.

Igualmente expongo que se han tomado las providencias indicadas en las BASES y que hemos tenido la debida participación de lo tratado, aceptando lo asentado tanto en la(s) acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones, como de la(s) aclaración(es) complementaría(s) que se ha(n) generado al respecto, así también declaro que mi representada posee y conoce toda la información adicional proporcionada por LA S.D.U.O.P. como complemento de la documentación inicial que se recibió.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios del Estado de Guerrero No. 266, así como las disposiciones administrativas expedidas en la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley, aceptándose en lo conducente a la LICITACIÓN correspondiente y demás actos que de ella se deriven.

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01
CEL. 744 2354717 / 744 4490912 E-MAIL: imexa@telmexmail.com, gno_0301@hotmail.com

000186

De conformidad con lo anterior, se presenta la siguiente proposición con un importe total de: **$ 4,310,713.33 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS TRECE pesos 33/100 M. N.)** sin incluir el importe al valor agregado, cuyo desglose y resumen aparecen en el "Catálogo de Conceptos" del Documento AE-12 siendo el plazo de ejecución de **90** días naturales contados a partir del aviso de iniciación de trabajos que LA S.D.U.O.P. dé por escrito al CONTRATISTA.

Por último, se manifiesta que esta proposición se presenta según se estipula en las BASES cuya documentación esta completa.

ATENTAMENTE

ING. IRINA SALGADO HERNÁNDEZ.
ADMINISTRADOR ÚNICO.

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01
CEL. 744 2354717 / 744 4490912 E-MAIL: imexa@telmexmail.com, gno_0301@hotmail.com

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. **41066004-016-2023.**
REFERENTE A LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**

000001

DA-1 ORIGINAL DEL ESCRITO EN EL QUE SEÑALE DOMICILIO Y UNA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO, EN CASO DE CONTAR CON ELLA, PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y, EN SU CASO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, MISMO QUE SERVIRÁ PARA PRACTICAR LAS NOTIFICACIONES AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN TODOS SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE OTRO DISTINTO.

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01
CEL. 744 2354717 / 744 4490912 E-MAIL: gno_0301@hotmail.com

DA-1 ORIGINAL DEL ESCRITO EN EL QUE SEÑALE DOMICILIO Y UNA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO, EN CASO DE CONTAR CON ELLA, PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y, EN SU CASO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, MISMO QUE SERVIRÁ PARA PRACTICAR LAS NOTIFICACIONES AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN TODOS SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE OTRO DISTINTO.

Acapulco de Juárez, Gro., a 03 de agosto de 2023.

Ing. Luz María Meraza Radilla.
Secretaría De Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
del Municipio De Acapulco De Juárez, Guerrero
Presente

Que en mi carácter de **Administrador Único**, de la empresa **IMEXA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.**, lo que se acredita en los términos del testimonio de la póliza número **1585**, de fecha **16 de diciembre de 2009**, otorgada ante la fe del Licenciado **SHUNASHI JAZMÍN ALTAMIRANO PINEDA** Corredor Público número 5, de la Ciudad de Acapulco, Gro., inscrita en el Registro Público de la Ciudad de Acapulco, Guerrero, en el folio número **10160*17**, con fecha **17 de febrero de 2010**, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal, número **41066004-016-2023**, de fecha **18 de julio de 2023**, relativa a los trabajos consistentes en **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 42, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios del Estado de Guerrero No. 266 y a lo solicitado en el documento adicional DA 1 de la convocatoria a la licitación, a nombre de mi representada, me permito señalar como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven del procedimiento de licitación, el ubicado en **CALLE CORREGIDORA No. 4, COL. MORELOS, C.P. 39530, ACAPULCO, GRO.TELS. (744) 485 95 01, CEL. 744 2354717/744 4490912**, y dirección de correo electrónico **imexa@telmexmail.com**, para todos los efectos legales a que haya lugar.

ATENTAMENTE

ING. IRINA SALGADO HERNÁNDEZ.
ADMINISTRADOR ÚNICO.

telcel

Factura

000003

Folio Fiscal
7636CD22-ACF8-4550-8E09-C521E05EF5CC
Folio Telcel LC-0022767988
Total a pagar **$504.00**
Fecha de Corte 06 Jul 2023
No. de cuenta 070959993
Teléfono 7444490912
T MAX SL 6500 -$200
Fecha límite de pago 25 Jul 2023

Lugar de Expedición
Blvd. Norte No.1833,
Col. Villas San Alejandro,
C.P. 72090, Puebla, Puebla

Fecha de Expedición: 2023-07-06T14:34:53

IMEXA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.
CLLE CORREGIDORA(FDA BCA A 50M DE-) 4
MORELOS(LA FEDERAL 2)
ACAPULCO DE JUA GRO 39530 MEX

070959993

RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
RDI841003QJ4

Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 5525813700

Estado de Cuenta	Importe
Saldo anterior	$503.77
Pagos	-$503.77
Ajustes	$0.00
Total cargos anteriores	**$0.00**

Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod. Servicio	Valor Unitario	Objeto Impuesto	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48 SERV	83111603	434.29	02		434.29
Cargo de equipo 15 de 24	1	H87 PZA	43191501	263.45	01	263.45	263.45

Descripción	Base Impuesto	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe IVA
Servicios de Telecomunicaciones	434.29	002 IVA	Tasa	0.16	69.48

Equivalencia catálogo SAT

Clave Prod.	Descripción
83111603	Servicios de telefonía celular
43191501	Teléfonos móviles

Clave Unidad	Descripción
E48	Unidad de Servicio
H87	Pieza

Subtotal	**697.74**
Bonificación cargo equipo(Descuento)	263.45
Subtotal antes de IVA	**434.29**
Total Base IVA Tasa 16%	434.29
Total de IVA Tasa 16%	69.48
Cargos del mes	**$503.77**
(quinientos tres pesos 77/100 M.N.)	
Total nuevos cargos del mes	**503.77**
Cargo por redondeo	0.23
Total a pagar	**$504.00**

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *111 o desde un teléfono fijo 8002277700 Visite www.telcel.com

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. **41066004-016-2023.**
REFERENTE A LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**

000004

DA-2 ORIGINAL DEL ESCRITO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE QUIEN PRETENDA SOLICITAR ACLARACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA, EN EL QUE EXPRESE SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, POR SI O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO.

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01
CEL. 744 2354717 / 744 4490912 E-MAIL: mexa@telmexmail.com, gno_0301@hotmail.com

DA 2 ORIGINAL DEL ESCRITO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE QUIEN PRETENDA SOLICITAR ACLARACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA, EN EL QUE EXPRESE SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, POR SI O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO

Acapulco de Juárez, Gro., a 03 de agosto de 2023.

Ing. Luz María Meraza Radilla.
Secretaría De Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
del Municipio De Acapulco De Juárez, Guerrero
Presente

Que en mi carácter de **Administrador Único**, de la empresa **IMEXA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.**, lo que se acredita en los términos del testimonio de la póliza número **1585**, de fecha **16 de diciembre de 2009**, otorgada ante la fe del Licenciado **SHUNASHI JAZMÍN ALTAMIRANO PINEDA** Corredor Público número 5, de la Ciudad de Acapulco, Gro., inscrita en el Registro Público de la Ciudad de Acapulco, Guerrero, en el folio número **10160*17**, con fecha **17 de febrero de 2010**, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal, número **41066004-016-2023**, de fecha **18 de julio de 2023**, relativa a los trabajos consistentes en **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 44, fracción XX de la Ley de Obras Públicas y Servicios Estado de Guerrero No. 266 y en el documento adicional DA 2 de la convocatoria a la licitación, habiéndome enterado del contenido de la convocatoria a la licitación, declaro como mis datos los siguientes:

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA PERSONA MORAL:
ICO091216UUA
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV
NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS:
IRINA SALGADO HERNÁNDEZ
MARCIAL MIGUEL VELASCO MARTINEZ

NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DEL NOTARIO, CORREDOR O FEDATARIO PÚBLICO ANTE QUIEN SE OTORGÓ EL ACTA CONSTITUTIVA Y, EN SU CASO, LAS MODIFICACIONES:
LIC. SHUNASHI JAZMÍN ALTAMIRANO PINEDA, CORREDOR PUBLICO No. 5, ACAPULCO, GUERRERO. POLIZA No. 1585.

NÚMERO, FECHA Y DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DEL ACTA CONSTITUTIVA:
No. 10160*17. 17 DE FEBRERO DE 2010, REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DE ACAPULCO, GUERRERO.

NÚMERO, FECHA Y DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE LAS REFORMAS O MODIFICACIONES AL ACTA CONSTITUTIVA:

NINGUNA
NOMBRE DEL ADMINISTRADOR ÚNICO: **IRINA SALGADO HERNÁNDEZ**

NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DEL NOTARIO, CORREDOR O FEDATARIO PÚBLICO ANTE QUIEN SE OTORGÓ EL INSTRUMENTO DEL QUE SE DESPRENDAN SUS FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN:
LIC. SHUNASHI JAZMÍN ALTAMIRANO PINEDA, CORREDOR PUBLICO No. 5, ACAPULCO, GUERRERO. POLIZA No. 1585.

Asimismo, habiéndose enterado mi representada por conducto de su representante legal, del contenido de la convocatoria a la licitación, sus anexos, modelos de contrato y de garantías a otorgarse, así como de los requisitos establecidos, manifiesto en su nombre, bajo protesta de decir verdad, su interés para participar en la licitación cuyos datos han quedado anotados anteriormente.

ATENTAMENTE

ING. IRINA SALGADO HERNÁNDEZ.
ADMINISTRADOR ÚNICO.

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01
CEL. 744 2354717 / 744 4490912 E-MAIL: imexa@telmexmail.com, gno_0301@hotmail.com

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. **41066004-016-2023.**
REFERENTE A LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**

000007

DA-3 ORIGINAL DEL ESCRITO MEDIANTE EL CUAL DECLARE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 62 Y 89, DE LA LOPSEG; Y QUE POR SU CONDUCTO NO PARTICIPAN EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SE ENCUENTREN INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN LOS TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 51 DE LA PROPIA LEY.

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01
CEL. 744 2354717 / 744 4490912 E-MAIL: [illegible], gno_0301@hotmail.com

DA-3 ORIGINAL DEL ESCRITO MEDIANTE EL CUAL DECLARE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 62 Y 89, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NO. 266; Y QUE POR SU CONDUCTO NO PARTICIPAN EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SE ENCUENTREN INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Acapulco de Juárez, Gro., a 03 de agosto de 2023.

Ing. Luz María Meraza Radilla.
Secretaría De Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
del Municipio De Acapulco De Juárez, Guerrero
Presente

Que en mi carácter de **Administrador Único**, de la empresa **IMEXA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.**, lo que se acredita en los términos del testimonio de la póliza número **1585**, de fecha **16 de diciembre de 2009**, otorgada ante la fe del Licenciado **SHUNASHI JAZMÍN ALTAMIRANO PINEDA** Corredor Público número 5, de la Ciudad de Acapulco, Gro., inscrita en el Registro Público de la Ciudad de Acapulco, Guerrero, en el folio número **10160*17**, con fecha **17 de febrero de 2010**, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal, número **41066004-016-2023**, de fecha **18 de julio de 2023**, relativa a los trabajos consistentes en **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 44, fracción XX de la Ley de Obras Públicas y Servicios Estado de Guerrero No. 266, y a lo solicitado en el documento adicional DA 3 de la convocatoria a la licitación, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no me encuentro en alguno de los supuestos que establecen los artículos 62 y 89, penúltimo párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios del Estado de Guerrero No. 266 y que por mi conducto no participan en este procedimiento de licitación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública.

ATENTAMENTE

ING. IRINA SALGADO HERNÁNDEZ.
ADMINISTRADOR ÚNICO.

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. **41066004-016-2023.**
REFERENTE A LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**

000009

DA-4 ORIGINAL DEL ESCRITO MEDIANTE EL CUAL LOS LICITANTES O SUS REPRESENTANTES LEGALES DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTEN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA SIN QUE RESULTE NECESARIO ACREDITAR SU PERSONALIDAD JURÍDICA.

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01
CEL. 744 2354717 / 744 4490912 E-MAIL: mexa@telmexmail.com, gno_0301@hotmail.com

DA-4 ORIGINAL DEL ESCRITO MEDIANTE EL CUAL LOS LICITANTES O SUS REPRESENTANTES LEGALES DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTEN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA, SIN QUE RESULTE NECESARIO ACREDITAR SU PERSONALIDAD JURÍDICA

Acapulco de Juárez, Gro., a 03 de agosto de 2023.

Ing. Luz María Meraza Radilla.
Secretaría De Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
del Municipio De Acapulco De Juárez, Guerrero
Presente

Que en mi carácter de **Administrador Único**, de la empresa **IMEXA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.**, lo que se acredita en los términos del testimonio de la póliza número **1585**, de fecha **16 de diciembre de 2009**, otorgada ante la fe del Licenciado **SHUNASHI JAZMÍN ALTAMIRANO PINEDA** Corredor Público número 5, de la Ciudad de Acapulco, Gro., inscrita en el Registro Público de la Ciudad de Acapulco, Guerrero, en el folio número **10160*17**, con fecha **17 de febrero de 2010**, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal, número **41066004-016-2023**, de fecha **18 de julio de 2023**, relativa a los trabajos consistentes en **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 42, fracción XII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios del Estado de Guerrero No. 266, y a lo solicitado en el documento adicional DA 6 de la convocatoria a la licitación, declaro como mis datos los siguientes

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA PERSONA MORAL:
ICO091216UUA
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV
NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS:
IRINA SALGADO HERNÁNDEZ
MARCIAL MIGUEL VELASCO MARTINEZ

NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DEL NOTARIO, CORREDOR O FEDATARIO PÚBLICO ANTE QUIEN SE OTORGÓ EL ACTA CONSTITUTIVA Y, EN SU CASO, LAS MODIFICACIONES:
LIC. SHUNASHI JAZMÍN ALTAMIRANO PINEDA, CORREDOR PUBLICO No. 5, ACAPULCO, GUERRERO. POLIZA No. 1585.

NÚMERO, FECHA Y DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DEL ACTA CONSTITUTIVA:
No. 10160*17. 17 DE FEBRERO DE 2010, REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DE ACAPULCO, GUERRERO.

NÚMERO, FECHA Y DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE LAS REFORMAS O MODIFICACIONES AL ACTA CONSTITUTIVA:

NINGUNA
NOMBRE DEL ADMINISTRADOR ÚNICO: **IRINA SALGADO HERNÁNDEZ**

NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DEL NOTARIO, CORREDOR O FEDATARIO PÚBLICO ANTE QUIEN SE OTORGÓ EL INSTRUMENTO DEL QUE SE DESPRENDAN SUS FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN:
LIC. SHUNASHI JAZMÍN ALTAMIRANO PINEDA, CORREDOR PUBLICO No. 5, ACAPULCO, GUERRERO. POLIZA No. 1585.

Asimismo, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que cuento con las facultades suficientes para comprometer a mi representada en los diversos actos de la licitación cuyos datos han quedado anotados anteriormente.

ATENTAMENTE

ING. IRINA SALGADO HERNÁNDEZ.
ADMINISTRADOR ÚNICO.

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. **41066004-016-2023.**
REFERENTE A LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**

000012

DA-5 ORIGINAL DEL ESCRITO QUE CONTENGA LA DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL LOS LICITANTES MANIFIESTEN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE POR SÍ MISMOS, O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA S.D.U.O.P, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01
CEL. 744 2354717 / 744 4490912 E-MAIL: mexa@telmexmail.com, gno_0301@hotmail.com

DA-5 ORIGINAL DEL ESCRITO QUE CONTENGA LA DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL LOS LICITANTES MANIFIESTEN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE POR SÍ MISMOS, O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES

Acapulco de Juárez, Gro., a 03 de agosto de 2023.

Ing. Luz María Meraza Radilla.
Secretaría De Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
del Municipio De Acapulco De Juárez, Guerrero
Presente

Que en mi carácter de **Administrador Único**, de la empresa **IMEXA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.**, lo que se acredita en los términos del testimonio de la póliza número **1585**, de fecha **16 de diciembre de 2009**, otorgada ante la fe del Licenciado **SHUNASHI JAZMÍN ALTAMIRANO PINEDA** Corredor Público número 5, de la Ciudad de Acapulco, Gro., inscrita en el Registro Público de la Ciudad de Acapulco, Guerrero, en el folio número **10160*17**, con fecha **17 de febrero de 2010**, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal, número **41066004-016-2023**, de fecha **18 de julio de 2023**, relativa a los trabajos consistentes en **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 42, fracción XII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios del Estado de Guerrero No. 266, y a lo solicitado en el documento adicional DA 5 de la convocatoria a la licitación, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que por mi mismo o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación u otros aspectos que me otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE

ING. IRINA SALGADO HERNÁNDEZ.
ADMINISTRADOR ÚNICO.

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. **41066004-016-2023.**
REFERENTE A LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**

000014

DA-6 EN SU CASO, CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES, CELEBRADO ENTRE DOS O MÁS INTERESADOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL PUNTO 4.11 DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, RATIFICADAS LAS FIRMAS ANTE NOTARIO, CORREDOR O FEDATARIO PÚBLICO.

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01 CEL. 744 2354717 / 744 4490912 E-MAIL: imexa@telmexmail.com, gno_0301@hotmail.com

DA-6 EN SU CASO, CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES, CELEBRADO ENTRE DOS O MÁS INTERESADOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL PUNTO 4.11 DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN

Acapulco de Juárez, Gro., a 03 de agosto de 2023.

Ing. Luz María Meraza Radilla.
Secretaría De Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
del Municipio De Acapulco De Juárez, Guerrero
Presente

Que en mi carácter de **Administrador Único**, de la empresa **IMEXA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.**, lo que se acredita en los términos del testimonio de la póliza número **1585**, de fecha **16 de diciembre de 2009**, otorgada ante la fe del Licenciado **SHUNASHI JAZMÍN ALTAMIRANO PINEDA** Corredor Público número 5, de la Ciudad de Acapulco, Gro., inscrita en el Registro Público de la Ciudad de Acapulco, Guerrero, en el folio número **10160*17**, con fecha **17 de febrero de 2010**, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal, número **41066004-016-2023**, de fecha **18 de julio de 2023**, relativa a los trabajos consistentes en **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que mi representada cuenta con la capacidad Técnica, Administrativa, Económica y Financiera para participar individualmente en el presente proceso de licitación.

Sin otro particular quedo de su atenta servidora.

ATENTAMENTE

ING. IRINA SALGADO HERNÁNDEZ.
ADMINISTRADOR ÚNICO.

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO. GRO. TELS. (744) 485 95 01
CEL. 744 2354717 / 744 4490912 E-MAIL: imexa@tolmexmail.com, gno_0301@hotmail.com

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. **41066004-016-2023.**
REFERENTE A LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**

DA-7 EN SU CASO, ESCRITO EN EL QUE LOS LICITANTES MANIFIESTEN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO, INCLUYEN SUPUESTOS, ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN VERÍDICOS Y SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR, ASÍ COMO QUE, EN SU CASO, CONSIDERAN COSTOS ESTIMADOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DEL MERCADO.

CALLE CORREGIDORA No. 4 COL. MORELOS C.P. 39530 ACAPULCO, GRO. TELS. (744) 485 95 01
CEL. 744 2354717 / 744 4490912 E-MAIL: mexa@telmexmail.com, gno_0301@hotmail.com

DA-7 MANIFIESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO, INCLUYEN SUPUESTOS, ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN VERÍDICOS Y SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR, ASÍ COMO QUE, EN SU CASO, CONSIDERAN COSTOS ESTIMADOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DEL MERCADO

Acapulco de Juárez, Gro., a 03 de agosto de 2023.

Ing. Luz María Meraza Radilla.
Secretaría De Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
del Municipio De Acapulco De Juárez, Guerrero
Presente

Que en mi carácter de **Administrador Único**, de la empresa **IMEXA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.**, lo que se acredita en los términos del testimonio de la póliza número **1585**, de fecha **16 de diciembre de 2009**, otorgada ante la fe del Licenciado **SHUNASHI JAZMÍN ALTAMIRANO PINEDA** Corredor Público número 5, de la Ciudad de Acapulco, Gro., inscrita en el Registro Público de la Ciudad de Acapulco, Guerrero, en el folio número **10160*17**, con fecha **17 de febrero de 2010**, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal, número **41066004-016-2023**, de fecha **18 de julio de 2023**, relativa a los trabajos consistentes en **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 42, fracción XII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios del Estado de Guerrero No. 266 y a lo solicitado en el documento adicional DA 7 de la convocatoria a la licitación, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o programas que previamente he realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado.

ATENTAMENTE

ING. IRINA SALGADO HERNÁNDEZ.
ADMINISTRADOR ÚNICO.

CONTRATO N. MAJ-FAISMUN/426-2023/LP

ACAPULCO
SIGUE PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

RAMO 33

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023
FAISMUN-2023
FONDO III

EXPEDIENTE TECNICO

MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO: REHABILITACION

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES**

No. DE OBRA:

LOCALIDAD: **ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO**





CONTRATO N. MAJ-FAISMUN/426-2023/LP

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

RAMO 33

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023
FAISMUN-2023
FONDO III

EXPEDIENTE TECNICO

MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO: REHABILITACION

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES**

No. DE OBRA:

LOCALIDAD: **ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO**

2023 AÑO DE Francisco VILLA

2023 AÑO DE JUAN RANULFO ESCUDERO

EETR-03
REV-02

ACAPULCO

BIENESTAR

FAIS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

TIPO DEL PROYECTO	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA
RUBRO DEL GASTO	URB.- URBANIZACION
SUBCLASIFICACION DEL PROYECTO	CALLE
MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO	REHABILITACION
CONTRIBUCION DEL PROYECTO A LA POBREZA	SERVICIO BASICO DE LA VIVIENDA
INCIDENCIA DEL PROYECTO	COMPLEMENTARIA
NOMBRE DEL PROGRAMA	URBANIZACION
NOMBRE DEL SUBPROGRAMA	REHABILITACION DE CALLE

ACAPULCO,GRO. 2023

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

RAMO 33

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 20223

FAISMUN 2023

I.- PRESENTACION

II.- DATOS BASICOS GENERALES

III.- CEDULA DE REGISTRO POR OBRA

IV.- VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

V.- ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD

VI.- DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL

VII.- INGENIERIA DE PROYECTO

VIII.- ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA

IX.- PRESUPUESTO

X.- EXPLOSION DE INSUMOS

XI.- PROGRAMA DE OBRA

XII.- NUMEROS GENERADORES

XIII.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

XIV.- ANALISIS DE INDIRECTOS Y UTILIDAD

XV.- CROQUIS DE MACRO Y MICROLOCALIZACION

XVI.- PLANOS Y PROYECTOS

I.- PRESENTACION

P R E S E N T A C I O N

POR SU FUNCION ECONOMICA POLITICA Y SOCIAL, ACAPULCO ES UNO DE LOS MUNICIPIOS MAS IMPORTANTES DEL ESTADO DE GUERRERO. SU UBICACIÓN GEOGRAFICA ASI COMO LAS PECULIARIDADES DE SU DEVENIR HISTORICO LE HAN PERMITIDO TENER UN RELEVANTE PROGRESO ECONOMICO Y SOCIAL NO EXENTO DE CONTRADICCIONES COMO CONSECUENCIA DE LA FALTA DE UNA PLANEACION URBANA. ES POR ELLO QUE LA ACTUAL ADMINISTRACION TIENE COMO PRIORIDAD **CONSTRUIR VIALIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DEL ENTORNO Y CONTAR CON CALLES Y ESPACIOS QUE OPTIMICEN LA MOVILIDAD EN LAS AREAS URBANA Y SUBURBANA DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO**, ES ASI COMO A TRAVES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, SUMANDO LOS ESFUERZOS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO EN CONJUNCION CON LA ENTUSIASTA PARTICIPACION CIUDADANA, SE PRETENDE DAR SOLUCION AL PROGRAMA DE URBANIZACION. ESTO PARA LOGRAR EL BIENESTAR DE SUS POBLADORES Y LA CONSOLIDACION DE LA IMAGEN Y EL DESARROLLO.

II.- DATOS BASICOS GENERALES

ACAPULCO

BIENESTAR

FAIS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

DATOS BASICOS GENERALES

GENERALES

MODALIDAD DEL PROYECTO: **REHABILITACION**

LOCALIZACION: **ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO**

REGION: **07.- ACAPULCO**

MUNICIPIO: **01.- ACAPULCO** LOCALIDAD: **ACAPULCO**

BARRIO, COLONIA O EJIDO: **ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO**

TIPO DE OBRA : REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES

NUEVA (**X**) EN PROCESO ( ) AMPLIACION ( )

REHABILITACION ( ) EQUIPAMIENTO ( )

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

2692.81 M2 TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MAYORES A 300 00 M2 (VIALIDAD)

699.43 M3 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II INCLUYE AFINE DE TALUD Y FONDO

3.37 M3 CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA, INCLUYE: ACOSTILLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA

13.62 M3 RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20 00 cm. DE ESPESOR, INC. ACARREO DENTRO DE LA OBR/

3.00 PZA. VALVULA DE ESFERA DE CPVC 13 MM, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS,INSTALACION DE PRUEBA

50.00 ML SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 2 1/2" CED. RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECT(

3.00 PZA TOMA DOMICILIARIA DE 13 MM. CON TUBO DE CPVC, INCLUYE: VALVULA DE INSERCION, CONEXIONES DE CPVC, LONGITUD PROMEDIO 7.00 MTS. EXCAVACION RELLENO Y ACARRI

1471.35 M2 PAVIMENTO PREMEZCLADO CONCRETO CONVENCIONAL f c = 250 kg/cm2 /EDAD 7 DÍAS/ TMA 20 MM/ REV. 10/ A TIRO DIRECTO, DE 15 CM. DE ESPESOR, . ACABADO A REGLA. INCLUY

1471.35 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO CALIBRE 600 PARA EVITAR DESHIDRATACION DEL CONCRETO

276.52 M3 MURO DE PIEDRA BRAZA DE LA REGION, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO COMUN, INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION DE 20 00 MTS

522.00 ML CALAFATEO EN LOSAS Y GUARNICIONES A BASE DE ASFALTO OXIDADO, INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, ACARREO EN 1ra. ESTACION Y MANO DE OBRA.

424.35 ML GUARNICION DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2, DE 15x20x50cm. DE SECCION, INCLUYE: ACABADO APARENTE, VACIADO Y CIMBRADO, ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION.

979.64 M3 CARGA MECANICA CON USO DE RETROEXCAVADORA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO 6 M3

2692.81 M2 LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20 MTS

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): **500** HABITANTES

III.- CEDULA DE REGISTRO POR OBRA

ACAPULCO

BIENESTAR

FAIS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

CEDULA DE REGISTRO

NUMERO DE OBRA :

DEPENDENCIA EJECUTORA : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

OBJETIVO : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL, DOTANDO DE LOS SERVICIOS BASICOS COMO: PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA POTABLE (OBRAS COMPLEMENTARIAS), LOGRANDO DAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LA CIUDANIA.

PROGRAMA : URBANIZACION

SUBPROGRAMA : REHABILITACION DE CALLE

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA : REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES

REGION : 07.- ACAPULCO

MUNICIPIO : 01.- ACAPULCO

LOCALIDAD : ACAPULCO ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION : $ 5,000,427.46

FEDERAL :	$ -	ESTATAL:	$ 5,000,427.46	BENEFICIARIOS :	$ -
CREDITO :	0.00	MUNICIPAL :	0.00	SUMA :	$ 5,000,427.46

DE CONSTRUCCION		DE OPERACION		DE IMPACTO	
1,471.35	M2	1,471.35	M2	500	HABITANTES

NUMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS : 500 HABITANTES

PROGRAMA DE EJECUCION :

CONCEPTOS DE LA OBRA	TIEMPO DE EJECUCION	
PRELIMINARES	agosto , 2023	agosto , 2023
TERRACERIAS	noviembre , 2023	noviembre , 2023
INSTALACION SANITARIA	octubre , 2023	octubre , 2023
INSTALACION HIDRAULICA	octubre , 2023	octubre , 2023
ALBAÑILERIA	septiembre , 2023	octubre , 2023
INSTALACION ELECTRICA Y LUMINARIAS	noviembre , 2023	noviembre , 2023
PAVIMENTACION	noviembre , 2023	noviembre , 2023
ACARREOS Y LIMPIEZA	noviembre , 2023	diciembre , 2023

FORMA DE EJECUCION DE LA OBRA : CONTRATO

FECHA DE INICIO : agosto-2023

FECHA DE TERMINACION : diciembre-2023

JORNALES A GENERAR : 2,523

EETR-03
REV-02

ACAPULCO

BIENESTAR

FAIS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

CEDULA DE INFORMACION BASICA POR PROYECTO

EJERCICIO : 2023

I.- UBICACION

	CLAVE :	FONDO :
FONDO :	III	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023
ESTADO :	012	GUERRERO
ZONA PRIORITARIA .		
REGION :	007	ACAPULCO
MUNICIPIO :	001	ACAPULCO
LOCALIDAD :		ACAPULCO
BARRIO, COLONIA, RANCHERIA, ETC. :		ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
CABECERA MUNICIPAL :	SI X	NO
TIPO DE LOCALIDAD :	CP X	PR ZI ( )

II.- IDENTIFICACION

Nº DE OBRA

	CLAVE	NOMBRE
PROGRAMA :	URBANIZACION	
SUBPROGRAMA :	REHABILITACION DE CALLE	
MODALIDAD DEL PROYECTO :	REHABILITACION	
NOMBRE DE LA OBRA :	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO	

TIPO DE OBRA	NUEVA(X)	AMPLIACION( )	REHABILITACION( )	PROCESO( )	EQUIPAMIENTO( )
MODALIDAD DE EJECUCION	C (X)	AM ( )	AD ( )	AC ( )	M ( ) EQ ( )
INSTANCIA EJECUTORA :	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO				

III.- INVERSIONES

INVERSION EJERCIDA AL 31 DE DIC. DEL 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONCEPTO	**TOTAL**	**FEDERAL**	**ESTATAL**	**MUNICIPAL**	**BENEFICIARIOS**	**CREDITO**	**OTROS**
INVERSION APROBADA O VALIDADA EN EL EJERCICIO 2023	**$ 5,000,427.46**	0.00	**$ 5,000,427.46**	0.00	$ -	0.00	0.00
CUATRIMESTRE							
PRIMERO							
SEGUNDO	$ 1,500,128.24		$ 1,500,128.24				
TERCERO	$ 3,500,299.22		$ 3,500,299.22				

IV.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

APROBADAS				ALCANZADAS			
METAS		BENEFICIARIOS DIRECTOS		METAS		BENEFICIARIOS DIRECTOS	
CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA
1471.35	M2	500	HABITANTES	**1471.35**	M2	500	HABITANTES

ANOTAR SI BENEFICIA A UNA O VARIAS LOCALIDADES (CUANTAS): 1

JORNALES A GENERAR : 2,523

EETR-03
REV-02

ACAPULCO

BIENESTAR

FAIS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

V.- AVANCE FISICO-FINANCIERO PROGRAMADO

TRIMESTRE	FISICO(%)	FINANCIERO(%)
PRIMERO	0	0
SEGUNDO	30	30
TERCERO	70	70

VI.- PERIODO DE EJECUCION

PROGRAMADO:	FECHA DE INICIO:	agosto-2023	FECHA DE TERMINACION:	diciembre-2023
REAL (CIERRE)	FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINACION:	
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION	SI:		NO:	FECHA:

VII.- SITUACION FISICA DE LA OBRA: (FECHA: _____)

TERMINADO Y OPERANDO:		TERMINADAS SIN OPERAR:
NO INICIADA:	EN PROCESO:	SUSPENDIDA:

VIII.- CONDICIONES OPERATIVAS DE LA OBRA (FECHA_____)

OPERA ADECUADAMENTE ( ) OPERA CON DEFICIENCIA ( ) NO OPERA ( )

EN SU CASO, CAUSAS POR LAS QUE NO OPERA O LO HACE CON DEFICIENCIA Y RECOMENDACIONES:

IV.- VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

DOP/052/24
27-FEB-24

14

ACAPULCO

BIENESTAR

FAIS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

VALIDACION Y DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE :

REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA, POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCION, COMPROMETIENDOSE LA MISMA A PROPORCIONAR LA SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA NECESARIA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO.

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
2021 - 2024

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD NORMATIVA

MTRA. ABELINA LOPEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

LUGAR: ACAPULCO, GUERRERO FECHA: agosto-2023

INFORMACION ADICIONAL :
LA DEPENDENCIA EJECUTORA CUENTA CON LOS PLANOS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LA OBRA.

V.- ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD

ACAPULCO

BIENESTAR

FAIS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD

FECHA: agosto-2023

La comunidad de: **ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO** del Municipio de **ACAPULCO** Declara que ha sido de su conocimiento y puesto a su consideracion, la realizacion del Proyecto denominado: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES**

el cual consta de las siguientes carácteristicas:

2692.81 M2 TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD)
699.43 M3 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II INCLUYE AFINE DE TALUD Y FONDO
3.37 M3 CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA, INCLUYE: ACOSTILLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA.
13.62 M3 RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC. ACARREO DENTRO DE LA OBR/
3.00 PZA. VALVULA DE ESFERA DE CPVC 13 MM, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS,INSTALACION DE PRUEBA
50.00 ML SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 2 1/2" CED. RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECT(
3.00 PZA TOMA DOMICILIARIA DE 13 MM. CON TUBO DE CPVC, INCLUYE: VALVULA DE INSERCION, CONEXIONES DE CPVC, LONGITUD PROMEDIO 7.00 MTS. EXCAVACION RELLENO Y ACARRI
1471.35 M2 PAVIMENTO PREMEZCLADO CONCRETO CONVENCIONAL f.c = 250 kg/cm2 /EDAD 7 DÍAS/ TMA 20 MM/ REV. 10/ A TIRO DIRECTO, DE 15 CM. DE ESPESOR, , ACABADO A REGLA. INCLUY
1471.35 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO CALIBRE 600 PARA EVITAR DESHIDRATACION DEL CONCRETO
276.52 M3 MURO DE PIEDRA BRAZA DE LA REGION, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO COMUN, INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION DE 20.00 MTS
522.00 ML CALAFATEO EN LOSAS Y GUARNICIONES A BASE DE ASFALTO OXIDADO, INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, ACARREO EN 1ra. ESTACION Y MANO DE OBRA.
424.35 ML GUARNICION DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2, DE 15x20x50cm. DE SECCION, INCLUYE: ACABADO APARENTE, VACIADO Y CIMBRADO, ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION.
979.64 M3 CARGA MECANICA CON USO DE RETROEXCAVADORA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO 6 M3
2692.81 M2 LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20 MTS

por lo que al estar de acuerdo con sus necesidades prioritarias, aceptan el proyecto y se comprometen a participar y/o aportar mano de obra, recursos economicos y/o materiales de la region, en un % del costo total de la obra como a continuación se desglosa:

CONCEPTO	PORCENTAJE	OBSERVACIONES

Asimismo, se compromete a proporcionar los terrenos necesarios para la ejecucion de las obras y a colaborar con las autoridades en la resolucion de la problemática que se presenta durante la ejecucion.

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL

MTRA. ABELINA LOPEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 2021 - 2024

EETR-03
REV-02

Licitada 12

SPD-11

BIENESTAR ACAPULCO FAIS 2023 Francisco VILLA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (FAISMUN)

ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD 2023

FECHA: 04 - AGO - 2023

LA COMUNIDAD DE: Acapulco de Juarez, Guerrero

DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, DECLARA QUE HA SIDO DE SU CONOCIMIENTO Y PUESTO A SU CONSIDERACIÓN, LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO DENOMINADO REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FALARON AV. UNIVERSPEL- CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: FRACC. MAGALLANES

; POR LO QUE AL ESTAR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES PRIORITARIAS, ACEPTAN EL PROYECTO Y SE COMPROMETEN A PARTICIPAR Y/O APORTAR YA SEA EN MANO DE OBRA, RECURSOS ECONÓMICOS Y/O MATERIALES DE LA REGIÓN, EN UN _____ % DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, COMO A CONTINUACIÓN SE DESGLOSA:

CONCEPTO	PORCENTAJE (%)	OBSERVACIONES
MANO DE OBRA		
RECURSOS ECONOMICOS		
RECURSOS MATERIALES		

ASIMISMO, SE COMPROMETEN A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA UBICACIÓN DE LAS OBRAS Y A COLABORAR CON LAS AUTORIDADES PARA LA RESOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTE DURANTE LA EJECUCIÓN.

POR EL COMITÉ COMUNITARIO PRESENTE

Lucero Mata Mendez

PRESIDENTE (A) DE (CPS)

POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

MTRA. ABELINA LOPEZ RODRIGUEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL DE ACAPULCO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

2023 Francisco VILLA

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE CAPACITACIÓN

1.1. INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Siendo el día 04 del mes de AGOSTO del año 2023, a las 13:15 horas en el domicilio FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO, localizado en el municipio **ACAPULCO DE JUAREZ**, de la entidad federativa **GUERRERO**, nos encontramos reunidos para celebrar la instalación del Comité de participación social que dará seguimiento y verificación a la obra de nombre REHABILITACION DE CALLE FELIPE II TRAMO FARALLON a realizarse con recursos del FAIS correspondiente al ejercicio fiscal 2023. AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES

DATOS DE LA OBRA *Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN			
Fecha de llenado: 04 - AGOSTO - 2023			
Nombre de la obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES			
Folio asignado en la MIDS: 428242		Monto total planeado: $ 5,000,427.46	
Periodo de ejecución	Fecha de inicio: 15 - AGO - 2023	Fecha de conclusión: 12 - DIC - 2023	
Entidad: **Guerrero**	Municipio: **Acapulco**	Localidad: ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO	
Si la obra tiene más de una su clasificación, indíquelas a continuación, así como los montos correspondientes:			
Subclasificación: Calle		Monto:	$ 3,741,351.67
Subclasificación: Drenaje Sanitario		Monto:	113,963.67
Subclasificación: Guarniciones y banquetas		Monto:	261,294.03
Subclasificación: Muro de contención		Monto:	883,818.09

CONSIDERANDOS

Que las autoridades locales, enlaces FAISMUN y personas servidoras públicas que apoyen en los procesos relacionados con el FAIS, deberán:

- Promover la participación de la población beneficiaria a través de la integración de los Comités de participación social (CPS) durante los procesos de identificación de necesidades, planeación, ejecución y seguimiento de las obras a realizar con el FAIS conforme al artículo 33, apartado B, fracción II, inciso b) de la Ley de Coordinación Fiscal.
- Capacitar a los CPS sobre los objetivos del FAIS, su población objetivo, labores y responsabilidades de los CPS.
- Registrar los anexos de participación social en el módulo de participación social de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS).

Que los Comités de participación social (CPS):

- Son órganos de participación y representación ciudadana rural, urbana, indígena o afromexicana, integrados equitativamente por mujeres y hombres en la mayoría de sus diversidades, electos de manera democrática para dar seguimiento a las obras financiadas con recursos del FAIS. También se reconocen como tales a las distintas formas de organización ciudadana con las que ya cuenta una localidad, siempre y cuando se apeguen a los criterios de la Guía de participación social vigente publicada por Bienestar.

- Su objetivo es dar seguimiento al inicio, desarrollo y conclusión de las obras/acciones a realizar con recursos del FAISMUN, para contribuir a que los recursos se utilicen bajo los principios de transparencia, economía, eficacia, legalidad y honradez.

- Deberán estar conformados por personas de la localidad donde se realice la obra y que no estén desempeñando un cargo público.

- La participación de la ciudadanía en los CPS no es remunerada; se trata de cargos honoríficos de servicio a la comunidad.

Que las actividades de los CPS son:

- Participar en la capacitación que brindará el gobierno local sobre las responsabilidades como integrantes de los CPS y de las obras a las que darán seguimiento.

- Participar en los procesos de planeación de proyectos en coordinación con las autoridades locales, mientras se apeguen a los Lineamientos del FAIS y a la disponibilidad de recursos.

- Realizar visitas a las obras e informar de sus avances, así como de la conclusión de las mismas a la ciudadanía.

- Registrar el seguimiento de las obras mediante el correcto llenado de los anexos de participación social vigentes publicados por Bienestar.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE SEGURIDAD Y BIENESTAR
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

ANEXO I. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE CAPACITACIÓN

ACUERDO ÚNICO

Se declara formalmente instalado el Comité de participación social conformado por las personas que al calce de este documento firman en conjunto con la persona enlace FAISMUN.

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Lucero Mata Méndez
Presidenta(e)
Nombre completo y firma

Mario Alberto Diaz Salado
Secretaria(o)
Nombre completo y firma

Ana Maria Sotelo M
Vocal
Nombre completo y firma

Luis Medina Sotelo
Vocal
Nombre completo y firma

CARMELO DIAZ DIAZ
Vocal
Nombre completo y firma

M.C. ALEJANDRO DIAZ LOPEZ
Enlace FAISMUN
DIRECTOR DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION DE PLANEACION

Rosa Teran Diaz
Testigo

Marcelo Diaz Teran
Testigo

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE CAPACITACIÓN

1.2. REPORTE DE CAPACITACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FAISMUN

DATOS DE LA CAPACITACIÓN *Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN		
Fecha y hora de la capacitación: 04 - AGO - 2023		
Lugar de la capacitación: FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO		
Nombre y cargo de la persona facilitadora:		
Número de asistentes a la capacitación	Mujeres: 4	Hombres: 3

INFORMACIÓN SOBRE LA CAPACITACIÓN *Esta sección deberá ser llenada a mano por el CPS

Responda las siguientes preguntas tachando el recuadro correspondiente:

1. ¿La obra fue acordada con las personas del CPS y de la localidad beneficiaria? Sí [X] No [ ]

2. Indique cuáles de los siguientes temas les fueron proporcionados durante la capacitación:

a) ¿Qué es el FAIS, a quiénes beneficia, qué tipos de obras se pueden realizar con él y cuál es la importancia de que la ciudadanía participe? Sí [X] No [ ]

b) ¿Cuáles son sus actividades y responsabilidades como integrantes del CPS? Sí [X] No [ ]

c) ¿Cómo se realiza el correcto llenado y uso de los APS? Sí [X] No [ ]

d) Características básicas de la obra: cuándo inicia, cuándo termina, cuánto va a costar, cómo quedará al finalizar. Sí [X] No [ ]


e) ¿Se entregaron los trípticos de participación social y de información del FAIS a todo el CPS? Sí [ ] No [ ]

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE CAPACITACIÓN


FOTOGRAFÍAS DE LA CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD. FRACC. MAGALLANES

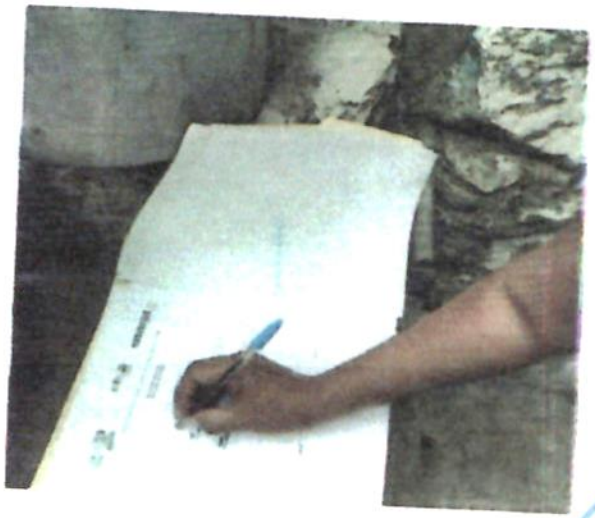





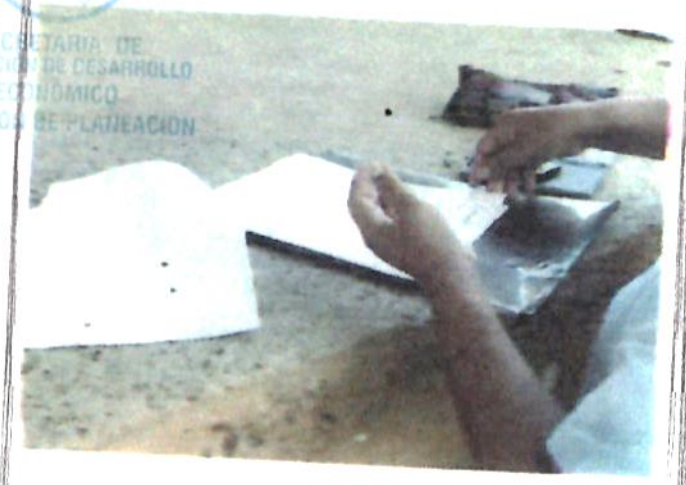

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

BIENESTAR

FAIS

2023 Francisco VILLA

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE CAPACITACIÓN

DATOS DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Nombre de C. Presidenta/e: LUCERO MATA MENDEZ

Domicilio y número telefónico:

¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? Sí ☐ NO ☐
En caso de responder sí, indique a cuál.

Nombre de C. Secretaria/o: MARIO ALBERTO DIAZ SALADO

Domicilio y número telefónico:

¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? Sí ☐ NO ☐
En caso de responder sí, indique a cuál.

Nombre de C. Vocal: ANA MARIA SOTELO M.

Domicilio y número telefónico:

¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? Sí ☐ NO ☐
En caso de responder sí, indique a cuál.

Nombre de C. Vocal: LUIS MEDINA SOTELO

Domicilio y número telefónico:

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? Sí ☐ NO ☐
En caso de responder sí, indique a cuál.

Nombre de C. Vocal: CARMELO DIAZ DIAZ

Domicilio y número telefónico:

¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? Sí ☐ NO ☐
En caso de responder sí, indique a cuál.

VI.- DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL

ACAPULCO

BIENESTAR

FAIS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

DICTAMEN SOBRE IMPACTO AMBIENTAL

ESTE DICTAMEN EVALUARA LA FORMA COMO PUEDE INFLUIR EN LA REALIZACION DE LA OBRA, Y SE INDICARAN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE HABRAN DE ADOPTARSE PARA EVITAR EL DETERIORO DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO DEL LUGAR, DONDE SE LLEVARA A CABO EL PROYECTO.

LOS ABAJO FIRMANTES, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

CONTEMPLADO EN EL PROGRAMA Y QUE SE LLEVARA A CABO EN BENEFICIO DE LA POBLACION RURAL Y DE LAS COLONIAS POPULARES URBANAS, CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS OFICIALES MEXICANAS (N.O.M.) POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, Y RECURSOS NATURALES, Y LA SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN VIRTUD DE QUE DICHA OBRA NO ALTERA EL MEDIO AMBIENTE NI SU FUNCIONAMIENTO, NI EL EQUILIBRIO ECOLOGICO DEL AREA.

POR EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO

LIC. JESUS CASTILLO AGUIRRE
DIRECTOR GENERAL DE ECOLOGIA Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA
Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
2021-2024

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

EETR-03
REV-02

VII.- INGENIERIA DE PROYECTO

ACAPULCO

BIENESTAR

FAIS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

INFORMACION TECNICA DE PROYECTOS

ANTECEDENTES :

NOMBRE DE LA LOCALIDAD : ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

MUNICIPIO : ACAPULCO ESTADO : GUERRERO

POBLACION : 500 HABITANTES

DISPONIBILIDAD DEL TERRENO: SI SUPERFICIE : 1,471.35 M2

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO:

PROYECTO: REHABILITACION

		VER GENERADOR	VER GENERADOR	VER GENERADOR
DIM:	M2	LARGO:	ANCHO:	PZA:

CANTIDAD PRESUPUESTADA 1471.35 M2

ARMADOS: ESTRUCTURA:

CANCELERIA: ALUMBRADO:

CIMENTACION: CUBIERTA:

ACAPULCO

BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

INFORMACION TECNICA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, EMPEDRADOS Y GUARNICIONES

I.- ANTECEDENTES

MODALIDAD DEL PROYECTO

REHABILITACION

NOMBRE DE LA LOCALIDAD

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

MUNICIPIO

01.- ACAPULCO

ESTADO

GUERRERO

LONGITUD DEL TRAMO:

TAMAÑO: **1,471.35 M2**

SERVICIO CON QUE CUENTA EL TRAMO:

ALCANTARILLADO: **SI**

AGUA POTABLE : **SI**

OTROS: **ALUMBRADO PUBLICO**

II.- CARACTERISTICAS DEL TERRENO

TOPOGRAFIA (PORCENTAJE DE PENDIENTE)

PLANO 80 % **LOMERIO** 20 %

TIPO DE MATERIAL:

A: 0 % B: 100 % C: ____ %

BANCOS DE MATERIALES EXISTENTES Y DISTANCIAS DE LA OBRA

GRAVA 35 KM ARENA 35 KM AGUA LOCAL KM

VIII.- ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA

ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO., 25 DE JULIO DEL 2023.

ACTA DE VISITA

Nº	ACCIÓN / OBRA	LICITACION PUBLICA (ESTATAL)
1	Rehabilitación de Calle Felipe II, Tramo Farallón Av. Universidad, Fracc. Magallanes, Acapulco De Juárez, Guerrero.	41066004-016-2023

Nº	NOMBRE DE LA EMPRESA	REPRESENTANTE	FIRMA	HORA
1	INMEXA CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	VICENTE ALARCON SEVERIANO		9:35
2	SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRAS A Y A S.A DE C.V.	LUIS ANTONIO AGUICERA BARRIENTOS		9:37
3	ALEXANDER CASTILLO LOPEZ	ARQ. BENJAMIN SOLIS HERRERA		9:40

ARQ. OPUS SALMERON J.
RESIDENTE

IX.- PRESUPUESTO

ACAPULCO

BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROYECTO: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES**
REGION: 07.- ACAPULCO **MUNICIPIO:** 01.- ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: **ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO**

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO		IMPORTE
PRELIMINARES	$	304,640.19
TERRACERIAS	$	356,945.21
INSTALACION SANITARIA	$	38,119.79
INSTALACION HIDRAULICA	$	98,244.54
ALBAÑILERIA	$	1,024,942.47
INSTALACION ELECTRICA Y LUMINARIAS	$	68,683.68
PAVIMENTACION	$	2,151,418.58
ACARREOS Y LIMPIEZA	$	267,718.87
TOTAL:	$	4,310,713.33

D E S G L O S E

SUBTOTAL	$	4,310,713.33
IVA 16%	$	689,714.13
TOTAL	**$**	**5,000,427.46**

POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL

MTRA. ABELINA LOPEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
2021-2024

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A	**REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**					
A01	**TERRACERIAS (CAMINO ALTERNO)**					
3-0073	Trazo y nivelación topográficas del terreno para estructuras estableciendo ejes y referencias, para superficie mayores a 300.00 m2 (vialidad) incluye: elaboración de planos	M2	2,692.81	$17.31	$46,612.54	1.08%
D-CAR5A10	Demolición a maquina de carpeta asfaltica de 5.00 a 10.00 cms. De espesor. Incluye mano de obra y acarreos en 1a. estación.	M2	1,649.00	$73.31	$120,888.19	2.80%
D-BANQU	Demolición mecánica de banqueta de 10 cms. de espesor incluye: herramienta menor, equipo y mano de obra.	M2	146.04	$63.40	$9,258.94	0.21%
D-GUARM	Demolición mecánica de guarnición de 15x20x50 cm., incluye extracción de pedacería, mano de obra, equipo y herramienta.	M	183.67	$69.73	$12,807.31	0.30%
1-0056	Descoronamiento de muro de piedra braza de 30 cm de ancho incluye: acarreo de material fuera de la obra producto de la demolición.	M	120.00	$108.12	$12,974.40	0.30%
EXC-001	Excavación por medios mecánicos en cepas de 0.00 A 2.00 mts de profundidad en material tipo II incluye afine de talud y fondo, acarreos a primera estación de 20 mts.	M3	699.43	$74.30	$51,967.65	1.21%
9-0139	Relleno de material producto de excavación compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor, incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.	M3	420.29	$83.66	$35,161.46	0.82%
9-0138	Relleno de material inerte de banco compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.	M3	30.00	$498.99	$14,969.70	0.35%
	TOTAL TERRACERIAS (CAMINO ALTERNO)				**$304,640.19**	**5.90%**
A02	**PRELIMINARES**					
31-0448	Apertura en caja por medios mecánicos en terreno tipo II-A, incluye acamellonamiento del material.	M3	558.00	$82.27	$45,906.66	1.06%
31-0454	Afine y compactación de sub rasante al 90 % PROCTOR mínimo, por medios mecánicos.	M2	1,471.35	$40.15	$59,074.70	1.37%
31-0457	Formación de base de 30 cms. de espesor con material producto de banco con equipo mecánico incluye vertido, afine, compactado al 95 % PROCTOR y agua.	M3	442.62	$519.14	$229,781.75	5.33%
32-0466	Afine y compactación en banquetas, andadores y plazas a mano incluye acarreos a primera estación.	M2	556.64	$39.85	$22,182.10	0.51%
	TOTALPRELIMINARES				**$356,945.21**	**8.28%**
A03	**CIMENTACIONES**					
4-0080	Excavación a mano en material tipo II-A, en seco y barreta de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad, depositando el producto de excavación a orilla de cepa, cualquier zona..	M3	16.00	$200.62	$3,209.92	0.07%
9-0139	Relleno de material producto de excavación compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor, incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.	M3	15.80	$83.66	$1,321.83	0.03%

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2021-2024

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
5-0102	Cama de arena para instalación de tubería incluye: acostillado, acarreo de material en 1ra. estación, material y mano de obra.	M3	2.00	$475.56	$951.12	0.02%
27-0412	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 3" CED. RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	50.00	$449.24	$22,462.00	0.52%
TOMDOM*	Toma domiciliaria de agua potable con tubo de CPVC de 13 mm. de 6 mts. de longitud, incluye: excavación, relleno, válvula de inserción, abrazadera de 4", acarreo de materiales, mano de obra y herramienta.	PZA	3.00	$1,760.31	$5,280.93	0.12%
314-IHS-07-087	Válvula de esfera de CPVC 13 mm, incluye: suministro de materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	3.00	$242.93	$728.79	0.02%
BOTA01	Caja para llave de banqueta (bota) incluye llave de cuadro roscable 1/2", herramienta menor, mano de obra, materiales y equipo.	PZA	3.00	$1,388.40	$4,165.20	0.10%
	TOTAL CIMENTACIONES				**$38,119.79**	**0.79%**
A04	**ESTRUCTURAS (MUROS, CONTRAFUERTES, TRABES Y LOSA)**					
EXC-001	Excavación por medios mecánicos en cepas de 0.00 A 2.00 mts de profundidad en material tipo II incluye afine de talud y fondo, acarreos a primera estación de 20 mts.	M3	47.26	$74.30	$3,511.42	0.08%
9-0139	Relleno de material producto de excavación compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor, incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.	M3	31.79	$83.66	$2,659.55	0.06%
6-0113	Relleno de material inerte de banco compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.	M3	13.62	$498.99	$6,796.24	0.16%
5-0102	Cama de arena para instalación de tubería incluye: acostillado, acarreo de material en 1ra. estación, material y mano de obra.	M3	3.37	$475.56	$1,602.64	0.04%
28-0417	Pozo de visita de forma cónica de 0.60 a 1.20 mts. de diámetro interior por 1.50 mts. de altura a base de mamposteria, muro de tabique de 25 cms. con aplanado de mortero cemento arena 1:3 acabado pulido, incluye excavación, acarreo y relleno.	PZA	2.00	$13,271.34	$26,542.68	0.62%
37-0579BP	Suministro y colocación de brocal y tapa de Polietileno alta resistencia abierto o cerrado para pozo de visita de 60 cm de diámetro, incluye material y mano de obra.	PZA	2.00	$4,210.10	$8,420.20	0.20%
26-0390*	Registro sanitario de 0.40x0.60x0.60 mts., a base de tabicón10x14x28, asentado con mortero cemento arena 1:3, aplanado interior acabado fino con mortero cemento arena 1:3, piso de 10 cm, de concreto simple F'c= 150 Kg/cm2, tapa de concreto F'c=250 Kg/cm2, armado con varilla del No. 3 @ 20 cm. en ambos sentidos, de 15 cm. de espesor incluye trazo, nivelación, barrenado y demolición de roca, acarreo y m.o.	PZA	2.00	$2,482.13	$4,964.26	0.12%
TUBO 8"	Suministro e instalación de tubo PVC sanitario de 8" de diametro incluye acarreos, materiales secundarios, conexiones y mano de obra.	M	42.80	$773.19	$33,092.53	0.77%

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2021-2024

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
SUM-COD2	SSuministro y colocación de codo PVC sanitario de 6"X45*, incluye carga y descarga en almacén de obra.	PZA	2.00	$356.10	$712.20	0.02%
PU-6255	Suministro y colocación de unión de servicio de P.V.C. De 150 mm (6") de diámetro para alcantarillado sanitario incluye carga y descarga en almacén de obra.	PZA	2.00	$624.14	$1,248.28	0.03%
PU-6239	Suministro de tubo de PVC sanitario de norma liso de 150 mm de diámetro, incluye flete, carga y descarga en almacén de obra.	ML	18.00	$483.03	$8,694.54	0.20%
	TOTAL ESTRUCTURAS (MUROS, CONTRAFUERTES, TRABES Y LOSA)				**$98,244.54**	**2.28%**
A05	**TERRACERIAS**					
18-0296	Muro de piedra braza de la región, asentada con mortero cemento arena 1:5, acabado común incluye: acarreo de materiales en 1ra. erstación de 20 mts.	M3	276.52	$2,755.36	$761,912.15	17.67%
18-0313	Dren para muro de mampostería a base de P.V.C. 4" tipo rígido incluye material y mano de obra.	ML	26.00	$130.32	$3,388.32	0.08%
18-0318	FILTRO DE GRAVA Y/O RAJUELA DE PIEDRA DE 30 CMS DE ESPESOR INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA	M3	53.70	$1,019.51	$54,747.69	1.27%
11-0151*	Anclaje de castillo de 20 x 15 cms. 4 var. # 4 y estribos del # 2 a.c. 20 cms. Hasta una profundidad de 50 cms., concreto f´c = 200 kg/cm2 incluye material y mano de obra.	PZA	13.00	$441.46	$5,738.98	0.13%
11-0160*	Cadena de desplante de concreto f'c=250 Kg/cm2, de 15x20 cm, armado con 6 varillas No.4 y estribos No. 2 a cada 25 cm, incluye cimbra común, acarreo de material 1ra. estación.	M	31.53	$882.93	$27,838.78	0.65%
11-0221	Losa de concreto f´c= 250 kg/cm2 de 10 cms de espesor armada con var. No. 4 a cada 15 cm. En ambos sentidos, para paso peatonal, según planos estructurales incluye cimbrado, armado, colado y descimbrado, material y mano de obra.	M2	26.80	$2,869.37	$76,899.12	1.78%
F-BARANDAL1	Suministro y colocación de barandal de tubo de acero negro de 1 1/2" con división de tubo de 1" con postes de 1 1/2" a cada metro soldado a placa de 1/2" de 15x15 cms. embutida en losa, incluye materiales, mano de obra, pintura, equipo y herramienta.	M	39.78	$2,373.49	$94,417.43	2.19%
	TOTAL TERRACERIAS				**$1,024,942.47**	**21.59%**
A06	**PAVIMENTACION**					
REG-AUX	Registro auxiliar para alumbrado público de 50x60x65mts., de tabique rojo recocido 7x14x28 cms., con 14 cms. de espesor asentado y aplanado con mortero cemento arena 1:5 incluye: plantilla de concreto de 10 cms de espesor f´c=100kg/cm2, marco y contramarco de ángulo de 1 1/2"x3/16" concreto f´c=200kg/cm2 en tapa y fijación de marco, drén de grava de 20 cms de espesor, herramienta menor, materiales y mano de obra.	PZA	8.00	$3,554.46	$28,435.68	0.66%
TUB-PESA50	Suministro y tendido de tubo conduit pvc pesado 50 mm de diámetro incluye conexión, trazo, excavación, relleno, cama de arena, herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra.	M	200.00	$201.24	$40,248.00	0.93%
	TOTAL PAVIMENTACION				**$68,683.68**	**1.59%**

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
2021-2024

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A07	**HERRERIA**					
4-0080	Excavación a mano en material tipo II-A, en seco y barreta de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad, depositando el producto de excavación a orilla de cepa, cualquier zona..	M3	64.35	$200.62	$12,909.90	0.30%
9-0138	Relleno de material inerte de banco compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.	M3	38.55	$498.99	$19,236.06	0.45%
32-0471	Guarnición de concreto simple de f'c= 200 kg/cm2 de 20x15x40 cm. de sección T.M.A. 3/4" Incluye cimbrado, descimbrado, materiales y mano de obra.	ML	424.35	$530.82	$225,253.47	5.23%
32-0475A	Pavimento premezclado F'c= 300 Kg/cm2, T.A.M. 3/4" de 20 cm. de espesor resistencia normal, acabado a regla incluye junta constructiva con chaflan de 1/2", en cada junta fria (al termino del colado) se procederá a colocar 8 conectores con varilla de 1/2" a cada 60 cms. 30-30 cms., fibra microsintetica, curado con curacreto, vibrado, acarreos de materiales a 1ra. estación.	M2	1,471.35	$976.95	$1,437,435.38	33.35%
SUMPOL	Suministro y colocación de hule negro calibre 600 para evitar deshidratación del concreto, incluye materiales, herramienta y mano de obra.	M2	1,471.35	$57.02	$83,896.38	1.95%
CORTE01	Corte de juntas en piso de concreto con cortadora manual de disco diamantado, incluye limpieza de la junta.	ML	522.00	$36.40	$19,000.80	0.44%
32-0484	Calafateo en losas y guarniciones a base de asfalto oxidado incluye material, desperdicios, acarreos a primera estación y mano de obra.	ML	522.00	$28.53	$14,892.66	0.35%
22-0333*	Pintura esmalte amarillo trafico en guarniciones con desarrollo de 30.0 cm., incluye material mano de obra y acarreos a primera estación.	ML	424.35	$91.64	$38,887.43	0.90%
32-0468	Banqueta de concreto hidráulico hecho en obra de f'c=150 kg/cm2 de 10 cms de espesor, T.M.A. 3/4", incluye curado, cimbrado, descimbrado, material y mano de obra.	M2	556.64	$538.78	$299,906.50	6.96%
	TOTAL DE HERRERIA				**$2,151,418.58**	**0.30%**
A08	**ACARREOS Y LIMPIEZAS**					
CARGA	Carga mecánica con uso de retroexcavadora y acarreo en camión de volteo (6M3) de material producto de excavación y/o demolición a tiro libre.	M3	979.64	$229.33	$224,660.84	5.21%
33-0528	Limpieza ultima general de obra para entrega con acopio y acarreo horizontal a 20 mts.	M2	2,692.81	$15.99	$43,058.03	1.00%
	Total ACARREOS Y LIMPIEZAS				**$267,718.87**	**6.21%**
	TOTAL REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.				**$4,310,713.33**	**100.00%**

SUBTOTAL	**$4,310,713.33**
I.V.A. 16.00%	**$689,714.13**
Total del presupuesto	**$5,000,427.46**

CANTIDAD CON LETRA

(CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 46/100 M. N.)

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-016-2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2021-2024

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Partida	Concepto	Importe
A	**Pavimentación integral de calle Felipe II, Fraccionamiento Farallón del Obispo**	
A1	Preliminares.	**$304,640.19**
(* TRESCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 19/100 M.N. *)		
A2	Terracerías	**$356,945.21**
(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 21/100 M.N. *)		
A3	Instalación Hidráulica.	**$38,119.79**
(* TREINTA Y OCHO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 79/100 M.N. *)		
A4	Instalación sanitaria.	**$98,244.54**
(* NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 54/100 M.N. *)		
A5	Albañileria	**$1,024,942.47**
(* UN MILLON VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N. *)		
A6	Instalaciones eléctricas y luminarias.	**$68,683.68**
(* SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 68/100 M.N. *)		
A7	Pavimentación.	**$2,151,418.58**
(* DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 58/100 M.N. *)		
A8	Acarreos y limpiezas.	**$267,718.87**
(* DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 87/100 M.N. *)		
A	**TOTAL Pavimentación integral de calle Felipe II, Fraccionamiento Farallón del Obispo**	**$4,310,713.33**

Total del presupuesto mostrado sin IVA: **$4,310,713.33**
IVA 16.00% **$689,714.13**
Total del presupuesto mostrado: **$5,000,427.46**
(* CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 46/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

X.- EXPLOSION DE INSUMOS

ACAPULCO

BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROYECTO: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES**
REGION: 07.- ACAPULCO
LOCALIDAD: **ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO** **MUNICIPIO:** 01.- ACAPULCO DE JUAREZ

RESUMEN DE EXPLOSION DE INSUMOS

CAPITULO			IMPORTE
MATERIALES		$	2,040,742.69
MANO DE OBRA		$	788,086.11
EQUIPO Y HERRAMIENTA		$	511,965.43
SUB-TOTAL		**$**	**3,340,794.23**
INDIRECTOS	**18.5842%**	$	620,859.88
SUMA		$	3,961,654.12
FINANCIAMIENTO	**0.7134%**	$	28,262.44
SUMA		$	3,989,916.56
UTILIDAD	**7.5000%**	$	299,243.74
SUMA		$	4,289,160.30
CARGOS ADICIONALES	**0.5025%**	$	21,553.03
SUMA		$	4,310,713.33
I . V. A	**16.00%**	$	689,714.13
TOTAL		**$**	**5,000,427.46**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-016-2023 **Fecha:** 03/08/2023 **Duración:** 90 días naturales

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

DOCUMENTO AE - 01 a

Inicio obra: 14/08/2023 **Fin obra:** 11/11/2023

Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Origen		Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
	MATERIALES		Nacional	Extranjero				
1.	ALAMBRE RECOCIDO	KG	x		230.823642	$38.00	$8,771.30	0.26%
3.	VARILLA DE 3/8" 9.5 MM	KG	x		66.983600	$28.36	$1,899.65	0.06%
7018	SOLDADURA ELECTRODO 7018	KG	x		9.945000	$137.00	$1,362.47	0.04%
AGUA	AGUA (MANEJO)	M3	x		493.993103	$50.80	$25,094.85	0.75%
ARENA	ARENA	M3	x		165.704562	$250.00	$41,426.14	1.24%
CAJA-BANQ	BOTA PARA LLAVE	PZA	x		3.000000	$750.00	$2,250.00	0.07%
CAL	CALHIDRA	TON	x		1.095974	$3,200.00	$3,507.12	0.10%
CLAVOS	CLAVOS DE 2 A 4 "	KG	x		58.877426	$65.00	$3,827.03	0.11%
CO06	PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 BCO. Y COLS. REG.	LT	x		47.739375	$285.00	$13,605.72	0.41%
CO08	PRIMARIO ANTICORROSIVO	LT	x		9.945000	$198.00	$1,969.11	0.06%
DUELA	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25"	PZA	x		80.784300	$30.00	$2,423.53	0.07%
GRAVA	GRAVA	M3	x		64.911075	$666.67	$43,274.27	1.30%
MAABR-4	ABRAZADERA DE 4 PULG	PZA	x		3.000000	$298.00	$894.00	0.03%
MAAC0001	ALAMBRE RECOCIDO	KG	x		24.032516	$28.50	$684.93	0.02%
MAAC0002	ALAMBRON # 2	KG	x		83.666000	$35.00	$2,928.31	0.09%
MAAC0003	ACERO DEL # 3 HASTA 6	KG	x		242.859580	$30.91	$7,506.79	0.22%
MAAC0004	ACERO DE REFUERZO DEL 3 AL 8 FY=4200 KG/	KG	x		36.000000	$34.00	$1,224.00	0.04%
MAAC0008	CLAVOS DE 2"	KG	x		0.760600	$55.00	$41.83	0.00%
MAACC-CPVC	ACCESORIOS DE CPVC	PZA	x		3.000000	$188.00	$564.00	0.02%
MAACER4	ACERO 4	KG	x		760.048000	$30.91	$23,493.08	0.70%
MAADAP-M1/2	ADAPTADOR MACHO BRONCE 1/2	PZA	x		3.000000	$135.00	$405.00	0.01%
MAAG0001	CEMENTO GRIS	TON	x		79.238764	$3,880.00	$307,446.41	9.20%
MAAG0008	AGUA (MANEJO)	M3	x		0.216771	$40.00	$8.67	0.00%
MABARR3.5	BARROTE PINO 3RA 1.5X3.5	PZA	x		19.564000	$75.00	$1,467.30	0.04%

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-016-2023 **Fecha:** 03/08/2023 **Duración:** 90 días naturales

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

DOCUMENTO AE - 01 a

Inicio obra: 14/08/2023 **Fin obra:** 11/11/2023

Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Origen		Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
MABROCAL-POL	BROCAL DE POLIETILENO	PZA	x		2.000000	$2,980.00	$5,960.00	0.18%
MACODO-PVC6	CODO PVC 6 PULG DIAM	PZA	x		2.000000	$255.00	$510.00	0.02%
MACON-1/2	CONECTOR CON VARILLA 1/2 DE 60 CM	PZA	x		588.540000	$78.00	$45,906.12	1.37%
MACONCE-PRE:	CONCRETO PREMEZCLADO FC= 300 KG/CM2	M3	x		301.626750	$2,320.00	$699,774.06	20.95%
MACON-PRE250	CONCRETO PREMEZCLADO FC= 250 KG/CM2	M3	x		2.814000	$2,020.00	$5,684.28	0.17%
MACURA-C	CURACRETO	LT	x		367.837500	$49.00	$18,024.04	0.54%
MADIESEL	DIESEL	LTO	x		12.843000	$21.20	$272.27	0.01%
MAEST-009	ESTOPA BLANCA	KG	x		0.100000	$81.00	$8.10	0.00%
MAFIBT-SIN	FIBRA MICRO SINTETICA	KG	x		176.562000	$220.00	$38,843.64	1.16%
MAGRA-RAY	GRAVA Y/O RAYUELA PARA FILTRO	M3	x		64.440000	$490.00	$31,575.60	0.95%
MAGRAVA	GRAVA PARA REGISTRO	M3	x		1.600000	$450.00	$720.00	0.02%
MAHE0007	TAPA REG. ELECT. 60X60 C/MRCO ANG. Y LAM	PZA	x		8.000000	$823.00	$6,584.00	0.20%
MAHILO	CARRETE DE HILO	PZA	x		21.542480	$50.00	$1,077.12	0.03%
MAHULE-N	HULE NEGRO CAL 600	M2	x		1574.344500	$35.00	$55,102.06	1.65%
MALA0180	ALAMBRE RECOCIDO No. 18	KG	x		0.200000	$30.00	$6.00	0.00%
MALIJ-TUB12	LIJA PARA TUBERIA	ML	x		0.250000	$22.50	$5.63	0.00%
MALLAVE-R1/2	LLAVE CUADRO ROSCABLE1/2PULG	PZA	x		3.000000	$225.00	$675.00	0.02%
MALLAV-INS1/2	LLAVE DE INSERCION 1/2"	PZA	x		3.000000	$90.00	$270.00	0.01%
MALLAV-NA1/2	LLAVE NARIZ BRONCE 1/2"	PZA	x		3.000000	$75.00	$225.00	0.01%
MAMA0001	MADERA DE PINO	PT	x		246.432000	$20.00	$4,928.64	0.15%
MAMA0002	CHAFLAN DE 1/2" X 1/2"	ML	x		3.350000	$25.00	$83.75	0.00%
MAMA0007	TRIPLAY DE PINO DE 16 MM.	PZA	x		5.748798	$775.00	$4,455.32	0.13%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-016-2023 **Fecha:** 03/08/2023 **Duración:** 90 días naturales

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

DOCUMENTO AE - 01 a

Inicio obra: 14/08/2023 **Fin obra:** 11/11/2023

Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Origen		Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
MAPE0001	ARENA DE LA REGION	M3	x		20.530519	$400.00	$8,212.21	0.25%
MAPE0002	GRAVA 1" A 3/4"	M3	x		0.730176	$390.00	$284.77	0.01%
MAPEG-PVC	PEGAMENTO PVC	PZA	x		11.350000	$71.00	$805.85	0.02%
MAPIED-BRA	PIEDRA BRAZA DE LA REGION	M3	x		373.302000	$749.00	$279,603.20	8.37%
MAPIN-ESM	PINTURA ESMALTE MCA COMEX O SIMILAR	LT			8.950500	$285.00	$2,550.89	0.08%
MAPLAC	PLACA 15X15 CM	KG	x		89.505000	$40.00	$3,580.20	0.11%
MAPLANN	PLANO	PLAN	x		0.683974	$12,500.00	$8,549.67	0.26%
MAPOLIN	POLIN DE 3RA VARIAS MEDIDAS	PT	x		83.267600	$17.70	$1,473.84	0.04%
MAPRUEBA-H	PRUEBA HIDROSTATICA	PRUE	x		1.500000	$450.00	$675.00	0.02%
MASFALT	ASFALTO OXIDADO	LT	x		195.750000	$32.00	$6,264.00	0.19%
MATABICON	TABICON	PZA	x		60.000000	$12.00	$720.00	0.02%
MATABIQUE	TABIQUE COMUN BARRO R.R. DE 7x14x28 CM.	PZA	x		2220.000000	$5.00	$11,100.00	0.33%
MATABL	TABLA DE 3RA	PZA	x		181.776000	$185.00	$33,628.56	1.01%
MATA-REG	TAPADERA DE REGISTRO CON ANGULO Y CONCRETO	PZA	x		2.000000	$750.00	$1,500.00	0.04%
MATBANCO	MATERIAL DE BANCO	M3	x		633.856500	$275.00	$174,310.54	5.22%
MATUB-1	TUBO ACERO 1 PULG	PZA	x		33.813000	$430.00	$14,539.59	0.44%
MATUB-3	TUBO PVC 3 PULG DIAM CED RD26	ML	x		53.500000	$275.00	$14,712.50	0.44%
MATUB-8PVC	TUBO PVC SANITARIO 8 PULG	ML	x		45.796000	$450.00	$20,608.20	0.62%
MATUB-ACE	TUBO DE ACERO 1 1/2 PULG	PZA	x		19.890000	$850.00	$16,906.50	0.51%
MATUB-CON50	TUBO CONDUIT PVC PESADO 50 MM	ML	x		214.000000	$32.00	$6,848.00	0.20%
MATUB-CPVC1/2	TUBERIA DE CPVC 1/2 PULG	ML	x		18.000000	$44.00	$792.00	0.02%
MATUB-PVC4	TUBO PVC 4"	ML	x		26.780000	$49.00	$1,312.22	0.04%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-016-2023 **Fecha:** 03/08/2023 **Duración:** 90 días naturales

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

DOCUMENTO
AE - 01 a

Inicio obra: 14/08/2023 **Fin obra:** 11/11/2023

Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Origen		Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
MATUB-PVC-6	TUBO PVC SANITARIO 6 PULG	ML	x		19.260000	$295.00	$5,681.70	0.17%
MAUNI-6	UNION SERVICIO PVC 6 PULG	PZA	x		2.000000	$380.00	$760.00	0.02%
MAVAL-ESF13	VALVULA ESFERA CPVC 13MM	PZA	x		3.000000	$160.00	$480.00	0.01%
MCLA0021	CLAVO	KG	x		0.200000	$45.00	$9.00	0.00%
SEG-CORT	SEGUETA PARA CORTE	PZA	x		0.100000	$15.94	$1.59	0.00%
THINNER	THINNER STANDARD	LT	x		104.760000	$77.00	$8,066.52	0.24%
	TOTAL MATERIALES						**$2,040,742.69**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-016-2023 **Fecha:** 03/08/2023 **Duración:** 90 días naturales

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

DOCUMENTO
AE - 01 b

Inicio obra: 14/08/2023 **Fin obra:** 11/11/2023

Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
	MANO DE OBRA						
MO01	PEON	JOR	03/08/2023	951.502042	$444.84	$423,266.17	12.67%
MO02	OFIC. ALBAÑIL	JOR	03/08/2023	303.264249	$836.56	$253,698.74	7.59%
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	03/08/2023	6.502857	$679.86	$4,421.03	0.13%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	03/08/2023	55.007865	$914.91	$50,327.25	1.51%
MO083	OFIC. PLOMERO	JOR	03/08/2023	6.502857	$601.54	$3,911.73	0.12%
MOAY0001	AYUDANTE GENERAL	JOR	03/08/2023	48.085225	$601.54	$28,925.19	0.87%
MO-ELEC	OFIC. ELECTRICO	JOR	03/08/2023	5.000000	$640.71	$3,203.55	0.10%
MOF-H	OFIC. HERRERO	JOR	03/08/2023	12.240000	$640.71	$7,842.29	0.23%
MOFI0001	OFIC. FIERRERO	JOR	03/08/2023	8.121212	$640.71	$5,203.34	0.16%
MOF-P	OFIC. PINTOR	JOR	03/08/2023	11.373041	$640.71	$7,286.82	0.22%
	TOTAL MANO DE OBRA					**$788,086.11**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO

Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
	EQUIPO Y HERRAMIENTA						
EQBAILAR	BAILARINA DE 4.5 HP	HOR	03/08/2023	61.325900	$100.33	$6,152.83	0.19%
EQCORTAP	CORTADORA DE PISO	HOR	03/08/2023	33.930000	$123.01	$4,173.73	0.12%
EQCV0001	CAMION VOLTEO DE 6 M3	HORA	03/08/2023	249.051273	$804.00	$200,237.22	5.99%
EQECORTE	EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO	HOR	03/08/2023	1.392300	$1,176.92	$1,638.63	0.05%
EQMOTO14H	MOTONIVELADORA CAT 14H DE 215 HP	HOR	03/08/2023	38.458600	$1,521.63	$58,519.76	1.62%
EQPIPA	CAMION PIPA DE 9 M3	HOR	03/08/2023	21.977387	$717.78	$15,774.93	0.47%
EQPLAN	PLANTA DE SOLDAR MILLER	HOR	03/08/2023	19.890000	$67.36	$1,339.79	0.04%
EQRE0001	REVOLVEDORA DE 1 SACO	HORA	03/08/2023	0.570450	$71.34	$40.70	0.00%
EQRETROEXCA	RETRO EXCAVADORA CAT 90 HP	HOR	03/08/2023	335.354011	$540.44	$181,238.72	4.60%
EQTRAN	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	HOR	03/08/2023	323.137200	$11.48	$3,709.62	0.11%
EQVAP	VIBROCOMPACTADOR VAP 70	HOR	03/08/2023	8.828100	$795.89	$7,026.20	0.21%
EQVG0002	VIBRADOR DE GASOLINA	HORA	03/08/2023	0.285225	$47.62	$13.58	0.00%
EQVIB	VIBRADOR PARA CONCRETO	HOR	03/08/2023	200.010750	$160.49	$32,099.73	0.66%
	TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA					**$511,965.43**	

RESUMEN DE EXPLOSION DE INSUMOS

MATERIALES	$ 2,040,742.69
MANO DE OBRA	$ 788,086.11
EQUIPO Y HERRAMIENTA	$ 511,965.43
TOTAL	$ 3,340,794.23

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

XI.- PROGRAMA DE OBRA

ACAPULCO

BIENESTAR

FAIS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

PROGRAMA DE OBRA FISICO - FINANCIERO
(CALENDARIO DE EJECUCION)

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES**

UBICACIÓN: **ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO** FECHA DE INICIO: **agosto-2023**

CONCEPTO	COSTO $	PONDERACION FISICO	PONDERACION FINANC.	MESES 7	8	9	10	11	12
PRELIMINARES	$ 304,640.19	6.67%	7.07%		■				
TERRACERIAS	$ 356,945.21	6.67%	8.28%					■	
INSTALACION SANITARIA	$ 38,119.79	13.33%	0.88%				■	■	
INSTALACION HIDRAULICA	$ 98,244.54	13.33%	2.28%				■	■	
ALBAÑILERIA	$ 1,024,942.47	26.67%	23.78%			■	■	■	
INSTALACION ELECTRICA Y LUMINARIAS	$ 68,683.68	6.67%	1.59%					■	
PAVIMENTACION	$ 2,151,418.58	6.67%	49.91%					■	
ACARREOS Y LIMPIEZA	$ 267,718.87	20.00%	6.21%					■	■
SUBTOTAL	$ 4,310,713.33	100%	100%						
16 % IVA	$ 689,714.13								
TOTAL	**$ 5,000,427.46**	**100%**	**100%**						

OBSERVACIONES:

ACAPULCO

BIENESTAR

FAIS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

CALENDARIO DE MINISTRACION DE RECURSOS

PROGRAMA: **URBANIZACION**

MUNICIPIO: **ACAPULCO DE JUAREZ**

FECHA DE INICIO: **agosto-2023**

CONCEPTO	COSTO $	PONDERACION		MESES											
		FISICO	FINANC.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES															
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO	$ 4,310,713.33	100%	100%												
SUBTOTAL	$ 4,310,713.33														
IVA	$ 689,714.13														
TOTAL	**$ 5,000,427.46**	**100%**	**100%**												

OBSERVACIONES:

XII.- NUMEROS GENERADORES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	C O N C E P T O	EJE	TRAMO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD EJECUTADA	REFERENCIA
A01	**TRABAJOS PRELIMINARES**									
3-0073	Trazo y nivelación topográficas del terreno para estructuras estableciendo ejes y referencias, para superficie mayores a 300.00 m2 (vialidad) incluye: elaboración de planos			M2	2,692.81				2,692.81	
								M2	2,692.81	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.


BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CROQUIS

A01 **TRABAJOS PRELIMINARES**

3-0073 Trazo y nivelación topográficas del terreno para estructuras estableciendo ejes y referencias, para superficie mayores a 300.00 m2 (vialidad) incluye: elaboración de planos

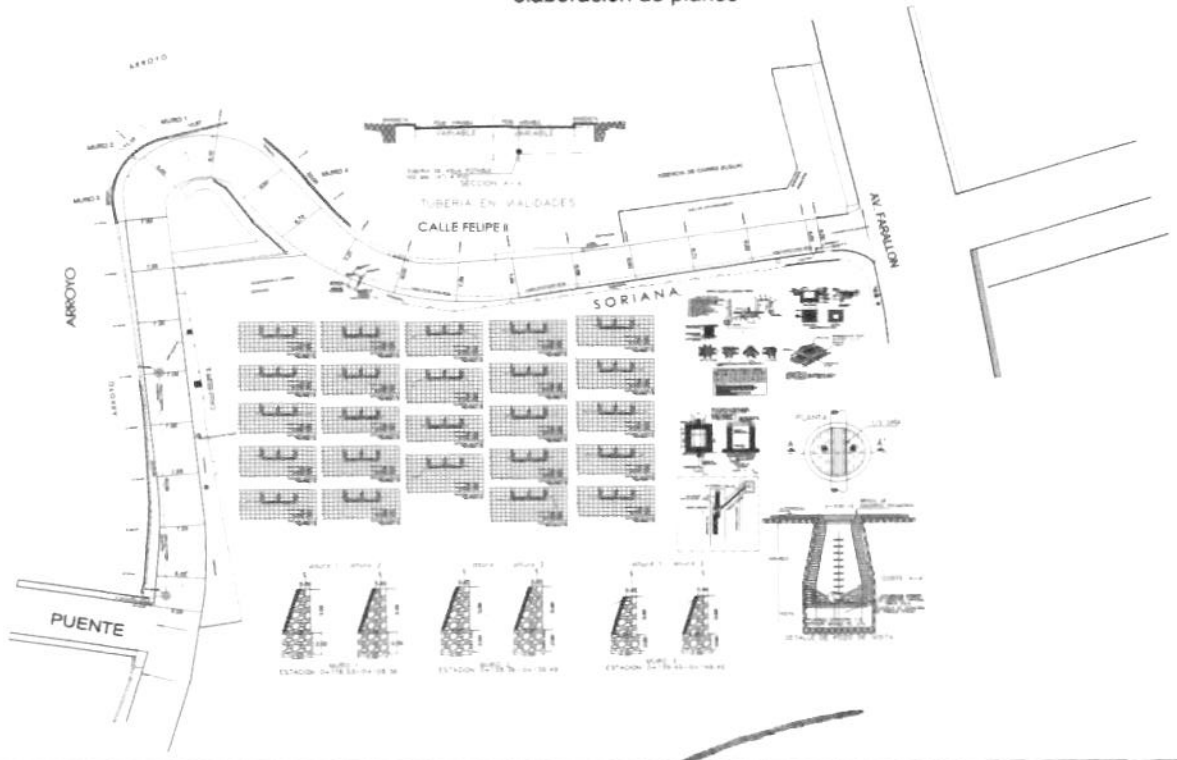

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	C O N C E P T O	EJE	TRAMO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD EJECUTADA	REFERENCIA
D-CARSA10	Demolición a maquina de carpeta asfaltica de 5.00 a 10.00 cms. De espesor. Incluye mano de obra y acarreos en 1a. estación.			M2	1,649.00				1,649.00	
								M2	1,649.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CROQUIS

D-CAR5A10 Demolición a maquina de carpeta asfaltica de 5.00 a 10.00 cms. De espesor. Incluye mano de obra y acarreos en 1a. estación.

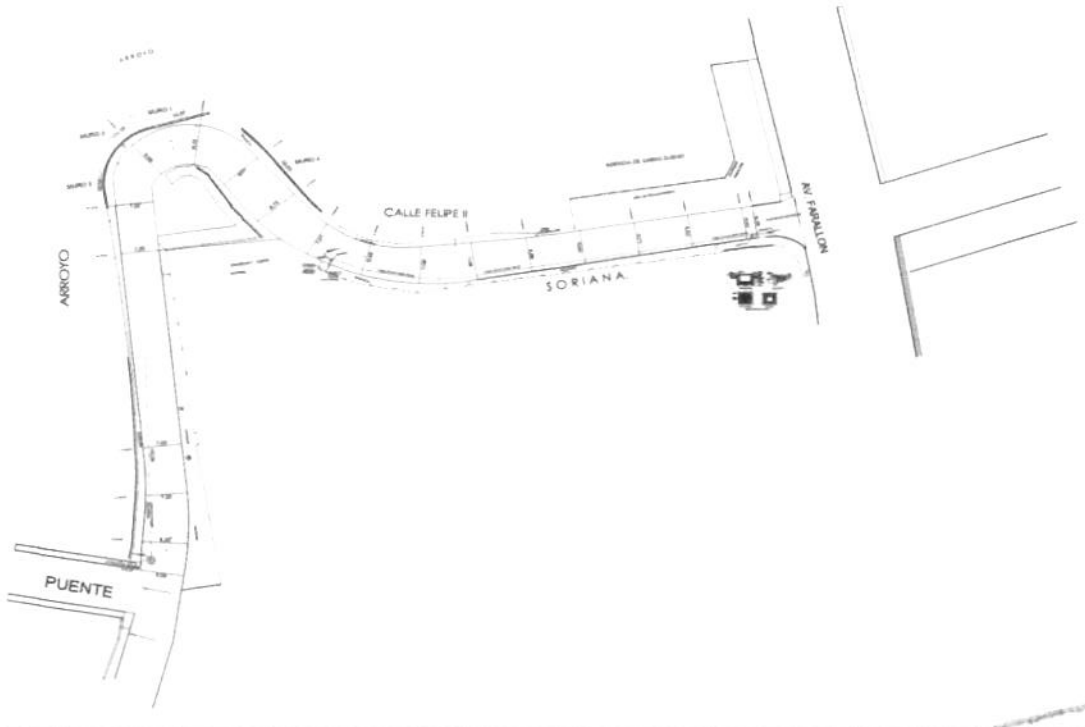



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	C O N C E P T O	EJE	TRAMO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD EJECUTADA	REFERENCIA
D-BANQU	Demolición mecánica de banqueta de 10 cms. de espesor incluye: herramienta menor, equipo y mano de obra.			M2	146.04				146.04	
								M2	146.04	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CROQUIS

D-BANQU Demolición mecánica de banqueta de 10 cms. de espesor incluye: herramienta menor, equipo y mano de obra.

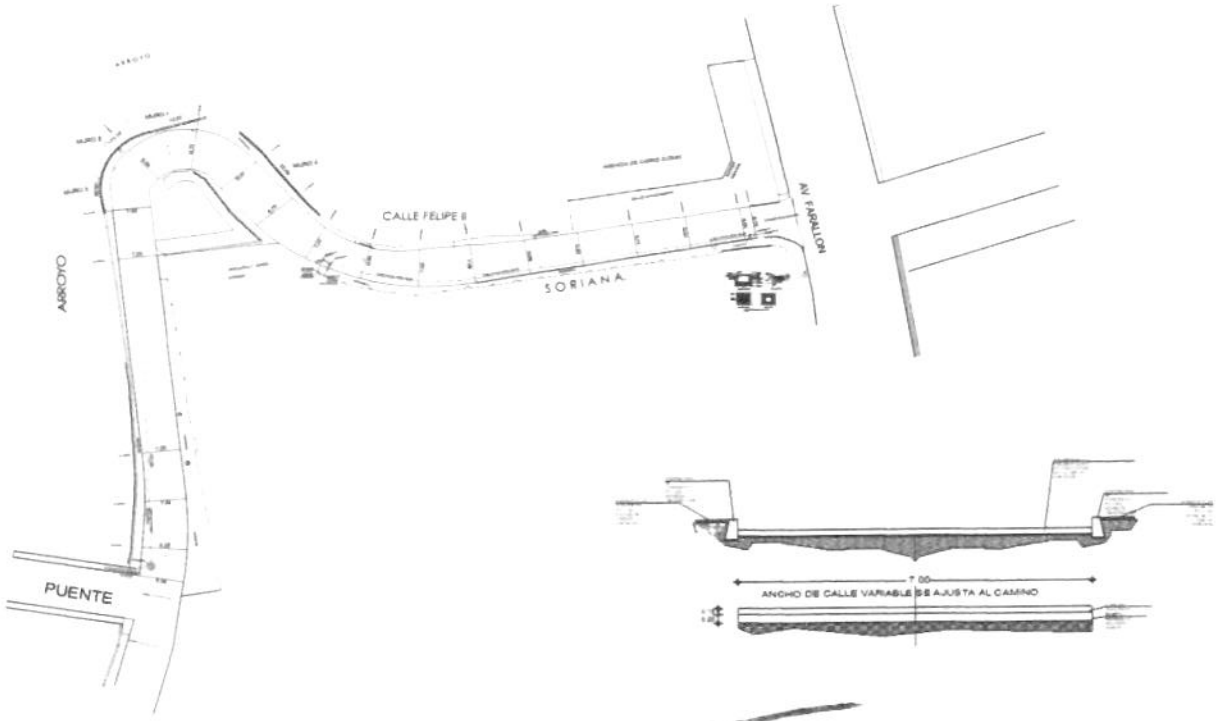

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	C O N C E P T O	EJE	TRAMO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD EJECUTADA	REFERENCIA
D-GUARM	Demolición mecánica de guarnición de 15x20x50 cm., incluye extracción de pedacería, mano de obra, equipo y herramienta.			M	183.67				183.67	
								M	183.67	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.


BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CROQUIS

D-GUARM Demolición mecánica de guarnición de 15x20x50 cm., incluye extracción de pedacería, mano de obra, equipo y herramienta.

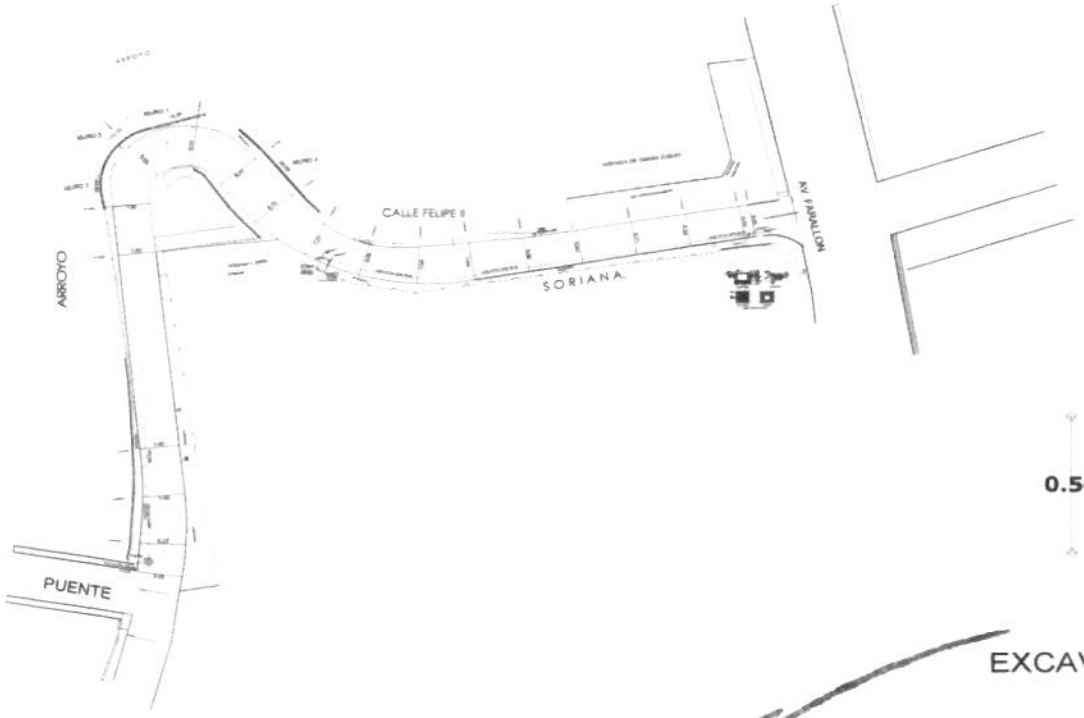

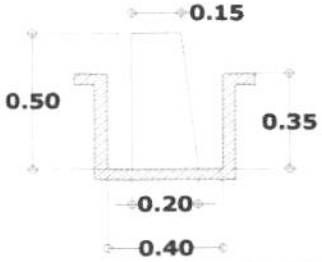

EXCAVACION GUARNICION

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	C O N C E P T O	EJE	TRAMO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD EJECUTADA	REFERENCIA
1-0056	Descoronamiento de muro de piedra braza de 30 cm de ancho incluye: acarreo de material fuera de la obra producto de la demolición.			M	120.00				120.00	
								M	**120.00**	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.


BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CROQUIS

1-0056 Descoronamiento de muro de piedra braza de 30 cm de ancho incluye: acarreo de material fuera de la obra producto de la demolición.

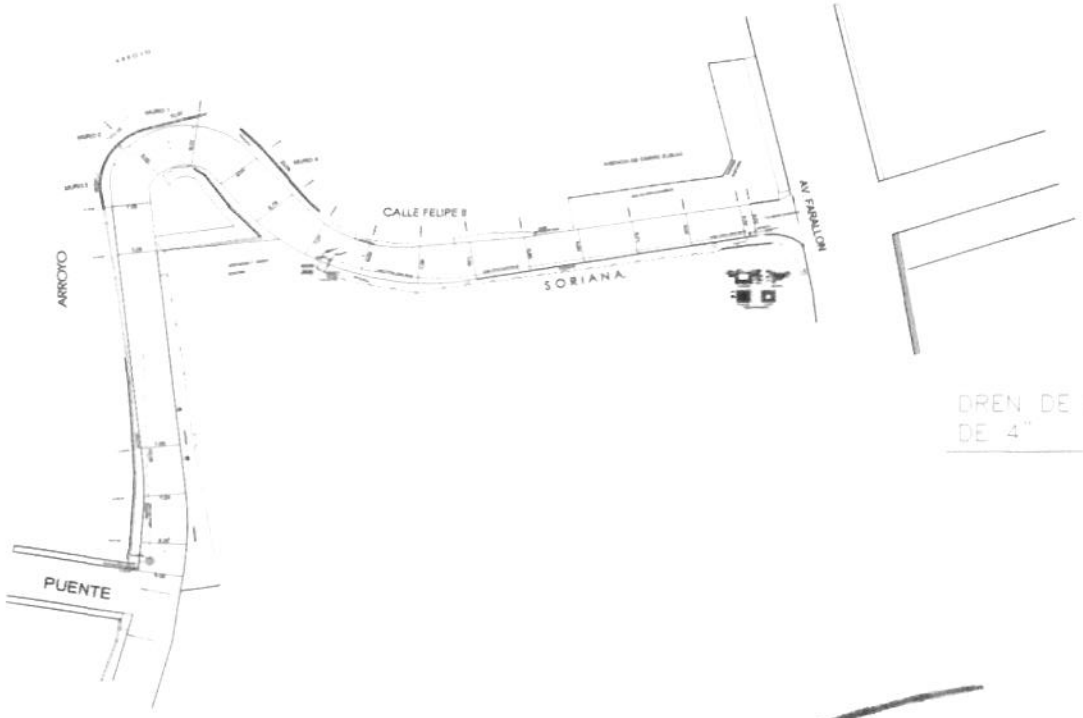

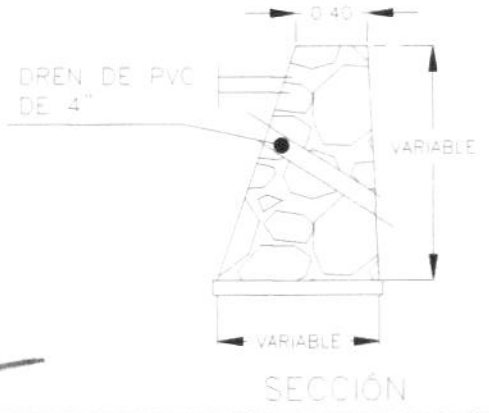

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	C O N C E P T O	EJE	TRAMO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD EJECUTADA	REFERENCIA
EXC-001	Excavación por medios mecánicos en cepas de 0.00 A 2.00 mts de profundidad en material tipo II incluye afine de talud y fondo, acarreos a primera estación de 20 mts.			M3	699.43				699.43	
								M3	**699.43**	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.


BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CROQUIS

EXC-001 Excavación por medios mecánicos en cepas de 0.00 A 2.00 mts de profundidad en material tipo II incluye afine de talud y fondo, acarreos a primera estación de 20 mts.

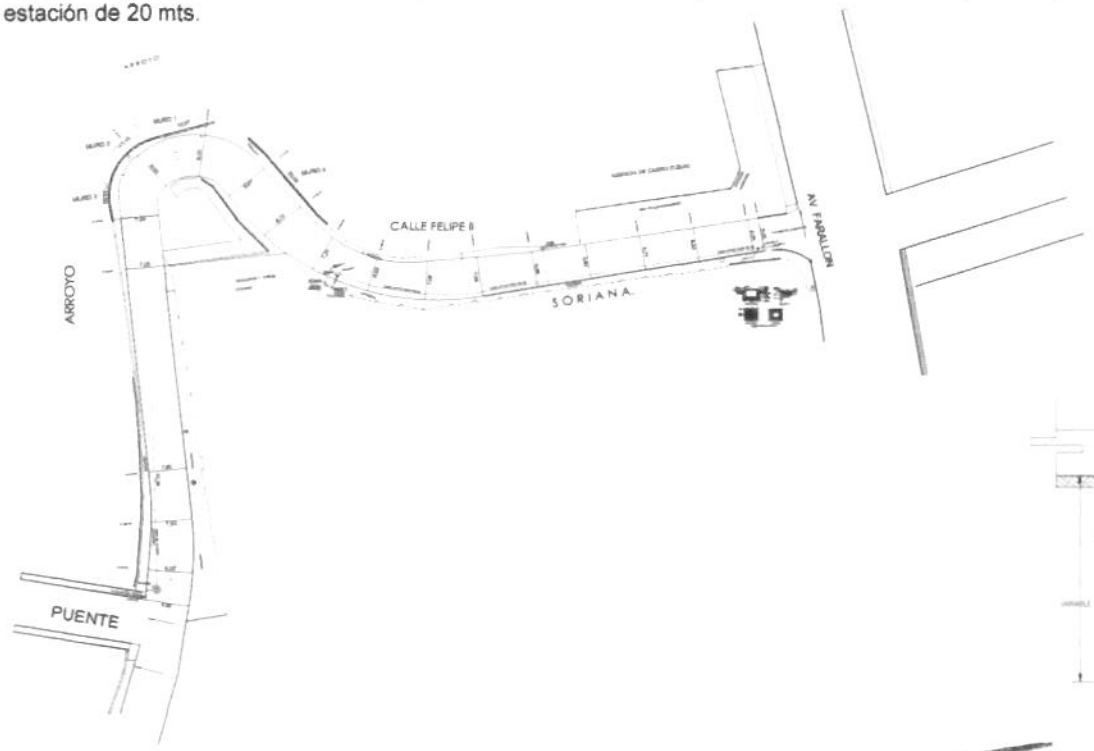

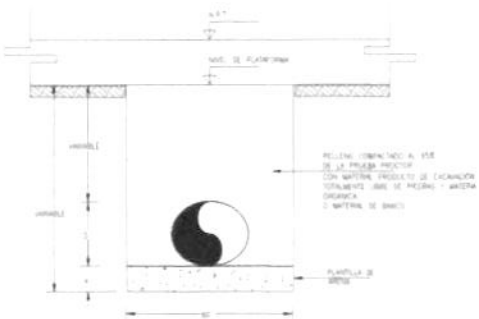

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	C O N C E P T O	EJE	TRAMO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD EJECUTADA	REFERENCIA
9-0139	Relleno de material producto de excavación compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor, incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.			M3	420.29				420.29	
								M3	**420.29**	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.


BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CROQUIS

9-0139 Relleno de material producto de excavación compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor, incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.

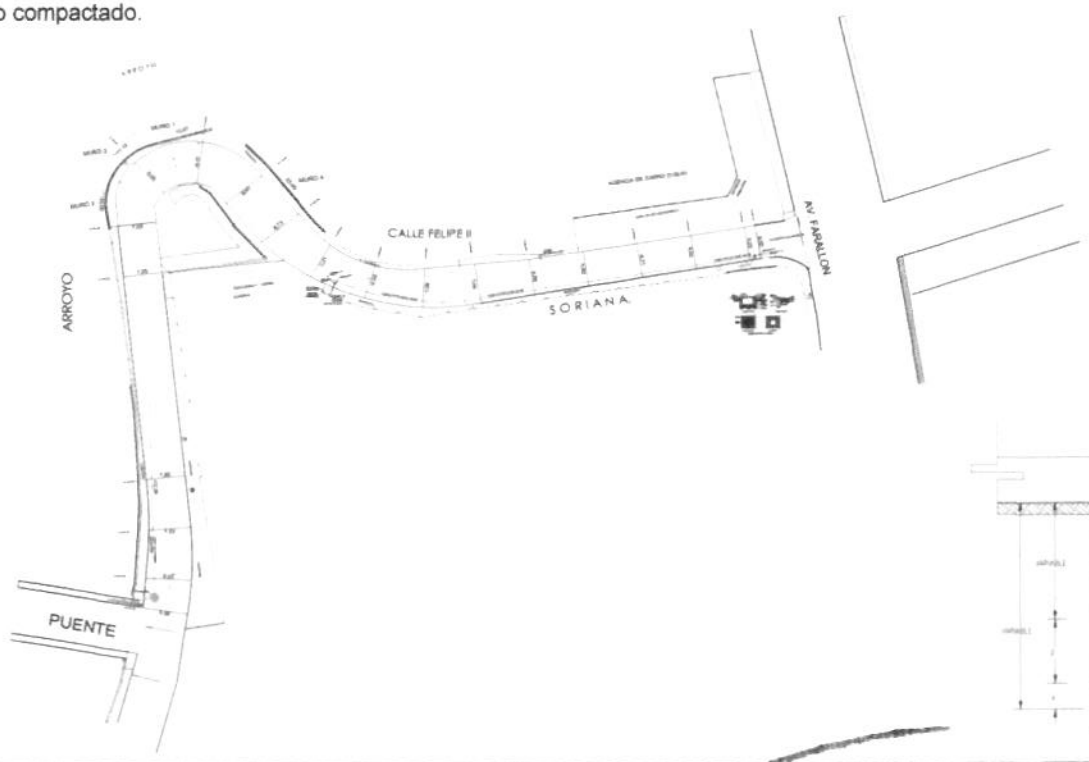

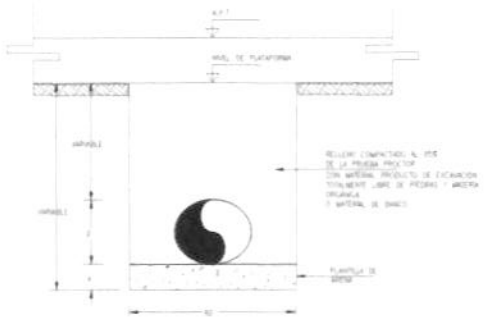

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD EJECUTADA	REFERENCIA
9-0138	Relleno de material inerte de banco compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.			M3	30.00				30.00	
								M3	**30.00**	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.


BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CROQUIS

9-0138 Relleno de material inerte de banco compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.

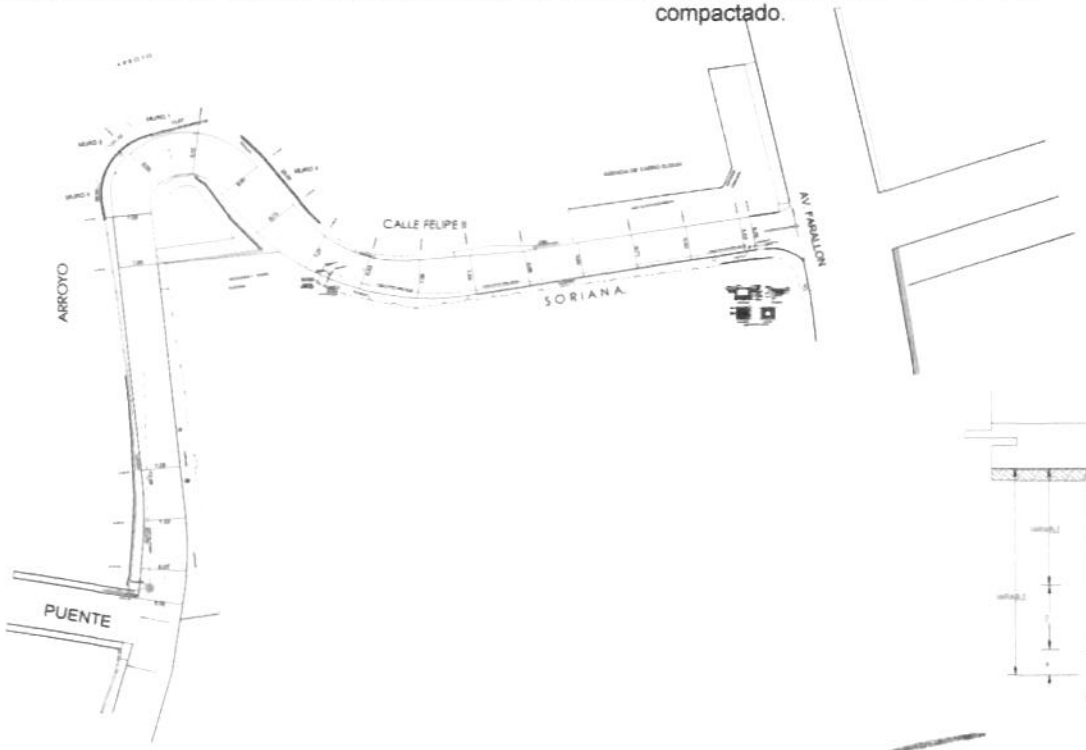

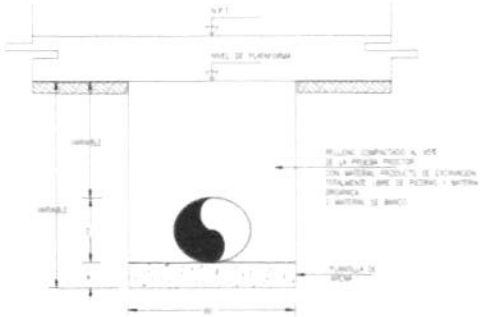

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	C O N C E P T O	EJE	TRAMO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD EJECUTADA	REFERENCIA
31-0448	Apertura en caja por medios mecánicos en terreno tipo II-A, incluye acamellonamiento del material.			M3	558.00				558.00	
								M3	**558.00**	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CROQUIS

31-0448 Apertura en caja por medios mecánicos en terreno tipo II-A, incluye acamellonamiento del material.

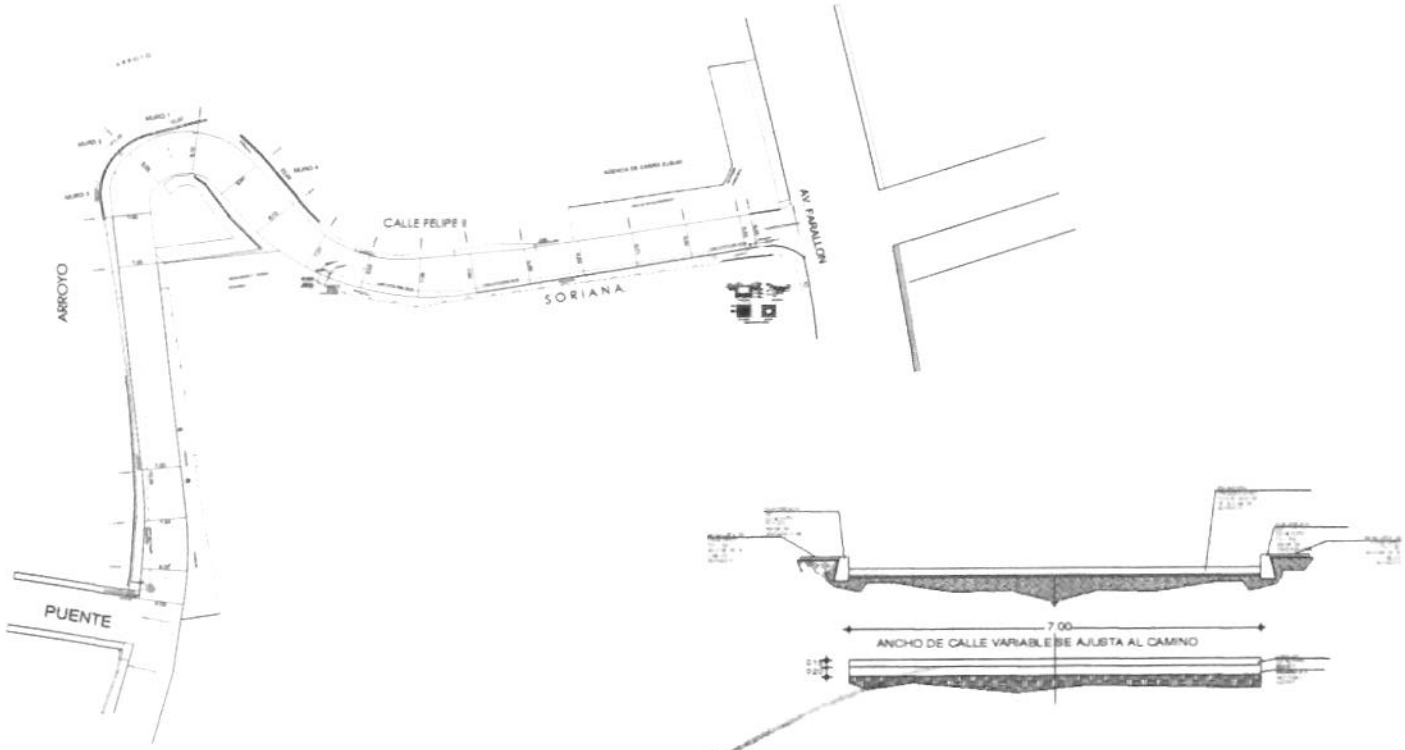

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	C O N C E P T O	EJE	TRAMO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD EJECUTADA	REFERENCIA
31-0454	Afine y compactación de sub rasante al 90 % PROCTOR mínimo, por medios mecánicos.			M2	1,471.35				1,471.35	
								M2	**1,471.35**	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAR

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CROQUIS

31-0454 Afine y compactación de sub rasante al 90 % PROCTOR mínimo, por medios mecánicos.

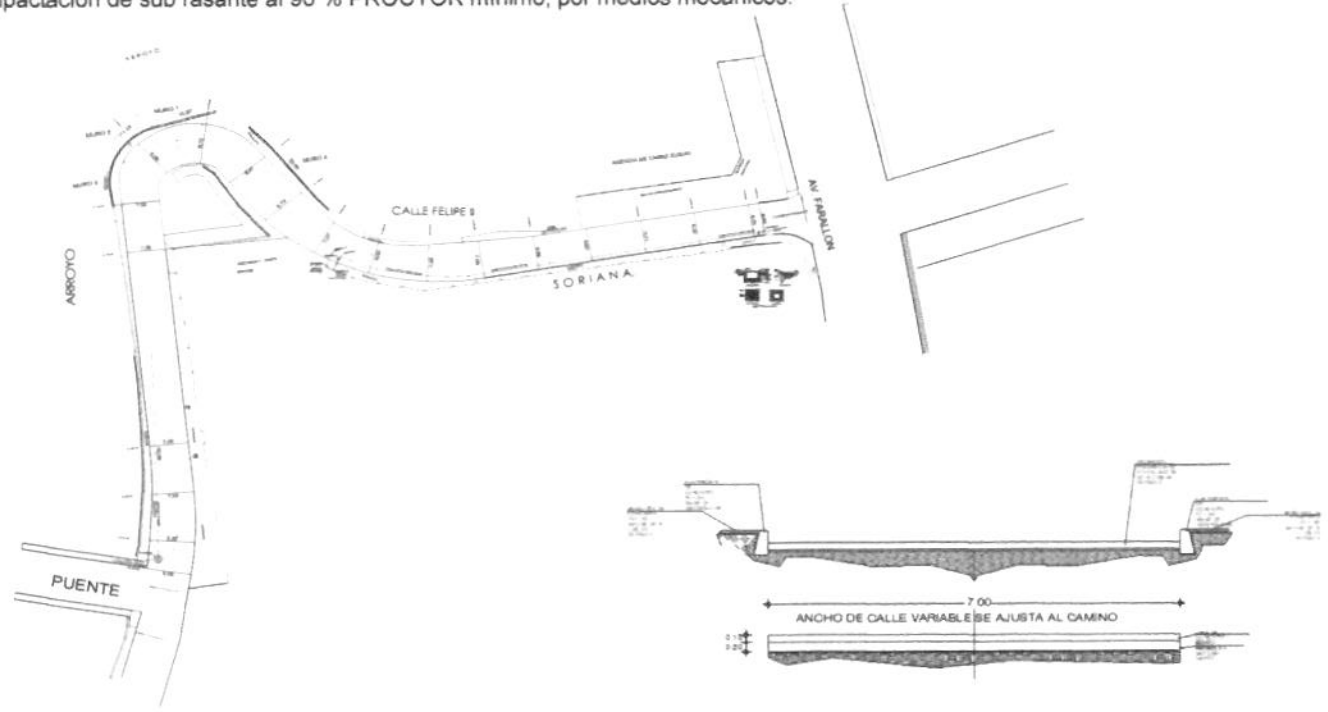

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	C O N C E P T O	EJE	TRAMO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD EJECUTADA	REFERENCIA
31-0457	Formación de base de 30 cms. de espesor con material producto de banco con equipo mecánico incluye vertido, afine, compactado al 95 % PROCTOR y agua.			M3	442.62				442.62	
								M3	**442.62**	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAR
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero


CROQUIS

31-0457 Formación de base de 30 cms. de espesor con material producto de banco con equipo mecánico incluye vertido, afine, compactado al 95 % PROCTOR y agua.





EXCAVACION GUARNICION



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	C O N C E P T O	EJE	TRAMO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD EJECUTADA	REFERENCIA
32-0466	Afine y compactación en banquetas, andadores y plazas a mano incluye acarreos a primera estación.			M2	556.64				556.64	
								M2	**556.64**	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAR

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.


BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero


CROQUIS

32-0466 Afine y compactación en banquetas, andadores y plazas a mano incluye acarreos a primera estación.



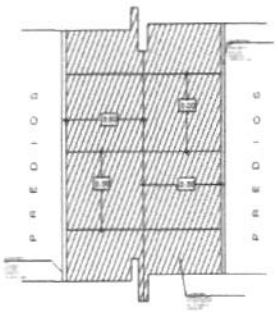

EXCAVACION GUARNICION



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	C O N C E P T O	EJE	TRAMO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD EJECUTADA	REFERENCIA
4-0080	Excavación a mano en material tipo II-A, en seco y barreta de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad, depositando el producto de excavación a orilla de cepa, cualquier zona..			M3	16.00				16.00	
								M3	**16.00**	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAR

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CROQUIS

4-0080 Excavación a mano en material tipo II-A, en seco y barreta de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad, depositando el producto de excavación a orilla de cepa, cualquier zona..



EXCAVACION GUARNICION



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD EJECUTADA	REFERENCIA
9-0139	Relleno de material producto de excavación compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor, incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.			M3	15.80				15.80	
								M3	**15.80**	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES


H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CROQUIS

9-0139 Relleno de material producto de excavación compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor, incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.



EXCAVACION GUARNICION



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAR
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	C O N C E P T O	EJE	TRAMO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD EJECUTADA	REFERENCIA
5-0102	Cama de arena para instalación de tubería incluye: acostillado, acarreo de material en 1ra. estación, material y mano de obra.			M3	2.00				2.00	
								M3	**2.00**	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.


BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CROQUIS

5-0102 Cama de arena para instalación de tubería incluye: acostillado, acarreo de material en 1ra. estación, material y mano de obra.

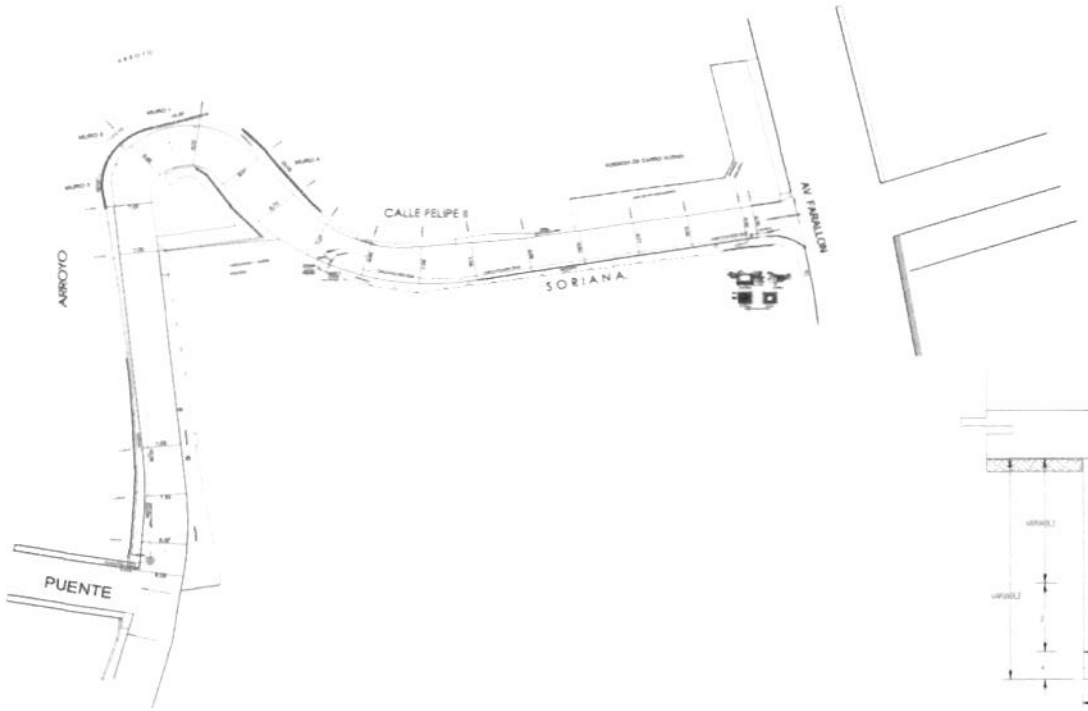

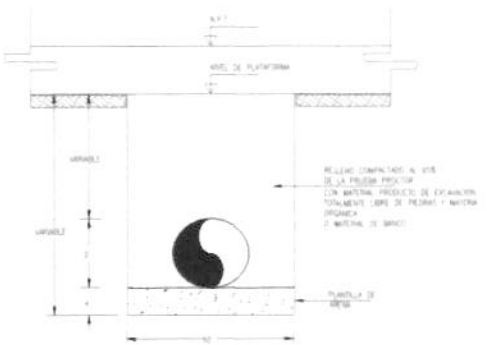

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	C O N C E P T O	EJE	TRAMO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD EJECUTADA	REFERENCIA
27-0412	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 3" CED. RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.			ML	50.00				50.00	
								ML	**50.00**	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CROQUIS

27-0412 SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 3" CED. RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

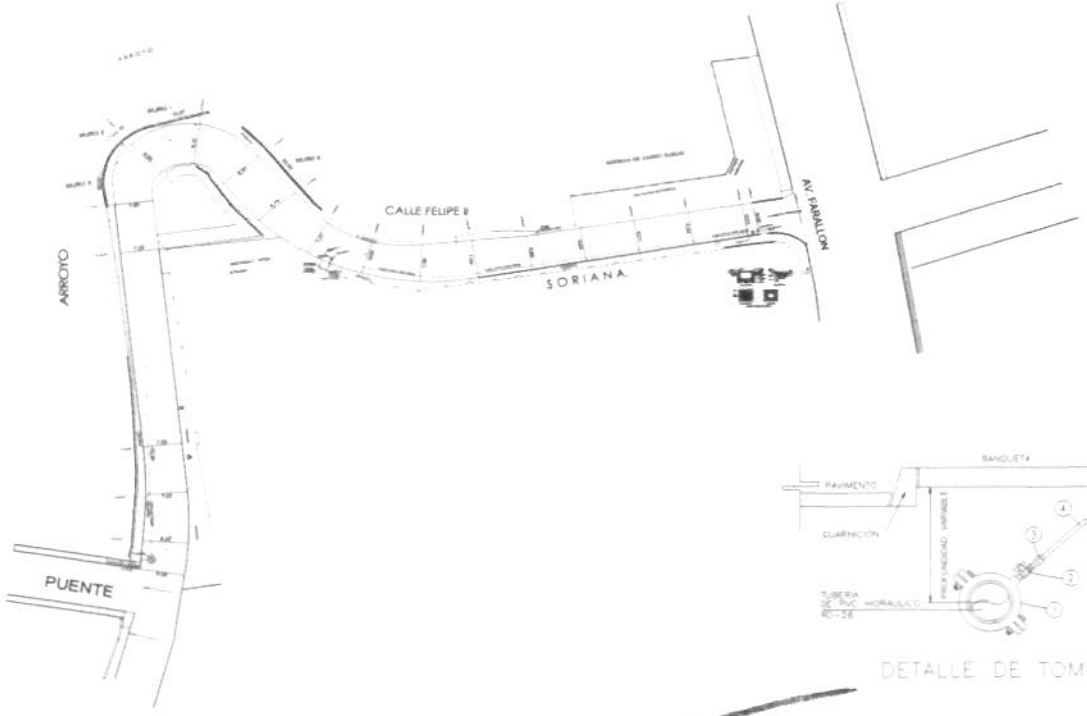

DETALLE DE TOMA DOMICILIARIA

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	C O N C E P T O	EJE	TRAMO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD EJECUTADA	REFERENCIA
TOMDOM*	Toma domiciliaria de agua potable con tubo de CPVC de 13 mm. de 6 mts. de longitud, incluye: excavación, relleno, válvula de inserción, abrazadera de 4", acarreo de materiales, mano de obra y herramienta.			PZA	3.00				3.00	
								PZA	**3.00**	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.


BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CROQUIS

TOMDOM* Toma domiciliaria de agua potable con tubo de CPVC de 13 mm. de 6 mts. de longitud, incluye: excavación, relleno, válvula de inserción, abrazadera de 4", acarreo de materiales, mano de obra y herramienta.

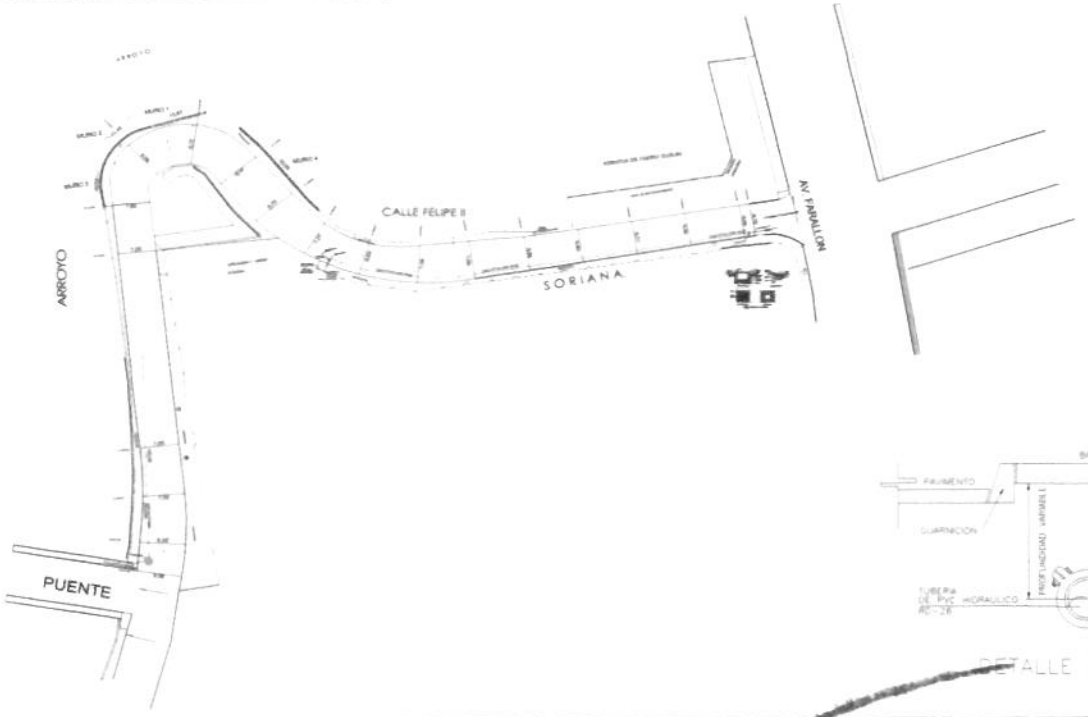

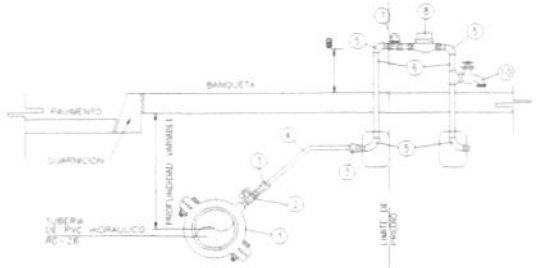

DETALLE DE TOMA DOMICILIARIA

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD EJECUTADA	REFERENCIA
314-IHS-07-087	Válvula de esfera de CPVC 13 mm, incluye: suministro de materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.			PZA	3.00				3.00	
								PZA	**3.00**	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CROQUIS

314-IHS-07-087 Válvula de esfera de CPVC 13 mm, incluye: suministro de materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.

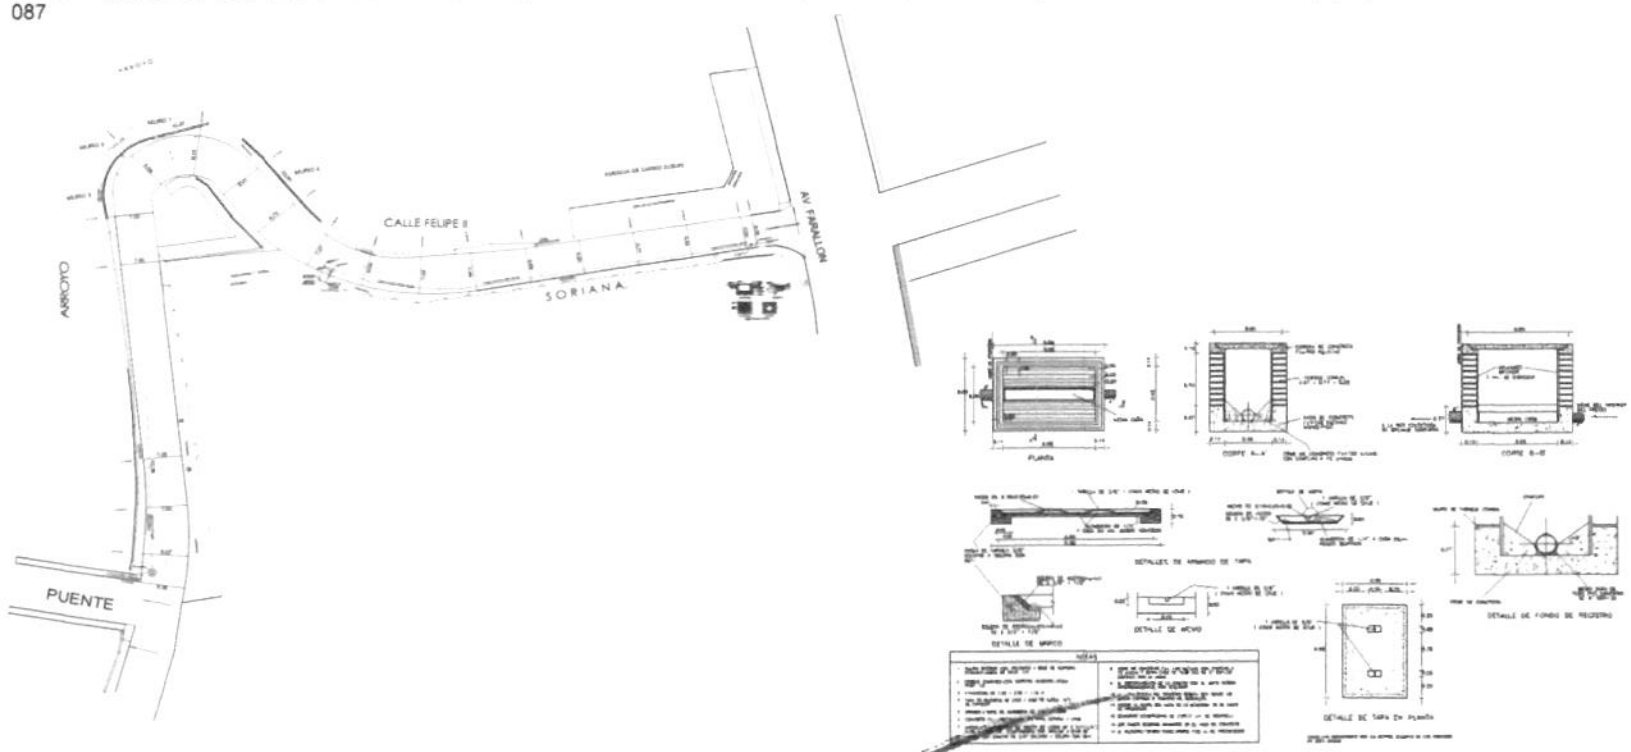

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	C O N C E P T O	EJE	TRAMO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD EJECUTADA	REFERENCIA
BOTA01	Caja para llave de banqueta (bota) incluye llave de cuadro roscable 1/2", herramienta menor, mano de obra, materiales y equipo.			PZA	3.00				3.00	
								PZA	**3.00**	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CROQUIS

BOTA01 Caja para llave de banqueta (bota) incluye llave de cuadro roscable 1/2", herramienta menor, mano de obra, materiales y equipo.

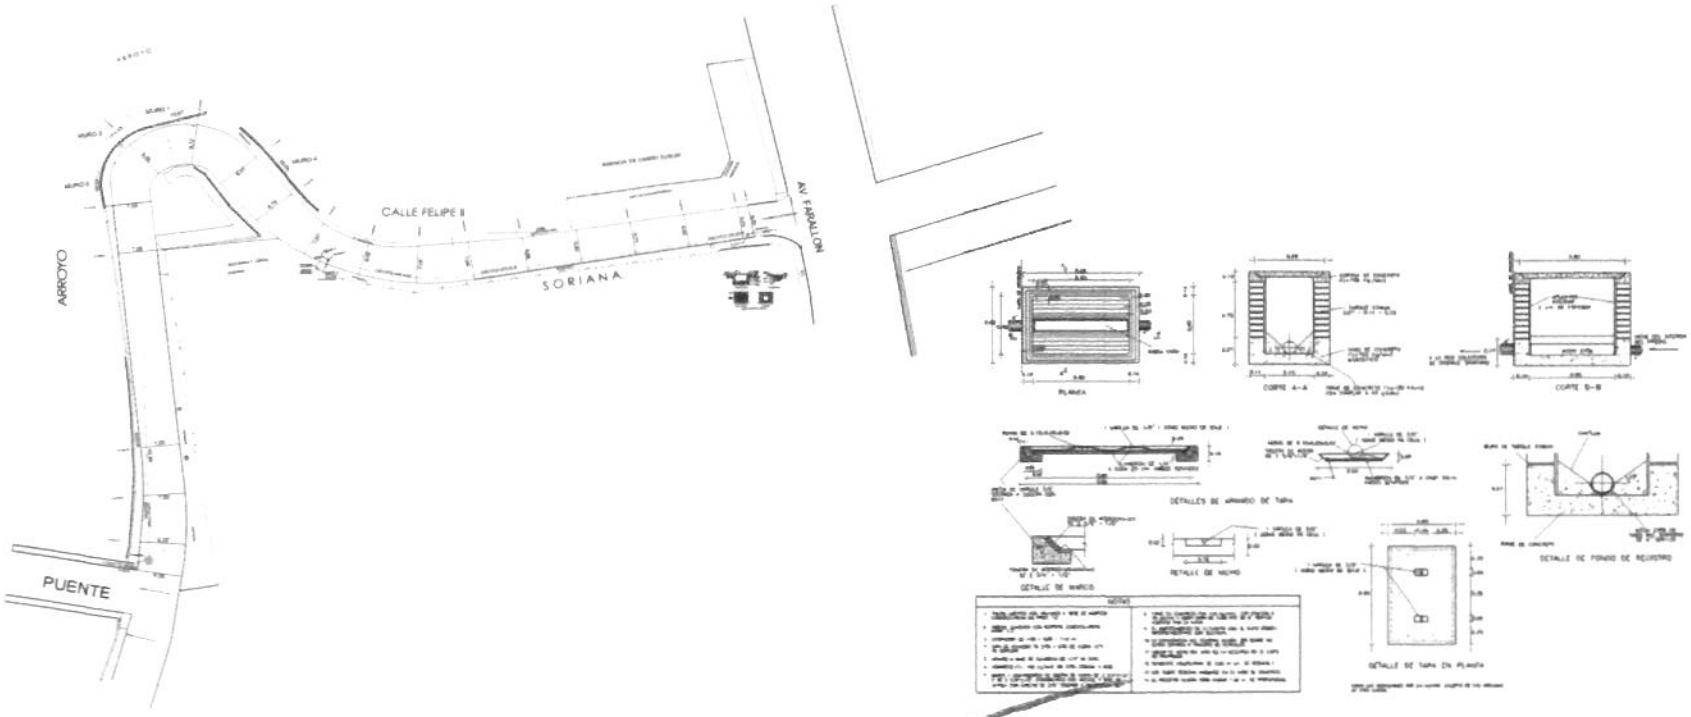

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	C O N C E P T O	EJE	TRAMO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD EJECUTADA	REFERENCIA
EXC-001	Excavación por medios mecánicos en cepas de 0.00 A 2.00 mts de profundidad en material tipo II incluye afine de talud y fondo, acarreos a primera estación de 20 mts.			M3	47.26				47.26	
								M3	**47.26**	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.


BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CROQUIS

EXC-001 Excavación por medios mecánicos en cepas de 0.00 A 2.00 mts de profundidad en material tipo II incluye afine de talud y fondo, acarreos a primera estación de 20 mts.

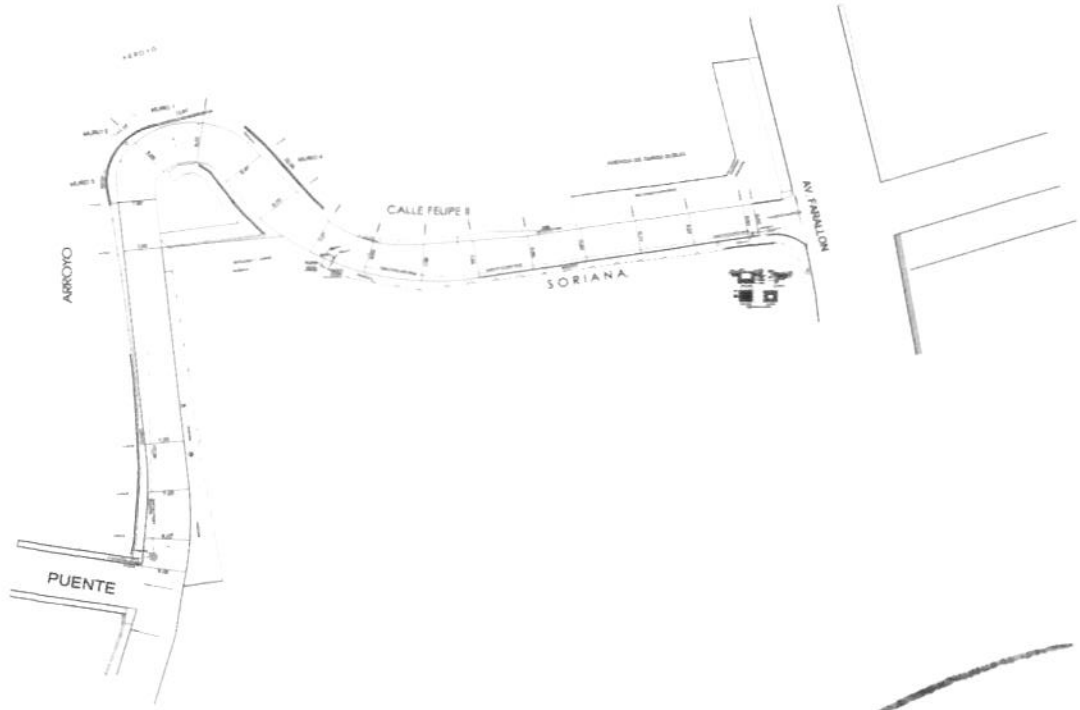

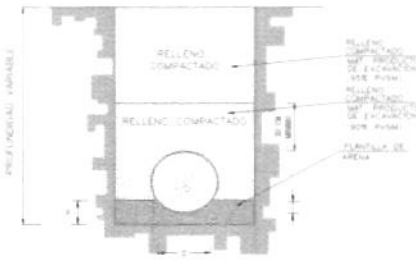

DETALLE DE ZANJA
PARA UNA TUBERIA

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	C O N C E P T O	EJE	TRAMO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD EJECUTADA	REFERENCIA
9-0139	Relleno de material producto de excavación compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor, incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.			M3	31.79				31.79	
								M3	**31.79**	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CROQUIS

9-0139 Relleno de material producto de excavación compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor, incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.

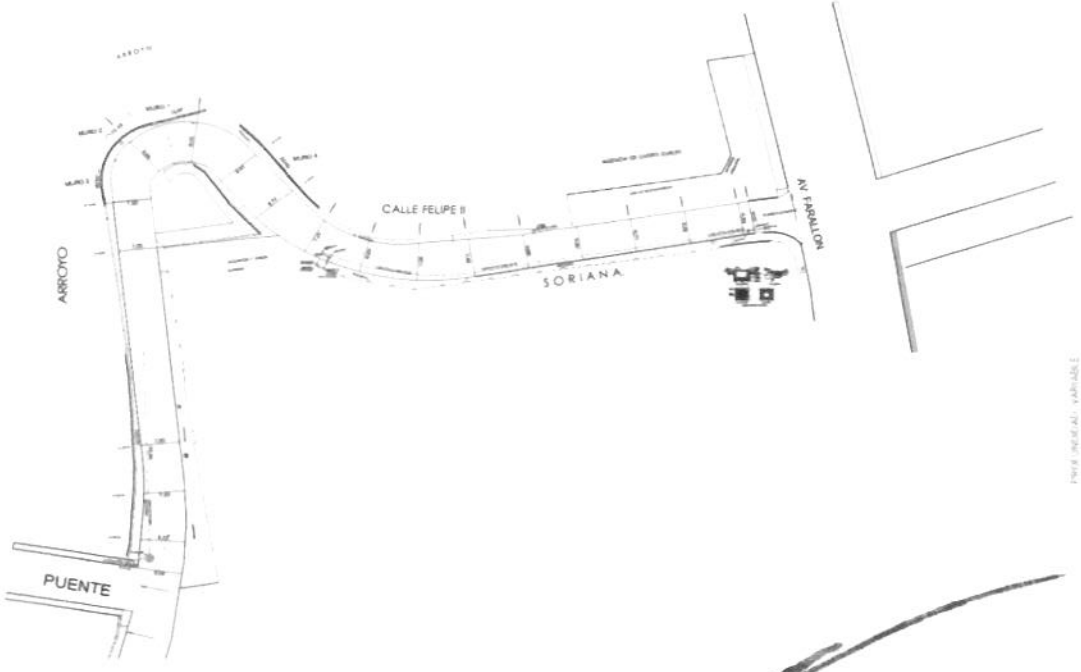



DETALLE DE ZANJA
PARA UNA TUBERIA

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	C O N C E P T O	EJE	TRAMO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD EJECUTADA	REFERENCIA
6-0113	Relleno de material inerte de banco compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.			M3	13.62				13.62	
								M3	**13.62**	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.


BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CROQUIS

6-0113 Relleno de material inerte de banco compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.

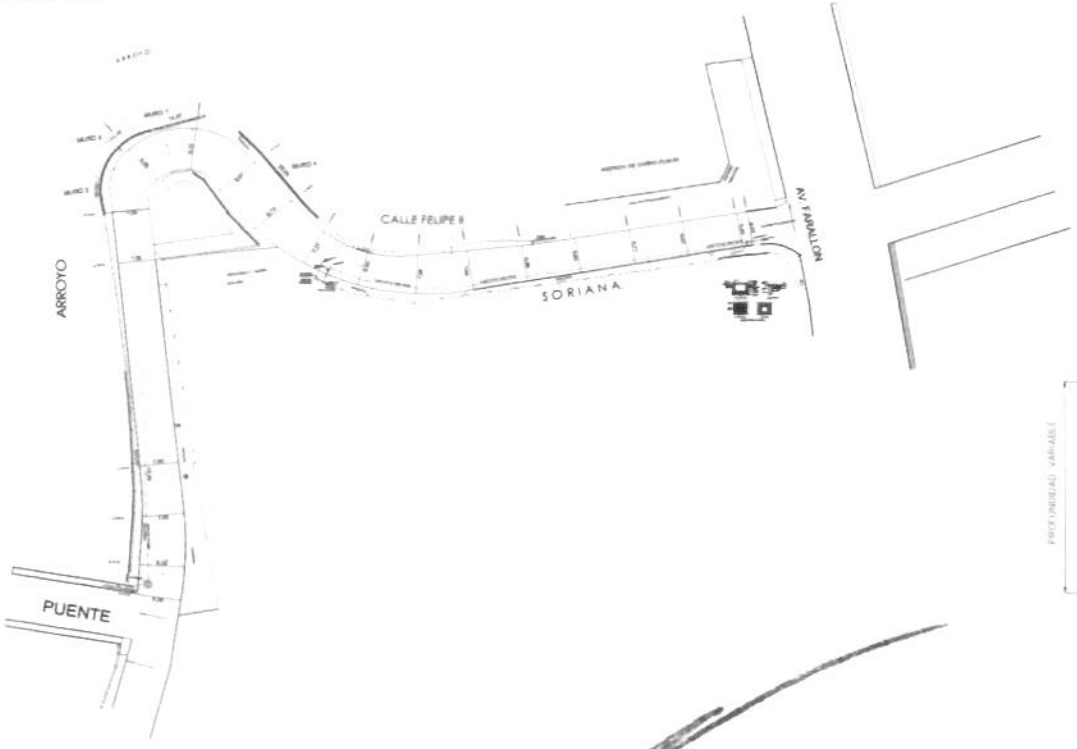

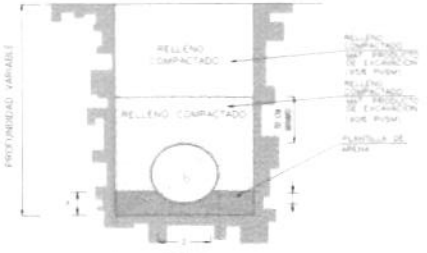

DETALLE DE ZANJA PARA UNA TUBERIA

JEFE DE OBRA PÚBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	C O N C E P T O	EJE	TRAMO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD EJECUTADA	REFERENCIA
5-0102	Cama de arena para instalación de tubería incluye: acostillado, acarreo de material en 1ra. estación, material y mano de obra.			M3	3.37				3.37	
								M3	**3.37**	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.


BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CROQUIS

5-0102 Cama de arena para instalación de tubería incluye: acostillado, acarreo de material en 1ra. estación, material y mano de obra.

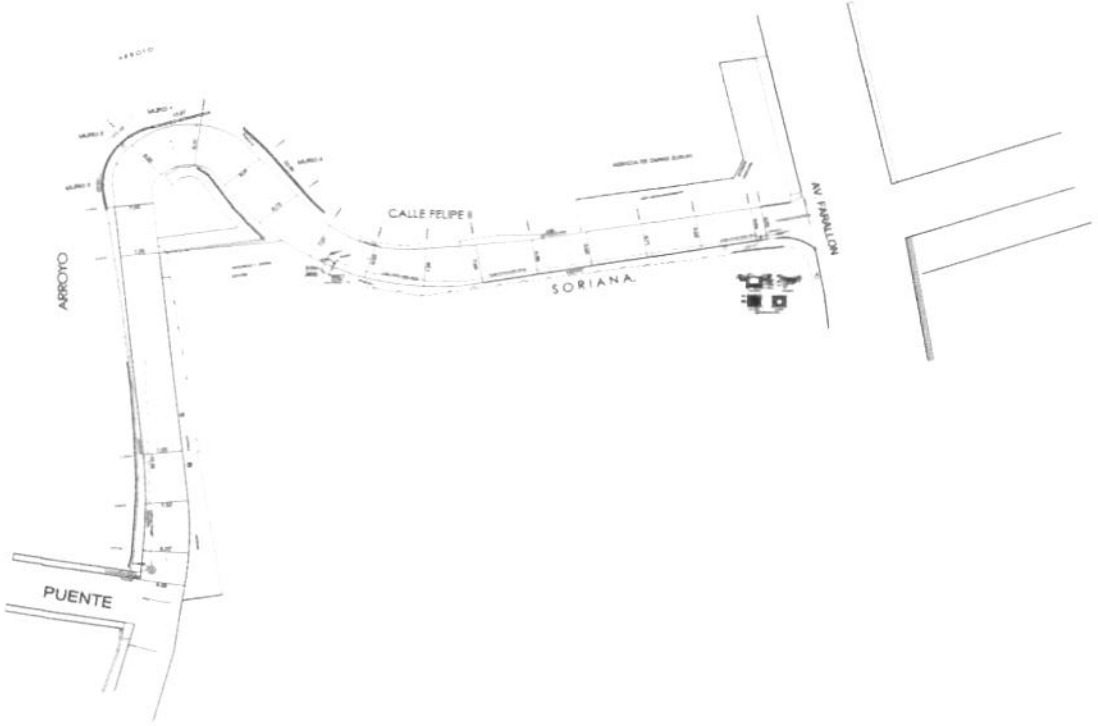

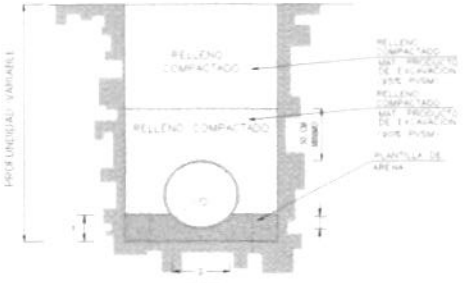

DETALLE DE ZANJA PARA UNA TUBERIA

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	C O N C E P T O	EJE	TRAMO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD EJECUTADA	REFERENCIA
28-0417	Pozo de visita de forma cónica de 0.60 a 1.20 mts. de diámetro interior por 1.50 mts. de altura a base de mamposteria, muro de tabique de 25 cms. con aplanado de mortero cemento arena 1:3 acabado pulido, incluye excavación, acarreo y relleno.			PZA	2.00				2.00	
								PZA	**2.00**	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.


BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CROQUIS

28-0417 Pozo de visita de forma cónica de 0.60 a 1.20 mts. de diámetro interior por 1.50 mts. de altura a base de mamposteria, muro de tabique de 25 cms. con aplanado de mortero cemento arena 1:3 acabado pulido, incluye excavación, acarreo y relleno.

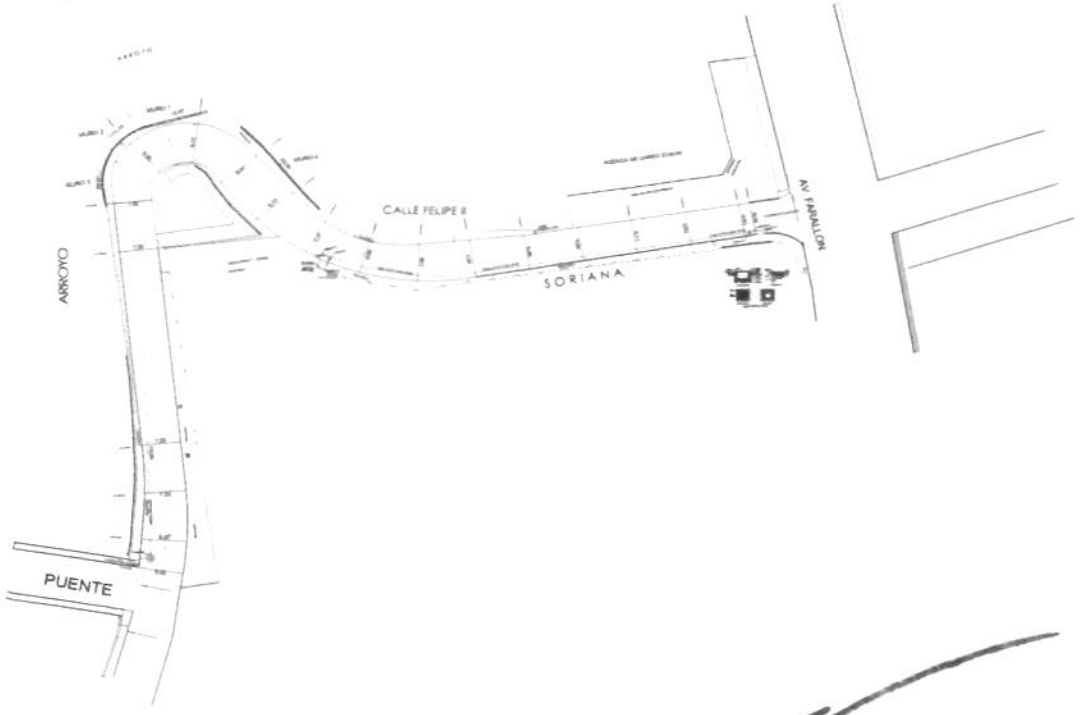

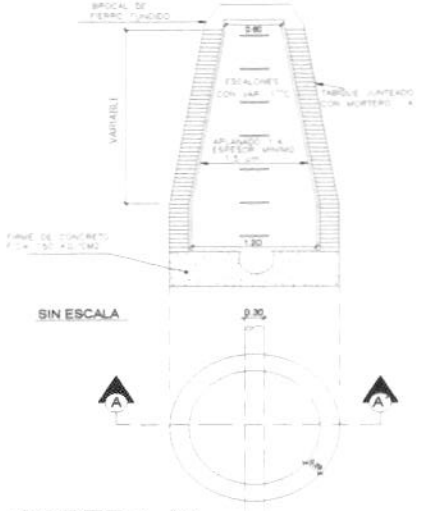

CORTE A-A´
DETALLE POZO DE VISITA

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	C O N C E P T O	EJE	TRAMO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD EJECUTADA	REFERENCIA
37-0579BP	Suministro y colocación de brocal y tapa de Polietileno alta resistencia abierto o cerrado para pozo de visita de 60 cm de diámetro, incluye material y mano de obra.			PZA	2.00				2.00	
								PZA	**2.00**	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR


H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CROQUIS

37-0579BP Suministro y colocación de brocal y tapa de Polietileno alta resistencia abierto o cerrado para pozo de visita de 60 cm de diámetro, incluye material y mano de obra.

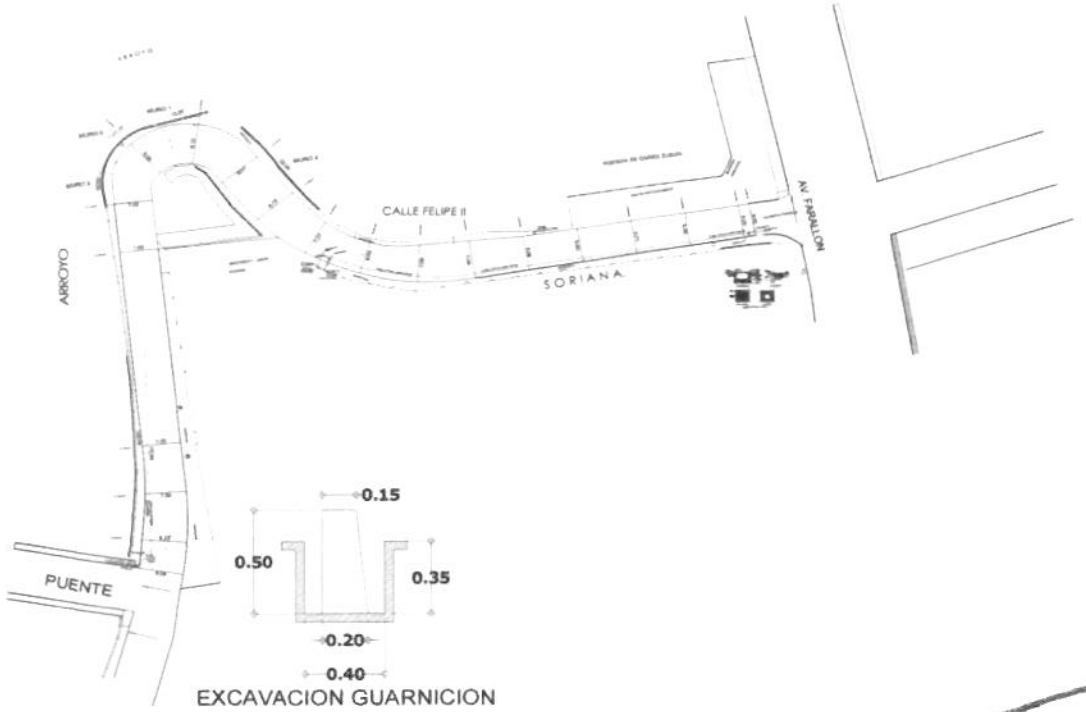

EXCAVACION GUARNICION

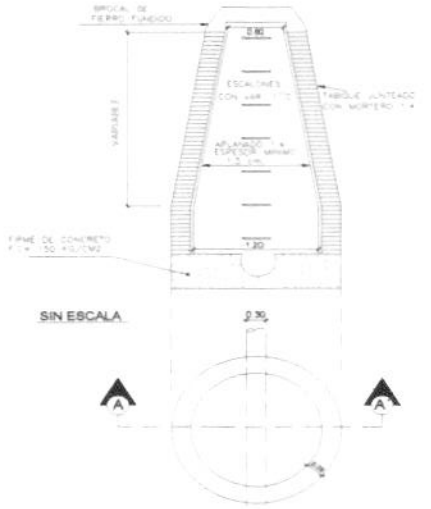

CORTE A-A´
DETALLE POZO DE VISITA

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	C O N C E P T O	EJE	TRAMO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD EJECUTADA	REFERENCIA
26-0390*	Registro sanitario de 0.40x0.60x0.60 mts., a base de tabicón10x14x28, asentado con mortero cemento arena 1:3, aplanado interior acabado fino con mortero cemento arena 1:3, piso de 10 cm, de concreto simple F'c= 150 Kg/cm2, tapa de concreto F'c=250 Kg/cm2, armado con varilla del No. 3 @ 20 cm. en ambos sentidos, de 15 cm. de espesor incluye trazo, nivelación, barrenado y demolición de roca, acarreo y m.o.			PZA	2.00				2.00	
								PZA	2.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.


BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CROQUIS

26-0390* Registro sanitario de 0.40x0.60x0.60 mts., a base de tabicón10x14x28, asentado con mortero cemento arena 1:3, aplanado interior acabado fino con mortero cemento arena 1:3, piso de 10 cm, de concreto simple F'c= 150 Kg/cm2, tapa de concreto F'c=250 Kg/cm2, armado con varilla del No. 3 @ 20 cm. en ambos sentidos, de 15 cm. de espesor incluye trazo, nivelación, barrenado y demolición de roca, acarreo y m.o.

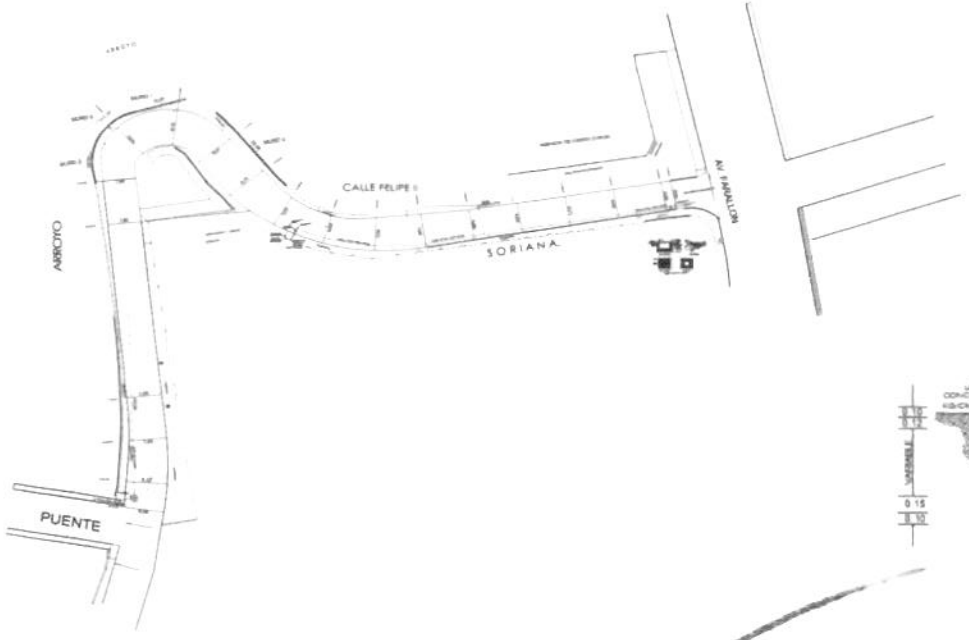



SECCION DE REGISTRO

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	C O N C E P T O	EJE	TRAMO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD EJECUTADA	REFERENCIA
TUBO 8"	Suministro e instalación de tubo PVC sanitario de 8" de diametro incluye acarreos, materiales secundarios, conexiones y mano de obra.			M	42.80				42.80	
								M	42.80	

JEFE DE OBRA PÚBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.


BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CROQUIS

TUBO 8" Suministro e instalación de tubo PVC sanitario de 8" de diametro incluye acarreos, materiales secundarios, conexiones y mano de obra.

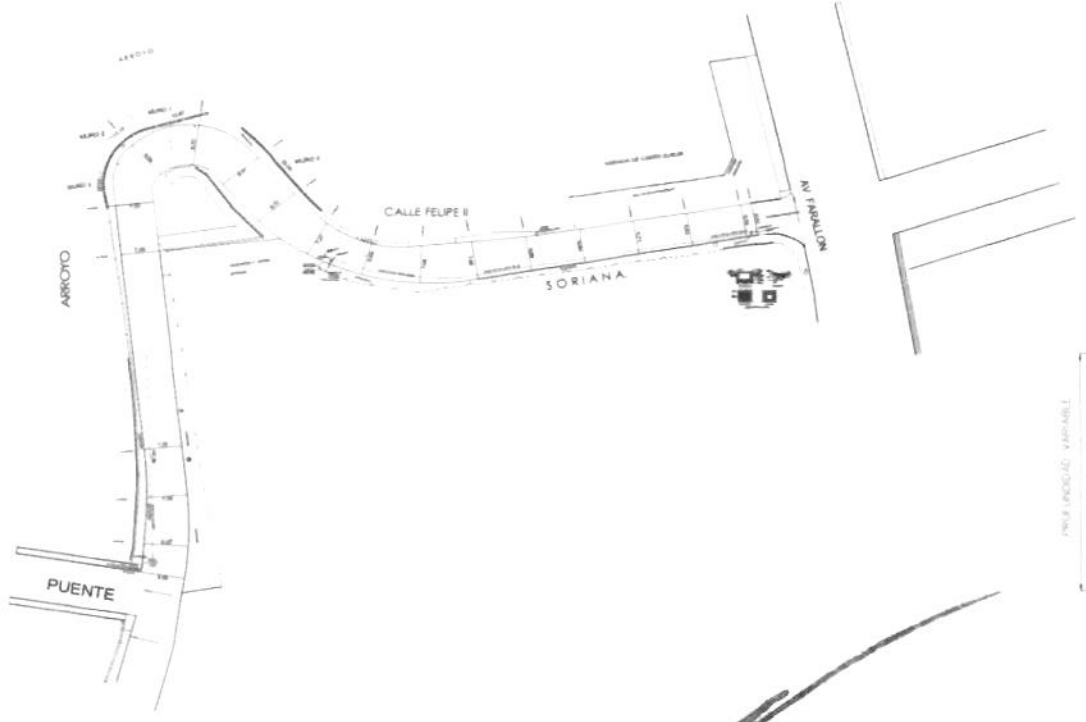

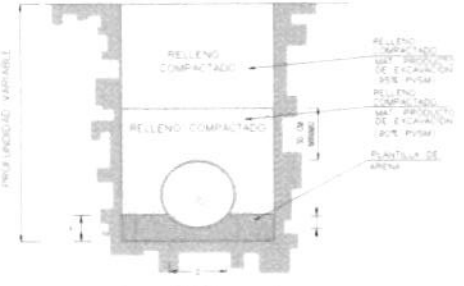

DETALLE DE ZANJA
PARA UNA TUBERIA

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	C O N C E P T O	EJE	TRAMO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD EJECUTADA	REFERENCIA
SUM-COD2	SSuministro y colocación de codo PVC sanitario de 6"X45°, incluye carga y descarga en almacén de obra.			PZA	2.00				2.00	
								PZA	2.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.


BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero


CROQUIS

SUM-COD2 SSuministro y colocación de codo PVC sanitario de 6"X45°, incluye carga y descarga en almacén de obra.

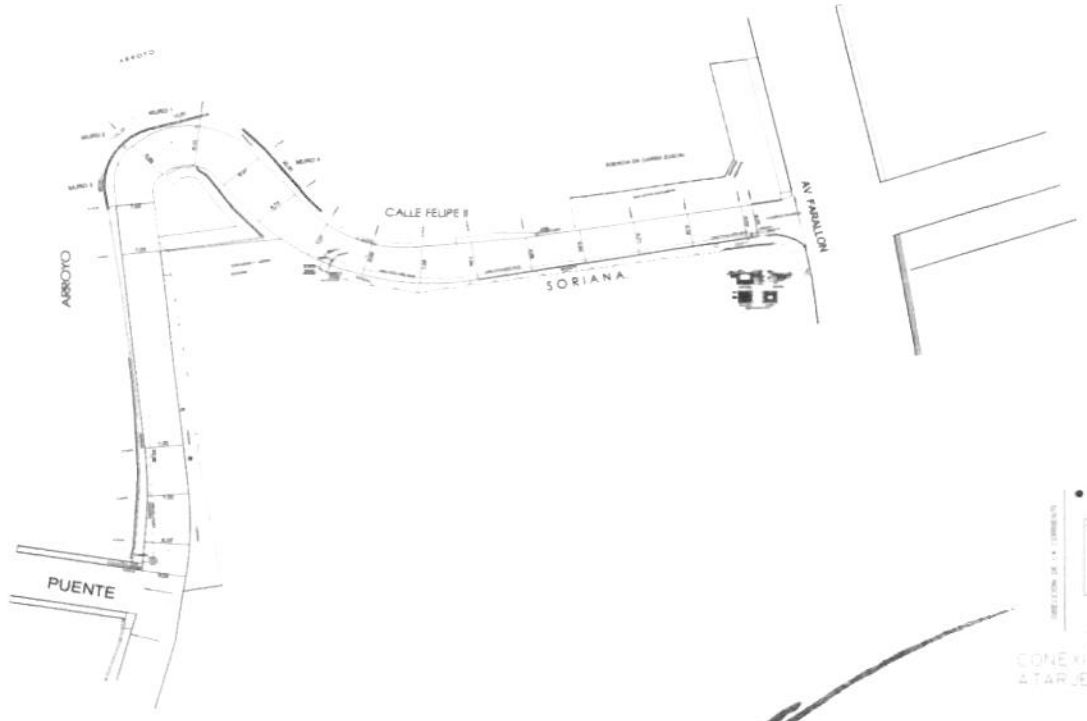



DETALLE DE CONEXIÓN A SILLETA



CONEXIÓN DE DESCARGA SANITARIA A TUBO DE ATARJEA

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	C O N C E P T O	EJE	TRAMO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD EJECUTADA	REFERENCIA
PU-6255	Suministro y colocación de unión de servicio de P.V.C. De 150 mm (6") de diámetro para alcantarillado sanitario incluye carga y descarga en almacén de obra.			PZA	2.00				2.00	
								PZA	2.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.


BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero


CROQUIS

PU-6255 Suministro y colocación de unión de servicio de P.V.C. De 150 mm (6") de diámetro para alcantarillado sanitario incluye carga y descarga en almacén de obra.

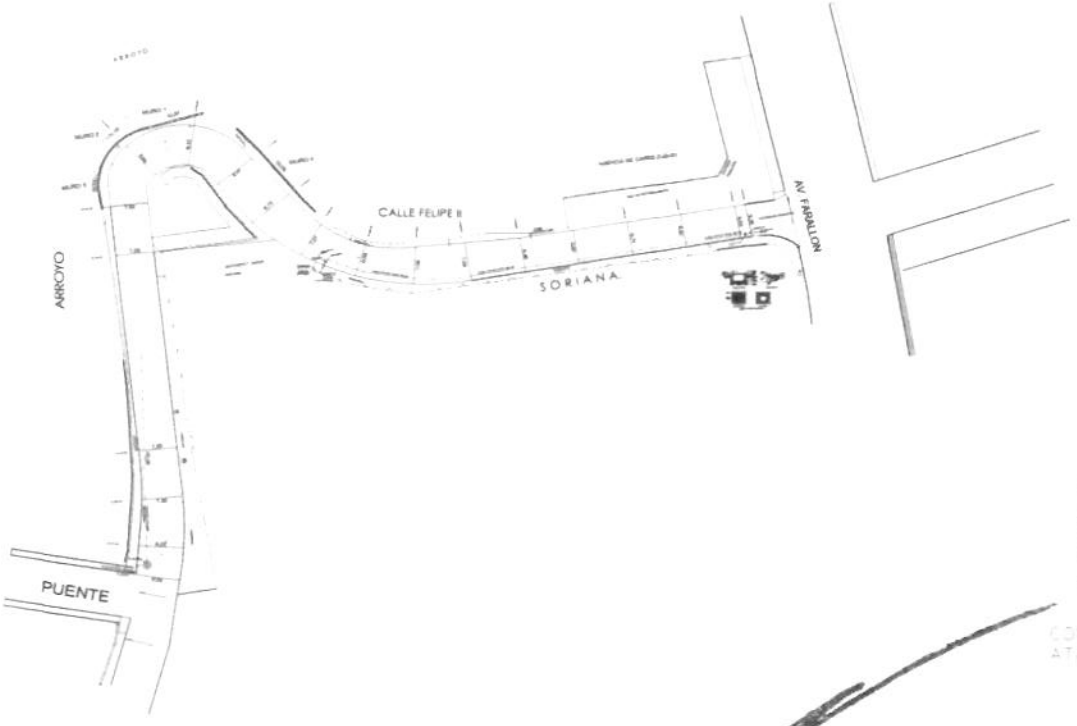



DETALLE DE CONEXIÓN A BILLETA



CONEXIÓN DE DESCARGA SANITARIA A TUBO DE ATARJEA

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	C O N C E P T O	EJE	TRAMO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD EJECUTADA	REFERENCIA
PU-6239	Suministro de tubo de PVC sanitario de norma liso de 150 mm de diámetro, incluye flete, carga y descarga en almacén de obra.			ML	18.00				18.00	
								ML	18.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.


BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.
	MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero
	LOCALIDAD:	ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CROQUIS

PU-6239 Suministro de tubo de PVC sanitario de norma liso de 150 mm de diámetro, incluye flete, carga y descarga en almacén de obra.

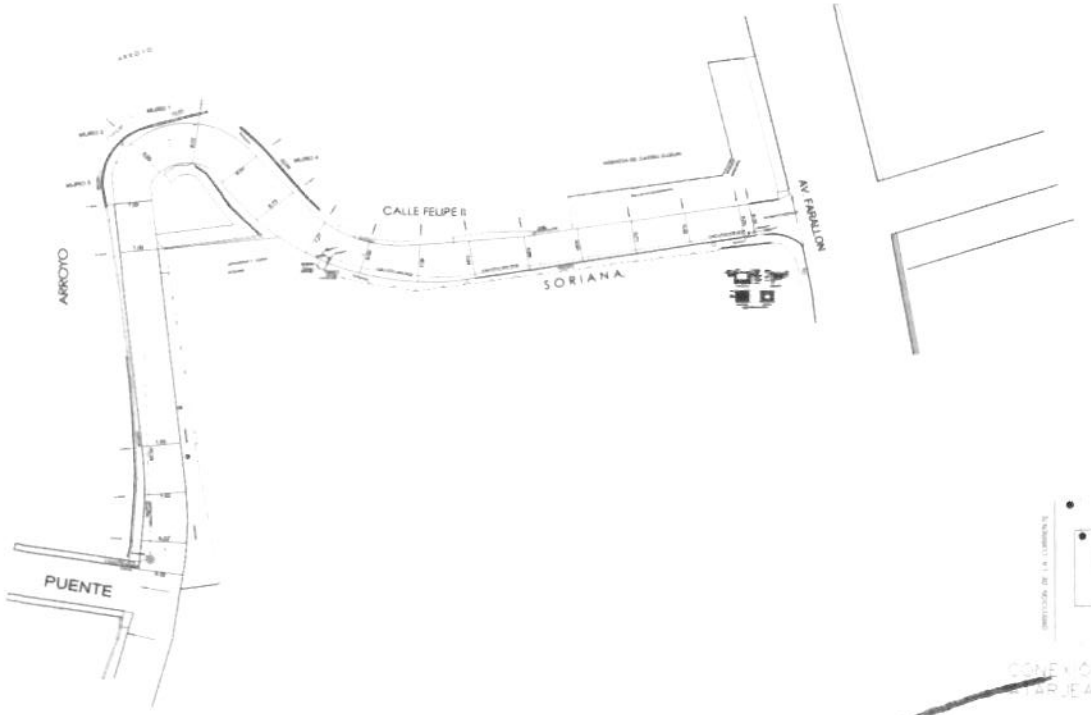



DETALLE DE CONEXIÓN A SILLETA



CONEXIÓN DE DESCARGA SANITARIA A TUBO DE TUBERÍA

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD EJECUTADA	REFERENCIA
18-0296	Muro de piedra braza de la región, asentada con mortero cemento arena 1:5, acabado común incluye: acarreo de materiales en 1ra. erstación de 20 mts.			M3	276.52				276.52	
								M3	276.52	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.


BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CROQUIS

18-0296 Muro de piedra braza de la región, asentada con mortero cemento arena 1:5, acabado común incluye: acarreo de materiales en 1ra. erstación de 20 mts.

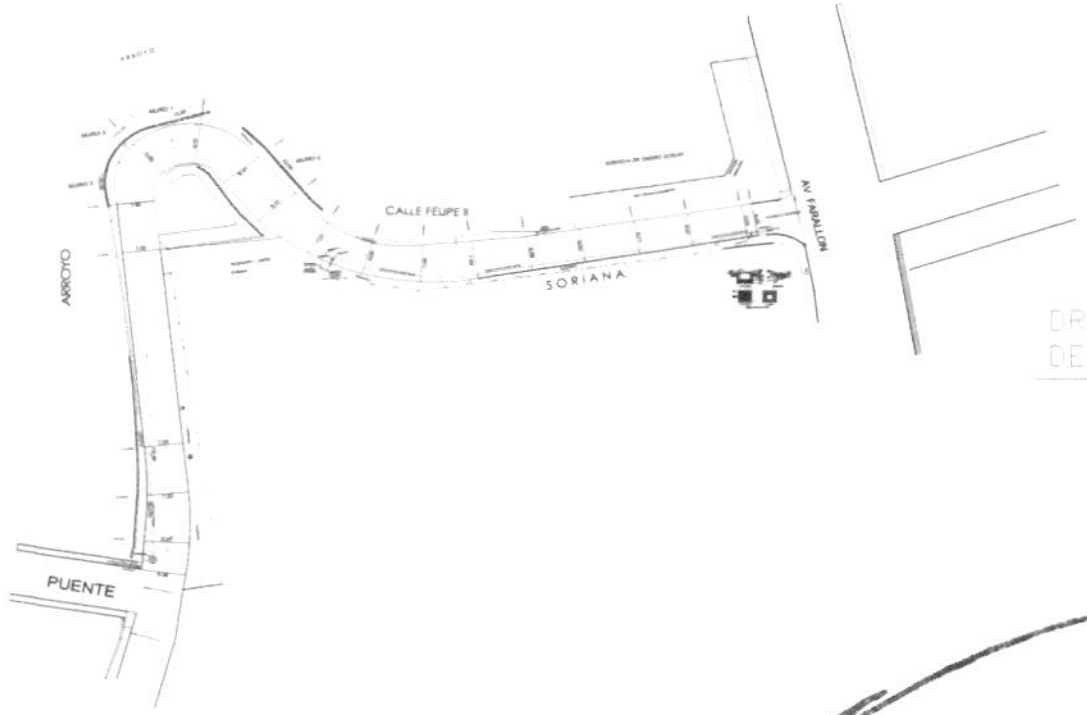

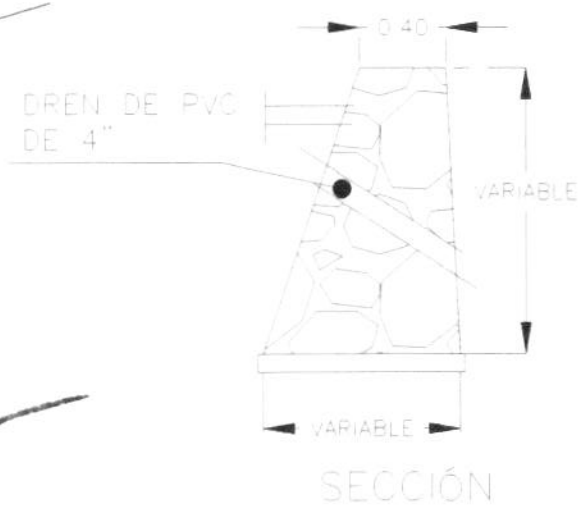

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	C O N C E P T O	EJE	TRAMO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD EJECUTADA	REFERENCIA
18-0313	Dren para muro de mampostería a base de P.V.C. 4" tipo rígido incluye material y mano de obra.			ML	26.00				26.00	
								ML	26.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.


BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CROQUIS

18-0313 Dren para muro de mampostería a base de P.V.C. 4" tipo rígido incluye material y mano de obra.

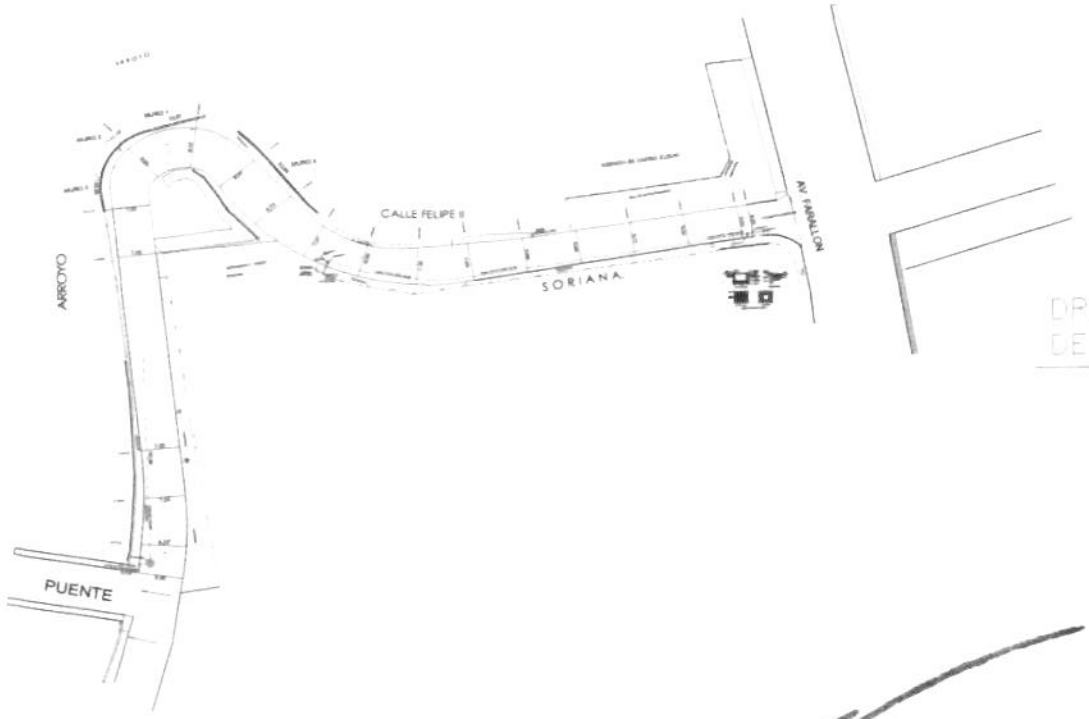

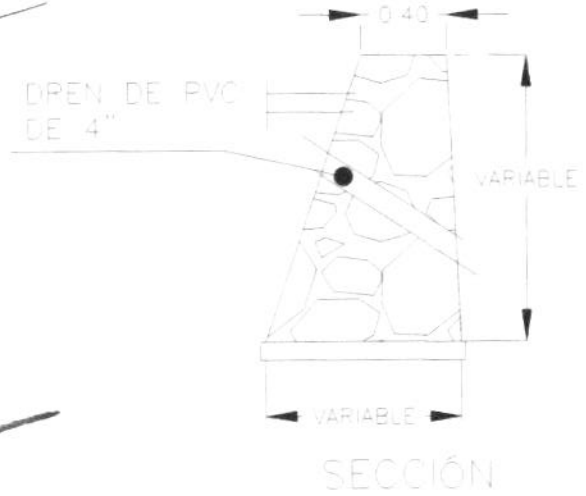

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	C O N C E P T O	EJE	TRAMO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD EJECUTADA	REFERENCIA
18-0318	FILTRO DE GRAVA Y/O RAJUELA DE PIEDRA DE 30 CMS DE ESPESOR INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA			M3	53.70				53.70	
								M3	**53.70**	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.


BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CROQUIS

18-0318 FILTRO DE GRAVA Y/O RAJUELA DE PIEDRA DE 30 CMS DE ESPESOR INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA

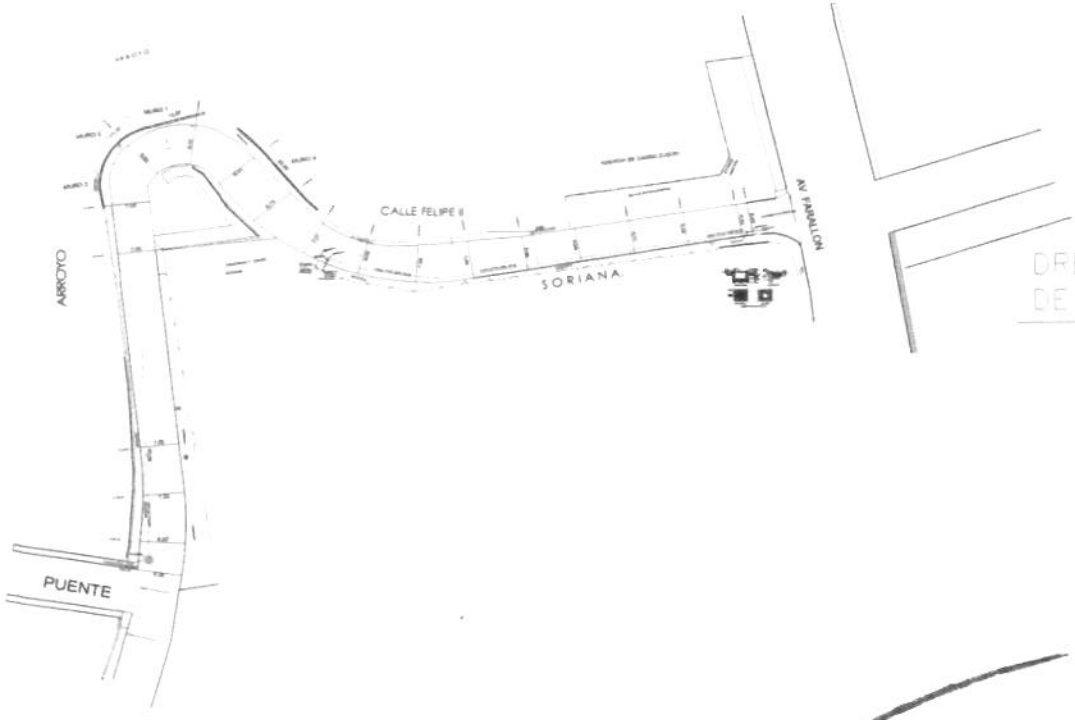

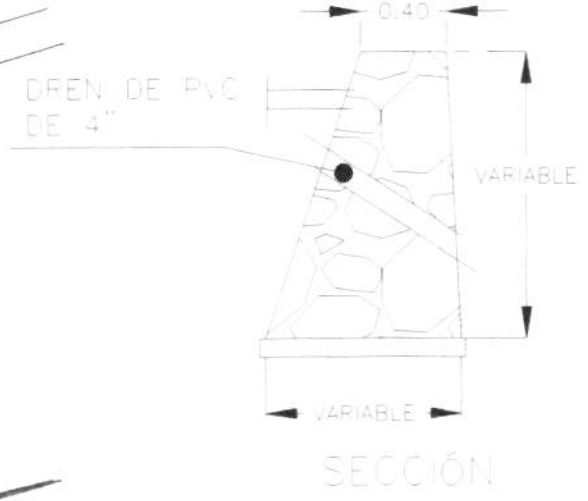

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	C O N C E P T O	EJE	TRAMO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD EJECUTADA	REFERENCIA
11-0151*	Anclaje de castillo de 20 x 15 cms. 4 var. # 4 y estribos del # 2 a.c. 20 cms. Hasta una profundidad de 50 cms., concreto f´c = 200 kg/cm2 incluye material y mano de obra.			PZA	13.00				13.00	
								PZA	13.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CROQUIS

11-0151* Anclaje de castillo de 20 x 15 cms. 4 var. # 4 y estribos del # 2 a.c. 20 cms. Hasta una profundidad de 50 cms., concreto f´c = 200 kg/cm2 incluye material y mano de obra.

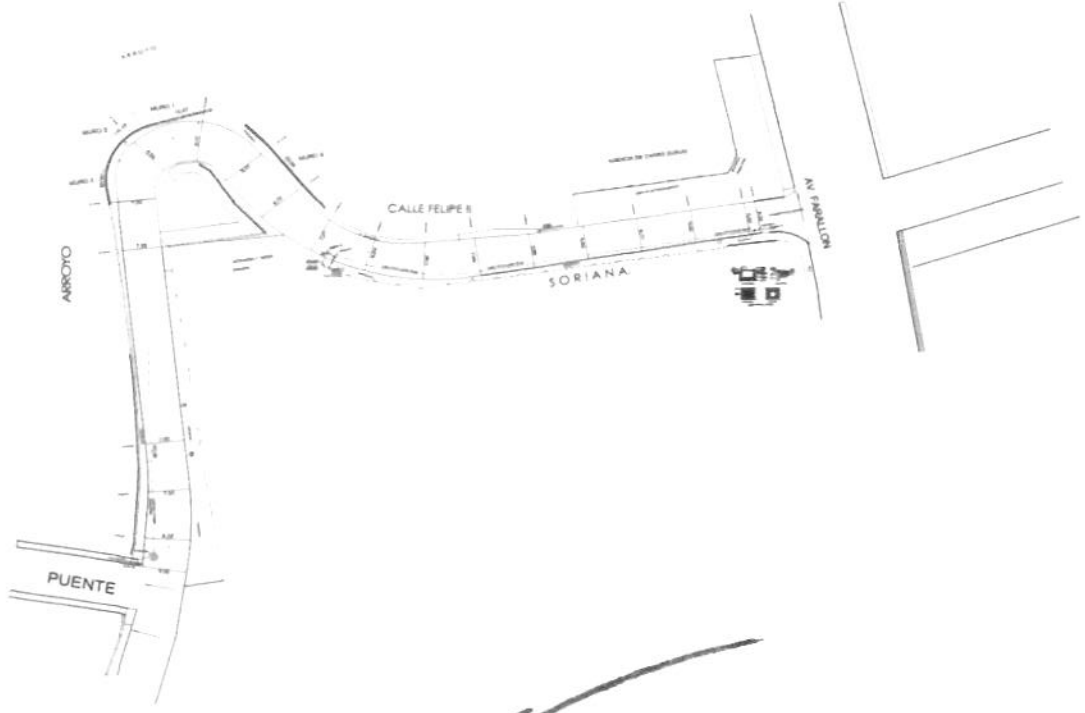

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	C O N C E P T O	EJE	TRAMO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD EJECUTADA	REFERENCIA
11-0160*	Cadena de desplante de concreto f'c=250 Kg/cm2, de 15x20 cm, armado con 6 varillas No.4 y estribos No. 2 a cada 25 cm, incluye cimbra común, acarreo de material 1ra. estación.			M	31.53				31.53	
								M	31.53	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CROQUIS

11-0160* Cadena de desplante de concreto f'c=250 Kg/cm2, de 15x20 cm, armado con 6 varillas No.4 y estribos No. 2 a cada 25 cm, incluye cimbra común, acarreo de material 1ra. estación.



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	C O N C E P T O	EJE	TRAMO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD EJECUTADA	REFERENCIA
11-0221	Losa de concreto f´c= 250 kg/cm2 de 10 cms de espesor armada con var. No. 4 a cada 15 cm. En ambos sentidos, para paso peatonal, según planos estructurales incluye cimbrado, armado, colado y descimbrado, material y mano de obra.			M2	26.80				26.80	
								M2	26.80	

JEFE DE OBRA PÚBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CROQUIS

11-0221 Losa de concreto f´c= 250 kg/cm2 de 10 cms de espesor armada con var. No. 4 a cada 15 cm. En ambos sentidos, para paso peatonal, según planos estructurales incluye cimbrado, armado, colado y descimbrado, material y mano de obra.

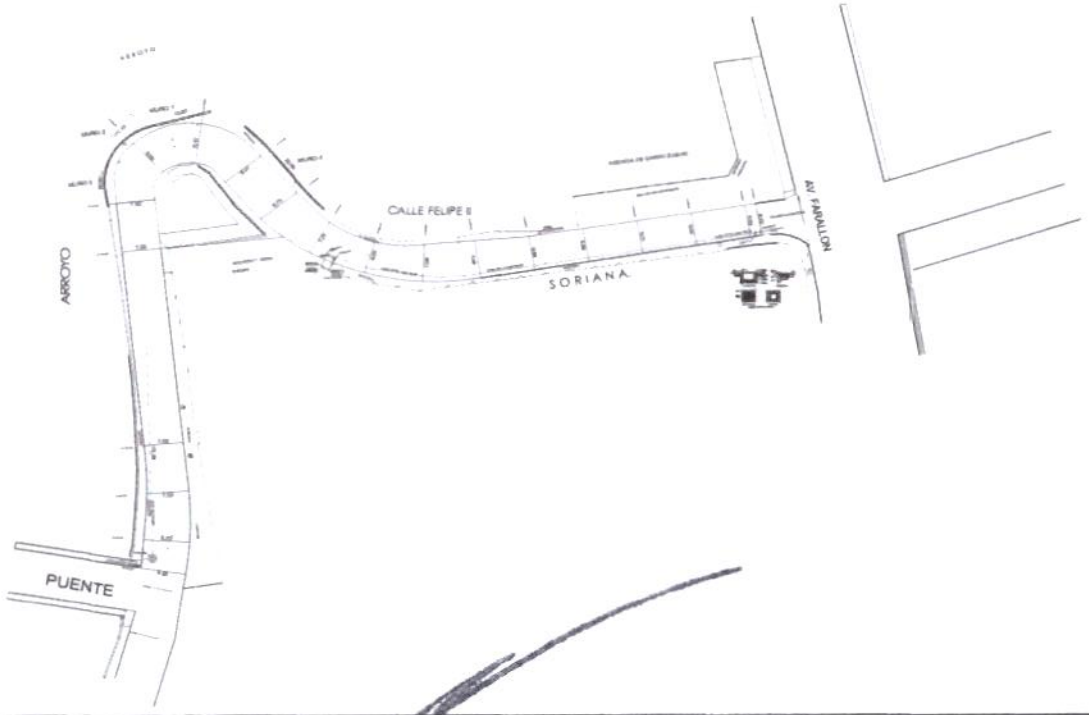

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD EJECUTADA	REFERENCIA
F-BARANDAL1	Suministro y colocación de barandal de tubo de acero negro de 1 1/2" con división de tubo de 1" con postes de 1 1/2" a cada metro soldado a placa de 1/2" de 15x15 cms. embutida en losa, incluye materiales, mano de obra, pintura, equipo y herramienta.			M	39.78				39.78	
								M	39.78	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CROQUIS

F-BARANDAL1 Suministro y colocación de barandal de tubo de acero negro de 1 1/2" con división de tubo de 1" con postes de 1 1/2" a cada metro soldado a placa de 1/2" de 15x15 cms. embutida en losa, incluye materiales, mano de obra, pintura, equipo y herramienta.

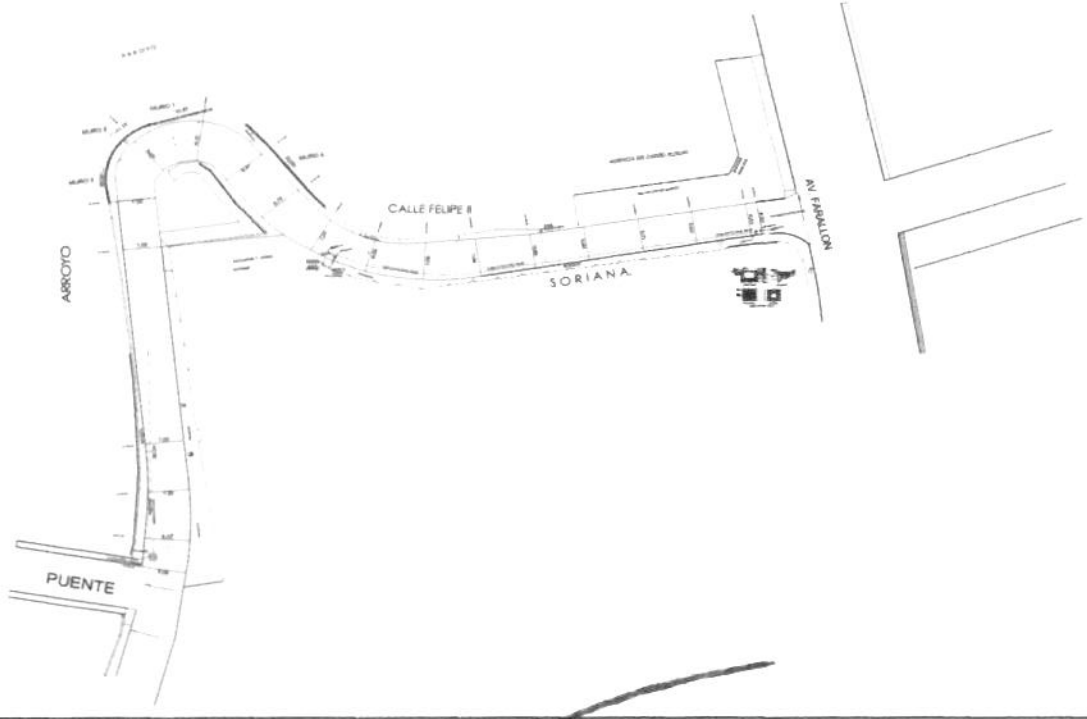

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	C O N C E P T O	EJE	TRAMO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD EJECUTADA	REFERENCIA
REG-AUX	Registro auxiliar para alumbrado público de 50x60x65mts., de tabique rojo recocido 7x14x28 cms., con 14 cms. de espesor asentado y aplanado con mortero cemento arena 1:5 incluye: plantilla de concreto de 10 cms de espesor f´c=100kg/cm2, marco y contramarco de ángulo de 1 1/2"x3/16" concreto f´c=200kg/cm2 en tapa y fijación de marco, drén de grava de 20 cms de espesor, herramienta menor, materiales y mano de obra.			PZA	8.00				8.00	
								PZA	8.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CROQUIS

REG-AUX Registro auxiliar para alumbrado público de 50x60x65mts., de tabique rojo recocido 7x14x28 cms., con 14 cms. de espesor asentado y aplanado con mortero cemento arena 1:5 incluye: plantilla de concreto de 10 cms de espesor f´c=100kg/cm2, marco y contramarco de ángulo de 1 1/2"x3/16" concreto f´c=200kg/cm2 en tapa y fijación de marco, drén de grava de 20 cms de espesor, herramienta menor, materiales y mano de obra.

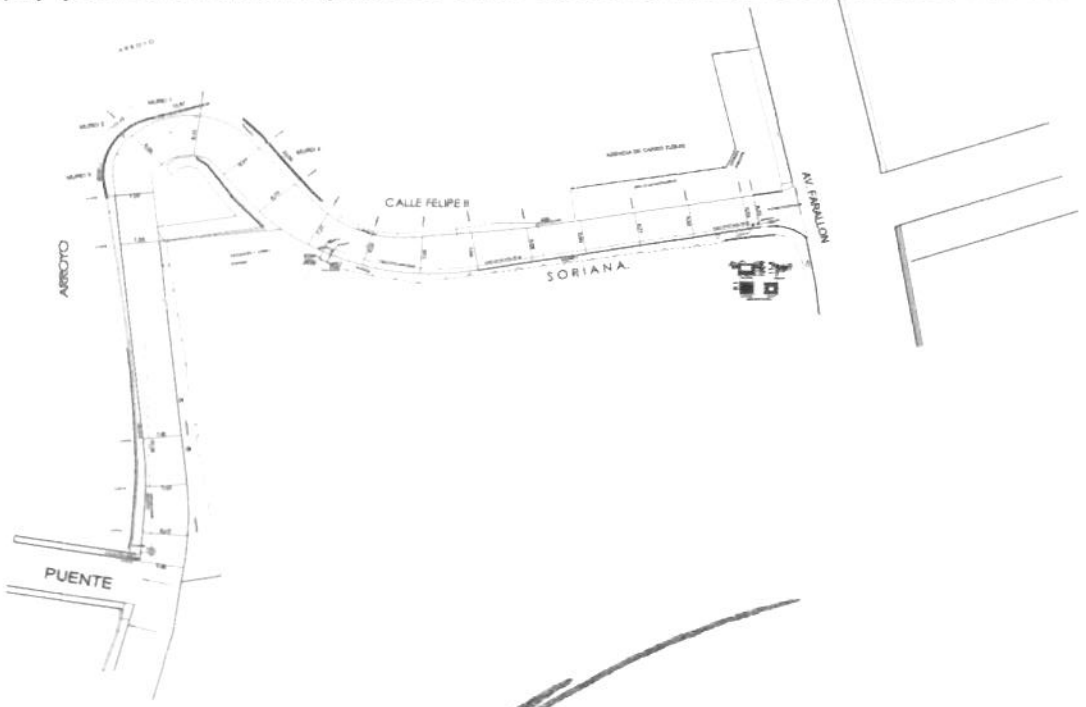

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	C O N C E P T O	EJE	TRAMO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD EJECUTADA	REFERENCIA
TUB-PESA50	Suministro y tendido de tubo conduit pvc pesado 50 mm de diámetro incluye conexión, trazo, excavación, relleno, cama de arena, herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra.			M	200.00				200.00	
								M	**200.00**	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CROQUIS

TUB-PESA50 Suministro y tendido de tubo conduit pvc pesado 50 mm de diámetro incluye conexión, trazo, excavación, relleno, cama de arena, herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra.

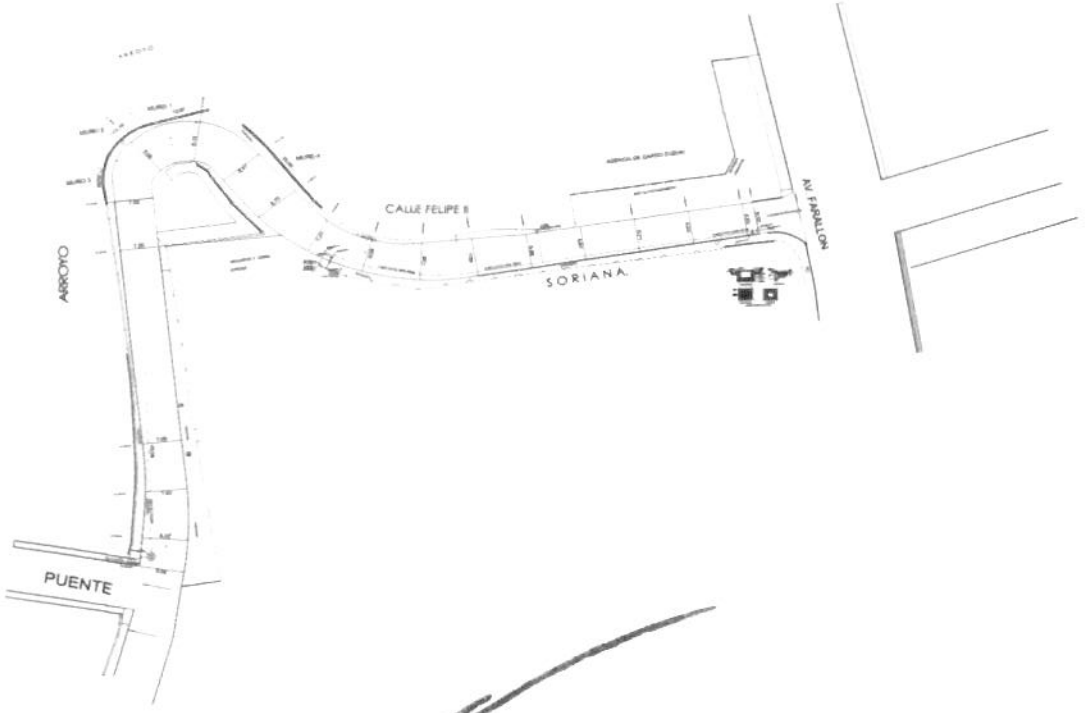

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	C O N C E P T O	EJE	TRAMO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD EJECUTADA	REFERENCIA
4-0080	Excavación a mano en material tipo II-A, en seco y barreta de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad, depositando el producto de excavación a orilla de cepa, cualquier zona..			M3	64.35				64.35	
								M3	**64.35**	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CROQUIS

4-0080 Excavación a mano en material tipo II-A, en seco y barreta de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad, depositando el producto de excavación a orilla de cepa, cualquier zona..

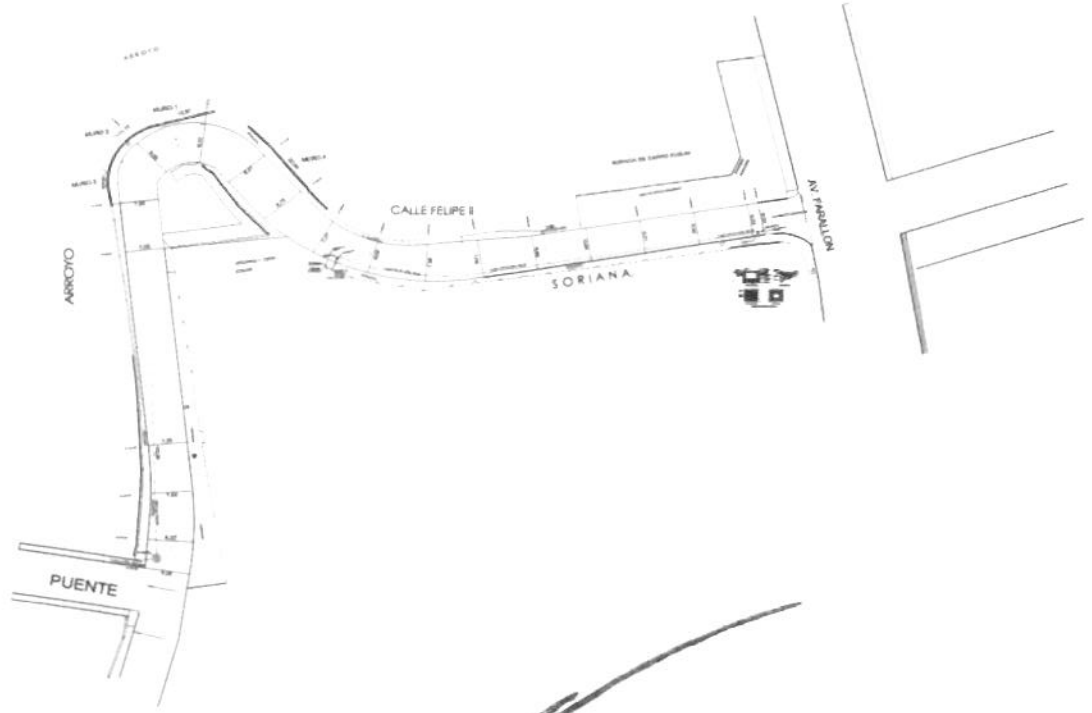

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	C O N C E P T O	EJE	TRAMO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD EJECUTADA	REFERENCIA
9-0138	Relleno de material inerte de banco compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.			M3	38.55				38.55	
								M3	**38.55**	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.


BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CROQUIS

9-0138 Relleno de material inerte de banco compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.

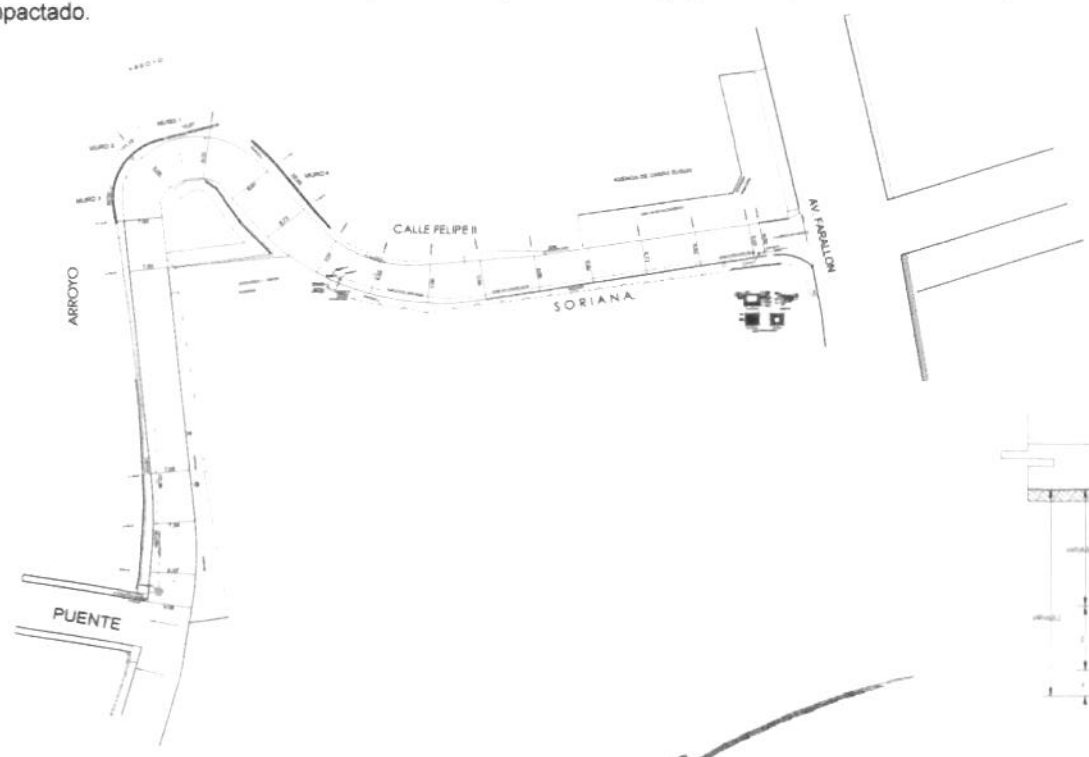

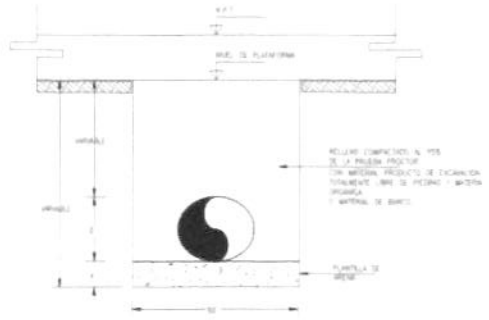

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	C O N C E P T O	EJE	TRAMO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD EJECUTADA	REFERENCIA
32-0471	Guarnición de concreto simple de f´c= 200 kg/cm2 de 20x15x40 cm. de sección T.M.A. 3/4" Incluye cimbrado, descimbrado, materiales y mano de obra.			ML	424.35				424.35	
								ML	**424.35**	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.


BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CROQUIS

32-0471 Guarnición de concreto simple de f´c= 200 kg/cm2 de 20x15x40 cm. de sección T.M.A. 3/4" Incluye cimbrado, descimbrado, materiales y mano de obra.

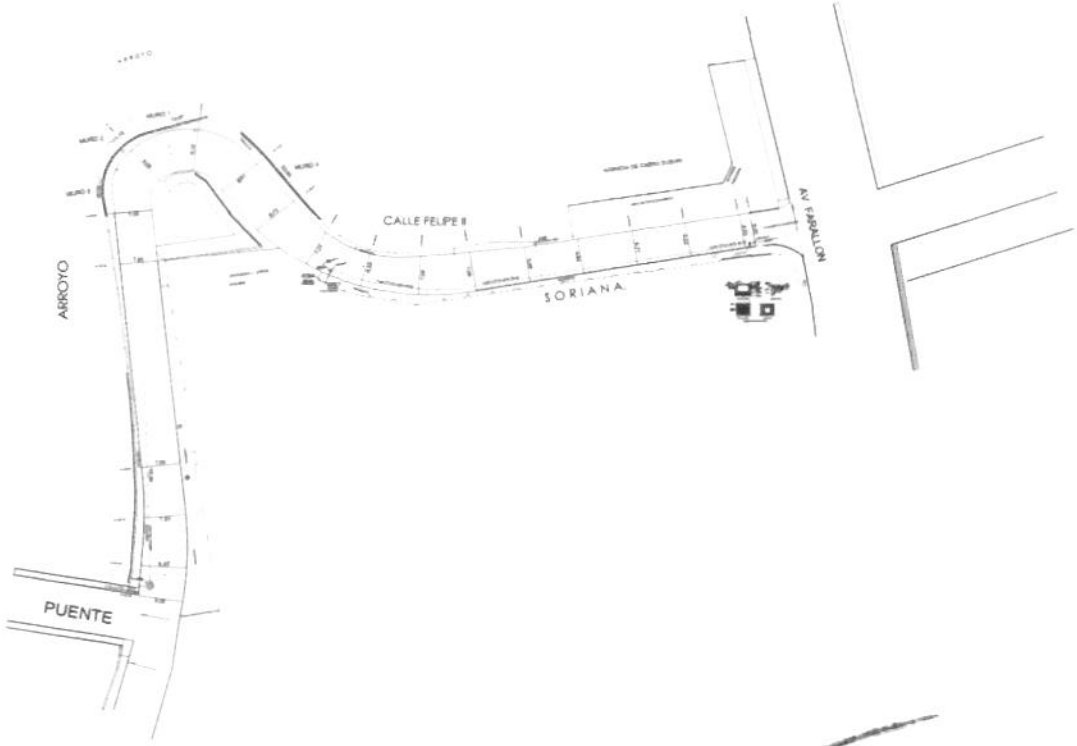



EXCAVACION GUARNICION

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	C O N C E P T O	EJE	TRAMO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD EJECUTADA	REFERENCIA
32-0475A	Pavimento premezclado F'c= 300 Kg/cm2, T.A.M. 3/4" de 20 cm. de espesor resistencia normal, acabado a regla incluye junta constructiva con chaflan de 1/2", en cada junta fria (al termino del colado) se procederá a colocar 8 conectores con varilla de 1/2" a cada 60 cms. 30-30 cms., fibra microsintetica, curado con curacreto, vibrado, acarreos de materiales a 1ra. estación.			M2	1,471.35				1,471.35	
								M2	**1471.35**	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CROQUIS

32-0475A Pavimento premezclado F'c= 300 Kg/cm2, T.A.M. 3/4" de 20 cm. de espesor resistencia normal, acabado a regla incluye junta constructiva con chaflan de 1/2", en cada junta fria (al termino del colado) se procederá a colocar 8 conectores con varilla de 1/2" a cada 60 cms. 30-30 cms., fibra microsintetica, curado con curacreto, vibrado, acarreos de materiales a 1ra. estación.

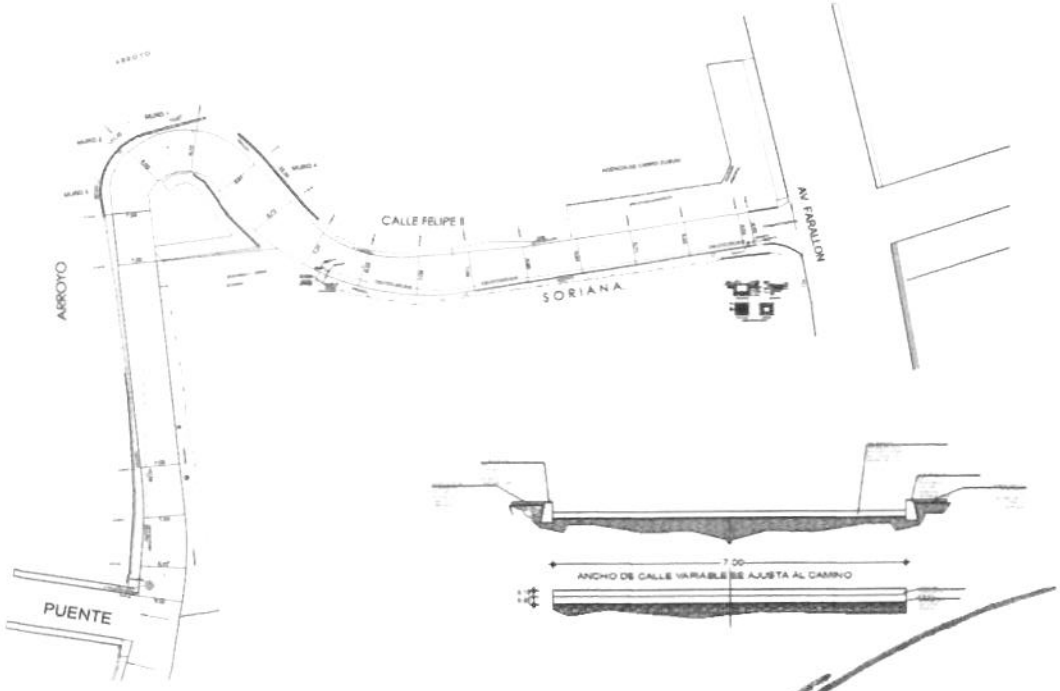



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	C O N C E P T O	EJE	TRAMO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD EJECUTADA	REFERENCIA
SUMPOL	Suministro y colocación de hule negro calibre 600 para evitar deshidratación del concreto, incluye materiales, herramienta y mano de obra.			M2	1,471.35				1,471.35	
								M2	1,471.35	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.


BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CROQUIS

SUMPOL Suministro y colocación de hule negro calibre 600 para evitar deshidratación del concreto, incluye materiales, herramienta y mano de obra.

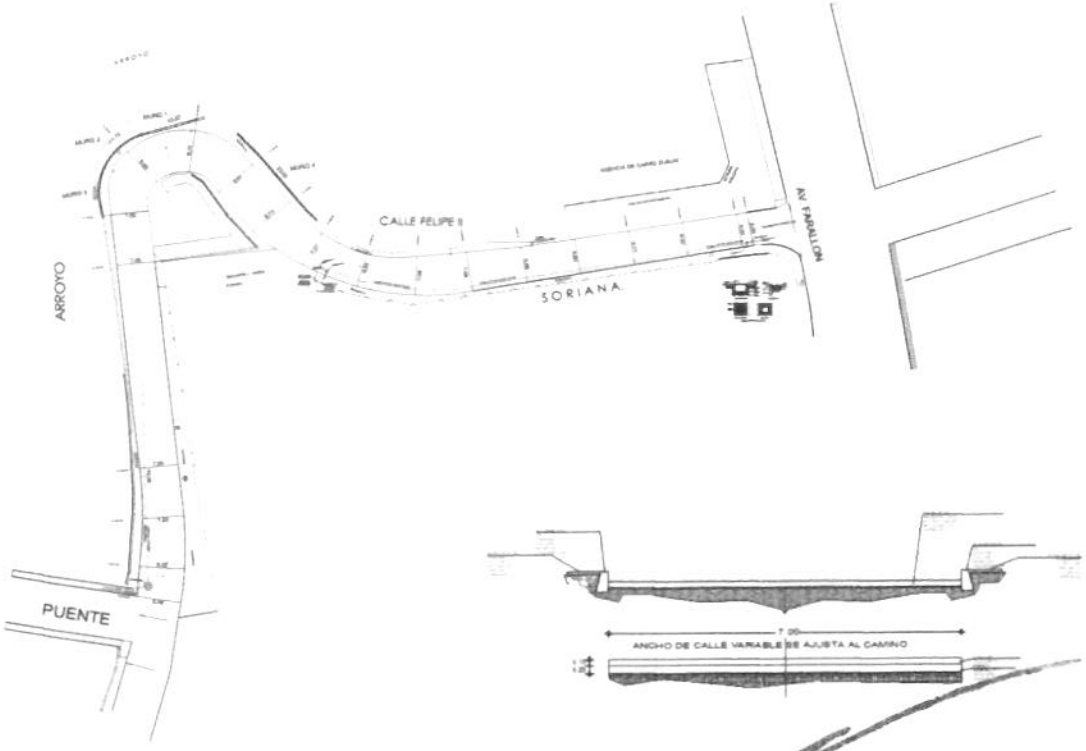

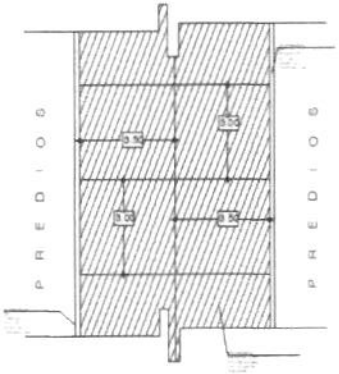

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD EJECUTADA	REFERENCIA
CORTE01	Corte de juntas en piso de concreto con cortadora manual de disco diamantado, incluye limpieza de la junta.			ML	522.00				522.00	
								ML	522.00	


JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CROQUIS

CORTE01 Corte de juntas en piso de concreto con cortadora manual de disco diamantado, incluye limpieza de la junta.

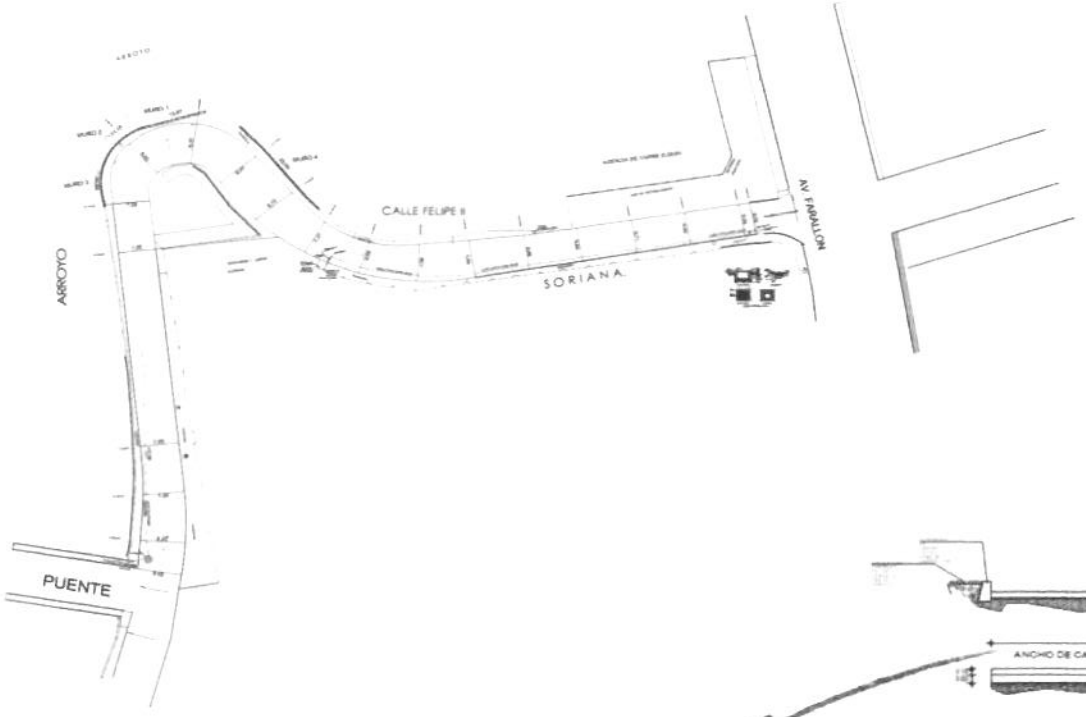





JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD EJECUTADA	REFERENCIA
32-0484	Calafateo en losas y guarniciones a base de asfalto oxidado incluye material, desperdicios, acarreos a primera estación y mano de obra.			ML	522.00				522.00	
								ML	**522.00**	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CROQUIS

32-0484 Calafateo en losas y guarniciones a base de asfalto oxidado incluye material, desperdicios, acarreos a primera estación y mano de obra.





EXCAVACION GUARNICION



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	C O N C E P T O	EJE	TRAMO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD EJECUTADA	REFERENCIA
22-0333*	Pintura esmalte amarillo trafico en guarniciones con desarrollo de 30.0 cm., incluye material mano de obra y acarreos a primera estación.			ML	424.35				424.35	
								ML	**424.35**	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CROQUIS

22-0333* Pintura esmalte amarillo trafico en guarniciones con desarrollo de 30.0 cm., incluye material mano de obra y acarreos a primera estación.





EXCAVACION GUARNICION



JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	C O N C E P T O	EJE	TRAMO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD EJECUTADA	REFERENCIA
32-0468	Banqueta de concreto hidráulico hecho en obra de f´c=150 kg/cm2 de 10 cms de espesor, T.M.A. 3/4", incluye curado, cimbrado, descimbrado, material y mano de obra.			M2	556.64				556.64	
								M2	**556.64**	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD EJECUTADA	REFERENCIA
CARGA	Carga mecánica con uso de retroexcavadora y acarreo en camión de volteo (6M3) de material producto de excavación y/o demolición a tiro libre.			M3	979.64				979.64	
								M3	979.64	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CROQUIS

CARGA Carga mecánica con uso de retroexcavadora y acarreo en camión de volteo (6M3) de material producto de excavación y/o demolición a tiro libre.

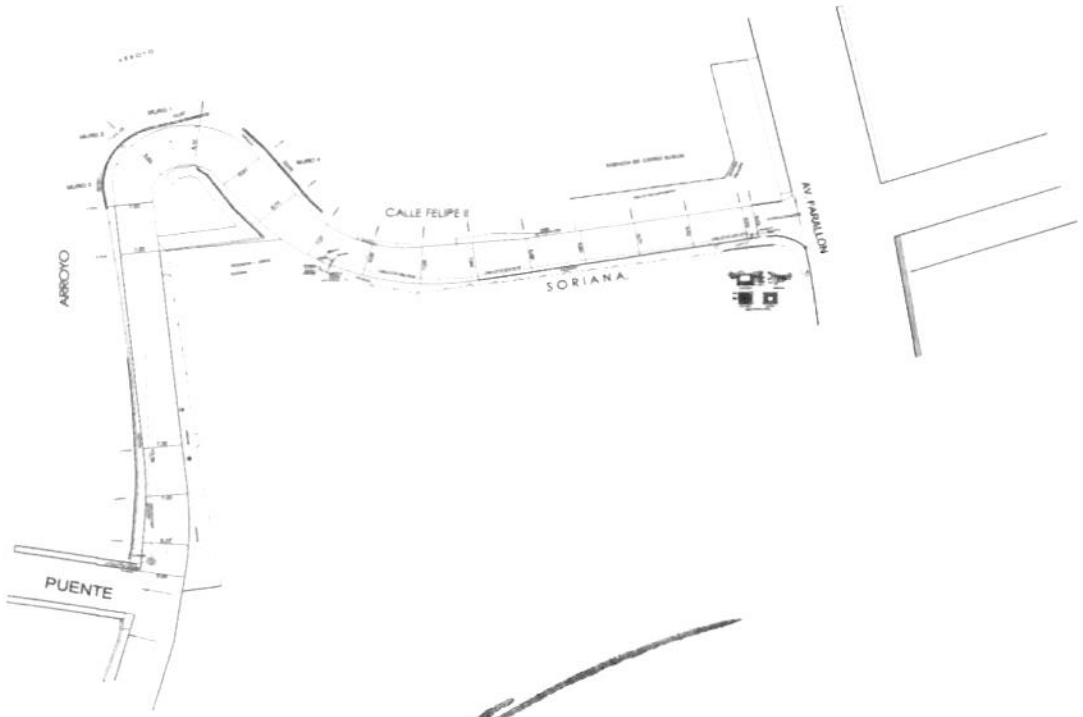

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	C O N C E P T O	EJE	TRAMO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD EJECUTADA	REFERENCIA
33-0528	Limpieza ultima general de obra para entrega con acopio y acarreo horizontal a 20 mts.			M2	2692.81				2,692.81	
								M2	**2,692.81**	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.

BIENESTAR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CROQUIS

33-0528 Limpieza ultima general de obra para entrega con acopio y acarreo horizontal a 20 mts.

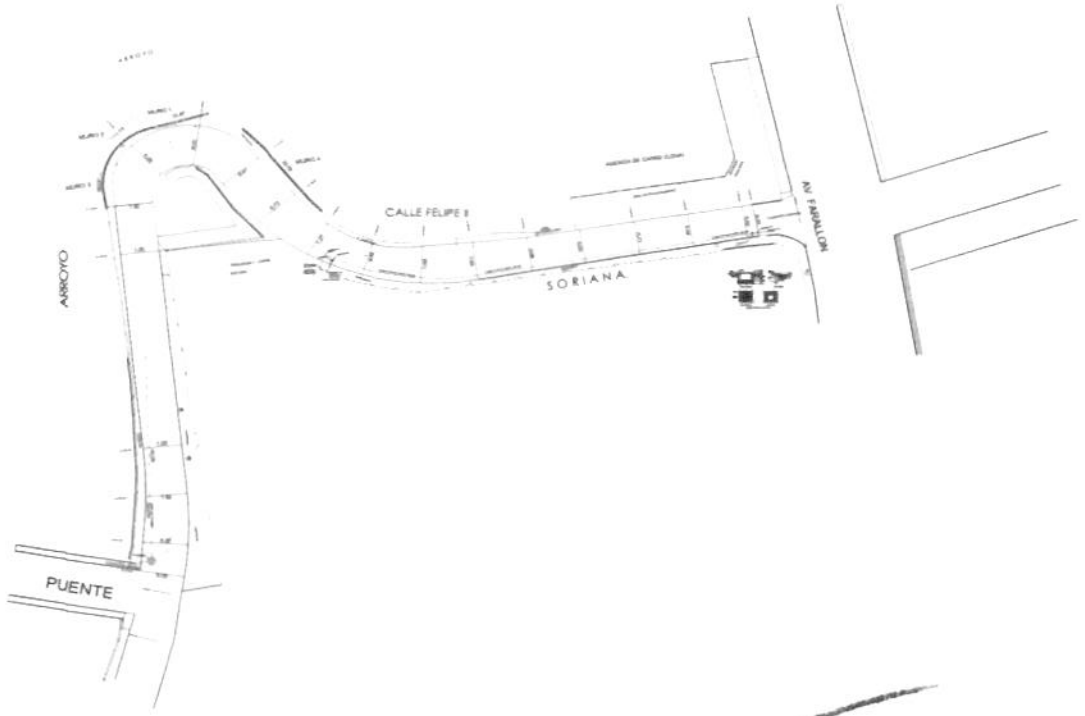

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

XIII- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A1	Análisis No.:		10			
Análisis:	**3-0073**		**M2**		**2,692.8100**	**$46,612.54**	

Trazo y nivelación topográficas del terreno para estructuras estableciendo ejes y referencias, para superficie mayores a 300.00 m2 (vialidad) incluye: elaboración de planos topográficos.

MATERIALES							
CAL	CALHIDRA	TON	$3,200.00	*	0.000407	$1.30	9.69%
DUELA	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25"	PZA	$30.00	*	0.030000	$0.90	6.71%
MAHILO	CARRETE DE HILO	PZA	$50.00	*	0.008000	$0.40	2.98%
3.	VARILLA DE 3/8" 9.5 MM	KG	$28.36	*	0.020000	$0.57	4.25%
MAPLANN	PLANO	PLAN	$12,500.00	*	0.000254	$3.18	23.70%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$6.35**	**47.32%**
MANO DE OBRA							
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	$1,455.27	/	300.000000	$4.85	36.14%
MO01	PEON	JOR	$444.84	*	0.001500	$0.67	4.99%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$5.52**	**41.13%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQTRAN	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	HOR	$11.48	*	0.120000	$1.38	10.28%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$5.52	*	0.030000	$0.17	1.27%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$1.55**	**11.55%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$13.42**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$2.49	
	SUBTOTAL1					$15.91	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$0.11	
	SUBTOTAL2					$16.02	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$1.20	
	SUBTOTAL3					$17.22	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.09	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$17.31**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A1	Análisis No.:		20			
Análisis:	**D-CAR5A10**		**M2**		**1,649.0000**	**$120,888.19**	

Demolición a maquina de carpeta asfaltica de 5.00 a 10.00 cms. De espesor. Incluye mano de obra y acarreos en 1a. estación.

MANO DE OBRA							
2P	CUADRILLA 02 (2 PEON + 0.1 CABO)	JOR	$1,010.61	*	0.003000	$3.03	5.33%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$3.03**	**5.33%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQRETROEXCA\	RETRO EXCAVADORA CAT 90 HP	HOR	$540.44	/	25.000000	$21.62	38.06%
EQCV0001	CAMION VOLTEO DE 6 M3	HORA	$804.00	/	25.000000	$32.16	56.61%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$53.78**	**94.67%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$56.81**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$10.56	
	SUBTOTAL1					$67.37	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$0.48	
	SUBTOTAL2					$67.85	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$5.09	
	SUBTOTAL3					$72.94	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.37	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$73.31**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A1	Análisis No.:		30			
Análisis:	**D-BANQU**		**M2**		**146.0400**	**$9,258.94**	

Demolición mecánica de banqueta de 10 cms. de espesor incluye: herramienta menor, equipo y mano de obra.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRETROEXCA\	RETRO EXCAVADORA CAT 90 HP	HOR	$540.44	/	11.000000	$49.13	100.00%

SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**		**$49.13**	**100.00%**
	(CD) COSTO DIRECTO		**$49.13**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS	18.5842%	$9.13	
	SUBTOTAL1		$58.26	
	(CF) FINANCIAMIENTO	0.7134%	$0.42	
	SUBTOTAL2		$58.68	
	(CU) UTILIDAD	7.5000%	$4.40	
	SUBTOTAL3		$63.08	
	CARGOS ADICIONALES			
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3	0.502500%	$0.32	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)		**$63.40**	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A1	Análisis No.:		40			
Análisis:	**D-GUARM**		**M**		**183.6700**	**$12,807.31**	

Demolición mecánica de guarnición de 15x20x50 cm., incluye extracción de pedacería, mano de obra, equipo y herramienta.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRETROEXCA\	RETRO EXCAVADORA CAT 90 HP	HOR	$540.44	/	10.000000	$54.04	100.00%

SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**		**$54.04**	**100.00%**
	(CD) COSTO DIRECTO		**$54.04**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS	18.5842%	$10.04	
	SUBTOTAL1		$64.08	
	(CF) FINANCIAMIENTO	0.7134%	$0.46	
	SUBTOTAL2		$64.54	
	(CU) UTILIDAD	7.5000%	$4.84	
	SUBTOTAL3		$69.38	
	CARGOS ADICIONALES			
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3	0.502500%	$0.35	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)		**$69.73**	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A1	Análisis No.:		50			
Análisis:	**1-0056**		**M**		**120.0000**	**$12,974.40**	
Descoronamiento de muro de piedra braza de 30 cm de ancho incluye: acarreo de material fuera de la obra producto de la demolición.							
MANO DE OBRA							
2P	CUADRILLA 02 (2 PEON + 0.1 CABO)	JOR	$1,010.61	*	0.020000	$20.21	24.12%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$20.21**	**24.12%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQRETROEXCA\	RETRO EXCAVADORA CAT 90 HP	HOR	$540.44	/	8.500000	$63.58	75.88%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$63.58**	**75.88%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$83.79**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$15.57	
	SUBTOTAL1					$99.36	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$0.71	
	SUBTOTAL2					$100.07	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$7.51	
	SUBTOTAL3					$107.58	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.54	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$108.12**	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A1	Análisis No.:		60			
Análisis:	**EXC-001**		**M3**		**699.4300**	**$51,967.65**	

Excavación por medios mecánicos en cepas de 0.00 A 2.00 mts de profundidad en material tipo II incluye afine de talud y fondo, acarreos a primera estación de 20 mts.

MANO DE OBRA							
2P	CUADRILLA 02 (2 PEON + 0.1 CABO)	JOR	$1,010.61	*	0.003500	$3.54	6.15%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$3.54**	**6.15%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQRETROEXCA\	RETRO EXCAVADORA CAT 90 HP	HOR	$540.44	*	0.100000	$54.04	93.85%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$54.04**	**93.85%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$57.58**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$10.70	
	SUBTOTAL1					$68.28	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$0.49	
	SUBTOTAL2					$68.77	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$5.16	
	SUBTOTAL3					$73.93	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.37	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$74.30**	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A1	Análisis No.:		70			
Análisis:	**9-0139**		**M3**		**420.2900**	**$35,161.46**	

Relleno de material producto de excavación compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor, incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.

MATERIALES							
AGUA	AGUA (MANEJO)	M3	$50.80	*	0.105000	$5.33	8.22%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$5.33**	**8.22%**
MANO DE OBRA							
2P	CUADRILLA 02 (2 PEON + 0.1 CABO)	JOR	$1,010.61	/	20.000000	$50.53	77.94%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$50.53**	**77.94%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQPIPA	CAMION PIPA DE 9 M3	HOR	$717.78	*	0.012500	$8.97	13.84%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$8.97**	**13.84%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$64.83**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$12.05	
	SUBTOTAL1					$76.88	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$0.55	
	SUBTOTAL2					$77.43	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$5.81	
	SUBTOTAL3					$83.24	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.42	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$83.66**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A1	Análisis No.:		80			
Análisis:	**9-0138**		**M3**		**30.0000**	**$14,969.70**	

Relleno de material inerte de banco compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.

MATERIALES							
AGUA	AGUA (MANEJO)	M3	$50.80	*	0.103429	$5.25	1.36%
MATBANCO	MATERIAL DE BANCO	M3	$275.00	*	1.250000	$343.75	88.89%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$349.00**	**90.25%**
MANO DE OBRA							
2P	CUADRILLA 02 (2 PEON + 0.1 CABO)	JOR	$1,010.61	/	35.000000	$28.87	7.47%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$28.87**	**7.47%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQPIPA	CAMION PIPA DE 9 M3	HOR	$717.78	*	0.012326	$8.85	2.29%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$8.85**	**2.29%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$386.72**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$71.87	
	SUBTOTAL1					$458.59	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$3.27	
	SUBTOTAL2					$461.86	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$34.64	
	SUBTOTAL3					$496.50	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$2.49	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$498.99**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A2	Análisis No.:		10			
Análisis:	**31-0448**		**M3**		**558.0000**	**$45,906.66**	
Apertura en caja por medios mecánicos en terreno tipo II-A, incluye acamellonamiento del material.							
MANO DE OBRA							
2P	CUADRILLA 02 (2 PEON + 0.1 CABO)	JOR	$1,010.61	/	350.000000	$2.89	4.53%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$2.89**	**4.53%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQMOTO14H	MOTONIVELADORA CAT. 14H DE 215 HP	HOR	$1,521.63	/	25.000000	$60.87	95.47%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$60.87**	**95.47%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$63.76**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$11.85	
	SUBTOTAL1					$75.61	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$0.54	
	SUBTOTAL2					$76.15	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$5.71	
	SUBTOTAL3					$81.86	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.41	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$82.27**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A2	Análisis No.:		20			
Análisis:	**31-0454**		**M2**		**1,471.3500**	**$59,074.70**	
Afine y compactación de sub rasante al 90 % PROCTOR mínimo, por medios mecánicos.							
MATERIALES							
AGUA	AGUA (MANEJO)	M3	$50.80	*	0.050000	$2.54	8.16%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$2.54**	**8.16%**
MANO DE OBRA							
2P	CUADRILLA 02 (2 PEON + 0.1 CABO)	JOR	$1,010.61	/	50.000000	$20.21	64.94%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$20.21**	**64.94%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQPIPA	CAMION PIPA DE 9 M3	HOR	$717.78	*	0.005000	$3.59	11.54%
EQVAP	VIBROCOMPACTADOR VAP 70	HOR	$795.89	*	0.006000	$4.78	15.36%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$8.37**	**26.90%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$31.12**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$5.78	
	SUBTOTAL1					$36.90	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$0.26	
	SUBTOTAL2					$37.16	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$2.79	
	SUBTOTAL3					$39.95	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.20	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$40.15**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A2	Análisis No.:		30			
Análisis:	**31-0457**		**M3**		**442.6200**	**$229,781.75**	
Formación de base de 30 cms. de espesor con material producto de banco con equipo mecánico incluye vertido, afine, compactado al 95 % PROCTOR y agua.							
MATERIALES							
AGUA	AGUA (MANEJO)	M3	$50.80	*	0.100000	$5.08	1.26%
MATBANCO	MATERIAL DE BANCO	M3	$275.00	*	1.200000	$330.00	82.02%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$335.08**	**83.28%**
MANO DE OBRA							
2P	CUADRILLA 02 (2 PEON + 0.1 CABO)	JOR	$1,010.61	/	80.000000	$12.63	3.14%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$12.63**	**3.14%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQPIPA	CAMION PIPA DE 9 M3	HOR	$717.78	*	0.012500	$8.97	2.23%
EQMOTO14H	MOTONIVELADORA CAT. 14H DE 215 HP	HOR	$1,521.63	*	0.030000	$45.65	11.35%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$54.62**	**13.58%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$402.33**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$74.77	
	SUBTOTAL1					$477.10	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$3.40	
	SUBTOTAL2					$480.50	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$36.04	
	SUBTOTAL3					$516.54	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$2.60	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$519.14**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A2	Análisis No.:		40			
Análisis:	**32-0466**		**M2**		**556.6400**	**$22,182.10**	
Afine y compactación en banquetas, andadores y plazas a mano incluye acarreos a primera estación.							
MATERIALES							
AGUA	AGUA (MANEJO)	M3	$50.80	*	0.040000	$2.03	6.57%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$2.03**	**6.57%**
MANO DE OBRA							
2P	CUADRILLA 02 (2 PEON + 0.1 CABO)	JOR	$1,010.61	/	70.000000	$14.44	46.76%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$14.44**	**46.76%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQPIPA	CAMION PIPA DE 9 M3	HOR	$717.78	*	0.004000	$2.87	9.29%
EQBAILAR	BAILARINA DE 4.5 HP	HOR	$100.33	*	0.115000	$11.54	37.37%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$14.41**	**46.66%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$30.88**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$5.74	
	SUBTOTAL1					$36.62	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$0.26	
	SUBTOTAL2					$36.88	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$2.77	
	SUBTOTAL3					$39.65	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.20	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$39.85**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A3	Análisis No.:		10			
Análisis:	**4-0080**		**M3**		**16.0000**	**$3,209.92**	

Excavación a mano en material tipo II-A, en seco y barreta de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad, depositando el producto de excavación a orilla de cepa, cualquier zona..

MANO DE OBRA

2P	CUADRILLA 02 (2 PEON + 0.1 CABO)	JOR	$1,010.61	/	6.500000	$155.48	100.00%

SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**		**$155.48**	**100.00%**
	(CD) COSTO DIRECTO		**$155.48**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS	18.5842%	$28.89	
	SUBTOTAL1		$184.37	
	(CF) FINANCIAMIENTO	0.7134%	$1.32	
	SUBTOTAL2		$185.69	
	(CU) UTILIDAD	7.5000%	$13.93	
	SUBTOTAL3		$199.62	
	CARGOS ADICIONALES			
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3	0.502500%	$1.00	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)		**$200.62**	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A3	Análisis No.:		20			
Análisis:	**9-0139**		**M3**		**15.8000**	**$1,321.83**	

Relleno de material producto de excavación compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor, incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.

MATERIALES							
AGUA	AGUA (MANEJO)	M3	$50.80	*	0.105000	$5.33	8.22%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$5.33**	**8.22%**
MANO DE OBRA							
2P	CUADRILLA 02 (2 PEON + 0.1 CABO)	JOR	$1,010.61	/	20.000000	$50.53	77.94%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$50.53**	**77.94%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQPIPA	CAMION PIPA DE 9 M3	HOR	$717.78	*	0.012500	$8.97	13.84%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$8.97**	**13.84%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$64.83**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$12.05	
	SUBTOTAL1					$76.88	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$0.55	
	SUBTOTAL2					$77.43	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$5.81	
	SUBTOTAL3					$83.24	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.42	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$83.66**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A3	Análisis No.:		30			
Análisis:	**5-0102**		**M3**		**2.0000**	**$951.12**	

Cama de arena para instalación de tubería incluye: acostillado, acarreo de material en 1ra. estación, material y mano de obra.

MATERIALES							
ARENA	ARENA	M3	$250.00	*	1.070000	$267.50	72.58%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$267.50**	**72.58%**
MANO DE OBRA							
2P	CUADRILLA 02 (2 PEON + 0.1 CABO)	JOR	$1,010.61	/	10.000000	$101.06	27.42%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$101.06**	**27.42%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$368.56**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$68.49	
	SUBTOTAL1					$437.05	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$3.12	
	SUBTOTAL2					$440.17	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$33.01	
	SUBTOTAL3					$473.18	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$2.38	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$475.56**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A3	Análisis No.:		40			
Análisis:	**27-0412**		**ML**		**50.0000**	**$22,462.00**	

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 3" CED. RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

MATERIALES							
MATUB-3	TUBO PVC 3 PULG DIAM CED RD26	ML	$275.00	*	1.070000	$294.25	84.52%
MAPRUEBA-H	PRUEBA HIDROSTATICA	PRUE	$450.00	*	0.030000	$13.50	3.88%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$307.75**	**88.40%**
MANO DE OBRA							
1P1E	CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE)	JOR	$1,414.08	/	35.000000	$40.40	11.60%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$40.40**	**11.60%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$348.15**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$64.70	
	SUBTOTAL1					$412.85	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$2.95	
	SUBTOTAL2					$415.80	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$31.19	
	SUBTOTAL3					$446.99	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$2.25	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$449.24**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A3	Análisis No.:		50			
Análisis:	**TOMDOM***		**PZA**		**3.0000**	**$5,280.93**	

Toma domiciliaria de agua potable con tubo de CPVC de 13 mm. de 6 mts. de longitud, incluye: excavación, relleno, válvula de inserción, abrazadera de 4", acarreo de materiales, mano de obra y herramienta.

MATERIALES							
MALLAV-INS1/2	LLAVE DE INSERCION 1/2"	PZA	$90.00	*	1.000000	$90.00	6.60%
MAADAP-M1/2	ADAPTADOR MACHO BRONCE 1/2	PZA	$135.00	*	1.000000	$135.00	9.90%
MALLAV-NA1/2	LLAVE NARIZ BRONCE 1/2"	PZA	$75.00	*	1.000000	$75.00	5.50%
MATUB-CPVC1/2	TUBERIA DE CPVC 1/2 PULG	ML	$44.00	*	6.000000	$264.00	19.35%
MAACC-CPVC	ACCESORIOS DE CPVC	PZA	$188.00	*	1.000000	$188.00	13.78%
MAABR-4	ABRAZADERA DE 4 PULG	PZA	$298.00	*	1.000000	$298.00	21.84%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$1050.00**	**76.97%**
MANO DE OBRA							
1P1E	CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE)	JOR	$1,414.08	/	4.500000	$314.24	23.03%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$314.24**	**23.03%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$1,364.24**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$253.53	
	SUBTOTAL1					$1,617.77	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$11.54	
	SUBTOTAL2					$1,629.31	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$122.20	
	SUBTOTAL3					$1,751.51	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$8.80	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$1,760.31**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A3	Análisis No.:		60			
Análisis:	**314-IHS-07-087**		**PZA**		**3.0000**	**$728.79**	

Válvula de esfera de CPVC 13 mm, incluye: suministro de materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES							
MAVAL-ESF13	VALVULA ESFERA CPVC 13MM	PZA	$160.00	*	1.000000	$160.00	84.98%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$160.00**	**84.98%**
MANO DE OBRA							
1P1E	CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE)	JOR	$1,414.08	/	50.000000	$28.28	15.02%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$28.28**	**15.02%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$188.28**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$34.99	
	SUBTOTAL1					$223.27	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$1.59	
	SUBTOTAL2					$224.86	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$16.86	
	SUBTOTAL3					$241.72	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$1.21	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$242.93**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A3	Análisis No.:		70			
Análisis:	**BOTA01**		**PZA**		**3.0000**	**$4,165.20**	

Caja para llave de banqueta (bota) incluye llave de cuadro roscable 1/2", herramienta menor, mano de obra, materiales y equipo.

MATERIALES							
CAJA-BANQ	BOTA PARA LLAVE	PZA	$750.00	*	1.000000	$750.00	69.70%
MALLAVE-R1/2	LLAVE CUADRO ROSCABLE1/2PULG	PZA	$225.00	*	1.000000	$225.00	20.91%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$975.00**	**90.61%**
MANO DE OBRA							
1P1E	CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE)	JOR	$1,414.08	/	14.000000	$101.01	9.39%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$101.01**	**9.39%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$1,076.01**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$199.97	
	SUBTOTAL1					$1,275.98	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$9.10	
	SUBTOTAL2					$1,285.08	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$96.38	
	SUBTOTAL3					$1,381.46	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$6.94	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$1,388.40**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A4	Análisis No.:		10			
Análisis:	**EXC-001**		**M3**		**47.2600**	**$3,511.42**	

Excavación por medios mecánicos en cepas de 0.00 A 2.00 mts de profundidad en material tipo II incluye afine de talud y fondo, acarreos a primera estación de 20 mts.

MANO DE OBRA							
2P	CUADRILLA 02 (2 PEON + 0.1 CABO)	JOR	$1,010.61	*	0.003500	$3.54	6.15%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$3.54**	**6.15%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQRETROEXCA\	RETRO EXCAVADORA CAT 90 HP	HOR	$540.44	*	0.100000	$54.04	93.85%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$54.04**	**93.85%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$57.58**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$10.70	
	SUBTOTAL1					$68.28	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$0.49	
	SUBTOTAL2					$68.77	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$5.16	
	SUBTOTAL3					$73.93	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.37	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$74.30**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A4	Análisis No.:		20			
Análisis:	**9-0139**		**M3**		**31.7900**	**$2,659.55**	

Relleno de material producto de excavación compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor, incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.

MATERIALES							
AGUA	AGUA (MANEJO)	M3	$50.80	*	0.105000	$5.33	8.22%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$5.33**	**8.22%**
MANO DE OBRA							
2P	CUADRILLA 02 (2 PEON + 0.1 CABO)	JOR	$1,010.61	/	20.000000	$50.53	77.94%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$50.53**	**77.94%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQPIPA	CAMION PIPA DE 9 M3	HOR	$717.78	*	0.012500	$8.97	13.84%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$8.97**	**13.84%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$64.83**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$12.05	
	SUBTOTAL1					$76.88	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$0.55	
	SUBTOTAL2					$77.43	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$5.81	
	SUBTOTAL3					$83.24	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.42	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$83.66**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A4	Análisis No.:		30			
Análisis:	**9-0138**		**M3**		**13.6200**	**$6,796.24**	

Relleno de material inerte de banco compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.

MATERIALES							
AGUA	AGUA (MANEJO)	M3	$50.80	*	0.103429	$5.25	1.36%
MATBANCO	MATERIAL DE BANCO	M3	$275.00	*	1.250000	$343.75	88.89%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$349.00**	**90.25%**
MANO DE OBRA							
2P	CUADRILLA 02 (2 PEON + 0.1 CABO)	JOR	$1,010.61	/	35.000000	$28.87	7.47%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$28.87**	**7.47%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQPIPA	CAMION PIPA DE 9 M3	HOR	$717.78	*	0.012326	$8.85	2.29%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$8.85**	**2.29%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$386.72**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$71.87	
	SUBTOTAL1					$458.59	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$3.27	
	SUBTOTAL2					$461.86	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$34.64	
	SUBTOTAL3					$496.50	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$2.49	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$498.99**	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A4	Análisis No.:		40			
Análisis:	**5-0102**		**M3**		**3.3700**	**$1,602.64**	

Cama de arena para instalación de tubería incluye: acostillado, acarreo de material en 1ra. estación, material y mano de obra.

MATERIALES							
ARENA	ARENA	M3	$250.00	*	1.070000	$267.50	72.58%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$267.50**	**72.58%**
MANO DE OBRA							
2P	CUADRILLA 02 (2 PEON + 0.1 CABO)	JOR	$1,010.61	/	10.000000	$101.06	27.42%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$101.06**	**27.42%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$368.56**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$68.49	
	SUBTOTAL1					$437.05	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$3.12	
	SUBTOTAL2					$440.17	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$33.01	
	SUBTOTAL3					$473.18	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$2.38	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$475.56**	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A4	Análisis No.:		50			
Análisis:	**28-0417**		**PZA**		**2.0000**	**$26,542.68**	

Pozo de visita de forma cónica de 0.60 a 1.20 mts. de diámetro interior por 1.50 mts. de altura a base de mamposteria, muro de tabique de 25 cms. con aplanado de mortero cemento arena 1:3 acabado pulido, incluye excavación, acarreo y relleno.

MATERIALES							
MATABIQUE	TABIQUE COMUN BARRO R.R. DE 7x14x28 CM.	PZA	$5.00	*	750.000000	$3750.00	36.46%
MAAC0004	ACERO DE REFUERZO DEL 3 AL 8 FY=4200 KG/	KG	$34.00	*	18.000000	$612.00	5.95%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$4362.00**	**42.41%**
MANO DE OBRA							
1A5P	CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)	JOR	$3,341.39	/	1.500000	$2227.59	21.66%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$2227.59**	**21.66%**
BASICOS							
MABA0006	MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3	M3	$2,251.34	*	1.500000	$3377.01	32.83%
MABA001	CIMBRA COMUN	ML	$58.10	*	1.000000	$58.10	0.56%
MABA0017	CONCRETO F'C=200KG/CM2 T.M.A. 3/4"	M3	$2,171.34	*	0.120000	$260.56	2.53%
SUBTOTAL:	**BASICOS**					**$3695.67**	**35.93%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$10,285.26**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$1,911.43	
	SUBTOTAL1					$12,196.69	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$87.01	
	SUBTOTAL2					$12,283.70	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$921.28	
	SUBTOTAL3					$13,204.98	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$66.36	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$13,271.34**	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A4	Análisis No.:		60			
Análisis:	**37-0579BP**		**PZA**		**2.0000**	**$8,420.20**	

Suministro y colocación de brocal y tapa de Polietileno alta resistencia abierto o cerrado para pozo de visita de 60 cm de diámetro, incluye material y mano de obra.

MATERIALES							
MABROCAL-POL	BROCAL DE POLIETILENO	PZA	$2,980.00	*	1.000000	$2980.00	91.33%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$2980.00**	**91.33%**
MANO DE OBRA							
1P1E	CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE)	JOR	$1,414.08	/	5.000000	$282.82	8.67%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$282.82**	**8.67%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$3,262.82**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$606.37	
	SUBTOTAL1					$3,869.19	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$27.60	
	SUBTOTAL2					$3,896.79	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$292.26	
	SUBTOTAL3					$4,189.05	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$21.05	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$4,210.10**	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A4	Análisis No.:		70			
Análisis:	**26-0390***		**PZA**		**2.0000**	**$4,964.26**	

Registro sanitario de 0.40x0.60x0.60 mts., a base de tabicón10x14x28, asentado con mortero cemento arena 1:3, aplanado interior acabado fino con mortero cemento arena 1:3, piso de 10 cm, de concreto simple F'c= 150 Kg/cm2, tapa de concreto F'c=250 Kg/cm2, armado con varilla del No. 3 @ 20 cm. en ambos sentidos, de 15 cm. de espesor incluye trazo, nivelación, barrenado y demolición de roca, acarreo y m.o.

MATERIALES							
MATABICON	TABICON	PZA	$12.00	*	30.000000	$360.00	18.71%
MATA-REG	TAPADERA DE REGISTRO CON ANGULO Y CONCRETO	PZA	$750.00	*	1.000000	$750.00	38.99%
MAAG0001	CEMENTO GRIS	TON	$3,880.00	*	0.005000	$19.40	1.01%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$1129.40**	**58.71%**
MANO DE OBRA							
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	$1,455.27	/	3.000000	$485.09	25.22%
2P	CUADRILLA 02 (2 PEON + 0.1 CABO)	JOR	$1,010.61	/	10.000000	$101.06	5.25%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$586.15**	**30.47%**
BASICOS							
MABA0006	MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3	M3	$2,251.34	*	0.070000	$157.59	8.19%
MABA0016	CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4"	M3	$2,104.59	*	0.024000	$50.51	2.63%
SUBTOTAL:	**BASICOS**					**$208.10**	**10.82%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$1,923.65**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$357.49	
	SUBTOTAL1					$2,281.14	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$16.27	
	SUBTOTAL2					$2,297.41	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$172.31	
	SUBTOTAL3					$2,469.72	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$12.41	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$2,482.13**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A4	Análisis No.:		80			
Análisis:	**TUBO 8"**		**M**		**42.8000**	**$33,092.53**	
Suministro e instalación de tubo PVC sanitario de 8" de diametro incluye acarreos, materiales secundarios, conexiones y mano de obra.							
MATERIALES							
MAPEG-PVC	PEGAMENTO PVC	PZA	$71.00	*	0.250000	$17.75	2.96%
MATUB-8PVC	TUBO PVC SANITARIO 8 PULG	ML	$450.00	*	1.070000	$481.50	80.35%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$499.25**	**83.32%**
MANO DE OBRA							
1P1E	CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE)	JOR	$1,414.08	/	15.000000	$94.27	15.73%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$94.27**	**15.73%**
BASICOS							
MABA0006	MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3	M3	$2,251.34	*	0.002534	$5.70	0.95%
SUBTOTAL:	**BASICOS**					**$5.70**	**0.95%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$599.22**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$111.36	
	SUBTOTAL1					$710.58	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$5.07	
	SUBTOTAL2					$715.65	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$53.67	
	SUBTOTAL3					$769.32	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$3.87	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$773.19**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A4	Análisis No.:		90			
Análisis:	**SUM-COD2**		**PZA**		**2.0000**	**$712.20**	
Suministro y colocación de codo PVC sanitario de 6"X45°, incluye carga y descarga en almacén de obra.							
MATERIALES							
MAPEG-PVC	PEGAMENTO PVC	PZA	$71.00	*	0.030000	$2.13	0.77%
MACODO-PVC6	CODO PVC 6 PULG DIAM	PZA	$255.00	*	1.000000	$255.00	92.40%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$257.13**	**93.17%**
MANO DE OBRA							
1P1E	CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE)	JOR	$1,414.08	/	75.000000	$18.85	6.83%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$18.85**	**6.83%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$275.98**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$51.29	
	SUBTOTAL1					$327.27	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$2.33	
	SUBTOTAL2					$329.60	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$24.72	
	SUBTOTAL3					$354.32	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$1.78	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$356.10**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A4	Análisis No.:		100			
Análisis:	**PU-6255**		**PZA**		**2.0000**	**$1,248.28**	

Suministro y colocación de unión de servicio de P.V.C. De 150 mm (6") de diámetro para alcantarillado sanitario incluye carga y descarga en almacén de obra.

MATERIALES							
MAPEG-PVC	PEGAMENTO PVC	PZA	$71.00	*	0.025000	$1.78	0.37%
MAUNI-6	UNION SERVICIO PVC 6 PULG	PZA	$380.00	*	1.000000	$380.00	78.56%
SEG-CORT	SEGUETA PARA CORTE	PZA	$15.94	*	0.050000	$0.80	0.17%
MALIJ-TUB12	LIJA PARA TUBERIA	ML	$22.50	*	0.125000	$2.81	0.58%
MAEST-009	ESTOPA BLANCA	KG	$81.00	*	0.050000	$4.05	0.84%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$389.44**	**80.51%**
MANO DE OBRA							
1P1E	CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE)	JOR	$1,414.08	/	15.000000	$94.27	19.49%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$94.27**	**19.49%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$483.71**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$89.89	
	SUBTOTAL1					$573.60	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$4.09	
	SUBTOTAL2					$577.69	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$43.33	
	SUBTOTAL3					$621.02	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$3.12	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$624.14**	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A4	Análisis No.:		110			
Análisis:	**PU-6239**		**ML**		**18.0000**	**$8,694.54**	

Suministro de tubo de PVC sanitario de norma liso de 150 mm de diámetro, incluye flete, carga y descarga en almacén de obra.

MATERIALES							
MAPEG-PVC	PEGAMENTO PVC	PZA	$71.00	*	0.030000	$2.13	0.57%
MATUB-PVC-6	TUBO PVC SANITARIO 6 PULG	ML	$295.00	*	1.070000	$315.65	84.32%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$317.78**	**84.89%**
MANO DE OBRA							
1P1E	CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE)	JOR	$1,414.08	/	25.000000	$56.56	15.11%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$56.56**	**15.11%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$374.34**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$69.57	
	SUBTOTAL1					$443.91	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$3.17	
	SUBTOTAL2					$447.08	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$33.53	
	SUBTOTAL3					$480.61	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$2.42	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$483.03**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A5	Análisis No.:		10			
Análisis:	**18-0296**		**M3**		**276.5200**	**$761,912.15**	

Muro de piedra braza de la región, asentada con mortero cemento arena 1:5, acabado común incluye: acarreo de materiales en 1ra. erstación de 20 mts.

MATERIALES							
MAPIED-BRA	PIEDRA BRAZA DE LA REGION	M3	$749.00	*	1.350000	$1011.15	47.35%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$1011.15**	**47.35%**
MANO DE OBRA							
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	$1,455.27	/	3.000000	$485.09	22.72%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$485.09**	**22.72%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQCV0001	CAMION VOLTEO DE 6 M3	HORA	$804.00	*	0.096000	$77.18	3.61%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$77.18**	**3.61%**
BASICOS							
MABA0009	MORTERO CEMENTO ARENA 1:5	M3	$1,686.07	*	0.333300	$561.97	26.32%
SUBTOTAL:	**BASICOS**					**$561.97**	**26.32%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$2,135.39**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$396.85	
	SUBTOTAL1					$2,532.24	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$18.07	
	SUBTOTAL2					$2,550.31	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$191.27	
	SUBTOTAL3					$2,741.58	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$13.78	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$2,755.36**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A5	Análisis No.:		20			
Análisis:	**18-0313**		**ML**		**26.0000**	**$3,388.32**	
Dren para muro de mampostería a base de P.V.C. 4" tipo rígido incluye material y mano de obra.							
MATERIALES							
MATUB-PVC4	TUBO PVC 4"	ML	$49.00	*	1.030000	$50.47	49.97%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$50.47**	**49.97%**
MANO DE OBRA							
2P	CUADRILLA 02 (2 PEON + 0.1 CABO)	JOR	$1,010.61	/	20.000000	$50.53	50.03%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$50.53**	**50.03%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$101.00**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$18.77	
	SUBTOTAL1					$119.77	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$0.85	
	SUBTOTAL2					$120.62	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$9.05	
	SUBTOTAL3					$129.67	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.65	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$130.32**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A5	Análisis No.:		30			
Análisis:	**18-0318**		**M3**		**53.7000**	**$54,747.69**	
FILTRO DE GRAVA Y/O RAJUELA DE PIEDRA DE 30 CMS DE ESPESOR INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA							
MATERIALES							
MAGRA-RAY	GRAVA Y/O RAYUELA PARA FILTRO	M3	$490.00	*	1.200000	$588.00	74.42%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$588.00**	**74.42%**
MANO DE OBRA							
2P	CUADRILLA 02 (2 PEON + 0.1 CABO)	JOR	$1,010.61	/	5.000000	$202.12	25.58%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$202.12**	**25.58%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$790.12**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$146.84	
	SUBTOTAL1					$936.96	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$6.68	
	SUBTOTAL2					$943.64	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$70.77	
	SUBTOTAL3					$1,014.41	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$5.10	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$1,019.51**	



JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A5	Análisis No.:		40			
Análisis:	**11-0151***		**PZA**		**13.0000**	**$5,738.98**	

Anclaje de castillo de 20 x 15 cms. 4 var. # 4 y estribos del # 2 a.c. 20 cms. Hasta una profundidad de 50 cms., concreto f´c = 200 kg/cm2 incluye material y mano de obra.

MANO DE OBRA							
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	$1,455.27	/	11.000000	$132.30	38.67%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$132.30**	**38.67%**
BASICOS							
MABA0001	CIMBRA APARENTE EN CADENAS Y CASTILLOS	M2	$317.03	*	0.100000	$31.70	9.27%
MABA0018	CONCRETO F'C=250KG/CM2 T.M.A. 3/4"	M3	$2,465.17	*	0.015000	$36.98	10.81%
MABA0019	ACERO RFZO. CIMENTACION ALAM.#2 FY=2530K	KG	$35.94	*	1.100000	$39.53	11.55%
MABA0020	ACERO RFZO. DEL FY=4200 KG/CM2	KG	$32.78	*	3.100000	$101.62	29.70%
SUBTOTAL:	**BASICOS**					**$209.83**	**61.33%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$342.13**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$63.58	
	SUBTOTAL1					$405.71	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$2.89	
	SUBTOTAL2					$408.60	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$30.65	
	SUBTOTAL3					$439.25	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$2.21	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$441.46**	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A5	Análisis No.:		50			
Análisis:	**11-0160***		**M**		**31.5300**	**$27,838.78**	

Cadena de desplante de concreto f'c=250 Kg/cm2, de 15x20 cm, armado con 6 varillas No.4 y estribos No. 2 a cada 25 cm, incluye cimbra común, acarreo de material 1ra. estación.

MANO DE OBRA							
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	$1,455.27	/	5.500000	$264.59	38.67%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$264.59**	**38.67%**
BASICOS							
MABA0001	CIMBRA APARENTE EN CADENAS Y CASTILLOS	M2	$317.03	*	0.200000	$63.41	9.27%
MABA0018	CONCRETO F'C=250KG/CM2 T.M.A. 3/4"	M3	$2,465.17	*	0.030000	$73.96	10.81%
MABA0019	ACERO RFZO. CIMENTACION ALAM.#2 FY=2530K	KG	$35.94	*	2.200000	$79.07	11.56%
MABA0020	ACERO RFZO. DEL FY=4200 KG/CM2	KG	$32.78	*	6.200000	$203.24	29.70%
SUBTOTAL:	**BASICOS**					**$419.68**	**61.33%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$684.27**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$127.17	
	SUBTOTAL1					$811.44	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$5.79	
	SUBTOTAL2					$817.23	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$61.29	
	SUBTOTAL3					$878.52	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$4.41	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$882.93**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A5	Análisis No.:		60			
Análisis:	**11-0221**		**M2**		**26.8000**	**$76,899.12**	

Losa de concreto f´c= 250 kg/cm2 de 10 cms de espesor armada con var. No. 4 a cada 15 cm. En ambos sentidos, para paso peatonal, según planos estructurales incluye cimbrado, armado, colado y descimbrado, material y mano de obra.

MATERIALES							
MAACER4	ACERO 4	KG	$30.91	*	28.360000	$876.61	39.42%
MAAC0001	ALAMBRE RECOCIDO	KG	$28.50	*	0.475000	$13.54	0.61%
MACON-PRE250	CONCRETO PREMEZCLADO FC= 250 KG/CM2	M3	$2,020.00	*	0.105000	$212.10	9.54%
MADIESEL	DIESEL	LTO	$21.20	*	0.300000	$6.36	0.29%
CLAVOS	CLAVOS DE 2 A 4 "	KG	$65.00	*	0.270000	$17.55	0.79%
MAMA0002	CHAFLAN DE 1/2" X 1/2"	ML	$25.00	*	0.125000	$3.13	0.14%
MAMA0007	TRIPLAY DE PINO DE 16 MM.	PZA	$775.00	*	0.120000	$93.00	4.18%
MABARR3.5	BARROTE PINO 3RA 1.5X3.5	PZA	$75.00	*	0.730000	$54.75	2.46%
MAPOLIN	POLIN DE 3RA VARIAS MEDIDAS	PT	$17.70	*	3.107000	$54.99	2.47%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$1332.03**	**59.90%**
MANO DE OBRA							
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	$1,455.27	/	3.300000	$440.99	19.83%
1F1A	CUADRILLA No 6 (1 FIERRERO + 1 AYUDANTE)	JOR	$1,413.76	/	3.300000	$428.41	19.27%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$869.40**	**39.10%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQVIB	VIBRADOR PARA CONCRETO	HOR	$117.49	*	0.190000	$22.32	1.00%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$22.32**	**1.00%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$2,223.75**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$413.27	
	SUBTOTAL1					$2,637.02	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$18.81	
	SUBTOTAL2					$2,655.83	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$199.19	
	SUBTOTAL3					$2,855.02	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$14.35	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$2,869.37**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A5	Análisis No.:		70			
Análisis:	**F-BARANDAL1**		**M**		**39.7800**	**$94,417.43**	

Suministro y colocación de barandal de tubo de acero negro de 1 1/2" con división de tubo de 1" con postes de 1 1/2" a cada metro soldado a placa de 1/2" de 15x15 cms. embutida en losa, incluye materiales, mano de obra, pintura, equipo y herramienta.

MATERIALES							
MATUB-ACE	TUBO DE ACERO 1 1/2 PULG	PZA	$850.00	*	0.500000	$425.00	23.10%
MATUB-1	TUBO ACERO 1 PULG	PZA	$430.00	*	0.850000	$365.50	19.87%
CO08	PRIMARIO ANTICORROSIVO	LT	$198.00	*	0.250000	$49.50	2.69%
THINNER	THINNER STANDARD	LT	$77.00	*	0.500000	$38.50	2.09%
MAPLAC	PLACA 15X15 CM	KG	$40.00	*	2.250000	$90.00	4.89%
3.	VARILLA DE 3/8" 9.5 MM	KG	$28.36	*	0.330000	$9.36	0.51%
7018	SOLDADURA ELECTRODO 7018	KG	$137.00	*	0.250000	$34.25	1.86%
MAPIN-ESM	PINTURA ESMALTE MCA COMEX O SIMILAR	LT	$285.00	*	0.225000	$64.13	3.49%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$1076.24**	**58.51%**
MANO DE OBRA							
1P1A	CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + AYUDANTE)	JOR	$1,413.76	/	9.250000	$152.84	8.31%
1H1A	CUADRILLA No 9 (1 HERRERO + AYUDANTE)	JOR	$1,413.76	/	3.250000	$435.00	23.65%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$587.84**	**31.96%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQPLAN	PLANTA DE SOLDAR MILLER	HOR	$67.36	*	0.500000	$33.68	1.83%
EQECORTE	EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO	HOR	$1,176.92	*	0.035000	$41.19	2.24%
EQCV0001	CAMION VOLTEO DE 6 M3	HORA	$804.00	*	0.125000	$100.50	5.46%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$175.37**	**9.53%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$1,839.45**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$341.85	
	SUBTOTAL1					$2,181.30	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$15.56	
	SUBTOTAL2					$2,196.86	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$164.76	
	SUBTOTAL3					$2,361.62	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$11.87	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$2,373.49**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A6	Análisis No.:		10			
Análisis:	**REG-AUX**		**PZA**		**8.0000**	**$28,435.68**	

Registro auxiliar para alumbrado público de 50x60x65mts., de tabique rojo recocido 7x14x28 cms., con 14 cms. de espesor asentado y aplanado con mortero cemento arena 1:5 incluye: plantilla de concreto de 10 cms de espesor f´c=100kg/cm2, marco y contramarco de ángulo de 1 1/2"x3/16" concreto f´c=200kg/cm2 en tapa y fijación de marco, drén de grava de 20 cms de espesor, herramienta menor, materiales y mano de obra.

MATERIALES							
MAHE0007	TAPA REG. ELECT. 60X60 C/MRCO ANG. Y LAM	PZA	$823.00	*	1.000000	$823.00	29.88%
MATABIQUE	TABIQUE COMUN BARRO R.R. DE 7x14x28 CM.	PZA	$5.00	*	90.000000	$450.00	16.34%
MAGRAVA	GRAVA PARA REGISTRO	M3	$450.00	*	0.200000	$90.00	3.27%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$1363.00**	**49.48%**
MANO DE OBRA							
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	$1,455.27	/	1.500000	$970.18	35.22%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$970.18**	**35.22%**
BASICOS							
MABA0009	MORTERO CEMENTO ARENA 1:5	M3	$1,686.07	*	0.250000	$421.52	15.30%
SUBTOTAL:	**BASICOS**					**$421.52**	**15.30%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$2,754.70**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$511.94	
	SUBTOTAL1					$3,266.64	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$23.30	
	SUBTOTAL2					$3,289.94	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$246.75	
	SUBTOTAL3					$3,536.69	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$17.77	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$3,554.46**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A6	Análisis No.:		20			
Análisis:	**TUB-PESA50**		**M**		**200.0000**	**$40,248.00**	

Suministro y tendido de tubo conduit pvc pesado 50 mm de diámetro incluye conexión, trazo, excavación, relleno, cama de arena, herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra.

MATERIALES							
MATUB-CON50	TUBO CONDUIT PVC PESADO 50 MM	ML	$32.00	*	1.070000	$34.24	21.95%
MAPE0001	ARENA DE LA REGION	M3	$400.00	*	0.100000	$40.00	25.65%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$74.24**	**47.60%**
MANO DE OBRA							
2P	CUADRILLA 02 (2 PEON + 0.1 CABO)	JOR	$1,010.61	/	20.000000	$50.53	32.40%
1E1A	CUADRILLA (1 OF ELECTRICO + AYUDANTE)	JOR	$1,247.66	/	40.000000	$31.19	20.00%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$81.72**	**52.40%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$155.96**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$28.98	
	SUBTOTAL1					$184.94	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$1.32	
	SUBTOTAL2					$186.26	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$13.97	
	SUBTOTAL3					$200.23	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$1.01	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$201.24**	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A7	Análisis No.:		10			
Análisis:	**4-0080**		**M3**		**64.3500**	**$12,909.90**	

Excavación a mano en material tipo II-A, en seco y barreta de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad, depositando el producto de excavación a orilla de cepa, cualquier zona..

MANO DE OBRA

2P	CUADRILLA 02 (2 PEON + 0.1 CABO)	JOR	$1,010.61	/	6.500000	$155.48	100.00%

SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**		**$155.48**	**100.00%**
	(CD) COSTO DIRECTO		**$155.48**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS	18.5842%	$28.89	
	SUBTOTAL1		$184.37	
	(CF) FINANCIAMIENTO	0.7134%	$1.32	
	SUBTOTAL2		$185.69	
	(CU) UTILIDAD	7.5000%	$13.93	
	SUBTOTAL3		$199.62	
	CARGOS ADICIONALES			
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3	0.502500%	$1.00	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)		**$200.62**	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A7	Análisis No.:		20			
Análisis:	**9-0138**		**M3**		**38.5500**	**$19,236.06**	

Relleno de material inerte de banco compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cms. de espesor incluye acarreo dentro de la obra, medido compactado.

MATERIALES							
AGUA	AGUA (MANEJO)	M3	$50.80	*	0.103429	$5.25	1.36%
MATBANCO	MATERIAL DE BANCO	M3	$275.00	*	1.250000	$343.75	88.89%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$349.00**	**90.25%**
MANO DE OBRA							
2P	CUADRILLA 02 (2 PEON + 0.1 CABO)	JOR	$1,010.61	/	35.000000	$28.87	7.47%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$28.87**	**7.47%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQPIPA	CAMION PIPA DE 9 M3	HOR	$717.78	*	0.012326	$8.85	2.29%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$8.85**	**2.29%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$386.72**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$71.87	
	SUBTOTAL1					$458.59	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$3.27	
	SUBTOTAL2					$461.86	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$34.64	
	SUBTOTAL3					$496.50	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$2.49	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$498.99**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A7	Análisis No.:		30			
Análisis:	**32-0471**		**ML**		**424.3500**	**$225,253.47**	

Guarnición de concreto simple de f´c= 200 kg/cm2 de 20x15x40 cm. de sección T.M.A. 3/4" Incluye cimbrado, descimbrado, materiales y mano de obra.

MATERIALES							
1.	ALAMBRE RECOCIDO	KG	$38.00	*	0.125000	$4.75	1.15%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$4.75**	**1.15%**
MANO DE OBRA							
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	$1,455.27	/	8.000000	$181.91	44.22%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$181.91**	**44.22%**
BASICOS							
MACIM-FRON	CIMBRA EN FRONTERA DE 3RA	ML	$40.17	*	1.000000	$40.17	9.76%
MABA0017	CONCRETO F'C=200KG/CM2 T.M.A. 3/4"	M3	$2,171.34	*	0.085000	$184.56	44.86%
SUBTOTAL:	**BASICOS**					**$224.73**	**54.63%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$411.39**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$76.45	
	SUBTOTAL1					$487.84	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$3.48	
	SUBTOTAL2					$491.32	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$36.85	
	SUBTOTAL3					$528.17	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$2.65	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$530.82**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A7	Análisis No.:		40			
Análisis:	**32-0475A**		**M2**		**1,471.3500**	**$1,437,435.38**	

Pavimento premezclado F'c= 300 Kg/cm2, T.A.M. 3/4" de 20 cm. de espesor resistencia normal, acabado a regla incluye junta constructiva con chaflan de 1/2", en cada junta fria (al termino del colado) se procederá a colocar 8 conectores con varilla de 1/2" a cada 60 cms. 30-30 cms., fibra microsintetica, curado con curacreto, vibrado, acarreos de materiales a 1ra. estación.

MATERIALES							
AGUA	AGUA (MANEJO)	M3	$50.80	*	0.100000	$5.08	0.67%
MACONCE-PRE:	CONCRETO PREMEZCLADO FC= 300 KG/CM2	M3	$2,320.00	*	0.205000	$475.60	62.82%
MACON-1/2	CONECTOR CON VARILLA 1/2 DE 60 CM	PZA	$78.00	*	0.400000	$31.20	4.12%
MAFIBT-SIN	FIBRA MICRO SINTETICA	KG	$220.00	*	0.120000	$26.40	3.49%
MACURA-C	CURACRETO	LT	$49.00	*	0.250000	$12.25	1.62%
MAAG0001	CEMENTO GRIS	TON	$3,880.00	*	0.009500	$36.86	4.87%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$587.39**	**77.58%**
MANO DE OBRA							
1A5P	CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)	JOR	$3,341.39	*	0.044000	$147.02	19.42%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$147.02**	**19.42%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQVIB	VIBRADOR PARA CONCRETO	HOR	$117.49	*	0.125000	$14.69	1.94%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$14.69**	**1.94%**
BASICOS							
MACIM-FRON	CIMBRA EN FRONTERA DE 3RA	ML	$40.17	*	0.200000	$8.03	1.06%
SUBTOTAL:	**BASICOS**					**$8.03**	**1.06%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$757.13**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$140.71	
	SUBTOTAL1					$897.84	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$6.41	
	SUBTOTAL2					$904.25	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$67.82	
	SUBTOTAL3					$972.07	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$4.88	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$976.95**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A7	Análisis No.:		50			
Análisis:	**SUMPOL**		**M2**		**1,471.3500**	**$83,896.38**	

Suministro y colocación de hule negro calibre 600 para evitar deshidratación del concreto, incluye materiales, herramienta y mano de obra.

MATERIALES							
MAHULE-N	HULE NEGRO CAL 600	M2	$35.00	*	1.070000	$37.45	84.75%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$37.45**	**84.75%**
MANO DE OBRA							
2P	CUADRILLA 02 (2 PEON + 0.1 CABO)	JOR	$1,010.61	/	150.000000	$6.74	15.25%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$6.74**	**15.25%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$44.19**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$8.21	
	SUBTOTAL1					$52.40	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$0.37	
	SUBTOTAL2					$52.77	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$3.96	
	SUBTOTAL3					$56.73	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.29	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$57.02**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A7	Análisis No.:		60			
Análisis:	**CORTE01**		**ML**		**522.0000**	**$19,000.80**	
Corte de juntas en piso de concreto con cortadora manual de disco diamantado, incluye limpieza de la junta.							
MANO DE OBRA							
2P	CUADRILLA 02 (2 PEON + 0.1 CABO)	JOR	$1,010.61	/	50.000000	$20.21	71.64%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$20.21**	**71.64%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQCORTAP	CORTADORA DE PISO	HOR	$123.01	*	0.065000	$8.00	28.36%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$8.00**	**28.36%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$28.21**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$5.24	
	SUBTOTAL1					$33.45	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$0.24	
	SUBTOTAL2					$33.69	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$2.53	
	SUBTOTAL3					$36.22	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.18	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$36.40**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A7	Análisis No.:		70			
Análisis:	**32-0484**		**ML**		**522.0000**	**$14,892.66**	

Calafateo en losas y guarniciones a base de asfalto oxidado incluye material, desperdicios, acarreos a primera estación y mano de obra.

MATERIALES							
MASFALT	ASFALTO OXIDADO	LT	$32.00	*	0.375000	$12.00	54.27%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$12.00**	**54.27%**
MANO DE OBRA							
2P	CUADRILLA 02 (2 PEON + 0.1 CABO)	JOR	$1,010.61	/	100.000000	$10.11	45.73%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$10.11**	**45.73%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$22.11**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$4.11	
	SUBTOTAL1					$26.22	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$0.19	
	SUBTOTAL2					$26.41	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$1.98	
	SUBTOTAL3					$28.39	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.14	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$28.53**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A7	Análisis No.:		80			
Análisis:	**22-0333***		**ML**		**424.3500**	**$38,887.43**	

Pintura esmalte amarillo trafico en guarniciones con desarrollo de 30.0 cm., incluye material mano de obra y acarreos a primera estación.

MATERIALES							
CO06	PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 BCO. Y COLS. REG.	LT	$285.00	*	0.112500	$32.06	45.14%
THINNER	THINNER STANDARD	LT	$77.00	*	0.200000	$15.40	21.68%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$47.46**	**66.83%**
MANO DE OBRA							
1P1A	CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + AYUDANTE)	JOR	$1,413.76	/	60.000000	$23.56	33.17%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$23.56**	**33.17%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$71.02**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$13.20	
	SUBTOTAL1					$84.22	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$0.60	
	SUBTOTAL2					$84.82	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$6.36	
	SUBTOTAL3					$91.18	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.46	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$91.64**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A7	Análisis No.:		90			
Análisis:	**32-0468**		**M2**		**556.6400**	**$299,906.50**	

Banqueta de concreto hidráulico hecho en obra de f´c=150 kg/cm2 de 10 cms de espesor, T.M.A. 3/4", incluye curado, cimbrado, descimbrado, material y mano de obra.

MATERIALES							
1.	ALAMBRE RECOCIDO	KG	$38.00	*	0.125000	$4.75	1.14%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$4.75**	**1.14%**
MANO DE OBRA							
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	$1,455.27	/	9.000000	$161.70	38.72%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$161.70**	**38.72%**
BASICOS							
MACIM-FRON	CIMBRA EN FRONTERA DE 3RA	ML	$40.17	*	0.750000	$30.13	7.22%
MABA0016	CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4"	M3	$2,104.59	*	0.105000	$220.98	52.92%
SUBTOTAL:	**BASICOS**					**$251.11**	**60.14%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$417.56**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$77.60	
	SUBTOTAL1					$495.16	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$3.53	
	SUBTOTAL2					$498.69	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$37.40	
	SUBTOTAL3					$536.09	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$2.69	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$538.78**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A8	Análisis No.:		10			
Análisis:	**CARGA**		**M3**		**979.6400**	**$224,660.84**	

Carga mecánica con uso de retroexcavadora y acarreo en camión de volteo (6M3) de material producto de excavación y/o demolición a tiro libre.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRETROEXCA\	RETRO EXCAVADORA CAT 90 HP	HOR	$540.44	/	10.000000	$54.04	30.41%
EQCV0001	CAMION VOLTEO DE 6 M3	HORA	$804.00	/	6.500000	$123.69	69.59%

SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**		**$177.73**	**100.00%**
	(CD) COSTO DIRECTO		**$177.73**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS	18.5842%	$33.03	
	SUBTOTAL1		$210.76	
	(CF) FINANCIAMIENTO	0.7134%	$1.50	
	SUBTOTAL2		$212.26	
	(CU) UTILIDAD	7.5000%	$15.92	
	SUBTOTAL3		$228.18	
	CARGOS ADICIONALES			
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3	0.502500%	$1.15	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)		**$229.33**	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A8	Análisis No.:		20			
Análisis:	**33-0528**		**M2**		**2,692.8100**	**$43,058.03**	
Limpieza ultima general de obra para entrega con acopio y acarreo horizontal a 20 mts.							
MATERIALES							
AGUA	AGUA (MANEJO)	M3	$50.80	*	0.040000	$2.03	16.37%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$2.03**	**16.37%**
MANO DE OBRA							
2P	CUADRILLA 02 (2 PEON + 0.1 CABO)	JOR	$1,010.61	/	100.000000	$10.11	81.53%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$10.11**	**81.53%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQCV0001	CAMION VOLTEO DE 6 M3	HORA	$804.00	*	0.000319	$0.26	2.10%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$0.26**	**2.10%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$12.40**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				18.5842%	$2.30	
	SUBTOTAL1					$14.70	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.7134%	$0.10	
	SUBTOTAL2					$14.80	
	(CU) UTILIDAD				7.5000%	$1.11	
	SUBTOTAL3					$15.91	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.08	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$15.99**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**1A1P**		**JOR**				
CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)							
MANO DE OBRA							
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$914.91	*	0.100000	$91.49	6.29%
MO01	PEON	JOR	$444.84	*	1.000000	$444.84	30.57%
MO02	OFIC. ALBAÑIL	JOR	$836.56	*	1.000000	$836.56	57.48%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$1372.89**	**94.34%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO4	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$1,372.89	*	0.030000	$41.19	2.83%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$1,372.89	*	0.030000	$41.19	2.83%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$82.38**	**5.66%**
	Costo Directo:					**$1455.27**	**100.00%**

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**1A5P**		**JOR**				
CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)							
MANO DE OBRA							
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$914.91	*	0.100000	$91.49	2.74%
MO01	PEON	JOR	$444.84	*	5.000000	$2224.20	66.57%
MO02	OFIC. ALBAÑIL	JOR	$836.56	*	1.000000	$836.56	25.04%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$3152.25**	**94.34%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO4	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$3,152.25	*	0.030000	$94.57	2.83%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$3,152.25	*	0.030000	$94.57	2.83%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$189.14**	**5.66%**
	Costo Directo:					**$3341.39**	**100.00%**

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**1E1A**		**JOR**				
CUADRILLA (1 OF ELECTRICO + AYUDANTE)							
MANO DE OBRA							
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$914.91	*	0.100000	$91.49	7.33%
MO01	PEON	JOR	$444.84	*	1.000000	$444.84	35.65%
MO-ELEC	OFIC. ELECTRICO	JOR	$640.71	*	1.000000	$640.71	51.35%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$1177.04**	**94.34%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO4	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$1,177.04	*	0.030000	$35.31	2.83%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$1,177.04	*	0.030000	$35.31	2.83%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$70.62**	**5.66%**
	Costo Directo:					**$1247.66**	**100.00%**

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**1F1A**		**JOR**				
CUADRILLA No 6 (1 FIERRERO + 1 AYUDANTE)							
MANO DE OBRA							
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$914.91	*	0.100000	$91.49	6.47%
MOAY0001	AYUDANTE GENERAL	JOR	$601.54	*	1.000000	$601.54	42.55%
MOFI0001	OFIC. FIERRERO	JOR	$640.71	*	1.000000	$640.71	45.32%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$1333.74**	**94.34%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO4	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$1,333.74	*	0.030000	$40.01	2.83%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$1,333.74	*	0.030000	$40.01	2.83%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$80.02**	**5.66%**
	Costo Directo:					**$1413.76**	**100.00%**

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**1H1A**		**JOR**				
CUADRILLA No 9 (1 HERRERO + AYUDANTE)							
MANO DE OBRA							
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$914.91	*	0.100000	$91.49	6.47%
MOAY0001	AYUDANTE GENERAL	JOR	$601.54	*	1.000000	$601.54	42.55%
MOF-H	OFIC. HERRERO	JOR	$640.71	*	1.000000	$640.71	45.32%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$1333.74**	**94.34%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO4	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$1,333.74	*	0.030000	$40.01	2.83%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$1,333.74	*	0.030000	$40.01	2.83%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$80.02**	**5.66%**
	Costo Directo:					**$1413.76**	**100.00%**

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**1P1A**		**JOR**				
CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + AYUDANTE)							
MANO DE OBRA							
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$914.91	*	0.100000	$91.49	6.47%
MOAY0001	AYUDANTE GENERAL	JOR	$601.54	*	1.000000	$601.54	42.55%
MOF-P	OFIC. PINTOR	JOR	$640.71	*	1.000000	$640.71	45.32%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$1333.74**	**94.34%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO4	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$1,333.74	*	0.030000	$40.01	2.83%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$1,333.74	*	0.030000	$40.01	2.83%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$80.02**	**5.66%**
	Costo Directo:					**$1413.76**	**100.00%**

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**1P1E**		**JOR**				
CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE)							
MANO DE OBRA							
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	$679.86	*	1.000000	$679.86	48.08%
MO083	OFIC. PLOMERO	JOR	$601.54	*	1.000000	$601.54	42.54%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$914.91	*	0.100000	$91.49	6.47%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$1372.89**	**97.09%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$1,372.89	*	0.030000	$41.19	2.91%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$41.19**	**2.91%**
	Costo Directo:					**$1414.08**	**100.00%**

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**2A**		**JOR**				
CUADRILLA No 4 (2 AYUDANTE GENERAL)							
MANO DE OBRA							
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$914.91	*	0.200000	$182.98	12.82%
MOAY0001	AYUDANTE GENERAL	JOR	$601.54	*	2.000000	$1203.08	84.27%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$1386.06**	**97.09%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$1,386.06	*	0.030000	$41.58	2.91%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$41.58**	**2.91%**
	Costo Directo:					**$1427.64**	**100.00%**

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**2P**		**JOR**				
CUADRILLA 02 (2 PEON + 0.1 CABO)							
MANO DE OBRA							
MO01	PEON	JOR	$444.84	*	2.000000	$889.68	88.03%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$914.91	*	0.100000	$91.49	9.05%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$981.17**	**97.09%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$981.17	*	0.030000	$29.44	2.91%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$29.44**	**2.91%**
	Costo Directo:					**$1010.61**	**100.00%**

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**MABA0001**		**M2**				
CIMBRA APARENTE EN CADENAS Y CASTILLOS							
MATERIALES							
MAMA0007	TRIPLAY DE PINO DE 16 MM.	PZA	$775.00	*	0.333000	$258.08	81.41%
MAAC0001	ALAMBRE RECOCIDO	KG	$28.50	*	0.100000	$2.85	0.90%
MAAC0008	CLAVOS DE 2"	KG	$55.00	*	0.100000	$5.50	1.73%
MADIESEL	DIESEL	LTO	$21.20	*	0.500000	$10.60	3.34%
MAMA0001	MADERA DE PINO	PT	$20.00	*	2.000000	$40.00	12.62%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$317.03**	**100.00%**
	Costo Directo:					**$317.03**	**100.00%**

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**MABA0006**		**M3**				
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3							
MATERIALES							
AGUA	AGUA (MANEJO)	M3	$50.80	*	0.250000	$12.70	0.56%
ARENA	ARENA	M3	$250.00	*	1.100000	$275.00	12.21%
MAAG0001	CEMENTO GRIS	TON	$3,880.00	*	0.454000	$1761.52	78.24%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$2049.22**	**91.02%**
MANO DE OBRA							
2P	CUADRILLA 02 (2 PEON + 0.1 CABO)	JOR	$1,010.61	*	0.200000	$202.12	8.98%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$202.12**	**8.98%**
	Costo Directo:					**$2251.34**	**100.00%**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**MABA0009**		**M3**				
MORTERO CEMENTO ARENA 1:5							
MATERIALES							
AGUA	AGUA (MANEJO)	M3	$50.80	*	0.240000	$12.19	0.72%
ARENA	ARENA	M3	$250.00	*	1.200000	$300.00	17.79%
MAAG0001	CEMENTO GRIS	TON	$3,880.00	*	0.302000	$1171.76	69.50%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$1483.95**	**88.01%**
MANO DE OBRA							
2P	CUADRILLA 02 (2 PEON + 0.1 CABO)	JOR	$1,010.61	*	0.200000	$202.12	11.99%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$202.12**	**11.99%**
	Costo Directo:					**$1686.07**	**100.00%**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**MABA001**		**ML**				
CIMBRA COMUN							
MATERIALES							
MALA0180	ALAMBRE RECOCIDO No. 18	KG	$30.00	*	0.100000	$3.00	5.16%
MCLA0021	CLAVO	KG	$45.00	*	0.100000	$4.50	7.75%
MADIESEL	DIESEL	LTO	$21.20	*	0.500000	$10.60	18.24%
MAMA0001	MADERA DE PINO	PT	$20.00	*	2.000000	$40.00	68.85%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$58.10**	**100.00%**
	Costo Directo:					**$58.10**	**100.00%**

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**MABA0016**		**M3**				
CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4"							
MATERIALES							
ARENA	ARENA	M3	$250.00	*	0.450000	$112.50	5.35%
GRAVA	GRAVA	M3	$666.67	*	0.700000	$466.67	22.17%
AGUA	AGUA (MANEJO)	M3	$50.80	*	0.190000	$9.65	0.46%
MAAG0001	CEMENTO GRIS	TON	$3,880.00	*	0.360000	$1396.80	66.37%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$1985.62**	**94.35%**
MANO DE OBRA							
2A	CUADRILLA No 4 (2 AYUDANTE GENERAL)	JOR	$1,427.64	/	12.000000	$118.97	5.65%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$118.97**	**5.65%**
	Costo Directo:					**$2104.59**	**100.00%**

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**MABA0017**		**M3**				
CONCRETO F'C=200KG/CM2 T.M.A. 3/4"							
MATERIALES							
ARENA	ARENA	M3	$250.00	*	0.470000	$117.50	5.41%
GRAVA	GRAVA	M3	$666.67	*	0.660000	$440.00	20.26%
AGUA	AGUA (MANEJO)	M3	$50.80	*	0.190000	$9.65	0.44%
MAAG0001	CEMENTO GRIS	TON	$3,880.00	*	0.380000	$1474.40	67.90%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$2041.55**	**94.02%**
MANO DE OBRA							
2A	CUADRILLA No 4 (2 AYUDANTE GENERAL)	JOR	$1,427.64	/	11.000000	$129.79	5.98%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$129.79**	**5.98%**
	Costo Directo:					**$2171.34**	**100.00%**

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**MABA0018**		**M3**				
CONCRETO F'C=250KG/CM2 T.M.A. 3/4"							
MATERIALES							
MAPE0002	GRAVA 1" A 3/4"	M3	$390.00	*	0.640000	$249.60	10.13%
MAAG0001	CEMENTO GRIS	TON	$3,880.00	*	0.423000	$1641.24	66.58%
MAAG0008	AGUA (MANEJO)	M3	$40.00	*	0.190000	$7.60	0.31%
MAPE0001	ARENA DE LA REGION	M3	$400.00	*	0.465000	$186.00	7.55%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$2084.44**	**84.56%**
MANO DE OBRA							
1A5P	CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)	JOR	$3,341.39	*	0.099704	$333.15	13.51%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$333.15**	**13.51%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQRE0001	REVOLVEDORA DE 1 SACO	HORA	$71.34	*	0.500000	$35.67	1.45%
EQVG0002	VIBRADOR DE GASOLINA	HORA	$47.62	*	0.250000	$11.91	0.48%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$47.58**	**1.93%**
	Costo Directo:					**$2465.17**	**100.00%**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**MABA0019**		**KG**				
ACERO RFZO. CIMENTACION ALAM.#2 FY=2530K							
MATERIALES							
MAAC0001	ALAMBRE RECOCIDO	KG	$28.50	*	0.033000	$0.94	2.62%
MAAC0002	ALAMBRON # 2	KG	$35.00	*	1.000000	$35.00	97.38%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$35.94**	**100.00%**
	Costo Directo:					**$35.94**	**100.00%**

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**MABA0020**		**KG**				
ACERO RFZO. DEL FY=4200 KG/CM2							
MATERIALES							
MAAC0001	ALAMBRE RECOCIDO	KG	$28.50	*	0.033000	$0.94	2.87%
MAAC0003	ACERO DEL # 3 HASTA 6	KG	$30.91	*	1.030000	$31.84	97.13%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$32.78**	**100.00%**
	Costo Directo:					**$32.78**	**100.00%**

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**MACIM-FRON**		**ML**				
CIMBRA EN FRONTERA DE 3RA							
MATERIALES							
MATABL	TABLA DE 3RA	PZA	$185.00	*	0.160000	$29.60	73.69%
MAMA0001	MADERA DE PINO	PT	$20.00	*	0.200000	$4.00	9.96%
1.	ALAMBRE RECOCIDO	KG	$38.00	*	0.095238	$3.62	9.01%
CLAVOS	CLAVOS DE 2 A 4 "	KG	$65.00	*	0.045455	$2.95	7.34%
						$40.17	**100.00%**
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$40.17**	**100.00%**
	Costo Directo:						

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

Dependencia: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Licitación: 41066004-016-2023 FECHA: 03/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Ubicación: ,ACAPULCO DE JUAREZ,Guerrero

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO **Licitante**	C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES:	RLOPySRM ART. 210

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES

Código: EQCORTAP CORTADORA DE PISO	**Modelo:** DE PISO 13 H.P.	**Capacidad:** **Serie:** Tipo de Combustible: GASOLINA	
Indicador Economico de Referencia: CETES		% Tasa de Interes Anual:	11.090%
Indicador Especifico de mercado de Seguros: CETES		% Prima Anual Promedio de Seguros:	4.000%

PRECIO DE ADQUISICIÓN	$ 22,391.60		VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	4	
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	$ -		HORAS POR AÑO (Hea):	500	Hrs
EQUIPO ADICIONAL:	$ -		VIDA ECONOMICA (Ve):	2000	Hrs
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)	hrs		COSTO COMBUSTIBLE (Pc):	20.45	/Lts
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	$ -		COSTO LUBRICANTE (Pa):	104.48	/Lts
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)	hrs		POTENCIA NOMINAL:	13	HP
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	$ 22,391.60		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):	0.8	
VALOR DE RESCATE (Vr)	10%	$ 2,239.16	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):	10.4	
TASA DE INTERES ANUAL (i)	11.0900%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8	
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)	4.0000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):	0.1514	
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	$ 444.84		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):	0.0035	
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	$ 55.61		CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	2	Lts
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)	8 hrs		FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1	
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)	150.00 hrs		CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):	0.0133	

I.- CARGOS FIJOS	**OPERACIONES**	**ACTIVA**	**%**	**ESPERA**	**%**	**RESERVA**
a).- DEPRECIACION.....D =(Vm-Vr)/Ve	($22,391.6-$2,239.16)/2,000.00	$ 10.08	100%	$ 10.08	15%	$ 1.51
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	($22,391.6+$2,239.16)x11.0900 %/(2x500)	$ 2.73	100%	$ 2.73	100%	$ 2.73
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	($22,391.60+$2,239.16)x4.00 %/(2x500)	$ 0.99	100%	$ 0.99	100%	$ 0.99
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	0.8 x 10.08	$ 8.06		$ -	15%	$ 1.21
	Suma Cargos Fijos	**$ 21.86**		**$ 13.80**		**$ 6.44**

II.- CONSUMOS						
a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0.1514x10.4x $20.45	$ 32.20	5%	$ 1.61		$ -
b).-Otras Fuentes de Energia	$.00 * 0	$ -	5%	$ -		$ -
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.0035x10.4)+2/150] x $104.48lt	$ 5.19	5%	$ 0.26		$ -
d). Llantas.....N=Pn/Vn	$.00/0	$ -	15%	$ -		$ -
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	$00/0	$ -		$ -		$ -

f).-Otros Consumos

Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe	
DISCO DE DIAMANTE	JGO	$ 4,074.30	0.002000	*	$8.15	
		$ -	-			Suma: $ 8.15
		$ -	-			

Suma de Otros Consumos	$ 8.15	5%	$ 0.41		$ -
Suma de Consumos	**$ 45.64**		**$ 2.28**		**$ -**

III.- OPERACIÓN	CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	$ 444.84	8.0000	$ 55.61
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -

Suma de Operación Po=S/Ht	**$55.61**	100%	**$55.61**	100%	**$55.61**
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA	**$ 123.01**		**$ 71.69**		**$ 62.05**

Dependencia: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Licitación: 41066004-016-2023 FECHA: 03/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Ubicación: ,ACAPULCO DE JUAREZ,Guerrero

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO	C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA	RLOPySRM
Licitante	JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES:	ART. 210

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES

Código: EQCV0001	**Modelo:**	**Capacidad:**	
CAMION VOLTEO DE 6 M3		**Serie:**	
		Tipo de Combustible:	DIESEL
Indicador Economico de Referencia:	CETES	% Tasa de Interes Anual:	11.090%
Indicador Especifico de mercado de Seguros:	CETES	% Prima Anual Promedio de Seguros:	3.000%

PRECIO DE ADQUISICION	$	850,000.00		VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	4		
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	$	45,000.00		HORAS POR AÑO (Hea):	2000	Hrs	
EQUIPO ADICIONAL:	$	-		VIDA ECONOMICA (Ve):	8000	Hrs	
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)		1200.00	hrs	COSTO COMBUSTIBLE (Pc):	21.2	/Lts	
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	$	-		COSTO LUBRICANTE (Pa):	80	/Lts	
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)			hrs	POTENCIA NOMINAL:	170	HP	
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	$	805,000.00		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):	0.8		
VALOR DE RESCATE (Vr)		15%	$ 120,750.00	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):	136		
TASA DE INTERES ANUAL (i)		11.0900%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8		
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		3.0000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):	0.1514		
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	$	758.23		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):	0.003		
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	$	94.78		CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	20	Lts	
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)		8	hrs	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1		
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)		100.00	hrs	CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):			0.2000

I.- CARGOS FIJOS	OPERACIONES	ACTIVA	%	ESPERA	%	RESERVA
a).- DEPRECIACION.....D =(Vm-Vr)/Ve	($805,000.-$120,750.)/8,000.00	$ 85.53	100%	$ 85.53	15%	$ 12.83
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	($805,000.+$120,750.)x11.0900 %/(2x2000)	$ 25.67	100%	$ 25.67	100%	$ 25.67
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	($805,000.00+$120,750.00)x3.00 %/(2x2000)	$ 6.94	100%	$ 6.94	100%	$ 6.94
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	0.8 x 85.53	$ 68.42		$ -	15%	$ 10.26
	Suma Cargos Fijos	**$ 186.56**		**$ 118.14**		**$ 55.70**

II.- CONSUMOS

a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0.1514x136x $21.2	$ 436.52	5%	$ 21.83		$ -
b).-Otras Fuentes de Energia	$.00 * 0	$ -	5%	$ -		$ -
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.003x136)+20/100] x $80lt	$ 48.64	5%	$ 2.43		$ -
d). Llantas.....N=Pn/Vn	$45,000.00/1,200	$ 37.50	15%	$ 5.63		$ -
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	$00/0	$ -		$ -		$ -

f).-Otros Consumos

Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe		
		$ -	-				
		$ -	-			Suma:	$ -
		$ -	-				

Suma de Otros Consumos	$ -	5%	$ -	$ -
Suma de Consumos	**$ 522.66**		**$ 29.89**	**$ -**

III.- OPERACIÓN	CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht
MOCAMION-6	OPERADOR DE CAMION DE VOLTEO	JOR	$ 758.23	8.0000	$ 94.78
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
	Suma de Operación Po=S/Ht		**$94.78**	100% **$94.78**	100% **$94.78**
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA			**$ 804.00**	**$ 242.81**	**$ 150.48**

Dependencia: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Licitación: 41066004-016-2023 FECHA: 03/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Ubicación: ,ACAPULCO DE JUAREZ,Guerrero

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO **Licitante**	C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES:	RLOPySRM ART. 210

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES

Código: EQRE0001	**Modelo:**	**Capacidad:**	
REVOLVEDORA DE 1 SACO		**Serie:**	
		Tipo de Combustible:	GASOLINA
Indicador Economico de Referencia:	CETES	% Tasa de Interes Anual:	11.090%
Indicador Especifico de mercado de Seguros:	CETES	% Prima Anual Promedio de Seguros:	3.000%

PRECIO DE ADQUISICION	$	25,000.00		VIDA ECONÓMICA EN AÑOS:	2.2	
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	$	3,500.00		HORAS POR AÑO (Hea):	500	Hrs
EQUIPO ADICIONAL:	$	-		VIDA ECONOMICA (Ve):	1100	Hrs
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)		1200.00	hrs	COSTO COMBUSTIBLE (Pc):	21.55	/Lts
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	$	-		COSTO LUBRICANTE (Pa):	80	/Lts
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)			hrs	POTENCIA NOMINAL:	8	HP
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	$	21,500.00		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):	0.8	
VALOR DE RESCATE (Vr)		10%	$ 2,150.00	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):	6.4	
TASA DE INTERES ANUAL (i)		11.0900%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8	
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		3.0000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):	0.2271	
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	$	-		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):	0.0035	
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	$	-		CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	2	Lts
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)			hrs	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1	
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)		500.00	hrs	CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):	0.0040	

I.- CARGOS FIJOS	OPERACIONES	ACTIVA	%	ESPERA	%	RESERVA
a).- DEPRECIACION.....D =(Vm-Vr)/Ve	($21,500.-$2,150.)/1,100.00	$ 17.59	100%	$ 17.59	15%	$ 2.64
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	($21,500.+$2,150.)x11.0900 %/(2x500)	$ 2.62	100%	$ 2.62	100%	$ 2.62
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	($21,500.00+$2,150.00)x3.00 %/(2x500)	$ 0.71	100%	$ 0.71	100%	$ 0.71
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	0.8 x 17.59	$ 14.07		$ -	15%	$ 2.11
	Suma Cargos Fijos	**$ 34.99**		**$ 20.92**		**$ 8.08**

II.- CONSUMOS					
a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0.2271x6.4x $21.55	$ 31.32	5%	$ 1.57	$ -
b).-Otras Fuentes de Energia	$.00 * 0	$ -	5%	$ -	$ -
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.0035x6.4)+2/500] x $80lt	$ 2.11	5%	$ 0.11	$ -
d). Llantas.....N=Pn/Vn	$3,500.00/1,200	$ 2.92	15%	$ 0.44	$ -
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	$00/0	$ -		$ -	$ -
f).-Otros Consumos					

Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe	
		$ -	-			Suma: $ -
		$ -	-			
		$ -	-			

Suma de Otros Consumos	$ -	5%	$ -	$ -
Suma de Consumos	**$ 36.35**		**$ 2.12**	**$ -**

III.- OPERACIÓN	CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
		Suma de Operación Po=S/Ht		100%	100%
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA			**$ 71.34**	**$ 23.04**	**$ 8.08**

Dependencia: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Licitación: 41066004-016-2023 FECHA: 03/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Ubicación: ,ACAPULCO DE JUAREZ,Guerrero

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO **Licitante**	C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES:	RLOPySRM ART. 210

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES

Código: EQRETROEXCAVA	**Modelo:**	**Capacidad:**	
RETRO EXCAVADORA CAT 90 HP		**Serie:**	
		Tipo de Combustible:	DIESEL
Indicador Economico de Referencia:	CETES	% Tasa de Interes Anual:	11.090%
Indicador Especifico de mercado de Seguros:	CETES	% Prima Anual Promedio de Seguros:	3.000%

PRECIO DE ADQUISICION	$	570,000.00		VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	5	
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	$	30,000.00		HORAS POR AÑO (Hea):	2000	Hrs
EQUIPO ADICIONAL:	$	-		VIDA ECONOMICA (Ve):	10000	Hrs
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)		2000.00	hrs	COSTO COMBUSTIBLE (Pc):	21.2	/Lts
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	$	-		COSTO LUBRICANTE (Pa):	80	/Lts
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)			hrs	POTENCIA NOMINAL:	90	HP
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	$	540,000.00		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):	1	
VALOR DE RESCATE (Vr)		20%	$ 108,000.00	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):	90	
TASA DE INTERES ANUAL (i)		11.0900%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8	
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		3.0000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):	0.1514	
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	$	758.23		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):	0.0035	
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	$	94.78		CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	40	Lts
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)		8	hrs	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1	
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)		200.00	hrs	CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):	0.2000	

I.- CARGOS FIJOS	**OPERACIONES**	**ACTIVA**	**%**	**ESPERA**	**%**	**RESERVA**
a).- DEPRECIACION.....D =(Vm-Vr)/Ve	($540,000.-$108,000.)/10,000.00	$ 43.20	100%	$ 43.20	15%	$ 6.48
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	($540,000.+$108,000.)x11.0900 %/(2x2000)	$ 17.97	100%	$ 17.97	100%	$ 17.97
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	($540,000.00+$108,000.00)x3.00 %/(2x2000)	$ 4.86	100%	$ 4.86	100%	$ 4.86
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	0.8 x 43.2	$ 34.56		$ -	15%	$ 5.18
	Suma Cargos Fijos	**$ 100.59**		**$ 66.03**		**$ 34.49**

II.- CONSUMOS						
a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0.1514x90x $21.2	$ 288.87	5%	$ 14.44		$ -
b).-Otras Fuentes de Energia	$.00 * 0	$ -	5%	$ -		$ -
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.0035x90)+40/200] x $80lt	$ 41.20	5%	$ 2.06		$ -
d). Llantas.....N=Pn/Vn	$30,000.00/2,000	$ 15.00	15%	$ 2.25		$ -
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	$00/0	$ -		$ -		$ -

f).-Otros Consumos

Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe	
		$ -	-			
		$ -	-			Suma: $ -
		$ -	-			

Suma de Otros Consumos	$ -	5%	$ -		$ -
Suma de Consumos	**$ 345.07**		**$ 18.75**		**$ -**

III.- OPERACIÓN	CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht
MOOPERRETRO	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	JOR	$ 758.23	8.0000	$ 94.78
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
	Suma de Operación Po=S/Ht		**$94.78**	100% **$94.78**	100% **$94.78**
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA			**$ 540.44**	**$ 179.56**	**$ 129.27**

Dependencia: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Licitación: 41066004-016-2023 FECHA: 03/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Ubicación: ,ACAPULCO DE JUAREZ,Guerrero

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO	C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA	RLOPySRM
Licitante	JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES:	ART. 210

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES

Código: EQTRAN	**Modelo:**	**Capacidad:**	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA		**Serie:**	
		Tipo de Combustible:	
Indicador Economico de Referencia: CETES		% Tasa de Interes Anual:	11.090%
Indicador Especifico de mercado de Seguros: CETES		% Prima Anual Promedio de Seguros:	4.000%

PRECIO DE ADQUISICION	$	21,839.00		VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	10		
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	$	-		HORAS POR AÑO (Hea):	500	Hrs	
EQUIPO ADICIONAL:	$	-		VIDA ECONOMICA (Ve):	5000	Hrs	
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)			hrs	COSTO COMBUSTIBLE (Pc):		/Lts	
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	$	-		COSTO LUBRICANTE (Pa):		/Lts	
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)			hrs	POTENCIA NOMINAL:		HP	
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	$	21,839.00		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):	0.8		
VALOR DE RESCATE (Vr)		10%	$ 2,183.90	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):			
TASA DE INTERES ANUAL (i)		11.0900%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	1		
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		4.0000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):	0.1514		
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	$	-		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):	0.0035		
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	$	-		CAPACIDAD DEL CARTER (CC):		Lts	
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)			hrs	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1		
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)			hrs	CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):			

I.- CARGOS FIJOS	**OPERACIONES**	**ACTIVA**	**%**	**ESPERA**	**%**	**RESERVA**
a).- DEPRECIACION.....D =(Vm-Vr)/Ve	($21,839.-$2,183.9)/5,000.00	$ 3.93	100%	$ 3.93	15%	$ 0.59
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	($21,839.+$2,183.9)x11.0900 %/(2x500)	$ 2.66	100%	$ 2.66	100%	$ 2.66
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	($21,839.00+$2,183.90)x4.00 %/(2x500)	$ 0.96	100%	$ 0.96	100%	$ 0.96
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	1 x 3.93	$ 3.93		$ -	15%	$ 0.59
	Suma Cargos Fijos	**$ 11.48**		**$ 7.55**		**$ 4.80**

II.- CONSUMOS						
a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0.1514x0x $0	$ -	5%	$ -		$ -
b).-Otras Fuentes de Energia	$.00 * 0	$ -	5%	$ -		$ -
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.0035x0)+0/0] x $0lt	$ -	5%	$ -		$ -
d). Llantas.....N=Pn/Vn	$.00/0	$ -	15%	$ -		$ -
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	$00/0	$ -		$ -		$ -

f).-Otros Consumos

Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe	
		$ -	-			
		$ -	-			Suma: $ -
		$ -	-			

Suma de Otros Consumos	$ -	5%	$ -	$ -
Suma de Consumos	**$ -**		**$ -**	**$ -**

III.- OPERACIÓN	CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
		Suma de Operación Po=S/Ht		100%	100%
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA			**$ 11.48**	**$ 7.55**	**$ 4.80**

Dependencia: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Licitación: 41066004-016-2023 FECHA: 03/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Ubicación: ,ACAPULCO DE JUAREZ,Guerrero

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO **Licitante**	C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES:	RLOPySRM ART. 210

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES

Código: EQVG0002	**Modelo:**	**Capacidad:**	
VIBRADOR DE GASOLINA		**Serie:**	
		Tipo de Combustible:	DIESEL
Indicador Economico de Referencia:	CETES	% Tasa de Interes Anual:	11.090%
Indicador Especifico de mercado de Seguros:	CETES	% Prima Anual Promedio de Seguros:	6.300%

PRECIO DE ADQUISICION	$	20,000.00		VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	3		
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	$	-		HORAS POR AÑO (Hea):	400	Hrs	
EQUIPO ADICIONAL:	$	-		VIDA ECONOMICA (Ve):	1200	Hrs	
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)			hrs	COSTO COMBUSTIBLE (Pc):	21.2	/Lts	
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	$	-		COSTO LUBRICANTE (Pa):	80	/Lts	
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)			hrs	POTENCIA NOMINAL:	4	HP	
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	$	20,000.00		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):	0.8		
VALOR DE RESCATE (Vr)		15%	$ 3,000.00	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):	3.2		
TASA DE INTERES ANUAL (i)		11.0900%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8		
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		6.3000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):	0.2271		
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	$	-		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):	0.0035		
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	$	-		CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	1	Lts	
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)			hrs	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1		
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)		100.00	hrs	CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):			0.0100

I.- CARGOS FIJOS	**OPERACIONES**	**ACTIVA**	**%**	**ESPERA**	**%**	**RESERVA**
a).- DEPRECIACION.....D =(Vm-Vr)/Ve	($20,000.-$3,000.)/1,200.00	$ 14.17	100%	$ 14.17	15%	$ 2.13
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	($20,000.+$3,000.)x11.0900 %/(2x400)	$ 3.19	100%	$ 3.19	100%	$ 3.19
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	($20,000.00+$3,000.00)x6.30 %/(2x400)	$ 1.81	100%	$ 1.81	100%	$ 1.81
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	0.8 x 14.17	$ 11.34		$ -	15%	$ 1.70
	Suma Cargos Fijos	**$ 30.51**		**$ 19.17**		**$ 8.83**

II.- CONSUMOS						
a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0.2271x3.2x $21.2	$ 15.41	5%	$ 0.77	$	-
b).-Otras Fuentes de Energia	$.00 * 0	$ -	5%	$ -	$	-
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.0035x3.2)+1/100] x $80lt	$ 1.70	5%	$ 0.09	$	-
d). Llantas.....N=Pn/Vn	$.00/0	$ -	15%	$ -	$	-
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	$00/0	$ -		$ -	$	-

f).-Otros Consumos

Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe		
		$ -	-				
		$ -	-			Suma:	$ -
		$ -	-				

Suma de Otros Consumos	$ -	5%	$ -	$	-
Suma de Consumos	**$ 17.11**		**$ 0.86**	$	-

III.- OPERACIÓN	CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
		Suma de Operación Po=S/Ht		100%	100%
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA			**$ 47.62**	**$ 20.03**	**$ 8.83**

Dependencia: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Licitación: 41066004-016-2023 FECHA: 03/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Ubicación: ,ACAPULCO DE JUAREZ,Guerrero

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO	C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA	RLOPySRM
Licitante	JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES:	ART. 210

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES

Código: EQECORTE	**Modelo:**		**Capacidad:**		
EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO			**Serie:**		
			Tipo de Combustible:		
Indicador Economico de Referencia: CETES			% Tasa de Interes Anual:	11.090%	
Indicador Especifico de mercado de Seguros: CETES			% Prima Anual Promedio de Seguros:	4.000%	

PRECIO DE ADQUISICION	$	12,500.00			VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	3	
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	$	-			HORAS POR AÑO (Hea):	2000	Hrs
EQUIPO ADICIONAL:	$	-			VIDA ECONOMICA (Ve):	6000	Hrs
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)			hrs		COSTO COMBUSTIBLE (Pc):		/Lts
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	$	-			COSTO LUBRICANTE (Pa):		/Lts
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)			hrs		POTENCIA NOMINAL:		HP
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	$	12,500.00			FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):	1	
VALOR DE RESCATE (Vr)		9%	$	1,148.75	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):		
TASA DE INTERES ANUAL (i)		11.0900%			FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8	
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		4.0000%			COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):	0.1514	
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	$	-			COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):	0.003	
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	$	-			CAPACIDAD DEL CARTER (CC):		Lts
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)			hrs		FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1	
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)			hrs		CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):		

I.- CARGOS FIJOS	**OPERACIONES**	**ACTIVA**	**%**	**ESPERA**	**%**	**RESERVA**
a).- DEPRECIACION.....D =(Vm-Vr)/Ve	($12,500.-$1,148.75)/6,000.00	$ 1.89	100%	$ 1.89	15%	$ 0.28
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	($12,500.+$1,148.75)x11.0900 %/(2x2000)	$ 0.38	100%	$ 0.38	100%	$ 0.38
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	($12,500.00+$1,148.75)x4.00 %/(2x2000)	$ 0.14	100%	$ 0.14	100%	$ 0.14
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	0.8 x 1.89	$ 1.51		$ -	15%	$ 0.23
	Suma Cargos Fijos	**$ 3.92**		**$ 2.41**		**$ 1.03**

II.- CONSUMOS					
a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0.1514x0x $0	$ -	5%	$ -	$ -
b).-Otras Fuentes de Energia	$.00 * 0	$ -	5%	$ -	$ -
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.003x0)+0/0] x $0lt	$ -	5%	$ -	$ -
d). Llantas.....N=Pn/Vn	$.00/0	$ -	15%	$ -	$ -
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	$00/0	$ -		$ -	$ -

f).-Otros Consumos

Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe		
OXIGENO	CILI	$ 1,300.00	0.850000	*	$1,105.00		
ACETILENO	CIL	$ 800.00	0.085000	*	$68.00	**Suma:**	**$ 1,173.00**
		$ -	-				

Suma de Otros Consumos	$ 1,173.00	5%	$ 58.65		$ -
Suma de Consumos	**$ 1,173.00**		**$ 58.65**		**$ -**

III.- OPERACIÓN	CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
	Suma de Operación Po=S/Ht			100%	100%
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA			**$ 1,176.92**	**$ 61.06**	**$ 1.03**

Dependencia: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Licitación: 41066004-016-2023 FECHA: 03/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Ubicación: ,ACAPULCO DE JUAREZ,Guerrero

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO	C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA	RLOPySRM
Licitante	JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES:	ART. 210

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES

Código: EQMOTO14H **Modelo:** 14H **Capacidad:**
MOTONIVELADORA CAT. 14H DE 215 HP **Serie:**
Tipo de Combustible: DIESEL

Indicador Economico de Referencia: CETES — % Tasa de Interes Anual: 11.090%
Indicador Especifico de mercado de Seguros: CETES — % Prima Anual Promedio de Seguros: 4.000%

PRECIO DE ADQUISICION	$	4,814,940.00		VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	5
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	$	80,000.00		HORAS POR AÑO (Hea):	2000 Hrs
EQUIPO ADICIONAL:	$	-		VIDA ECONOMICA (Ve):	10000 Hrs
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)		3000.00 hrs		COSTO COMBUSTIBLE (Pc):	21.2 /Lts
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	$	-		COSTO LUBRICANTE (Pa):	80 /Lts
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)		hrs		POTENCIA NOMINAL:	215 HP
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	$	4,734,940.00		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):	0.75
VALOR DE RESCATE (Vr)		10%	$ 473,494.00	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):	161.25
TASA DE INTERES ANUAL (i)		11.0900%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.5
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		4.0000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):	0.1514
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	$	914.91		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):	0.0015
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	$	114.36		CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	20 Lts
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)		8 hrs		FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)		200.00 hrs		CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):	0.1000

I.- CARGOS FIJOS	OPERACIONES	ACTIVA	%	ESPERA	%	RESERVA
a).- DEPRECIACION.....D =(Vm-Vr)/Ve	($4,734,940.-$473,494.)/10,000.00	$ 426.14	100%	$ 426.14	15%	$ 63.92
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	($4,734,940.+$473,494.)x11.0900 %/(2x2000)	$ 144.40	100%	$ 144.40	100%	$ 144.40
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	($4,734,940.00+$473,494.00)x4.00 %/(2x2000)	$ 52.08	100%	$ 52.08	100%	$ 52.08
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	0.5 x 426.14	$ 213.07		$ -	15%	$ 31.96
	Suma Cargos Fijos	**$ 835.69**		**$ 622.62**		**$ 292.36**

II.- CONSUMOS						
a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0.1514x161.25x $21.2	$ 517.56	5%	$ 25.88		$ -
b).-Otras Fuentes de Energia	$.00 * 0	$ -	5%	$ -		$ -
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.0015x161.25)+20/200] x $80lt	$ 27.35	5%	$ 1.37		$ -
d). Llantas.....N=Pn/Vn	$80,000.00/3,000	$ 26.67	15%	$ 4.00		$ -
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	$00/0	$ -		$ -		$ -

f).-Otros Consumos

Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe	
		$ -	-			
		$ -	-			Suma: $ -
		$ -	-			

Suma de Otros Consumos	$ -	5%	$ -	$ -
Suma de Consumos	**$ 571.58**		**$ 31.25**	**$ -**

III.- OPERACIÓN	CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht
MO093	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JOR	$ 914.91	8.0000	$ 114.36
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
		Suma de Operación Po=S/Ht	$114.36	100% $114.36	100% $114.36
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA			**$ 1,521.63**	**$ 768.23**	**$ 406.72**

Dependencia: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Licitación: 41066004-016-2023 FECHA: 03/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Ubicación: ,ACAPULCO DE JUAREZ,Guerrero

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO	C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA	RLOPySRM
Licitante	JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES:	ART. 210

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES

Código: EQVAP	**Modelo:**	**Capacidad:**	
VIBROCOMPACTADOR VAP 70		**Serie:**	
		Tipo de Combustible:	DIESEL
Indicador Economico de Referencia:	CETES	% Tasa de Interes Anual:	11.090%
Indicador Especifico de mercado de Seguros:	CETES	% Prima Anual Promedio de Seguros:	4.000%

PRECIO DE ADQUISICION	$	1,135,599.20		VIDA ECONOMICA EN ANOS:	5		
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	$	26,800.00		HORAS POR AÑO (Hea):	2000	Hrs	
EQUIPO ADICIONAL:	$	-		VIDA ECONOMICA (Ve):	10000	Hrs	
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)		3000.00	hrs	COSTO COMBUSTIBLE (Pc):	21.2	/Lts	
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	$	-		COSTO LUBRICANTE (Pa):	80	/Lts	
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)			hrs	POTENCIA NOMINAL:	155	HP	
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	$	1,108,799.20		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):	0.8		
VALOR DE RESCATE (Vr)		10%	$ 110,879.92	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):	124		
TASA DE INTERES ANUAL (i)		11.0900%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8		
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		4.0000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):	0.1514		
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	$	914.91		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):	0.003		
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	$	114.36		CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	36	Lts	
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)		8	hrs	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1		
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)		150.00	hrs	CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):			0.2400

I.- CARGOS FIJOS	**OPERACIONES**	**ACTIVA**	**%**	**ESPERA**	**%**	**RESERVA**
a).- DEPRECIACION.....D =(Vm-Vr)/Ve	($1,108,799.2-$110,879.92)/10,000.00	$ 99.79	100%	$ 99.79	15%	$ 14.97
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	($1,108,799.2+$110,879.92)x11.0900 %/(2x2000)	$ 33.82	100%	$ 33.82	100%	$ 33.82
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	($1,108,799.20+$110,879.92)x4.00 %/(2x2000)	$ 12.20	100%	$ 12.20	100%	$ 12.20
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	0.8 x 99.79	$ 79.83		$ -	15%	$ 11.97
	Suma Cargos Fijos	**$ 225.64**		**$ 145.81**		**$ 72.96**

II.- CONSUMOS

a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0.1514x124x $21.2	$ 398.00	5%	$ 19.90		$ -
b).-Otras Fuentes de Energia	$.00 * 0	$ -	5%	$ -		$ -
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.003x124)+36/150] x $80lt	$ 48.96	5%	$ 2.45		$ -
d). Llantas.....N=Pn/Vn	$26,800.00/3,000	$ 8.93	15%	$ 1.34		$ -
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	$00/0	$ -		$ -		$ -

f).-Otros Consumos

Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe		
		$ -	-				
		$ -	-			Suma:	$ -
		$ -	-				
		Suma de Otros Consumos	$ -	5%	$ -		$ -
		Suma de Consumos	**$ 455.89**		**$ 23.69**		**$ -**

III.- OPERACIÓN	CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht
MO093	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JOR	$ 914.91	8.0000	$ 114.36
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
		Suma de Operación Po=S/Ht	**$114.36**	100% **$114.36**	100% **$114.36**
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA			**$ 795.89**	**$ 283.86**	**$ 187.32**

Dependencia: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Licitación: 41066004-016-2023 FECHA: 03/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Ubicación: ,ACAPULCO DE JUAREZ,Guerrero

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO	C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA	RLOPySRM
Licitante	JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES:	ART. 210

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES

Código: EQPIPA	**Modelo:**		**Capacidad:**		
CAMION PIPA DE 9 M3			**Serie:**		
			Tipo de Combustible:	GASOLINA	
Indicador Economico de Referencia:	CETES		% Tasa de Interes Anual:	11.090%	
Indicador Especifico de mercado de Seguros:	CETES		% Prima Anual Promedio de Seguros:	4.000%	

PRECIO DE ADQUISICION	$	703,488.70		VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	5		
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	$	16,000.00		HORAS POR AÑO (Hea):	2000	Hrs	
EQUIPO ADICIONAL:	$	-		VIDA ECONOMICA (Ve):	10000	Hrs	
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)		2000.00	hrs	COSTO COMBUSTIBLE (Pc):	20.45	/Lts	
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	$	-		COSTO LUBRICANTE (Pa):	104.48	/Lts	
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)			hrs	POTENCIA NOMINAL:	130	HP	
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	$	687,488.70		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):	0.7		
VALOR DE RESCATE (Vr)		20%	$ 137,497.74	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):	91		
TASA DE INTERES ANUAL (i)		11.0900%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8		
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		4.0000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):	0.2271		
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	$	914.91		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):	0.0035		
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	$	114.36		CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	18	Lts	
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)		8	hrs	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1		
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)		200.00	hrs	CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):	0.0900		

I.- CARGOS FIJOS	**OPERACIONES**	**ACTIVA**	**%**	**ESPERA**	**%**	**RESERVA**
a).- DEPRECIACION.....D =(Vm-Vr)/Ve	($687,488.7-$137,497.74)/10,000.00	$ 55.00	100%	$ 55.00	15%	$ 8.25
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	($687,488.7+$137,497.74)x11.0900 %/(2x2000)	$ 22.87	100%	$ 22.87	100%	$ 22.87
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	($687,488.70+$137,497.74)x4.00 %/(2x2000)	$ 8.25	100%	$ 8.25	100%	$ 8.25
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	0.8 x 55	$ 44.00		$ -	15%	$ 6.60
	Suma Cargos Fijos	**$ 130.12**		**$ 86.12**		**$ 45.97**

II.- CONSUMOS

a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0.2271x91x $20.45	$ 422.62	5%	$ 21.13		$ -
b).-Otras Fuentes de Energia	$.00 * 0	$ -	5%	$ -		$ -
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.0035x91)+18/200] x $104.48lt	$ 42.68	5%	$ 2.13		$ -
d). Llantas.....N=Pn/Vn	$16,000.00/2,000	$ 8.00	15%	$ 1.20		$ -
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	$00/0	$ -		$ -		$ -

f).-Otros Consumos

Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe	
		$ -	-			
		$ -	-			Suma: $ -
		$ -	-			

Suma de Otros Consumos	$ -	5%	$ -	$ -
Suma de Consumos	**$ 473.30**		**$ 24.46**	**$ -**

III.- OPERACIÓN	CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht
MO093	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JOR	$ 914.91	8.0000	$ 114.36
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -

Suma de Operación Po=S/Ht	**$114.36**	100%	**$114.36**	100%	**$114.36**
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA	**$ 717.78**		**$ 224.94**		**$ 160.33**

Dependencia: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Licitación: 41066004-016-2023 FECHA: 03/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Ubicación: ,ACAPULCO DE JUAREZ,Guerrero

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO	C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA	RLOPySRM
Licitante	JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES:	ART. 210

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES

Código: EQBAILAR	**Modelo:**	**Capacidad:**	
BAILARINA DE 4.5 HP		**Serie:**	
		Tipo de Combustible:	GASOLINA
Indicador Economico de Referencia:	CETES	% Tasa de Interes Anual:	11.090%
Indicador Especifico de mercado de Seguros:	CETES	% Prima Anual Promedio de Seguros:	4.000%

PRECIO DE ADQUISICION	$	33,607.00		VIDA ECONOMICA EN ANOS:	4	
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	$	-		HORAS POR AÑO (Hea):	1000	Hrs
EQUIPO ADICIONAL:	$	-		VIDA ECONOMICA (Ve):	4000	Hrs
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)			hrs	COSTO COMBUSTIBLE (Pc):	20.45	/Lts
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	$	-		COSTO LUBRICANTE (Pa):	104.48	/Lts
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)			hrs	POTENCIA NOMINAL:	8	HP
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	$	33,607.00		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):	1	
VALOR DE RESCATE (Vr)		10%	$ 3,360.70	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):	8	
TASA DE INTERES ANUAL (i)		11.0900%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8	
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		4.0000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):	0.1514	
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	$	444.84		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):	0.003	
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	$	55.61		CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	1	Lts
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)		8	hrs	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1	
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)		100.00	hrs	CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):	0.0100	

I.- CARGOS FIJOS	OPERACIONES	ACTIVA	%	ESPERA	%	RESERVA
a).- DEPRECIACION.....D =(Vm-Vr)/Ve	($33,607.-$3,360.7)/4,000.00	$ 7.56	100%	$ 7.56	15%	$ 1.13
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	($33,607.+$3,360.7)x11.0900 %/(2x1000)	$ 2.05	100%	$ 2.05	100%	$ 2.05
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	($33,607.00+$3,360.70)x4.00 %/(2x1000)	$ 0.74	100%	$ 0.74	100%	$ 0.74
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	0.8 x 7.56	$ 6.05		$ -	15%	$ 0.91
	Suma Cargos Fijos	**$ 16.40**		**$ 10.35**		**$ 4.83**

II.- CONSUMOS						
a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0.1514x8x $20.45	$ 24.77	5%	$ 1.24		$ -
b).-Otras Fuentes de Energia	$.00 * 0	$ -	5%	$ -		$ -
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.003x8)+1/100] x $104.48lt	$ 3.55	5%	$ 0.18		$ -
d). Llantas.....N=Pn/Vn	$.00/0	$ -	15%	$ -		$ -
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	$00/0	$ -		$ -		$ -

f).-Otros Consumos

Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe	
		$ -	-			
		$ -	-			Suma: $ -
		$ -	-			

Suma de Otros Consumos	$ -	5%	$ -	$ -
Suma de Consumos	**$ 28.32**		**$ 1.42**	**$ -**

III.- OPERACIÓN	CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	$ 444.84	8.0000	$ 55.61
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -

Suma de Operación Po=S/Ht	**$55.61**	100%	**$55.61**	100%	**$55.61**
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA	**$ 100.33**		**$ 67.38**		**$ 60.44**

Dependencia: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Licitación: 41066004-016-2023 FECHA: 03/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Ubicación: ,ACAPULCO DE JUAREZ,Guerrero

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO	C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA	RLOPySRM
Licitante	JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES:	ART. 210

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES

Código: EQPLAN	**Modelo:**		**Capacidad:**		
PLANTA DE SOLDAR MILLER			**Serie:**		
			Tipo de Combustible:		
Indicador Economico de Referencia:	CETES		% Tasa de Interes Anual:	11.090%	
Indicador Especifico de mercado de Seguros:	CETES		% Prima Anual Promedio de Seguros:	4.000%	

PRECIO DE ADQUISICION	$	25,521.00		VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	5		
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	$	-		HORAS POR AÑO (Hea):	2000	Hrs	
EQUIPO ADICIONAL:	$	-		VIDA ECONOMICA (Ve):	10000	Hrs	
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)			hrs	COSTO COMBUSTIBLE (Pc):		/Lts	
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	$	-		COSTO LUBRICANTE (Pa):		/Lts	
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)			hrs	POTENCIA NOMINAL:		HP	
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	$	25,521.00		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):	1		
VALOR DE RESCATE (Vr)		9%	$ 2,345.38	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):			
TASA DE INTERES ANUAL (i)		11.0900%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	1.5		
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		4.0000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):	0.1514		
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	$	444.84		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):	0.003		
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	$	55.61		CAPACIDAD DEL CARTER (CC):		Lts	
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)		8	hrs	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1		
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)			hrs	CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):			

I.- CARGOS FIJOS	**OPERACIONES**	**ACTIVA**	**%**	**ESPERA**	**%**	**RESERVA**
a).- DEPRECIACION.....D =(Vm-Vr)/Ve	($25,521.-$2,345.38)/10,000.00	$ 2.32	100%	$ 2.32	15%	$ 0.35
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	($25,521.+$2,345.38)x11.0900 %/(2x2000)	$ 0.77	100%	$ 0.77	100%	$ 0.77
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	($25,521.00+$2,345.38)x4.00 %/(2x2000)	$ 0.28	100%	$ 0.28	100%	$ 0.28
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	1.5 x 2.32	$ 3.48		$ -	15%	$ 0.52
	Suma Cargos Fijos	**$ 6.85**		**$ 3.37**		**$ 1.92**

II.- CONSUMOS						
a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0.1514x0x $0	$ -	5%	$ -		$ -
b).-Otras Fuentes de Energia	$4.90 * 1	$ 4.90	5%	$ 0.25		$ -
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.003x0)+0/0] x $0lt	$ -	5%	$ -		$ -
d). Llantas.....N=Pn/Vn	$.00/0	$ -	15%	$ -		$ -
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	$00/0	$ -		$ -		$ -

f).-Otros Consumos

Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe		
		$ -	-				
		$ -	-			Suma:	$ -
		$ -	-				

Suma de Otros Consumos	$ -	5%	$ -		$ -
Suma de Consumos	**$ 4.90**		**$ 0.25**		**$ -**

III.- OPERACIÓN	CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	$ 444.84	8.0000	$ 55.61
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
	Suma de Operación Po=S/Ht		**$55.61**	100% **$55.61**	100% **$55.61**
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA			**$ 67.36**	**$ 59.23**	**$ 57.53**

Dependencia: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Licitación: 41066004-016-2023 FECHA: 03/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Ubicación: ,ACAPULCO DE JUAREZ,Guerrero

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO **Licitante**	C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES:	RLOPySRM ART. 210

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES

Código: EQVIB VIBRADOR PARA CONCRETO	**Modelo:**	**Capacidad:** **Serie:** Tipo de Combustible: GASOLINA	
Indicador Economico de Referencia: CETES		% Tasa de Interes Anual:	11.090%
Indicador Especifico de mercado de Seguros: CETES		% Prima Anual Promedio de Seguros:	3.000%

PRECIO DE ADQUISICION	$	118,783.44		VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	0.8	
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	$	-		HORAS POR AÑO (Hea):	2500	Hrs
EQUIPO ADICIONAL:	$	-		VIDA ECONOMICA (Ve):	2000	Hrs
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)			hrs	COSTO COMBUSTIBLE (Pc):	24	/Lts
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	$	-		COSTO LUBRICANTE (Pa):	123.8	/Lts
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)			hrs	POTENCIA NOMINAL:	4	HP
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	$	118,783.44		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):	1	
VALOR DE RESCATE (Vr)		20%	$ 23,756.69	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):	4	
TASA DE INTERES ANUAL (i)		11.0900%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.3	
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		3.0000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):	0.227	
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	$	444.84		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):	0.003	
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	$	22.24		CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	5	Lts
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)		20	hrs	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1	
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)		100.00	hrs	CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):		0.0500

I.- CARGOS FIJOS	**OPERACIONES**	**ACTIVA**	**%**	**ESPERA**	**%**	**RESERVA**
a).- DEPRECIACION.....D =(Vm-Vr)/Ve	($118,783.44-$23,756.69)/2,000.00	$ 47.51	100%	$ 47.51	15%	$ 7.13
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	($118,783.44+$23,756.69)x11.0900 %/(2x2500)	$ 3.16	100%	$ 3.16	100%	$ 3.16
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	($118,783.44+$23,756.69)x3.00 %/(2x2500)	$ 0.86	100%	$ 0.86	100%	$ 0.86
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	0.3 x 47.51	$ 14.25		$ -	15%	$ 2.14
	Suma Cargos Fijos	**$ 65.78**		**$ 51.53**		**$ 13.29**

II.- CONSUMOS						
a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0.227x4x $24	$ 21.79	5%	$ 1.09		$ -
b).-Otras Fuentes de Energia	$.00 * 0	$ -	5%	$ -		$ -
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.003x4)+5/100] x $123.8lt	$ 7.68	5%	$ 0.38		$ -
d). Llantas.....N=Pn/Vn	$.00/0	$ -	15%	$ -		$ -
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	$00/0	$ -		$ -		$ -

f).-Otros Consumos

Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe	
		$ -	-			
		$ -	-			Suma: $ -
		$ -	-			

Suma de Otros Consumos	$ -	5%	$ -		$ -
Suma de Consumos	**$ 29.47**		**$ 1.47**		**$ -**

III.- OPERACIÓN	CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	$ 444.84	20.0000	$ 22.24
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
	Suma de Operación Po=S/Ht		**$22.24**	100% **$22.24**	100% **$22.24**
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA			**$ 117.49**	**$ 75.24**	**$ 35.53**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-016-2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

TABULADOR DE SALARIO BASE DE MANO DE OBRA E INTREGRACION DE SALARIOS

Código	Concepto	Unidad	Salario Base por Jornal	Factor Salario Real	Salario Real
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	$400.00	1.69964	$679.86
MOAY0001	AYUDANTE GENERAL	JOR	$350.00	1.71868	$601.54
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$550.00	1.66348	$914.91
MOFI0001	OFIC. FIERRERO	JOR	$375.00	1.70856	$640.71
MOF-H	OFIC. HERRERO	JOR	$375.00	1.70856	$640.71
MOF-P	OFIC. PINTOR	JOR	$375.00	1.70856	$640.71
MO02	OFIC. ALBAÑIL	JOR	$500.00	1.67311	$836.56
MO-ELEC	OFIC. ELECTRICO	JOR	$375.00	1.70856	$640.71
MO083	OFIC. PLOMERO	JOR	$350.00	1.71868	$601.54
MO01	PEON	JOR	$250.00	1.77935	$444.84

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO
AE - 02

LICITACIÓN No: 41066004-016-2023 Fecha: 2023/08/03

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

LUGAR: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO	***C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA***
Nombre del Licitante	JEFE DEL DEPTO DE COSTOS Y LICITACIONES:

DATOS BÁSICOS PARA EL ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL

Inicio: 14-ago-23 Terminación: 11-nov-23 Duración : 90 dias

DICAL	DÍAS CALENDARIO		365.00
DIAGI	DÍAS DE AGUINALDO		15.00
PIVAC	DÍAS POR PRIMA VACACIONAL		1.50
	Prima dominical		
Tp	**TOTAL DE DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO**	SUMA:	**381.50**
DIDOM	DÍAS DOMINGO		52.00
DIVAC	DÍAS DE VACACIONES		6.00
DILUN	DÍAS LUNES		3.00
DIFEO	DÍAS FESTIVOS POR LEY		2.00
DIPEC	DÍAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIA Y OTROS)		5.00
DIPCO	DÍAS POR COSTUMBRE		6.00
DIPEN	DÍAS POR PERMISOS Y ENFERMEDAD NO PROFESIONAL		
DISIN	DÍAS POR SINDICATO (CONTRATO COLECTIVO)		
DINLA	**DÍAS NO LABORADOS AL AÑO**	SUMA:	**74.00**
TI	**TOTAL DE DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO (DICAL)-(DINLA)**		291.00
Tp / TI	DÍAS PAGADOS / DÍAS LABORADOS		1.310997
FSBC	FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN (Tp-Te) / DICAL para cálculo de IMSS		1.045205

TABLA DE SALARIOS REALES

SALARIO MINIMO D.F $: 207.44

CLAVE	CATEGORÍAS	Salario Nominal $	Tp / TI	Obligación Obrero Patronal Ps= IMSS e INFONAVIT	Ps x (Tp/TI)	Otros cargos	Fsr= Ps (Tp / TI) + (Tp/TI)+G
						Otros cargos	
A	B	C	D	E	F = E x D	G = 0 %	H = D + F + G
MO01	PEON	250.00	1.310997	0.357252	0.468356		1.779353
MO02	OFIC. ALBAÑIL	500.00	1.310997	0.276215	0.362117		1.673114
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	400.00	1.310997	0.296450	0.388645		1.699642
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	250.00	1.310997	0.357252	0.468356		1.779353
MO082	CABO DE OFICIOS	550.00	1.310997	0.268865	0.352481		1.663478
MO083	OFIC. PLOMERO	350.00	1.310997	0.310973	0.407685		1.718682
MO093	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	550.00	1.310997	0.268865	0.352481		1.663478
MOAY0001	AYUDANTE GENERAL	350.00	1.310997	0.310973	0.407685		1.718682
MOCAMION-6	OPERADOR DE CAMION DE VOLTEO	450.00	1.310997	0.285240	0.373949		1.684946
MO-ELEC	OFIC. ELECTRICO	375.00	1.310997	0.303253	0.397564		1.708561
MOF-H	OFIC. HERRERO	375.00	1.310997	0.303253	0.397564		1.708561
MOFI0001	OFIC. FIERRERO	375.00	1.310997	0.303253	0.397564		1.708561
MOF-P	OFIC. PINTOR	375.00	1.310997	0.303253	0.397564		1.708561
MOOPERRETRO	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	450.00	1.310997	0.285240	0.373949		1.684946

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Inicio: 14/08/2023
Terminación: 11/11/2023
Duración: 90 Días

LICITACIÓN No: 41066004-016-2023 Fecha: 2023/08/03

Obra : REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Ubicación: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

DOCUMENTO
AE - 02

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
Nombre del Licitante

C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
JEFE DEL DEPTO DE COSTOS Y LICITACIONES:

Firma

SALARIO MINIMO D.F $:	207.44	3 veces salario mínimo D.F.	622.32	25 veces salario mínimo D.F.	5186.00	25 veces salario mínimo D.F.	5,186.00

CATEGORIA	SALARIO			I. RIESGO	II. ENFERMEDAD Y MATERNIDAD					III	IV		V			TOTAL	PS
Clave de Categoría	Salario Nominal $	Factor Salario Base de Cotización	Salario Base de Cotización	DE TRABAJO	Cuota Fija	Excedente de tres salarios mínimos	Aplicación IMSS al excedente	Prestaciones en dinero	Gastos médicos pensionados	INVALIDEZ Y VIDA	Retiro (SAR)	Cesantía en edad avanzada y vejez	Guarderías y Prestaciones sociales	INFONAVIT	Impuesto Sobre Nómina	Suma prestaciones	Obligación Obrero-Patronal
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
			BxC	ExD	FxSMDF	D-3SMDF	HxG	IxD	JxD	KxD	LxD	MxD	NxD	OxD	PxD	SUMA(F:P)	Q / D
	Sn	FSBC	SBC	0.50000%	20.4000%		1.5000%	0.9500%	1.4250%	2.3750%	2.00%	4.2750%	1.00%	5.00%	2.00%	SP	SP/SBC
MO01	250.00	1.0452	261.30	1.31	42.32			2.48	3.72	6.21	5.23	11.17	2.61	13.07	5.23	93.35	0.357252
MO02	500.00	1.0452	522.60	2.61	42.32			4.96	7.45	12.41	10.45	22.34	5.23	26.13	10.45	144.35	0.276215
MO031	400.00	1.0452	418.08	2.09	42.32			3.97	5.96	9.93	8.36	17.87	4.18	20.90	8.36	123.94	0.296450
MO067	250.00	1.0452	261.30	1.31	42.32			2.48	3.72	6.21	5.23	11.17	2.61	13.07	5.23	93.35	0.357252
MO082	550.00	1.0452	574.86	2.87	42.32			5.46	8.19	13.65	11.50	24.58	5.75	28.74	11.50	154.56	0.268865
MO083	350.00	1.0452	365.82	1.83	42.32			3.48	5.21	8.69	7.32	15.64	3.66	18.29	7.32	113.76	0.310973
MO093	550.00	1.0452	574.86	2.87	42.32			5.46	8.19	13.65	11.50	24.58	5.75	28.74	11.50	154.56	0.268865
MOAY0001	350.00	1.0452	365.82	1.83	42.32			3.48	5.21	8.69	7.32	15.64	3.66	18.29	7.32	113.76	0.310973
MOCAMION-6	450.00	1.0452	470.34	2.35	42.32			4.47	6.70	11.17	9.41	20.11	4.70	23.52	9.41	134.16	0.285240
MO-ELEC	375.00	1.0452	391.95	1.96	42.32			3.72	5.59	9.31	7.84	16.76	3.92	19.60	7.84	118.86	0.303253
MOF-H	375.00	1.0452	391.95	1.96	42.32			3.72	5.59	9.31	7.84	16.76	3.92	19.60	7.84	118.86	0.303253
MOFI0001	375.00	1.0452	391.95	1.96	42.32			3.72	5.59	9.31	7.84	16.76	3.92	19.60	7.84	118.86	0.303253
MOF-P	375.00	1.0452	391.95	1.96	42.32			3.72	5.59	9.31	7.84	16.76	3.92	19.60	7.84	118.86	0.303253
MOOPERRETRO	450.00	1.0452	470.34	2.35	42.32			4.47	6.70	11.17	9.41	20.11	4.70	23.52	9.41	134.16	0.285240

XIV.- ANALISIS DE INDIRECTOS Y UTILIDAD

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023 FECHA: 03/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

DOCUMENTO AE - 04

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

INICIO: 14/08/2023 TERMINACION: 11/11/2023 PLAZO: 90 DIAS

DESGLOSE DE COSTOS INDIRECTOS

MONTO DE LA OBRA A COSTO DIRECTO $ 3,340,812.23

CONCEPTO	TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS			
	ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL		ADMINISTRACION OFICINA DE CAMPO	
	MONTO	PORCENTAJE	MONTO	PORCENTAJE
I. HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES				
a. Personal directivo incluye: Prestaciones	165,149.56	4.9434%		
b. Personal técnico incluye: Prestaciones	48,000.16	1.4368%	199,499.42	5.9716%
c. Personal administrativo incluye: Prestaciones	37,823.88	1.1322%	43,439.88	1.3003%
d. Cuota Patronal del Seguro Social del inciso a, b y c (consideradas)				
e. Prestaciones de la LFT del inciso a, b y c (consideradas)				
f. Pasajes y viáticos (consideradas)				
g. Los que deriven de suscripción de contratos de trabajo del inciso a,b y c.				
SUBTOTALES	**250,973.60**		**242,939.30**	
II. DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS				
a. Edificios y Locales	6,681.62	0.2000%		
b. Locales de Mantenimiento y Guarda	3,340.81	0.1000%	5,011.22	0.1500%
c. Bodegas	2,505.61	0.0750%		
d. Instalaciones Generales	2,672.65	0.0800%	3,340.81	0.1000%
e. Muebles y enseres	1,503.37	0.0450%		
f. Depreciación o Renta, y Operación de Vehículos	2,004.49	0.0600%	5,011.22	0.1500%
g. Campamentos				
SUBTOTALES	**18,708.55**		**13,363.25**	
III. SERVICIOS				
a. Consultores,Asesores,Servicio y Laboratorios			6,681.62	0.2000%
b. Estudios e Investigación	3,340.81	0.1000%	3,340.81	0.1000%
SUBTOTALES	**3,340.81**		**10,022.44**	
IV. FLETES Y ACARREOS				
a. De Campamentos			1,844.13	0.0552%
b. De Equipo de Construcción				
c. De Plantas y elementos para Instalaciones				
d. De mobiliario			6,347.54	0.1900%
SUBTOTALES			**8,191.67**	
V. GASTOS OFICINA				
a. Papelería y útiles de escritorio	4,008.97	0.1200%	2,338.57	0.0700%
b. Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio.	3,006.73	0.0900%	334.08	0.0100%
c. equipo de computación	2,672.65	0.0800%		
d. Situación de fondos	1,670.41	0.0500%		
e. Copias y duplicados	835.20	0.0250%		
f. Luz, gas y otros consumos	2,004.49	0.0600%	1,670.41	0.0500%
g. Gastos de la licitación	11,692.84	0.3500%		
SUBTOTALES	**25,891.29**		**4,343.06**	
VI. CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	**2,839.69**	0.0850%	**1,670.41**	0.0500%
VII. SEGURIDAD E HIGIENE	**2,839.69**	0.0850%	**1,670.41**	0.0500%
VIII. SEGUROS Y FIANZAS				
a. Primas por Seguro	5,011.22	0.1500%		
b. Primas por Fianzas	5,011.22	0.1500%	20,039.26	0.5998%
SUBTOTALES	**10,022.44**		**20,039.26**	
IX. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES				
a. Construcción y conservación de caminos de acceso				
b. Montaje y desmantelamiento de equipo				
c. Construcción de Instalaciones generales				
1. De Campamentos				
2. De equipo de construcción				
3. De plantas y elementos para instalaciones				
4. Letrero nominativo de obra			4,008.97	0.1200%
SUBTOTALES			**4,008.97**	
TOTALES	314,616.07	9.4174%	306,248.76	9.1668%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA
JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES.

TOTALES $ 620,864.84 % INDIRECTO 18.5842%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ **SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS**	LICITACION 41066004-016-2023 QUE SE CELEBRARA EN GAR DE CELEBRACION ACAPULCO EL DIA: 3 de agosto de 2023 OBRA: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. LUGAR: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero	DOCUMENTO **AE - 05**
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO Razón Social delLicitante	C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACION	FIRMA

DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO (COSTO DIRECTO + INDIRECTO DE OBRA)

Inicio: 14/08/2023 Terminacion: 11/11/2023 Duracion: 90 Dias

COSTO DIRECTO DE LA OBRA:	3,340,812.23	TASA DE INTERES USADA (Anual)=	11.0900%	% APLICABLE AL PERIODO
INDIRECTO DE OBRA:	18.5842%	+ PUNTOS DEL BANCO=	4.0000%	1.6950%
COSTO DIRECTO +INDIRECTO:	3,961,675.46	TASA DE INTERES DIARIA =	0.0413%	LOP ART. 54 P. 1 y 2
MONTO TOTAL DE LA OBRA:	4,310,713.33	DIAS PARA PAGO DE ESTIMACIONES:	41	
			0.0000%	
			0.0000%	
			0.0000%	

ANTICIPOS		MONTO A EJERCER		IMPORTE DE ANTICIPOS		INDICADOR ECONOMICO
EJERCICIO		EJERCICIO		EJERCICIO		CETES 27-JUL-23
30.00%	0.00%	3,961,675.46	0.00	1,188,502.64	0.00	

%Am1= AMORTIZACION1		%Am2= AMORTIZACION2
EJERCICIO	**Spa1**= Saldo Por amortizar al Recibir 2do. Anticipo: $0.00	
%Am1= (Anticipo / 1er + 2do Ejercicio)		**%Am2= Spa1 / Ipe2**
30.0000%	**Ipe2**= Importe por Ejercer al Recibir el 2do Anticipo: $0.00	0.0000%

PERIODO SEGUN PROGRAMA	PERIODO	INGRESOS A COSTO DIRECTO + INDIRECTO				EGRESOS		IMPORTES		FINANCIAMIENTO
		ANTICIPOS	ESTIMACIONES	AMORTIZACION	COBROS	GASTOS DE OBRA (CD+I)	ANTICIPO PROVEEDORES *	DIFERENCIA	DIFERENCIA ACUMULADA	
	0	1,188,502.64	0.00		1,188,502.64	0.00	0.00	1,188,502.64	1,188,502.64	0.00
1	Mes1	0.00	500,689.80	0.00	0.00	500,689.80	**0.00**	-500,689.80	687,812.84	0.00
2	Mes2	0.00	859,559.64	150,206.94	350,482.86	859,559.64	**0.00**	-509,076.78	178,736.06	0.00
3	Mes3	0.00	2,089,279.00	257,867.89	601,691.75	2,089,279.00	**0.00**	-1,487,587.25	-1,308,851.19	-22,185.57
4	Mes4	0.00	512,147.02	626,783.70	1,462,495.30	512,147.02	**0.00**	950,348.27	-358,502.92	-6,076.77
	0	0.00	0.00	153,644.11	358,502.92	0.00	**0.00**	358,502.92	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	TOTALES	1,188,502.64	3,961,675.46	1,188,502.64	3,961,675.46	3,961,675.46	0.00			-28,262.34

0.00

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= INTERES NETO A PAGAR / GASTOS DE OBRA (COSTO DIRECTO +INDIRECTO) = 28,262.34 / 3,961,675.46 = **0.7134%**

* ANEXAR COMPROBANTES (CEDULA DE GASTOS DE ANTICIPOS)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023 03/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

DOCUMENTO
AE - 06

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD

CLAVE	CONCEPTO	FORMULA	IMPORTE	%
CD	COSTO DIRECTO		3,340,812.23	
CI	I.-INDIRECTO		620,864.83	18.5842%
CF	II.-FINANCIAMIENTO		28,261.65	0.7134%
Up%	**UTILIDAD PROPUESTA**			4.5000%
	PTU= PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD		10.00%	
	ISR= IMPUESTO SOBRE LA RENTA		30.00%	
%U	UTILIDAD NETA = Up% / [1- (PTU+ISR)]	%U =4.5 % / [1- (10%+ 30%)]		7.5000%
CU	CARGO POR UTILIDAD (COSTO DIRECTO+ COSTO INDIRECTO+ COSTO FINANCIAMIENTO) x % UTILIDAD NETA			
		($ 3,340,812.23 + $ 620,864.83 + $ 28,261.65) x 7.5% =	$299,245.40	
	IMPORTE TOTAL UTILIDAD		$299,245.40	
	PORCENTAJE TOTAL DE UTILIDAD (%=Total utilidad * 100 / (CD+CI+CF))			
		[$ 299,245.40 / ($ 3,340,812.23 + $ 620,864.83 + $ 28,261.65)] * 100%		**7.5000%**

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA
JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-016-2023 03/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

DOCUMENTO
AE - 07 a

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

DETERMINACION DE CARGOS ADICIONALES

CLAVE	CONCEPTO	FORMULA	IMPORTE	%
CD	COSTO DIRECTO		$3,340,812.23	
CI	I.-INDIRECTO		$620,864.83	18.5842%
CF	II.-FINANCIAMIENTO		$28,261.65	0.7134%
UT	III.- UTILIDAD TOTAL		$299,245.40	7.5000%
		Subtotal	**$4,289,184.11**	
	CARGOS ADICIONALES			
CSFP	IMPORTE DE LAS APORTACIONES POR CONCEPTO DE INSPECCION Y SUPERVISION QUE LAS LEYES DE LA MATERIA ENCOMIENDAN A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA. ARTICULO No. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS.			
	(CSFP = Subtotal / (1-.005) - Subtotal))	$ 4,289,184.11 / (1- 0 .005) - $ 4,289,184.11	$21,553.69	0.5025%
		TOTAL DE CARGOS ADICIONALES	**$21,553.69**	**0.5025%**

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA
JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES

XV.- CROQUIS DE MACRO Y MICROLOCALIZACION

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL (FONDO 3) 2023


CROQUIS DE MACROLOCALIZACION-1

OBRA-. REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES

REGION: 07 ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 ACAPULCO DE JUAREZ

LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

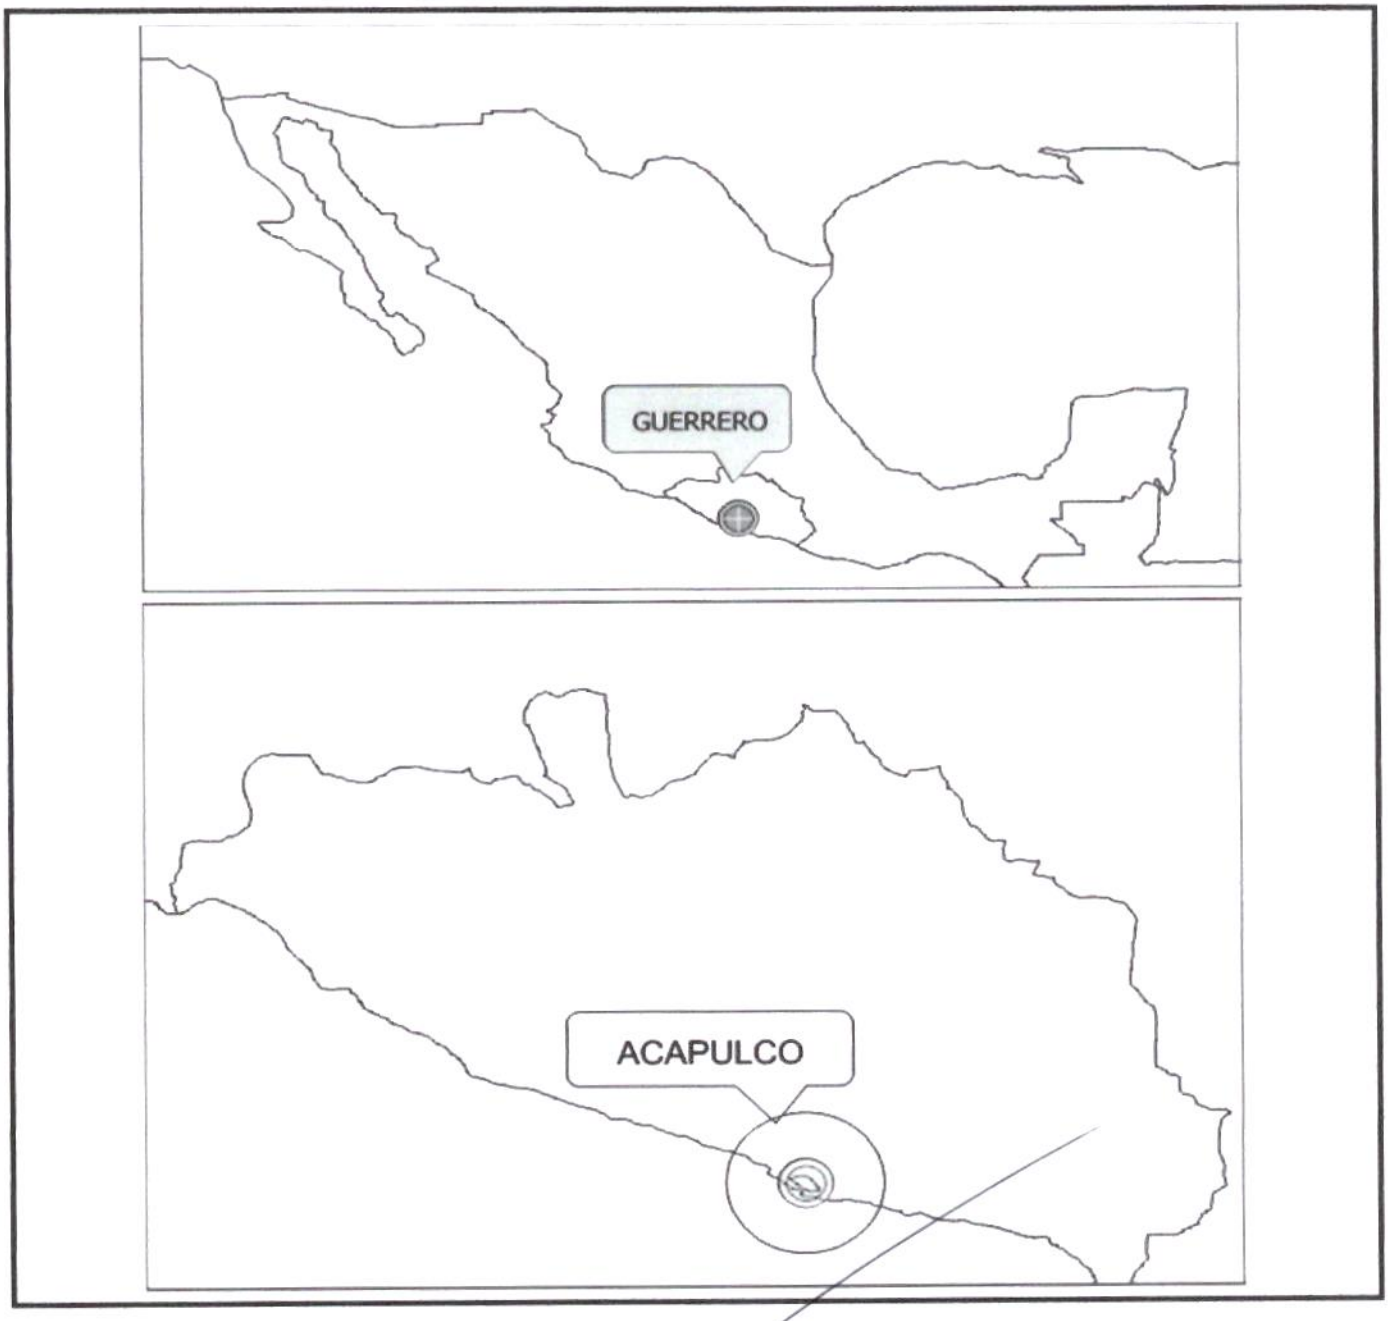

LATITUD: 16°51'45.3"N

LONGITUD: 99°52'10.8"W

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL (FONDO 3) 2023

BIENESTAR

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION-2

OBRA-. REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES
REGION: 07 ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

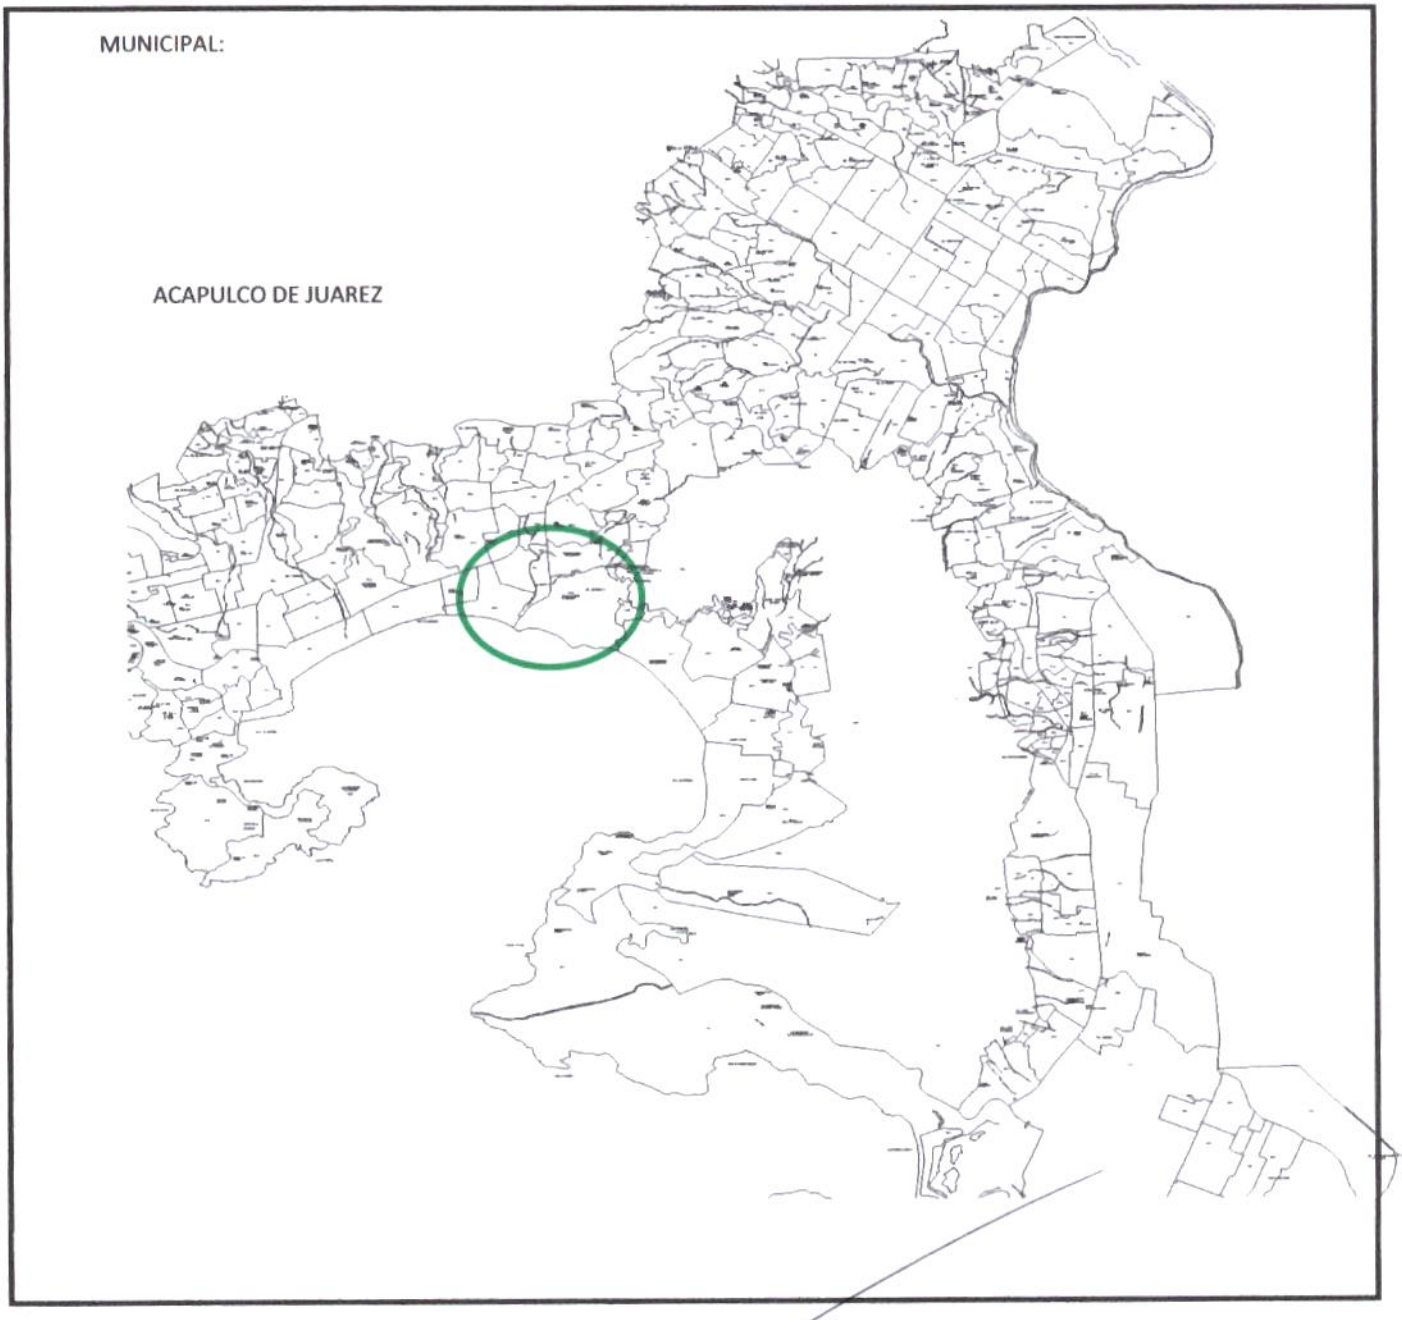

LATITUD: 16°51'45.3"N
LONGITUD: 99°52'10.8"W

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL (FONDO 3) 2023

BIENESTAR


CROQUIS DE MACROLOCALIZACION-3

OBRA-. REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES

REGION: 07 ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 ACAPULCO DE JUAREZ

LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

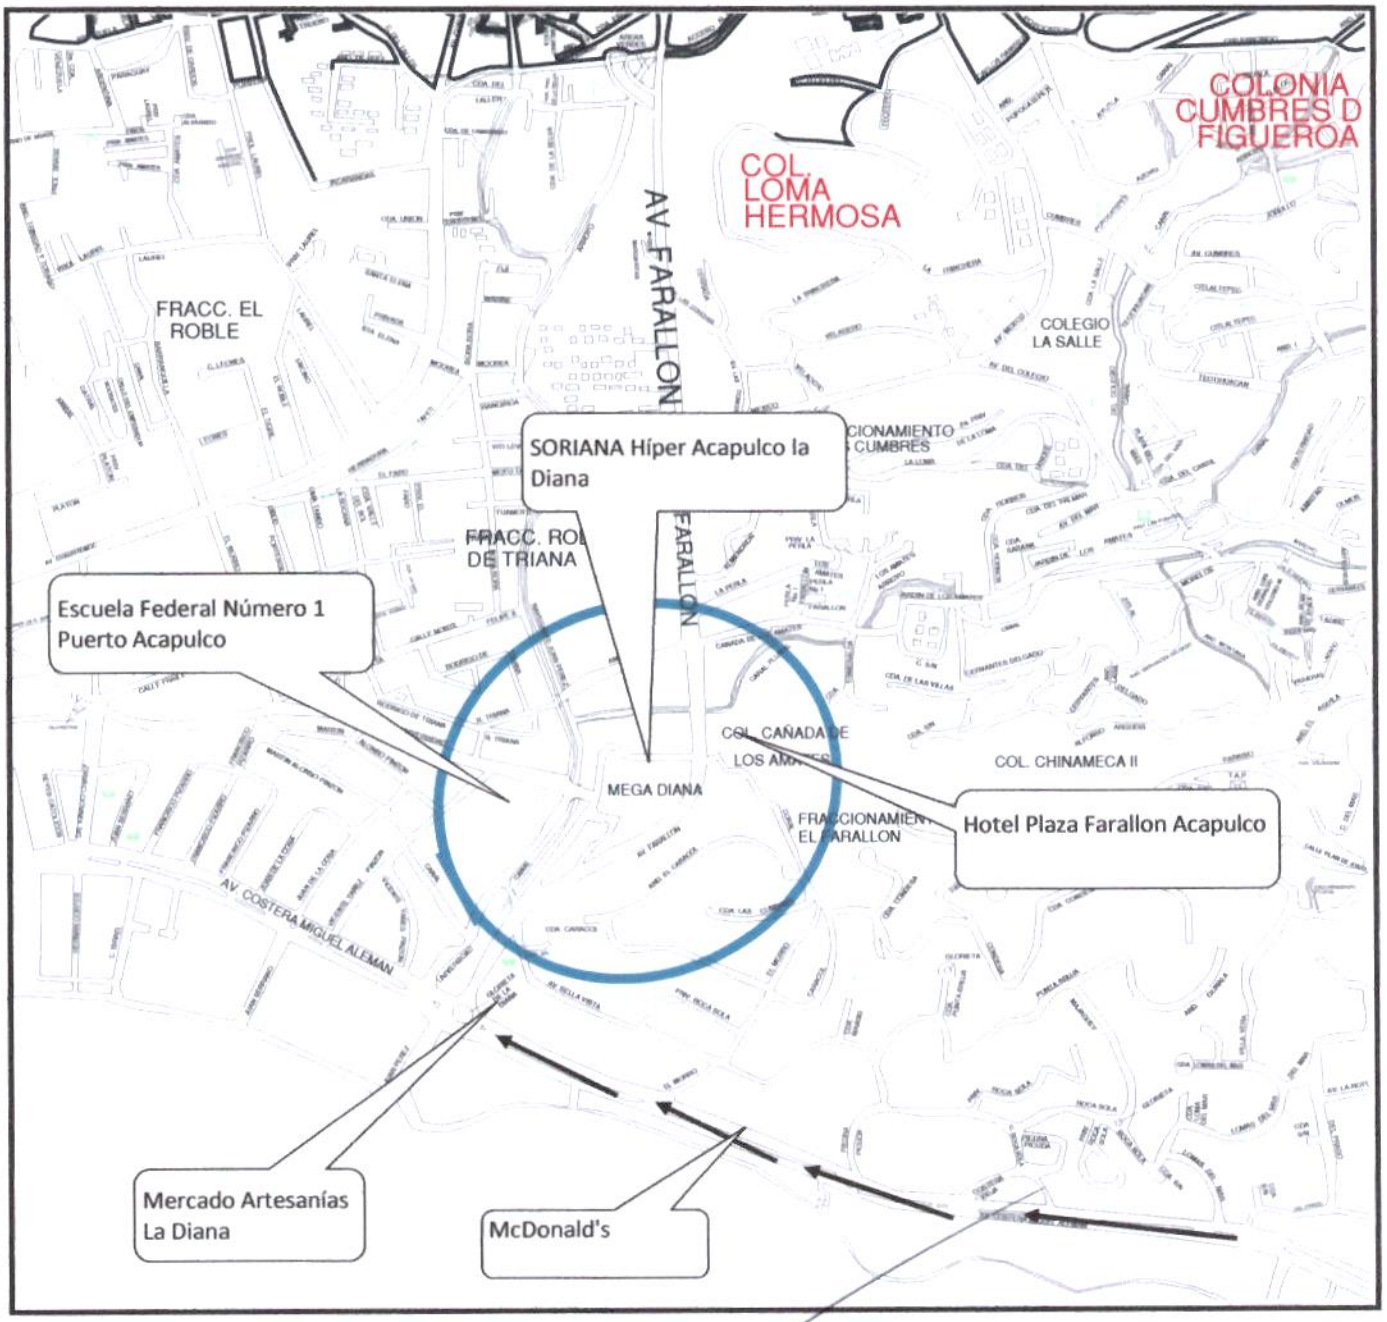

LATITUD: 16°51'45.3"N

LONGITUD: 99°52'10.8"W

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL (FONDO 3) 2023

BIENESTAR


CROQUIS DE MICROLOCALIZACION-4

OBRA-. REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES

REGION: 07 ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 ACAPULCO DE JUAREZ

LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

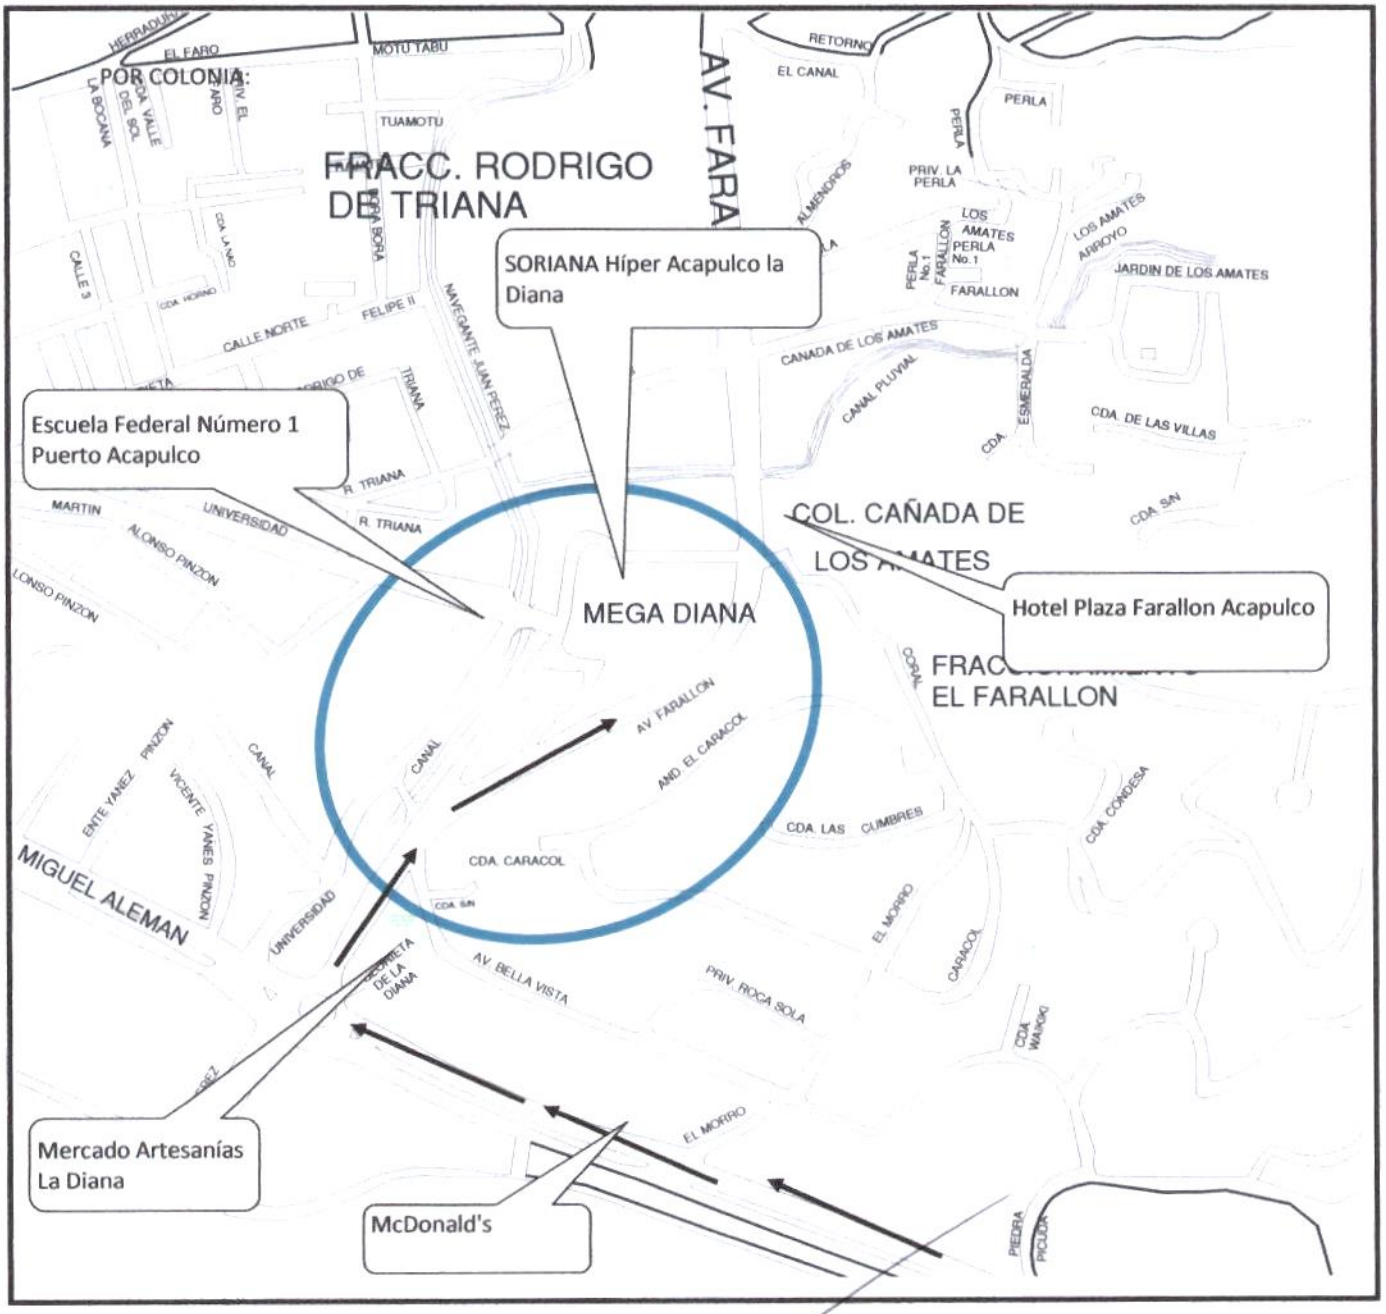

LATITUD: 16°51'45.3"N

LONGITUD: 99°52'10.8"W

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL (FONDO 3) 2023

BIENESTAR


CROQUIS DE MICROLOCALIZACION-5

OBRA-. REHABILITACION DE CALLE FELIPE II, TRAMO FARALLON AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MAGALLANES

REGION: 07 ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 ACAPULCO DE JUAREZ

LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

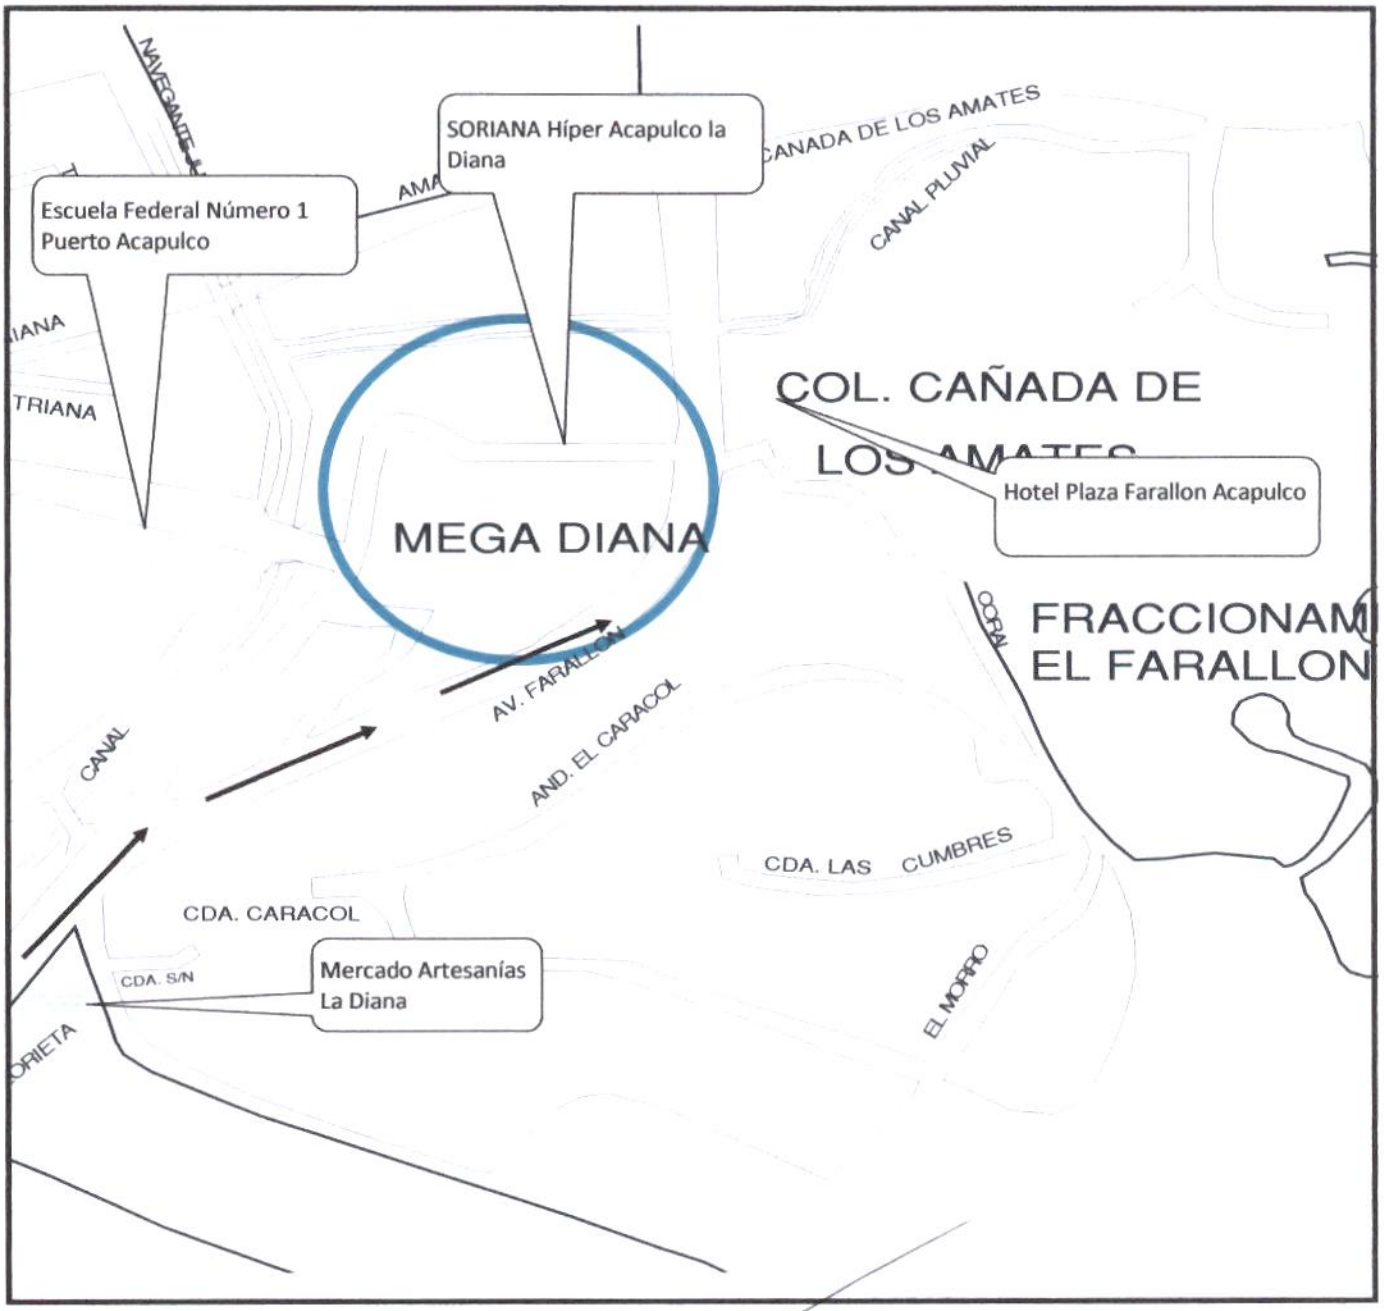

LATITUD: 16°51'45.3"N

LONGITUD: 99°52'10.8"W

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

XVI.- PLANOS Y PROYECTOS
